



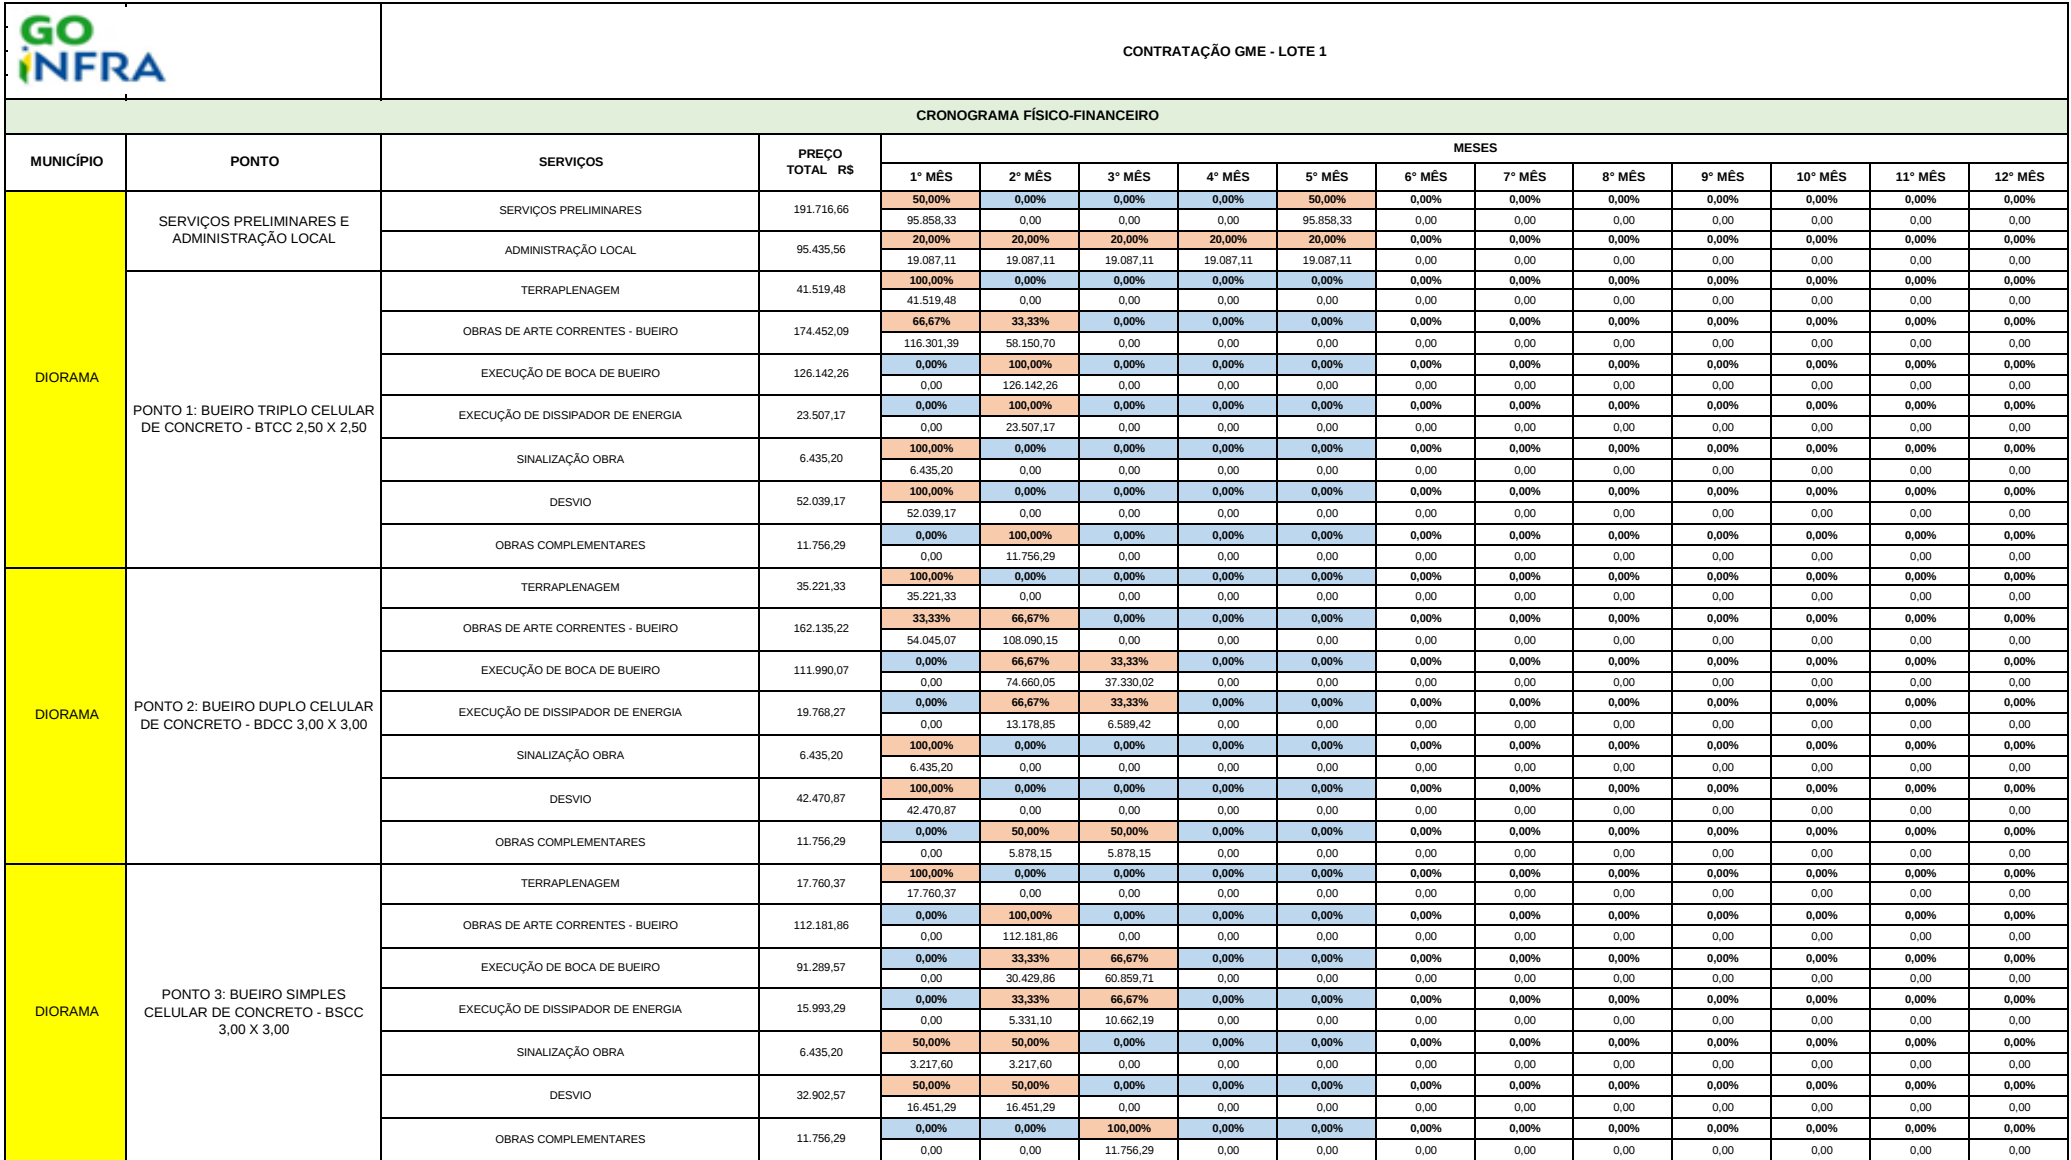

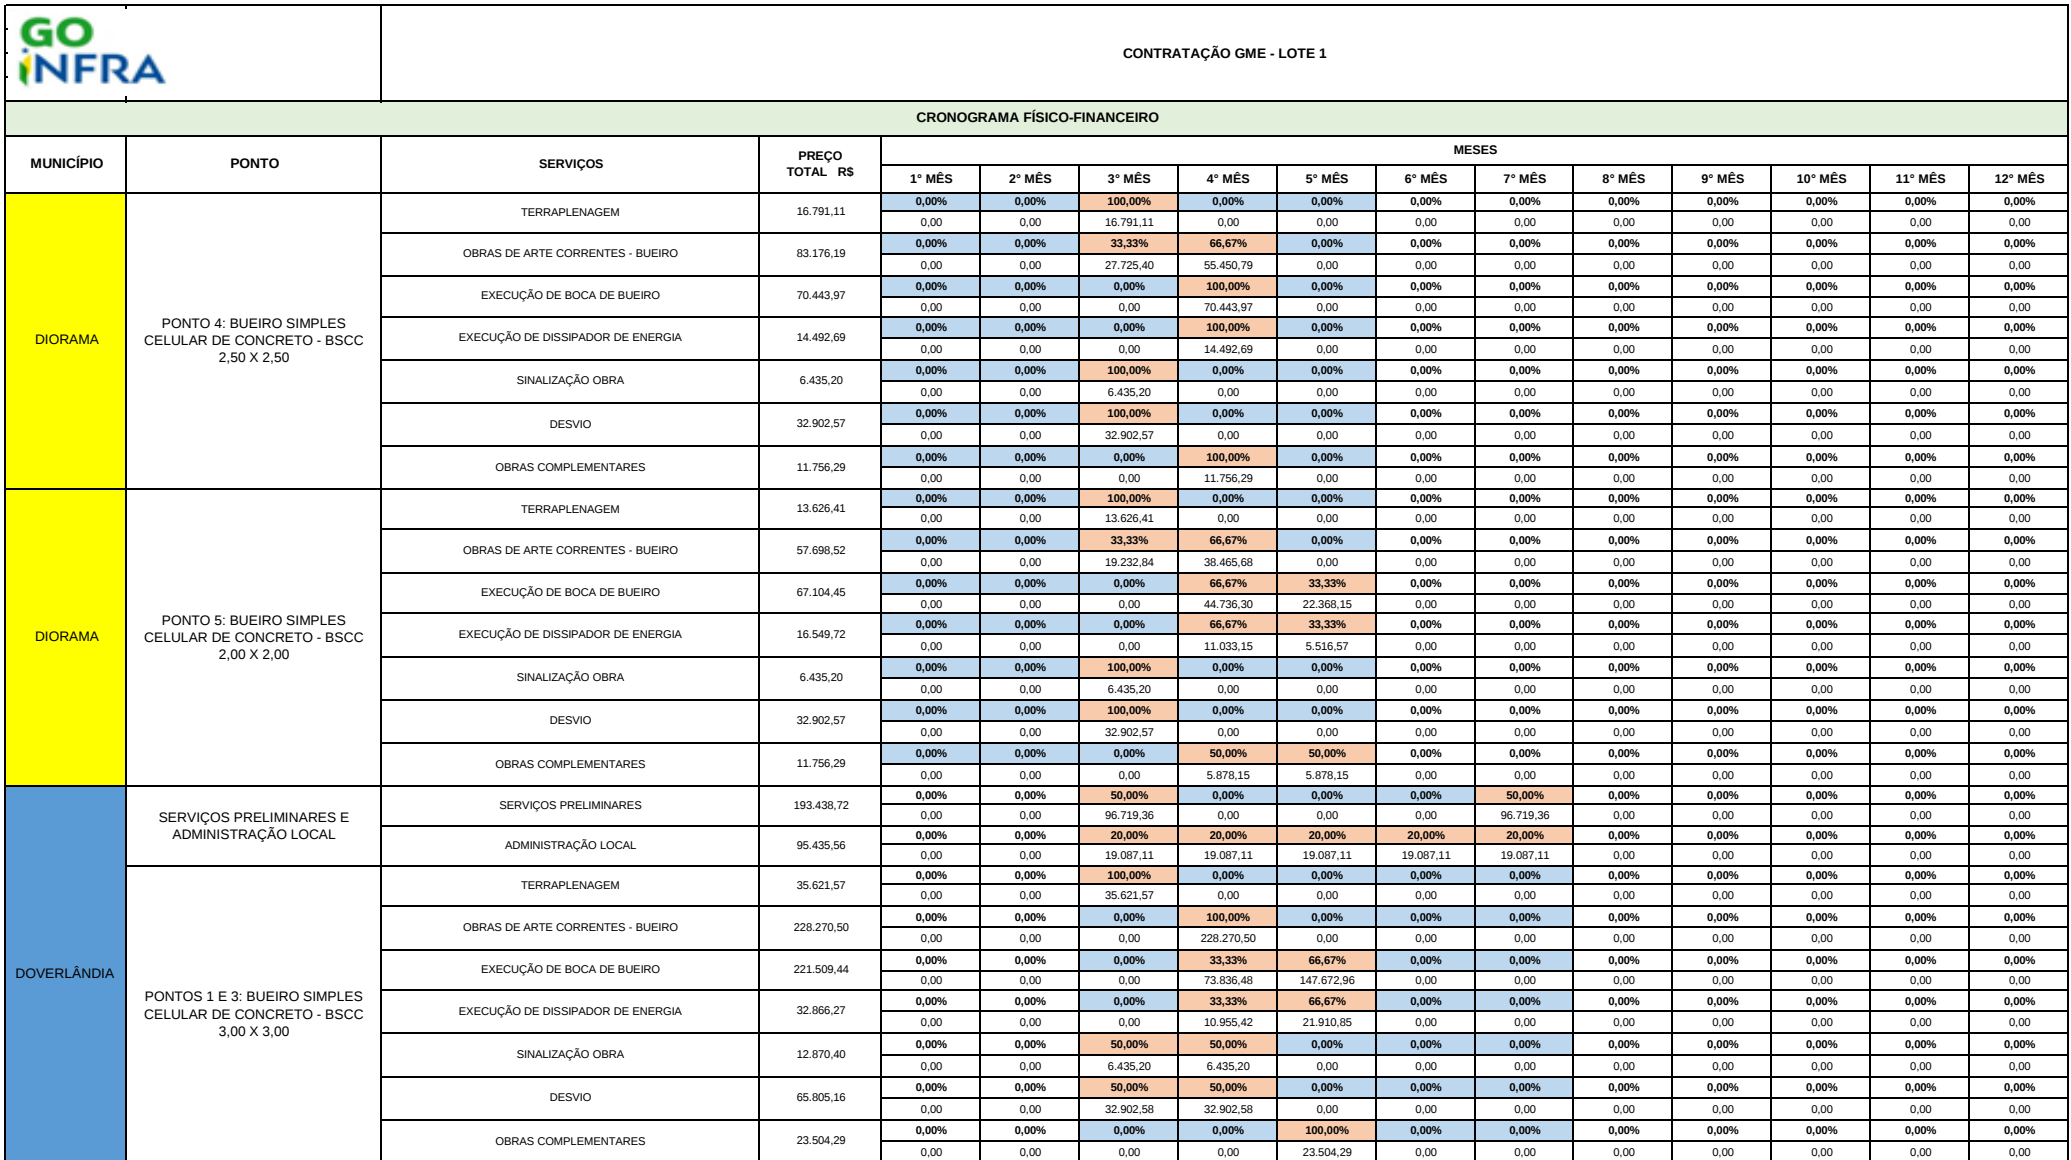

GO INFRA		CONTRATAÇÃO GME - LOTE 1													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
MUNICÍPIO	PONTO	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$	MESES											
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DOVERLÂNDIA	PONTO 2: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 2,50 X 2,50	TERRAPLENAGEM	29.289,70	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	29.289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	126.461,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	84.307,60	42.153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	103.375,95	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	19.235,59	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SINALIZAÇÃO OBRA	6.435,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESVIO	42.470,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS COMPLEMENTARES	11.756,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOVERLÂNDIA	PONTO 4: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BS CC 2,50 X 2,50	TERRAPLENAGEM	16.736,58	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	16.736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	82.898,94	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	27.632,98	55.265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	78.134,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.089,38	26.044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	14.784,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,26	4.928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SINALIZAÇÃO OBRA	6.435,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESVIO	32.902,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	32.902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS COMPLEMENTARES	11.756,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,15	5.878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOVERLÂNDIA	PONTO 5: BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO - BS CC 2,00 X 2,00	TERRAPLENAGEM	13.850,18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	56.465,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	66.234,86	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.078,29	44.156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	15.952,47	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317,49	10.634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SINALIZAÇÃO OBRA	6.435,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,60	3.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESVIO	32.902,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	16.451,29	16.451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS COMPLEMENTARES	11.756,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		CONTRATAÇÃO GME - LOTE 1														
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
MUNICÍPIO	PONTO	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$	MESES												
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
IPORÁ	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERVIÇOS PRELIMINARES	162.947,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.473,91	0,00	0,00	81.473,91	0,00	0,00	0,00	
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	95.435,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,89	23.858,89	23.858,89	23.858,89	0,00	0,00	0,00	
	PONTO 1: BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO - BTCC 3,00 X 3,00	TERRAPLENAGEM	50.043,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.043,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	221.290,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.763,35	147.526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	152.592,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.728,32	50.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	33.979,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.652,88	11.326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SINALIZAÇÃO OBRA	6.435,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DESVIO	52.039,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OBRAS COMPLEMENTARES	11.756,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPORÁ		PONTOS 2 E 3: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 3,00 X 3,00	TERRAPLENAGEM	69.705,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.705,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO		312.613,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.204,36	208.408,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO		142.579,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.053,27	47.526,64	0,00	0,00	0,00	
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA		37.146,42	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.764,28	12.382,14	0,00	0,00	0,00	
	SINALIZAÇÃO OBRA		12.870,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DESVIO		84.941,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OBRAS COMPLEMENTARES		23.504,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,15	11.752,15	0,00	0,00	0,00	
	PONTO 4: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 2,50 X 2,50	TERRAPLENAGEM	28.474,97	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.474,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	115.198,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO		93.714,49	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.238,16	62.476,33	0,00	0,00	0,00		
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA		16.220,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,80	10.813,60	0,00	0,00	0,00		
SINALIZAÇÃO OBRA		6.435,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,60	3.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESVIO		42.470,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.235,44	21.235,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
OBRAS COMPLEMENTARES		11.756,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,29	0,00	0,00	0,00		

		CONTRATAÇÃO GME - LOTE 1															
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
MUNICÍPIO	PONTO	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$	MESES													
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS		
JAUPACI	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERVIÇOS PRELIMINARES	172.078,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.039,13	0,00	0,00	86.039,13	
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	95.435,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,89	23.858,89	23.858,89	23.858,89	
	PONTOS 2, 4 e 7: BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO - BTCC 3,00 X 3,00	TERRAPLENAGEM	152.546,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	697.652,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.550,89	465.101,77	0,00	0,00	
		EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	397.943,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%	33,33%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.295,63	132.647,81	0,00	0,00
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	76.472,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%	33,33%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.981,75	25.490,87	0,00	0,00	
		SINALIZAÇÃO OBRA	19.305,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.305,60	0,00	0,00	0,00	
		DESVIO	156.117,53	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.117,53	0,00	0,00	0,00	
		OBRAS COMPLEMENTARES	35.260,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.630,30	17.630,30	0,00	
		JAUPACI	PONTO 5: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 3,00 X 3,00	TERRAPLENAGEM	35.498,16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.498,16	0,00	0,00	0,00	
OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	165.594,52			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.198,17	110.396,35	0,00	0,00	
EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	112.819,53			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%	33,33%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.213,02	37.606,51	0,00	0,00	
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	20.451,79			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%	33,33%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.634,53	6.817,26	0,00	0,00
SINALIZAÇÃO OBRA	6.435,20			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,20	0,00	0,00	0,00	
DESVIO	42.470,87			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,87	0,00	0,00	0,00	
OBRAS COMPLEMENTARES	11.756,29			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,15	5.878,15	0,00	0,00
JAUPACI	PONTO 6: BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO - BDCC 2,50 X 2,50	TERRAPLENAGEM	28.991,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.991,90	0,00	0,00		
		OBRAS DE ARTE CORRENTES - BUEIRO	121.063,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.354,34	80.708,67	0,00	0,00	
		EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO	98.426,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%	33,33%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.617,93	32.808,97	0,00	0,00
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	17.761,55	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%	33,33%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.841,03	5.920,52	0,00	0,00
		SINALIZAÇÃO OBRA	6.435,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,20	0,00	0,00	
		DESVIO	42.470,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,87	0,00	0,00	
		OBRAS COMPLEMENTARES	11.756,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,29
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				6,46%	7,75%	6,36%	8,19%	8,16%	9,05%	10,70%	7,83%	13,66%	14,61%	5,20%	2,04%		
VALOR SIMPLES				506.842,41	608.062,41	498.980,02	642.831,42	640.613,28	709.842,87	839.621,92	614.081,12	1.072.060,39	1.146.242,68	408.097,44	160.383,79		
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.			100,00%	6,46%	14,21%	20,57%	28,76%	36,92%	45,96%	56,66%	64,49%	78,15%	92,76%	97,96%	100,00%		
VALOR ACUMULADO			7.847.659,76	506.842,41	1.114.904,83	1.613.884,84	2.256.716,27	2.897.329,55	3.607.172,42	4.446.794,34	5.060.875,46	6.132.935,85	7.279.178,53	7.687.275,97	7.847.659,76		
