



CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA - MG
CONTRATADA: PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA
PROJETO: LACHONETE - RECANTO VERDE

REV_00
21/01/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS								
			1	2	3	4	5	6	TOTAL		
1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00	R\$ 4.532,48	0,30%	%	50,00%					50,00%	100,00%
				G							
				R\$	R\$2.266,24					R\$2.266,24	R\$4.532,48
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 177.179,44	11,69%	%	11,99%	24,28%	26,62%	23,04%	11,71%	2,37%	100,00%
				G							
				R\$	R\$21.250,41	R\$43.019,05	R\$47.159,74	R\$40.814,96	R\$20.742,12	R\$4.193,15	R\$177.179,44
3 SERVIÇOS INICIAIS											
3.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.403,47	0,09%	%	100,00%						100,00%
				G							
				R\$	R\$1.403,47						R\$1.403,47
3.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 62.594,41	4,13%	%	26,93%	13,32%	13,32%	13,32%	13,32%	19,80%	100,00%
				G							
				R\$	R\$16.856,42	R\$8.336,11	R\$8.336,11	R\$8.336,11	R\$8.336,11	R\$12.393,55	R\$62.594,41
3.3	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	R\$ 56.302,39	3,72%	%	100,00%						100,00%
				G							
				R\$	R\$56.302,39						R\$56.302,39
3.4	SINALIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 1.618,85	0,11%	%	35,20%	64,80%					100,00%
				G							
				R\$	R\$569,84	R\$1.049,01					R\$1.618,85
4 LACHONETE - RECANTO VERDE											
4.1	SERVIÇOS TÉCNICOS- MONTAGEM DO CANTEIRO	R\$ 17.483,44	1,15%	%	80,00%	20,00%					100,00%
				G							
				R\$	R\$13.986,75	R\$3.496,69					R\$17.483,44
4.2	SERVOÇOS PRELIMINARES	R\$ 42.047,27	2,77%	%	60,00%	40,00%					100,00%
				G							
				R\$	R\$25.228,36	R\$16.818,91					R\$42.047,27
5 ESTRUTURA											
5.1	FUNDAÇÕES E CONTEÇÕES	R\$ 436.070,30	28,78%	%	10,00%	45,00%	45,00%				100,00%
				G							
				R\$	R\$43.607,03	R\$196.231,64	R\$196.231,64				R\$436.070,30
5.2	MONTAGEM DE ESTRUTURA	R\$ 193.431,40	12,76%	%		50,00%	30,00%	20,00%			100,00%
				G							
				R\$		R\$96.715,70	R\$58.029,42	R\$38.686,28			R\$193.431,40
6 ARQUITETURA											

Esse documento foi assinado por IVAN BRUNO DA PAIXÃO JUNIOR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.consmepi.mg.gov.br/validate/JSY5F-V982Y-8FQ5S-K4HWD>





CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA - MG
CONTRATADA: PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA
PROJETO: LACHONETE - RECANTO VERDE

REV_00
21/01/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		MÊS								
				1	2	3	4	5	6	TOTAL		
6.1	PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 43.823,20	2,89%	%		5,00%	50,00%	45,00%				100,00%
				G								
				R\$		R\$2.191,16	R\$21.911,60	R\$19.720,44				R\$43.823,20
6.2	CONTRAPISO E ACABAMENTO	R\$ 19.394,21	1,28%	%				50,00%	50,00%			100,00%
				G								
				R\$				R\$9.697,11	R\$9.697,11			R\$19.394,21
6.3	INSTALAÇÃO DE LAJE E ACABAMENTO DO TETO	R\$ 172.655,38	11,39%	%			40,00%	30,00%	30,00%			100,00%
				G								
				R\$			R\$69.062,15	R\$51.796,61	R\$51.796,61			R\$172.655,38
6.4	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 53.281,14	3,52%	%				90,00%	10,00%			100,00%
				G								
				R\$				R\$47.953,03	R\$5.328,11			R\$53.281,14
6.5	ARREMATAS - ESQUADRILHAS	R\$ 121.103,96	7,99%	%				80,00%	20,00%			100,00%
				G								
				R\$				R\$96.883,17	R\$24.220,79			R\$121.103,96
6.6	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 30.325,33	2,00%	%				20,00%	70,00%	10,00%		100,00%
				G								
				R\$					R\$6.065,07	R\$21.227,73	R\$3.032,53	R\$30.325,33
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE TELECOMUNICAÇÕES E SPDA												
7.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 30.812,56	2,03%	%				50,00%	40,00%	10,00%		100,00%
				G								
				R\$				R\$15.406,28	R\$12.325,02	R\$3.081,26		R\$30.812,56
7.2	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 2.579,68	0,17%	%				30,00%	60,00%	10,00%		100,00%
				G								
				R\$				R\$773,90	R\$1.547,81	R\$257,97		R\$2.579,68
7.3	INSTALAÇÕES SPDA	R\$ 20.924,74	1,38%	%				10,00%	70,00%	20,00%		100,00%
				G								
				R\$					R\$2.092,47	R\$14.647,32	R\$4.184,95	R\$20.924,74
8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
8.1	INSTALAÇÕES ÁGUA POTÁVEL	R\$ 6.275,41	0,41%	%			10,00%	45,00%	30,00%	15,00%		100,00%
				G								
				R\$				R\$627,54	R\$2.823,93	R\$1.882,62	R\$941,31	R\$6.275,41
8.2	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 15.782,74	1,04%	%			10,00%	45,00%	30,00%	15,00%		100,00%
				G								
				R\$				R\$1.578,27	R\$7.102,23	R\$4.734,82	R\$2.367,41	R\$15.782,74
8.3	INSTALAÇÃO DE DRENAGEM PREDIAL	R\$ 1.820,64	0,12%	%		20,00%	40,00%	40,00%				100,00%
				G								
				R\$			R\$364,13	R\$728,26	R\$728,26			R\$1.820,64
8.4	INSTALAÇÃO DE GLP	R\$ 470,50	0,03%	%				50,00%	45,00%	5,00%		100,00%
				G								
				R\$					R\$235,25	R\$211,73	R\$23,53	R\$470,50
9 COMUNICAÇÃO VISUAL												
9.1	PLACAS	R\$ 420,60	0,03%	%	100,00%							100,00%
				G								
				R\$	R\$420,60							R\$420,60
10 LIMPEZA												
10.1	FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$ 3.027,00	0,20%	%							100,00%	100,00%
				G								
				R\$								R\$3.027,00
TOTAL		R\$1.515.360,54	100,00%	R\$	R\$181.891,51	R\$368.222,39	R\$403.664,73	R\$349.115,10	R\$176.697,91	R\$35.768,90		R\$1.515.360,54
TOTAL ACUMULADO				R\$	R\$181.891,51	R\$550.113,91	R\$953.778,64	R\$1.302.893,74	R\$1.479.591,64	R\$1.515.360,54		

Esse documento foi assinado por IVAN BRUNO DA PAIXÃO JUNIOR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.consmepi.mg.gov.br/validate/JSY5F-V982Y-8FQ5S-K4HWD>






CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA - MG
 CONTRATADA: PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA
 PROJETO: LACHONETE - RECANTO VERDE

REV_00
 21/01/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS					
			1	2	3	4	5	6

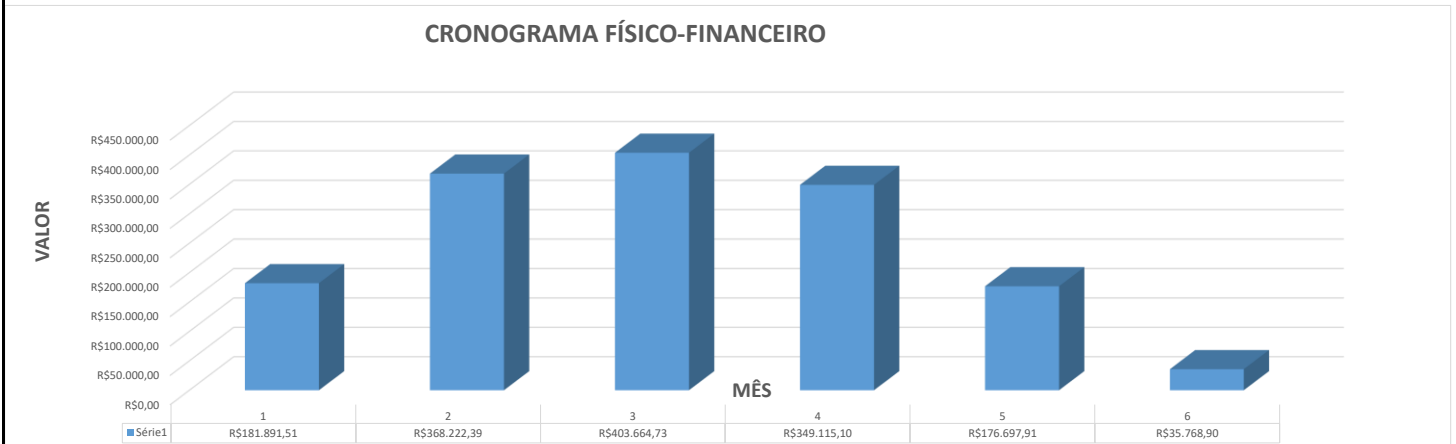

Assinado eletronicamente por:
 IVAN BRUNO DA PAIXÃO JUNIOR
 CPF: ***.005.416-**

IVAN BRUNO DA PAIXÃO JUNIOR
 DIRETOR SMIU
 MAT. 2302





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: JSY5F-V982Y-8FQ5S-K4HWD

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ IVAN BRUNO DA PAIXÃO JUNIOR (CPF *****.005.416-****) em 20/02/2026 16:03 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.176.104.252	Não disponível
Autenticação	ivan.paixaojr@hotmail.com (Verificado)
Login	
yIPOunukPHeo6cXOKx59VG3qAn4/le9edymVzzqPUIQ=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.consmepi.mg.gov.br/validate/JSY5F-V982Y-8FQ5S-K4HWD>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.consmepi.mg.gov.br/validate>
