


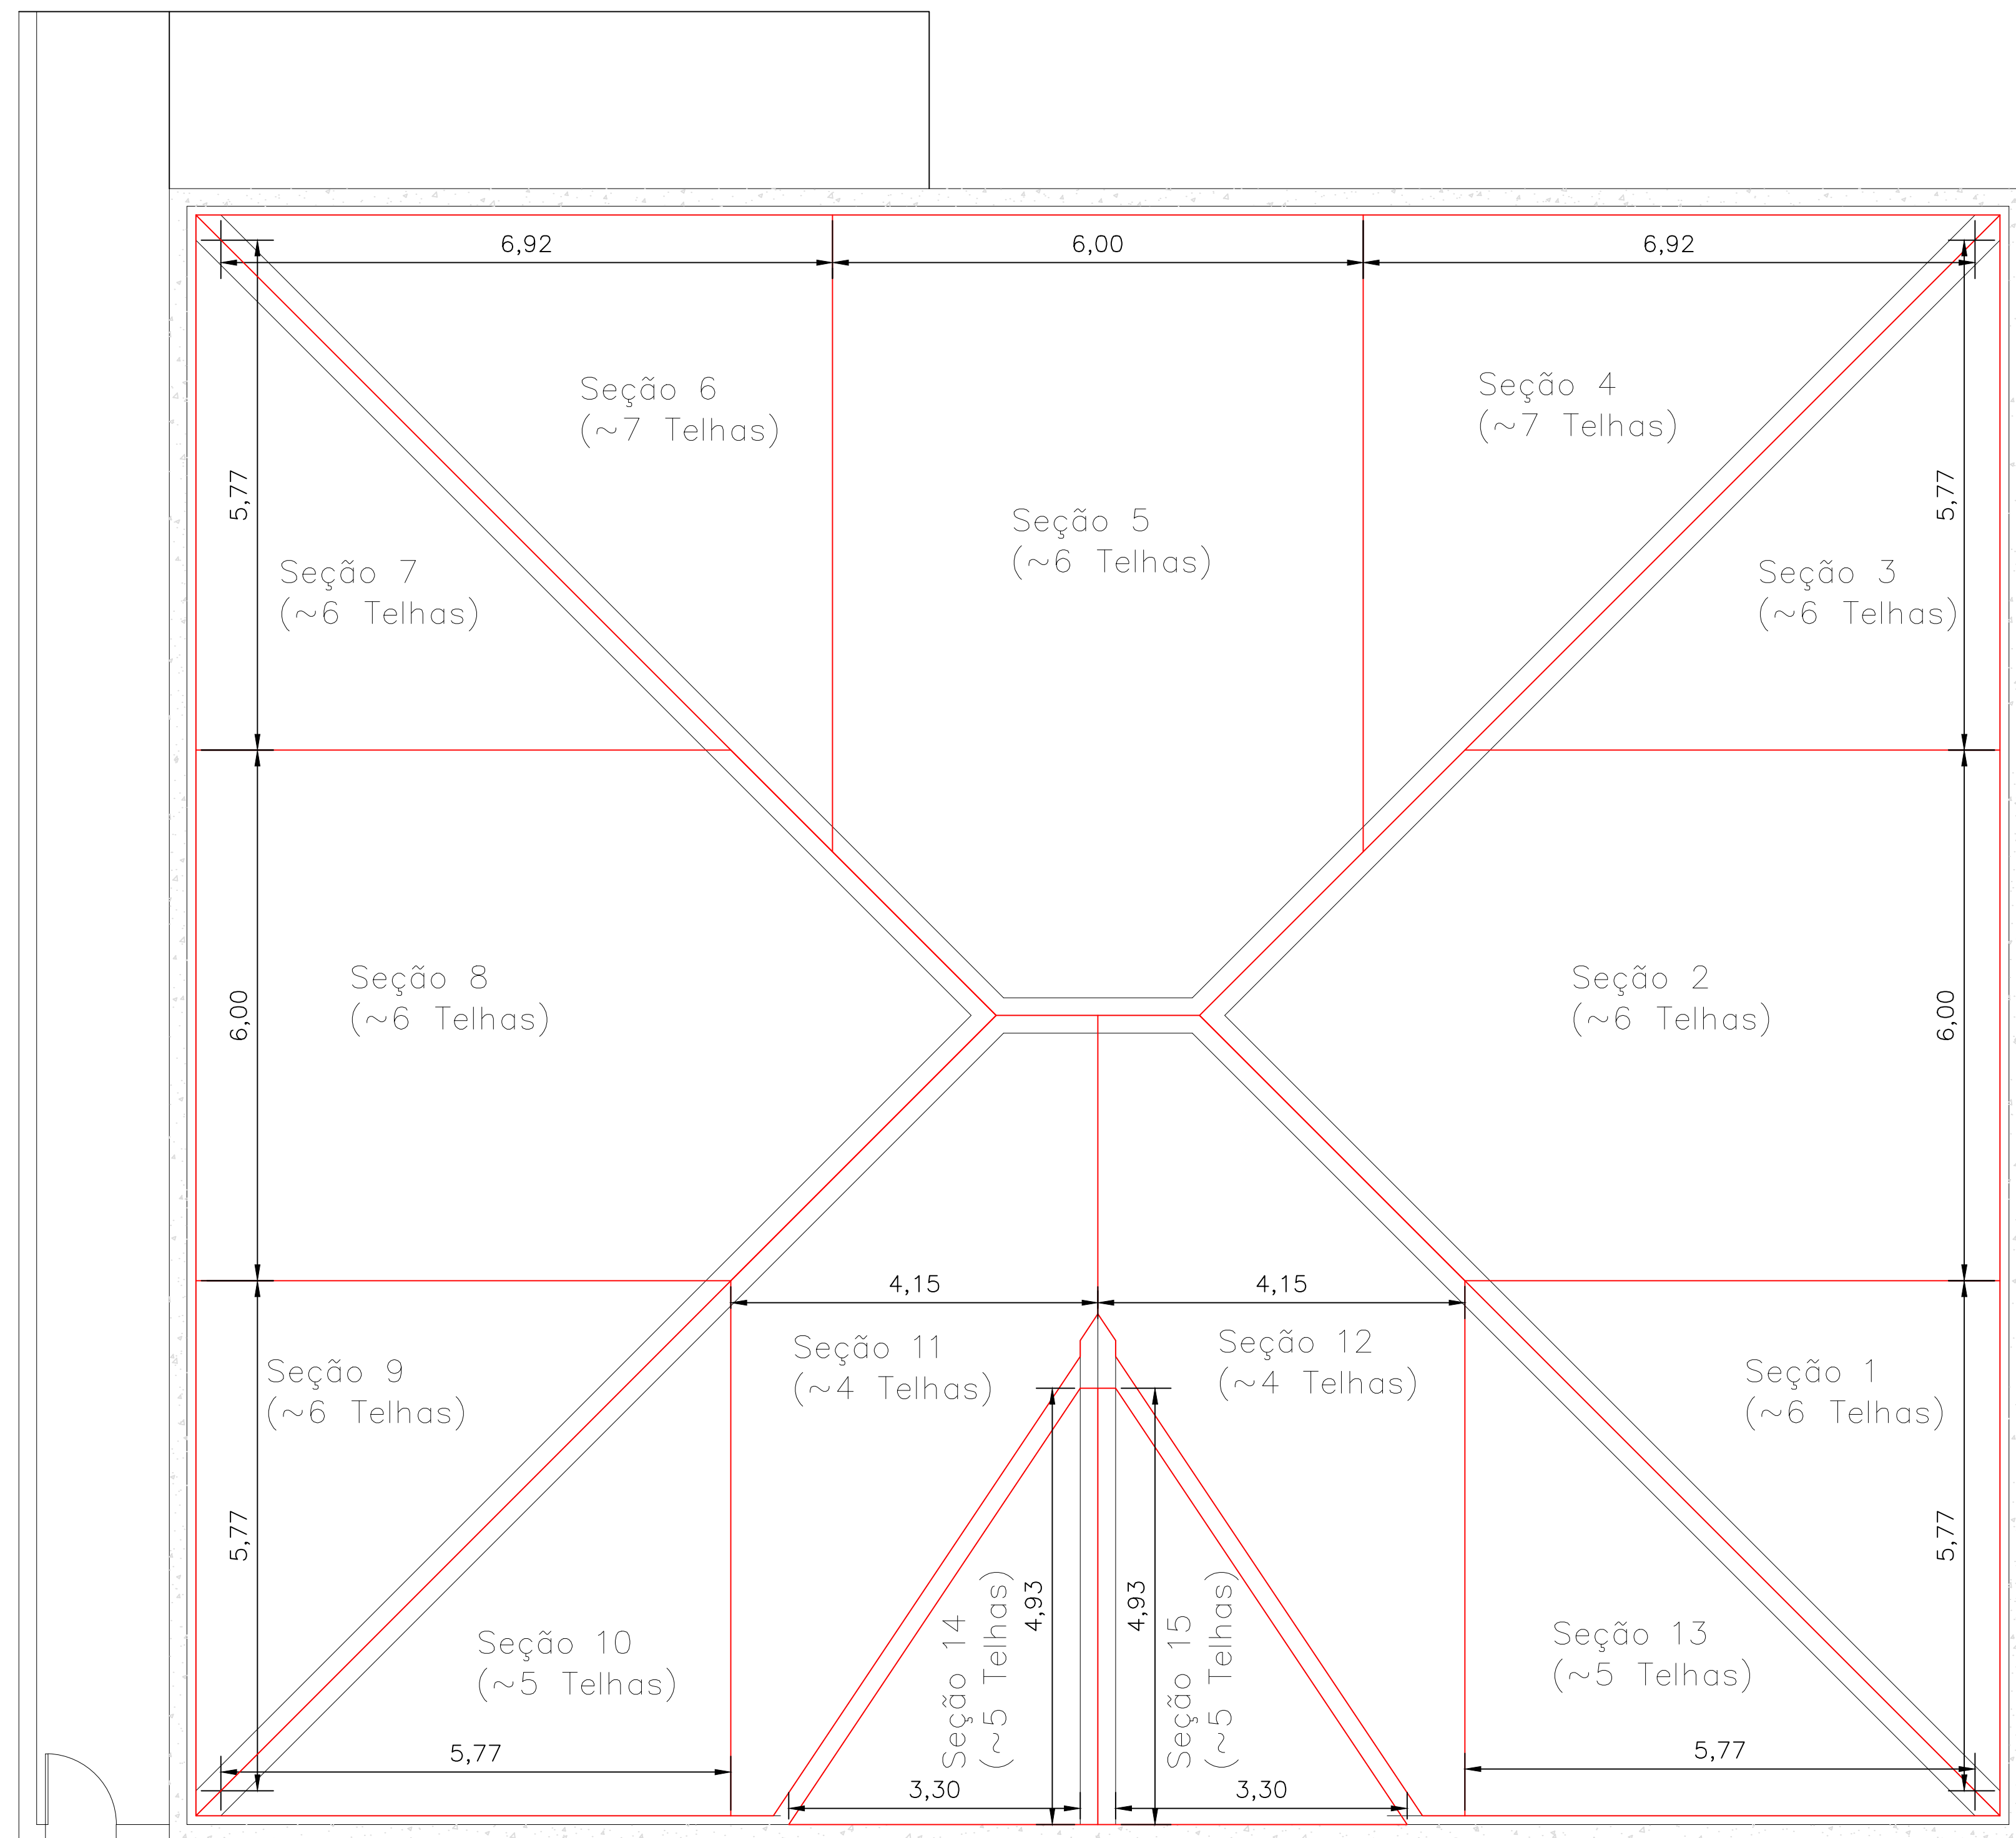

Detalhamento das Atividades:

Em complemento às atividades relacionadas no Cronograma de Execução, aqui detalhamos graficamente as seções (de 1 à 15), que são as áreas consideradas de trabalho para assim diminuir a possibilidade de intercorrências.

As águas do telhado foram subdivididas em seções, que possibilitam o início, término e proteção da área no mesmo dia de trabalho, para assim evitar problemas de infiltração de água da chuva e demais detritos provenientes do meio externo.

Observar que antes do início dos trabalhos de troca do telhamento na seções de cada água do telhado, as calhas e rufos deverão ser trocados na sua totalidade, para assim evitar emendas provisórias entre calha existente e calha nova. Esses serviços são descritos no cronograma de execução a cada início dos trabalhos de troca do telhamento nas seções de uma nova água de telhado.

R1	revisão geral solicitada	23/10/2015
R0	emissão inicial	15/10/2015
número	descrição	data
modificações		



Rua Hortência, n°154 - Botucatu/SP
Fone: (14) 99694-3806 e-mail: deltaeng@outlook.com.br
CNPJ: 30.078.814/0001-00

Autoria do projeto: CREA

Eng. Daniel Bicalho Buchignani 5062576281-S

cliente

Câmara Municipal de Botucatu

local

Botucatu / SP

obra

Reforma em Edifício do Poder Público

Detalhamento da Execução

☐ PRELIMINAR	☒ EXECUTIVO	escala
☐ PRÉ EXECUTIVO	☐ LIBERADO PARA OBRA	Indicadas
arquivo		data de início
DLT-255-HDR-01-02-R1		Jul/2025
desenho	data	folha nº
Daniel	15/10/2025	
revisado por:	revisão/data	
	R1 - 23/10/2025	
