




	OBRA: PJ CACH ITAP	INÍCIO PREVISTO: 13/01/2025	PRAZO ÚTIL: 75
	ENDEREÇO:	TÉRMINO PREVISTO: 25/04/2025	PRAZO CORRIDO: 103
	PROPRIETÁRIO:	RESP. TÉCNICO: Gilson Calegari Filho	ART/RRT DA OBRA:
CRONOGRAMA			

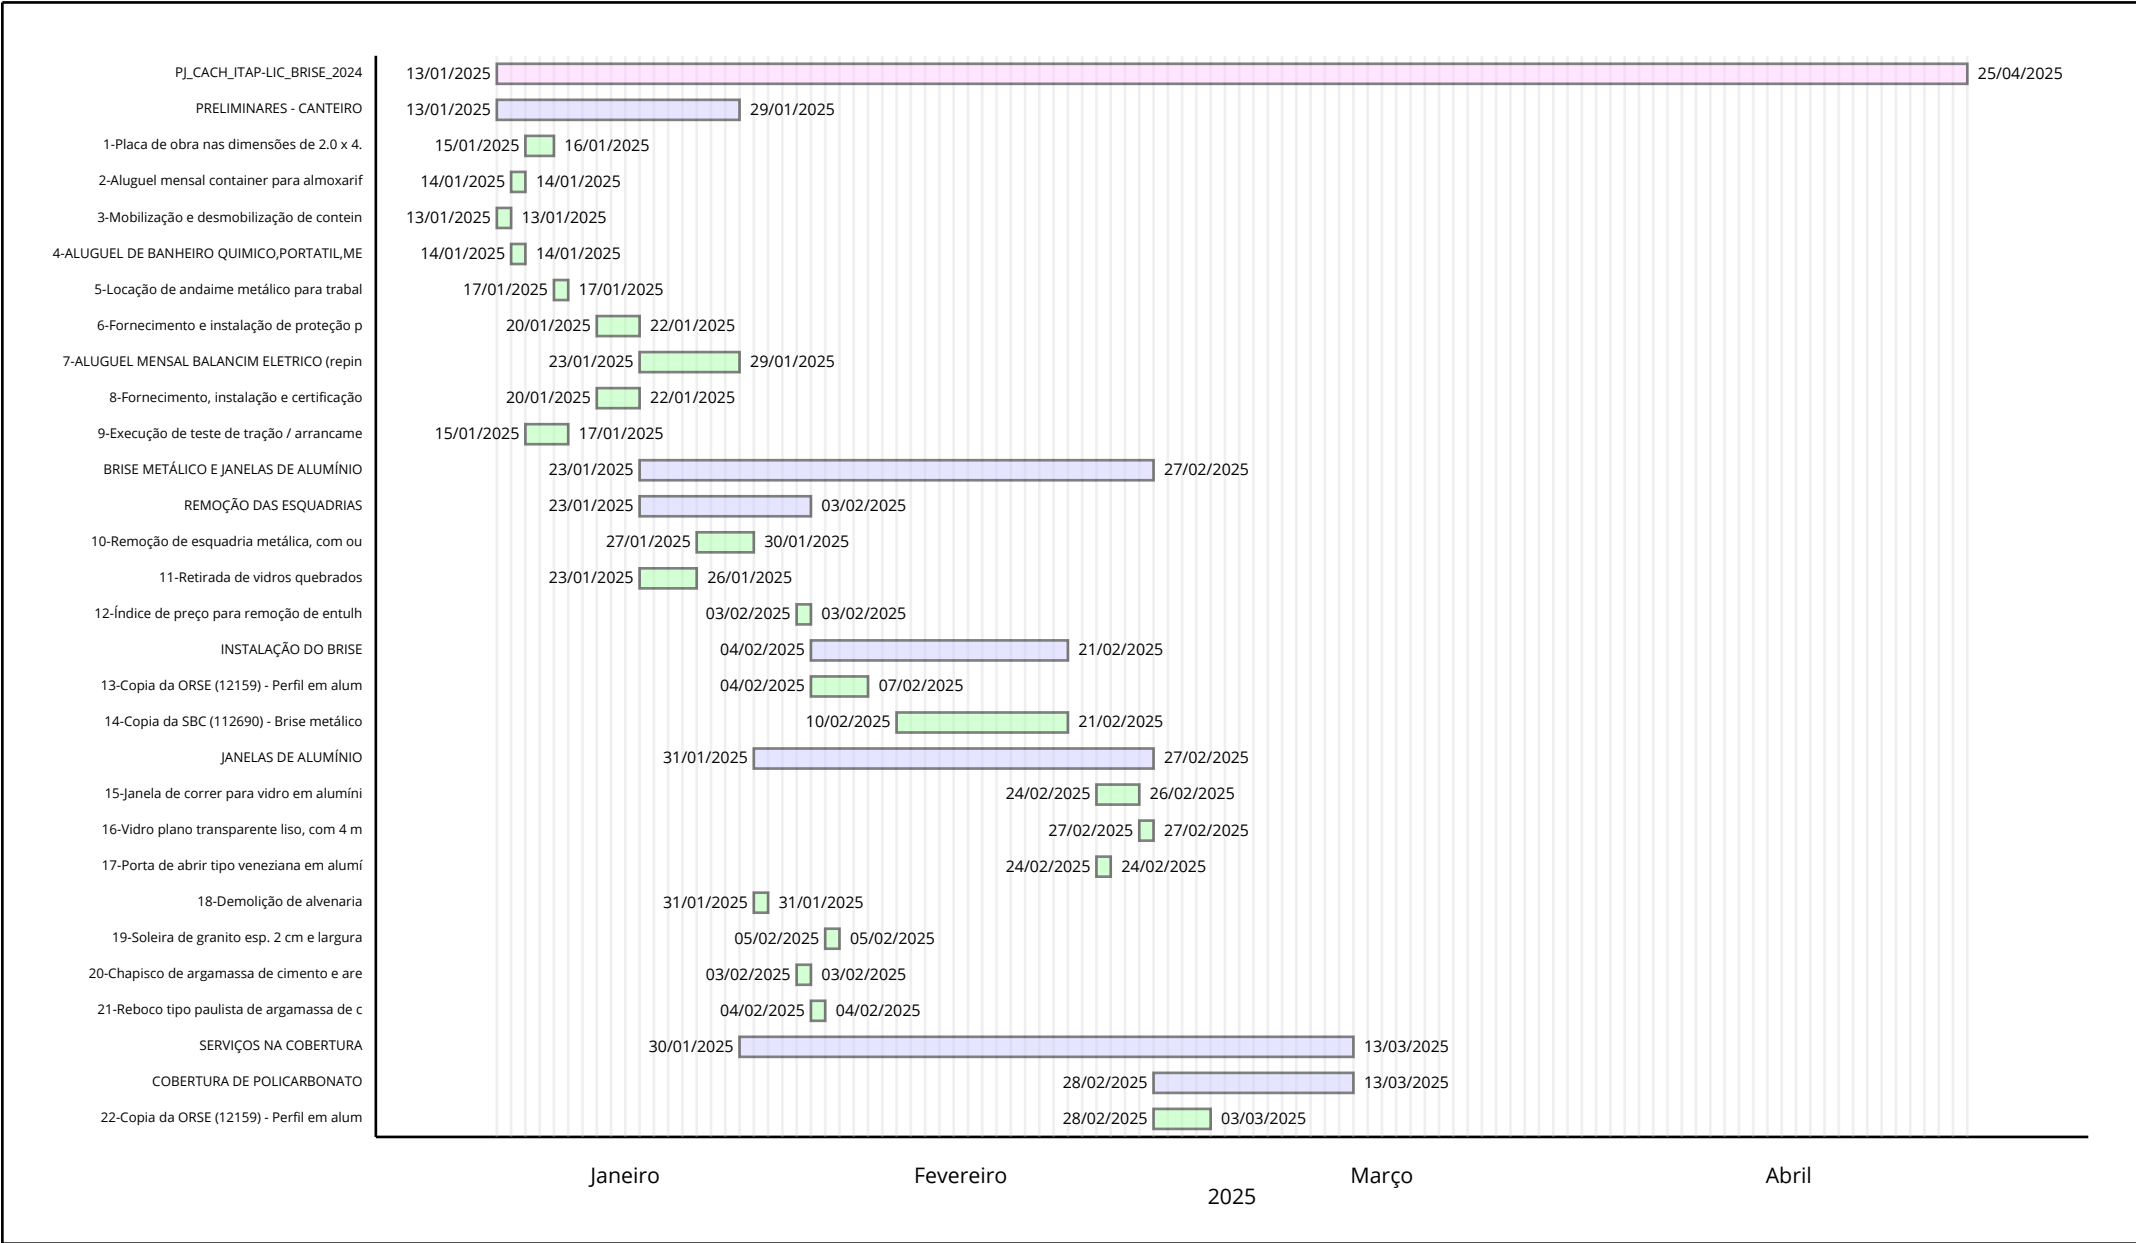


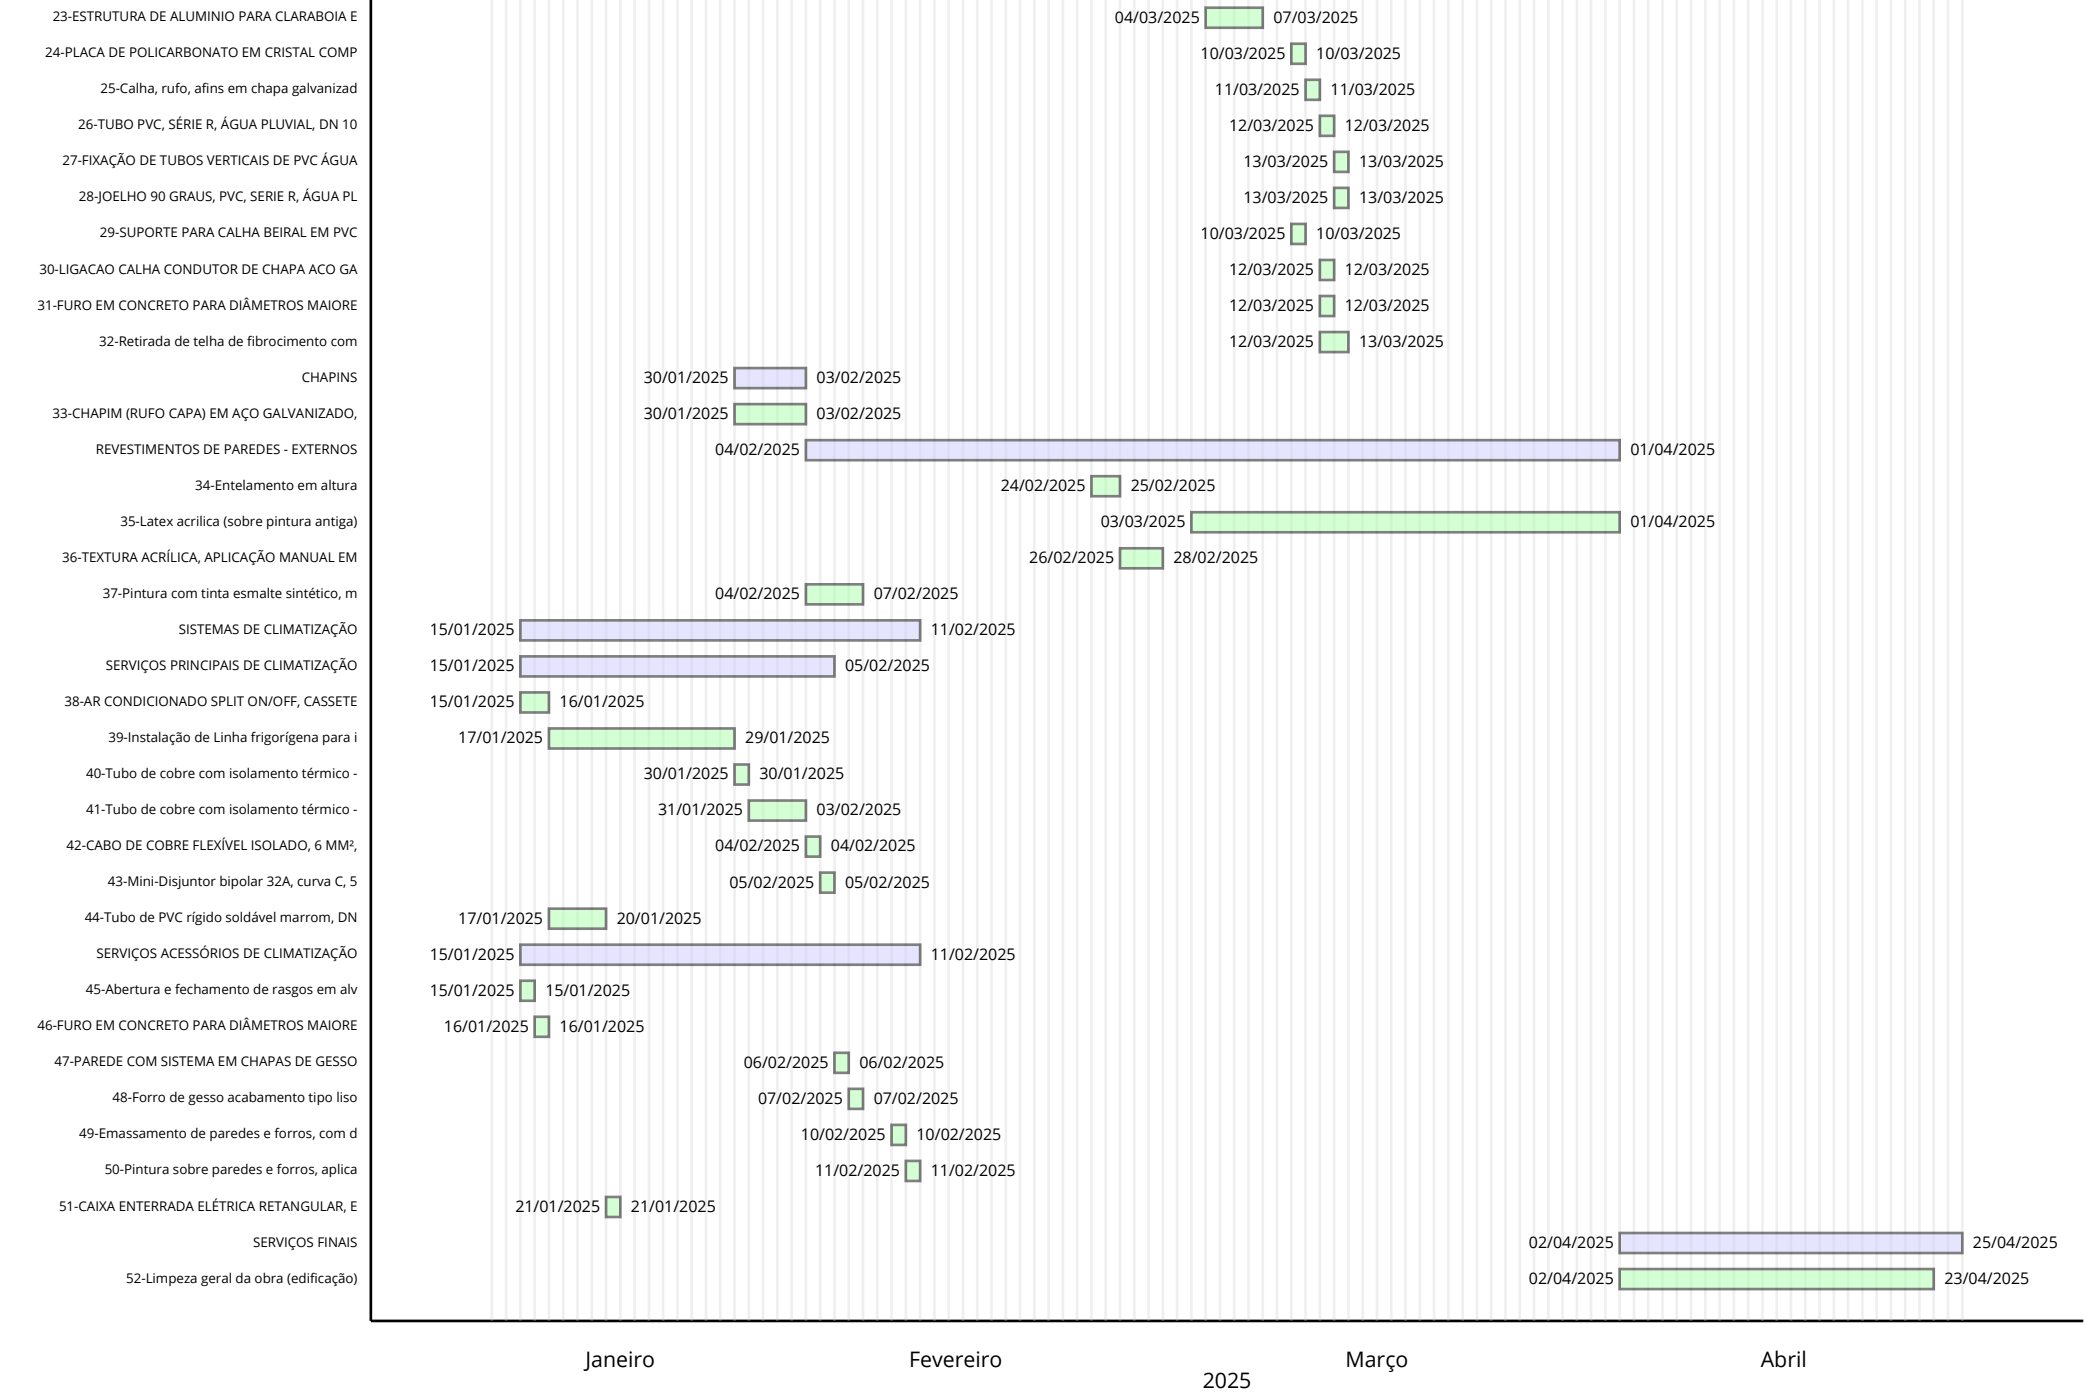

	OBRA: PJ CACH ITAP	INÍCIO PREVISTO: 13/01/2025	PRAZO ÚTIL: 75
	ENDEREÇO:	TÉRMINO PREVISTO: 25/04/2025	PRAZO CORRIDO: 103
	PROPRIETÁRIO:	RESP. TÉCNICO: Gilson Calegari Filho	ART/RRT DA OBRA:

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA

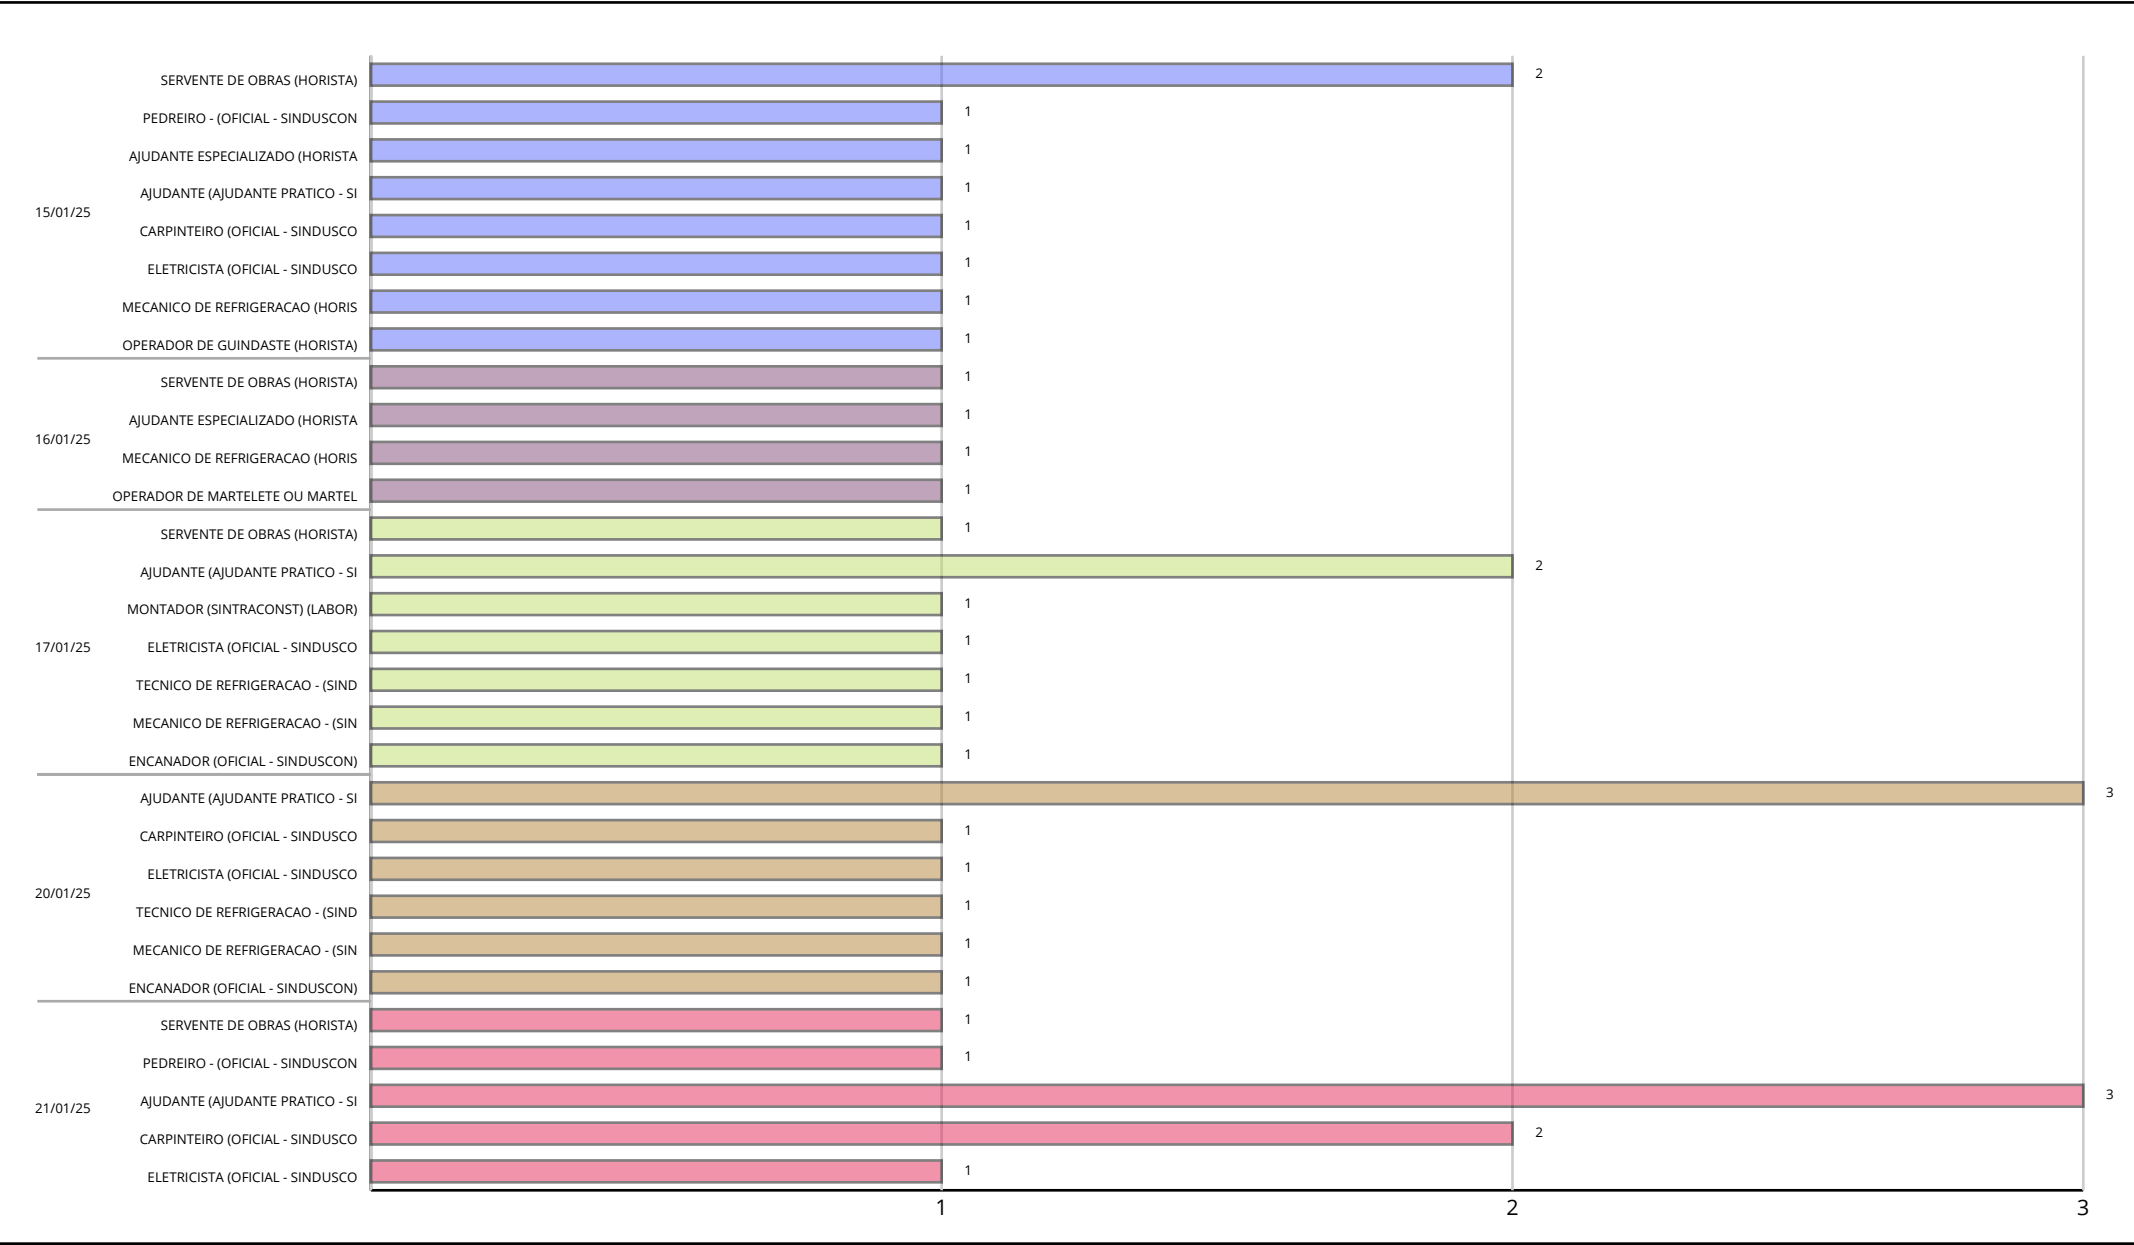

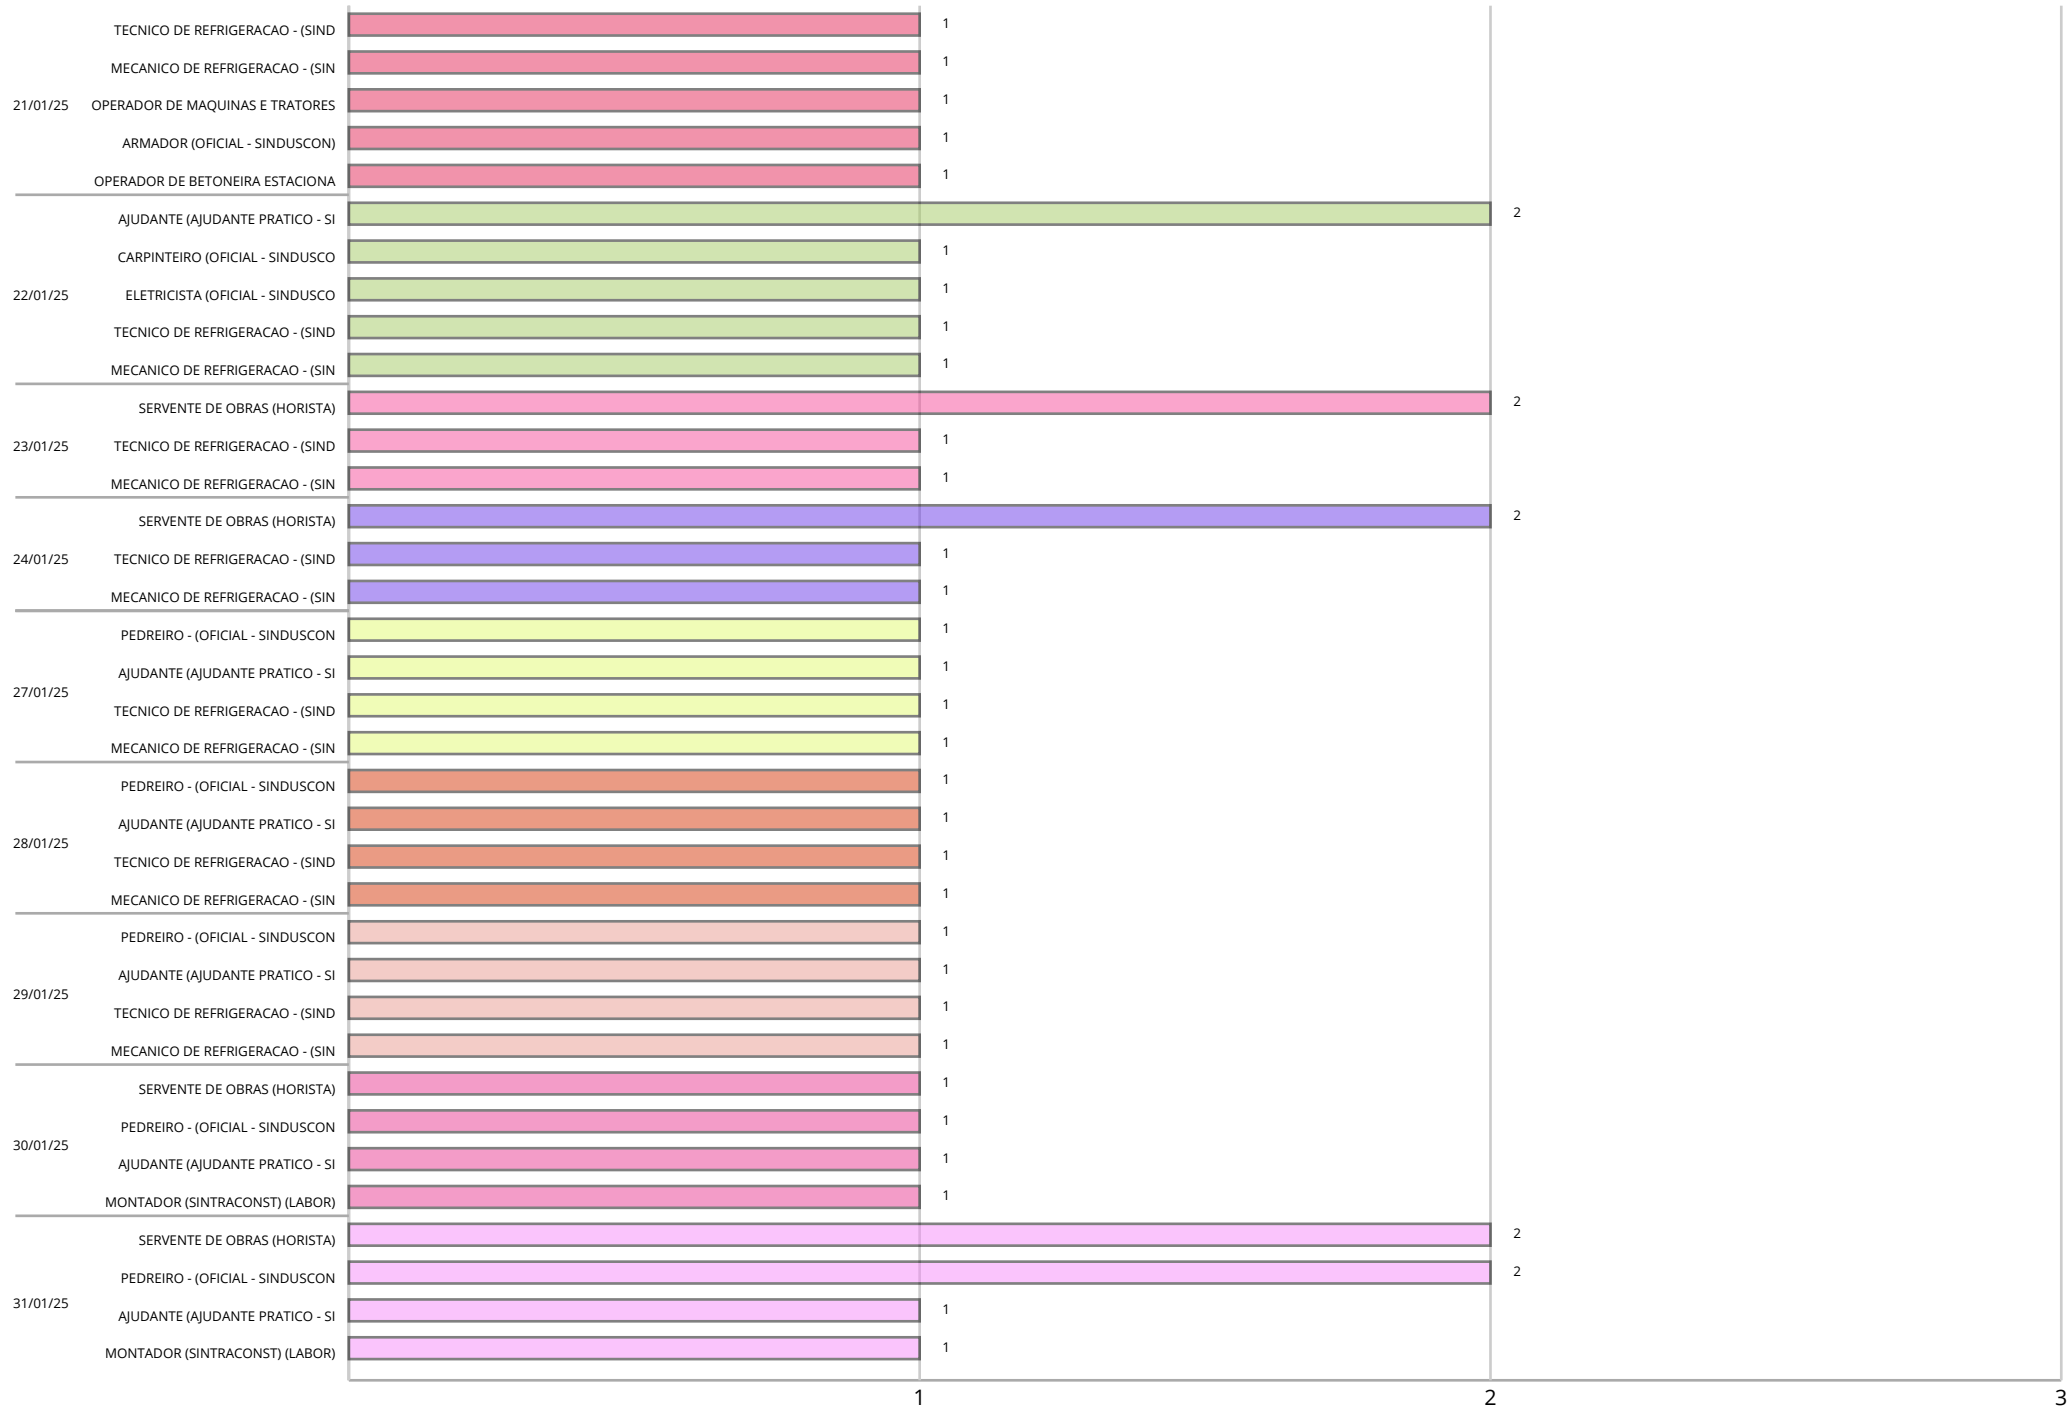



13/02/25	SERRALHEIRO (HORISTA)	1		
14/02/25	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	1		
	SERRALHEIRO (HORISTA)	1		
17/02/25	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	1		
	SERRALHEIRO (HORISTA)	1		
18/02/25	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	1		
	SERRALHEIRO (HORISTA)	1		
19/02/25	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	1		
	SERRALHEIRO (HORISTA)	1		
20/02/25	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	1		
	SERRALHEIRO (HORISTA)	1		
21/02/25	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	1		
	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	2		
24/02/25	PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)	3		
	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SI	1		
	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	1		
25/02/25	PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)	1		
	PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON)	1		
26/02/25	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SI	1		
	PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (	1		
	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	1		
28/02/25	SERRALHEIRO (HORISTA)	1		
	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	1		
	SERRALHEIRO (HORISTA)	1		
03/03/25	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SI	1		
	PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (	1		
	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	1		
	SERRALHEIRO (HORISTA)	1		
04/03/25	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SI	1		
	PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (	1		
	MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRAC	1		
	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	1		
	SERRALHEIRO (HORISTA)	1		
05/03/25	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SI	1		
	PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (	1		
	MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRAC	1		
		1		
		2		
		3		
		1		
		2		
		3		

05/03/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	
	SERRALHEIRO (HORISTA)	1	
06/03/25	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SI	1	
	PINTOR -{OFICIAL - SINDUSCON) (	1	
	MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRAC	1	
	SERRALHEIRO (HORISTA)	1	
07/03/25	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SI	1	
	PINTOR -{OFICIAL - SINDUSCON) (	1	
10/03/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	1	
	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SI	1	
	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCO	1	
	PINTOR -{OFICIAL - SINDUSCON) (	1	
11/03/25	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SI	1	
	PINTOR -{OFICIAL - SINDUSCON) (	1	
	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	1	
	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (	1	
12/03/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	2	
	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA	1	
	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SI	2	
	PINTOR -{OFICIAL - SINDUSCON) (	1	
	TELHADISTA	1	
	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTEL	1	
	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	2	
13/03/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	2	
	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SI	1	
	PINTOR -{OFICIAL - SINDUSCON) (	1	
	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	2	
14/03/25	PINTOR -{OFICIAL - SINDUSCON) (	1	
17/03/25	PINTOR -{OFICIAL - SINDUSCON) (	1	
18/03/25	PINTOR -{OFICIAL - SINDUSCON) (	1	
19/03/25	PINTOR -{OFICIAL - SINDUSCON) (	1	
20/03/25	PINTOR -{OFICIAL - SINDUSCON) (	1	
21/03/25	PINTOR -{OFICIAL - SINDUSCON) (	1	
24/03/25	PINTOR -{OFICIAL - SINDUSCON) (	1	
25/03/25	PINTOR -{OFICIAL - SINDUSCON) (	1	
26/03/25	PINTOR -{OFICIAL - SINDUSCON) (	1	

1


2


3


26/03/25			1
27/03/25	PINTOR -{OFICIAL - SINDUSCON} (		1
28/03/25	PINTOR -{OFICIAL - SINDUSCON} (		1
31/03/25	PINTOR -{OFICIAL - SINDUSCON} (		1
01/04/25	PINTOR -{OFICIAL - SINDUSCON} (		1
02/04/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)		1
03/04/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)		1
04/04/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)		1
07/04/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)		1
08/04/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)		1
09/04/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)		1
10/04/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)		1
11/04/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)		1
14/04/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)		1
15/04/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)		1
16/04/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)		1
17/04/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)		1
18/04/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)		1
21/04/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)		1
22/04/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)		1
23/04/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)		1
24/04/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)		1
25/04/25	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)		1


	OBRA: PJ CACH ITAP	INÍCIO PREVISTO: 13/01/2025	PRAZO ÚTIL: 75
	ENDEREÇO:	TÉRMINO PREVISTO: 25/04/2025	PRAZO CORRIDO: 103
	PROPRIETÁRIO:	RESP. TÉCNICO: Gilson Calegari Filho	ART/RRT DA OBRA:

HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA

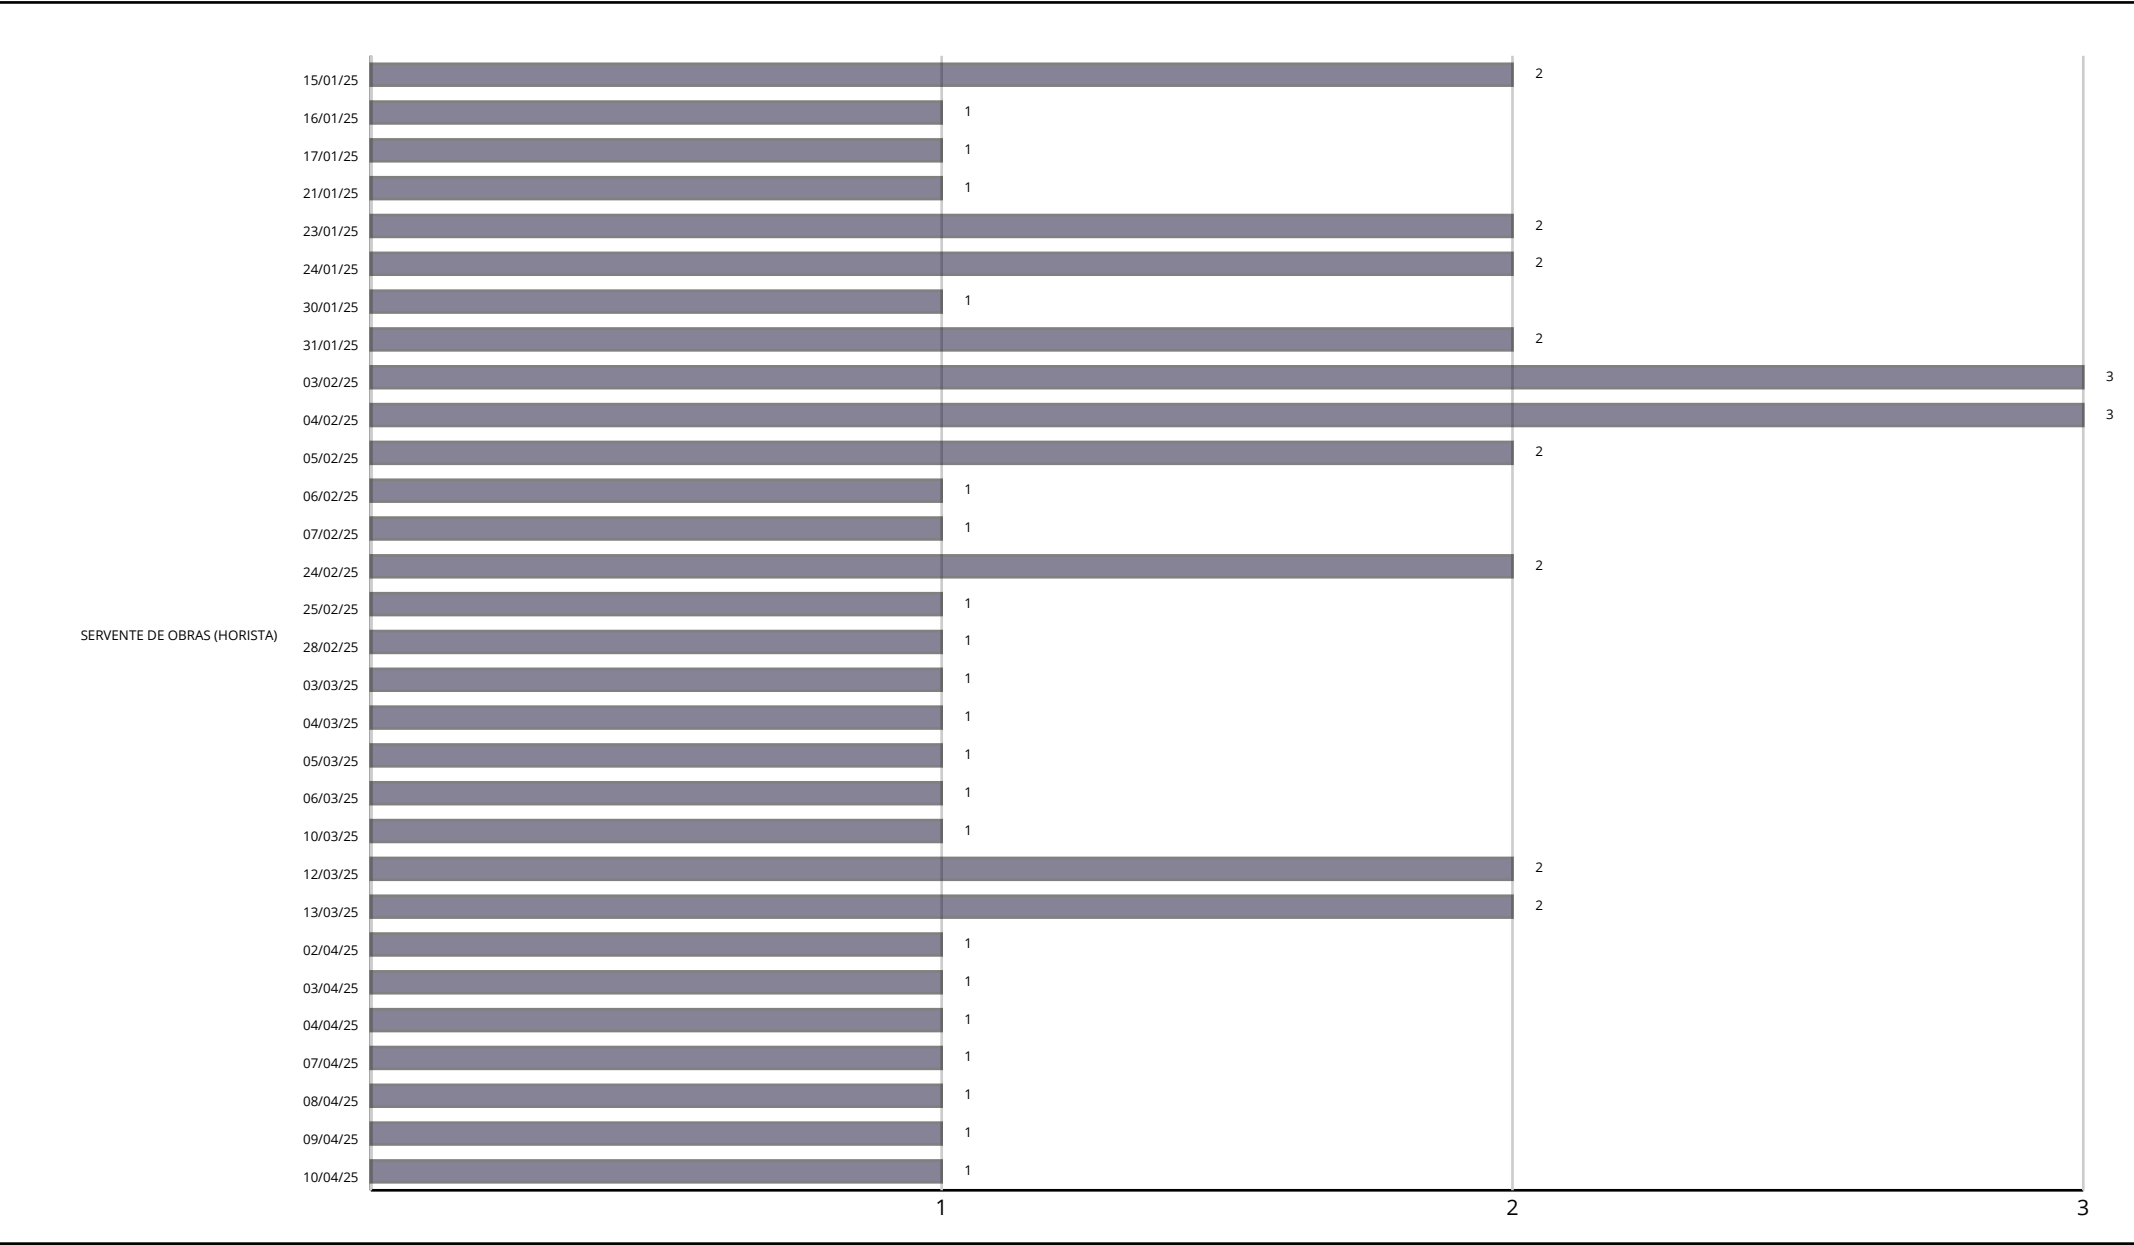


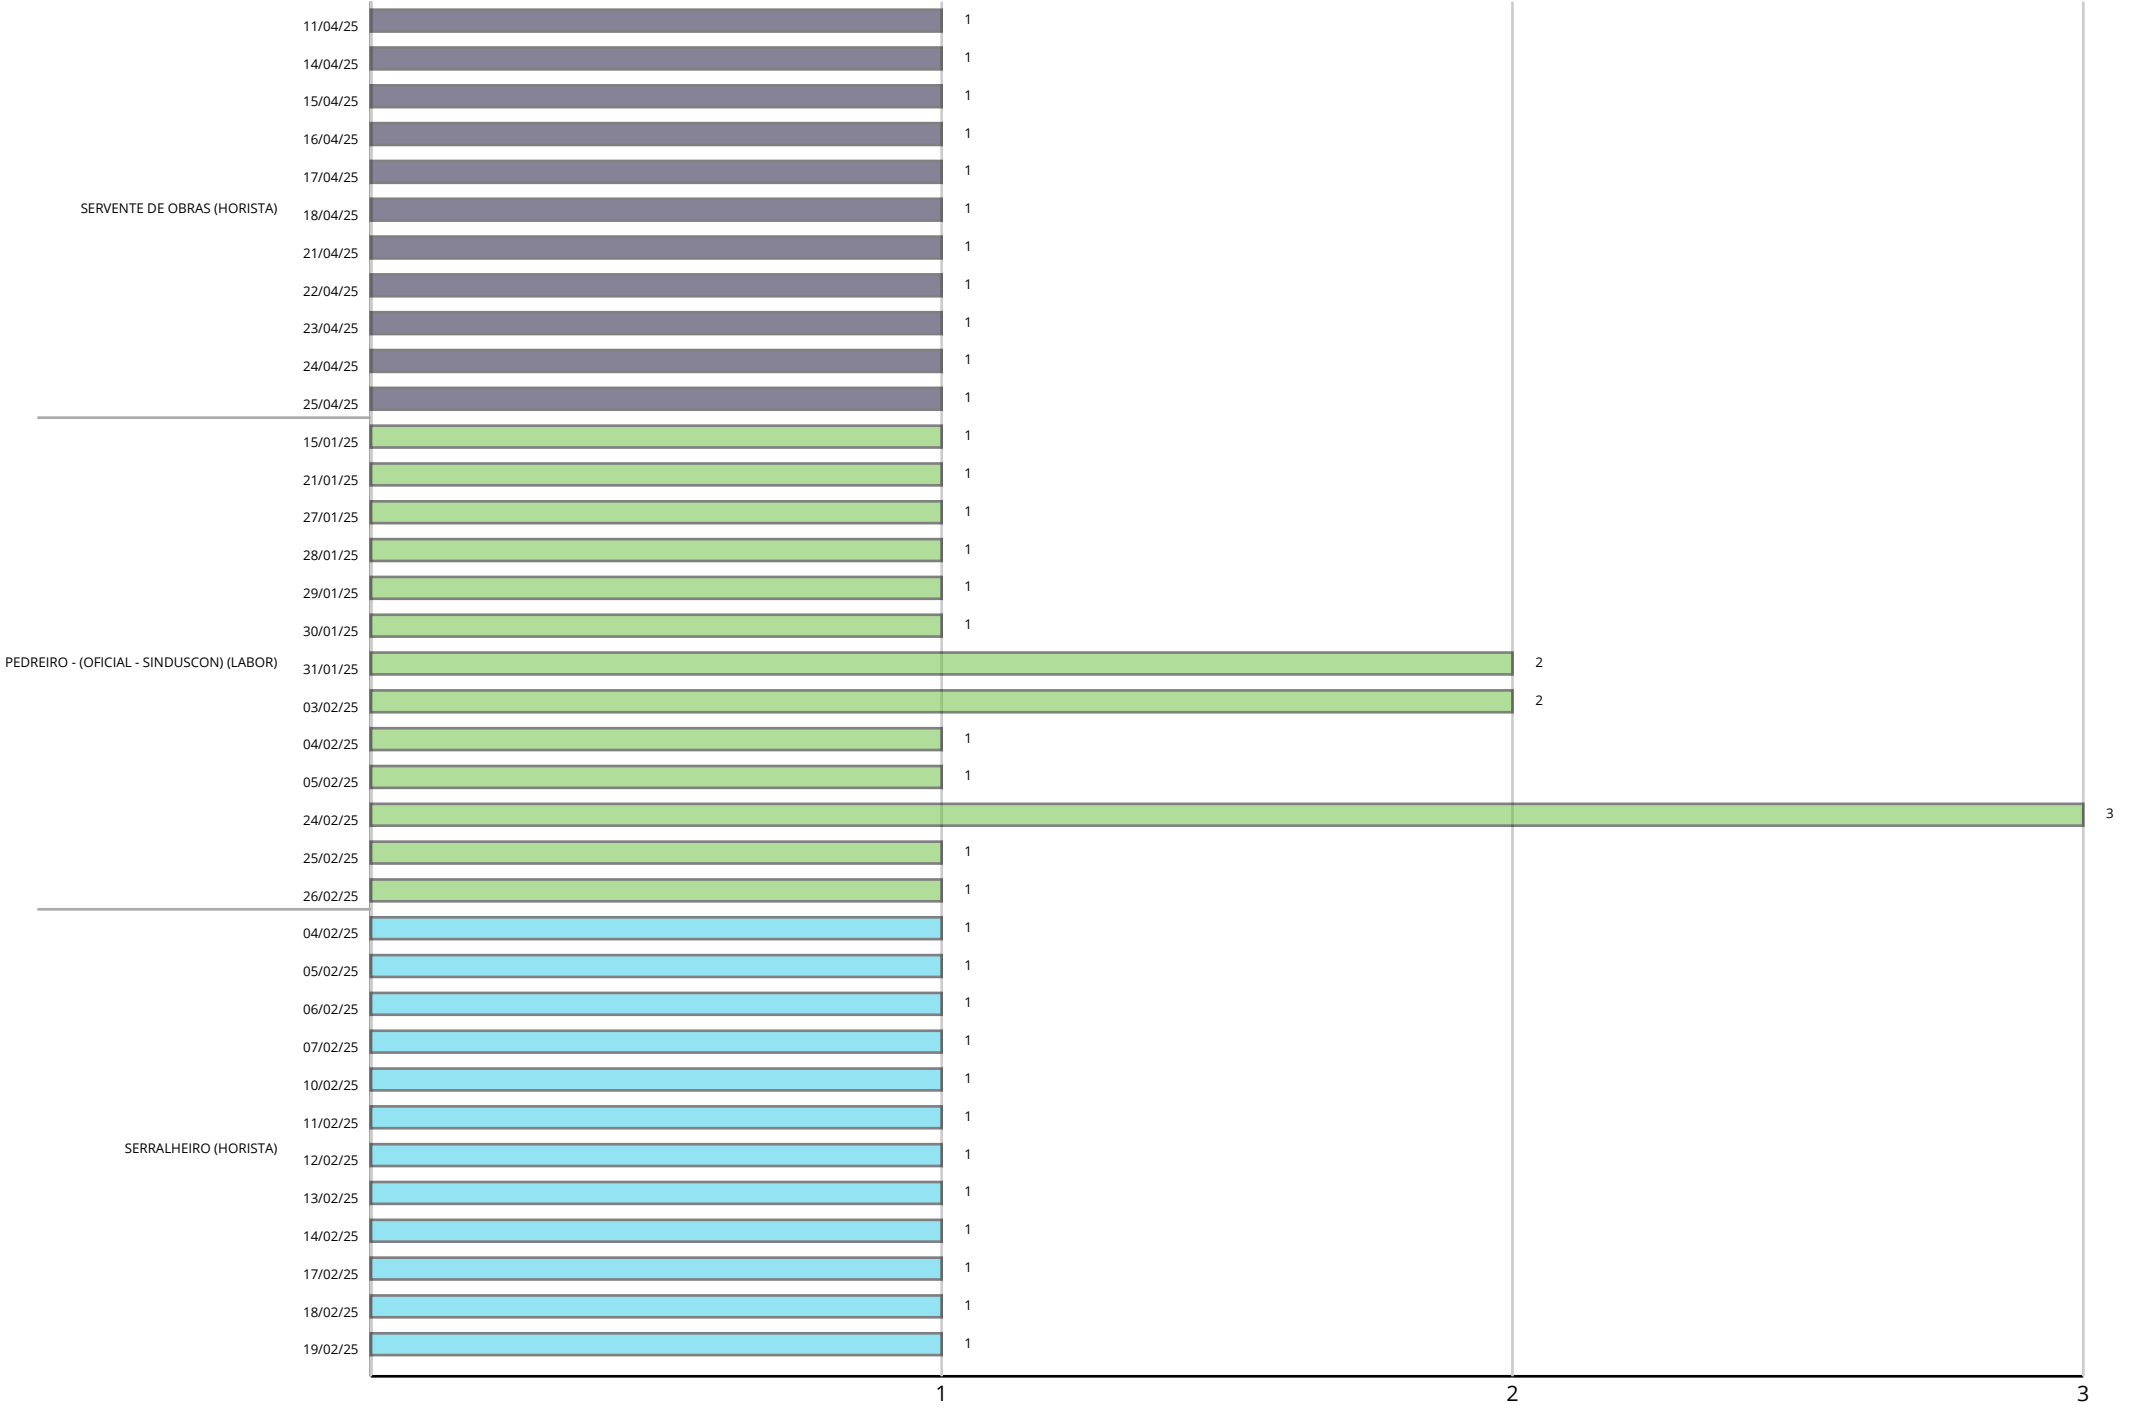

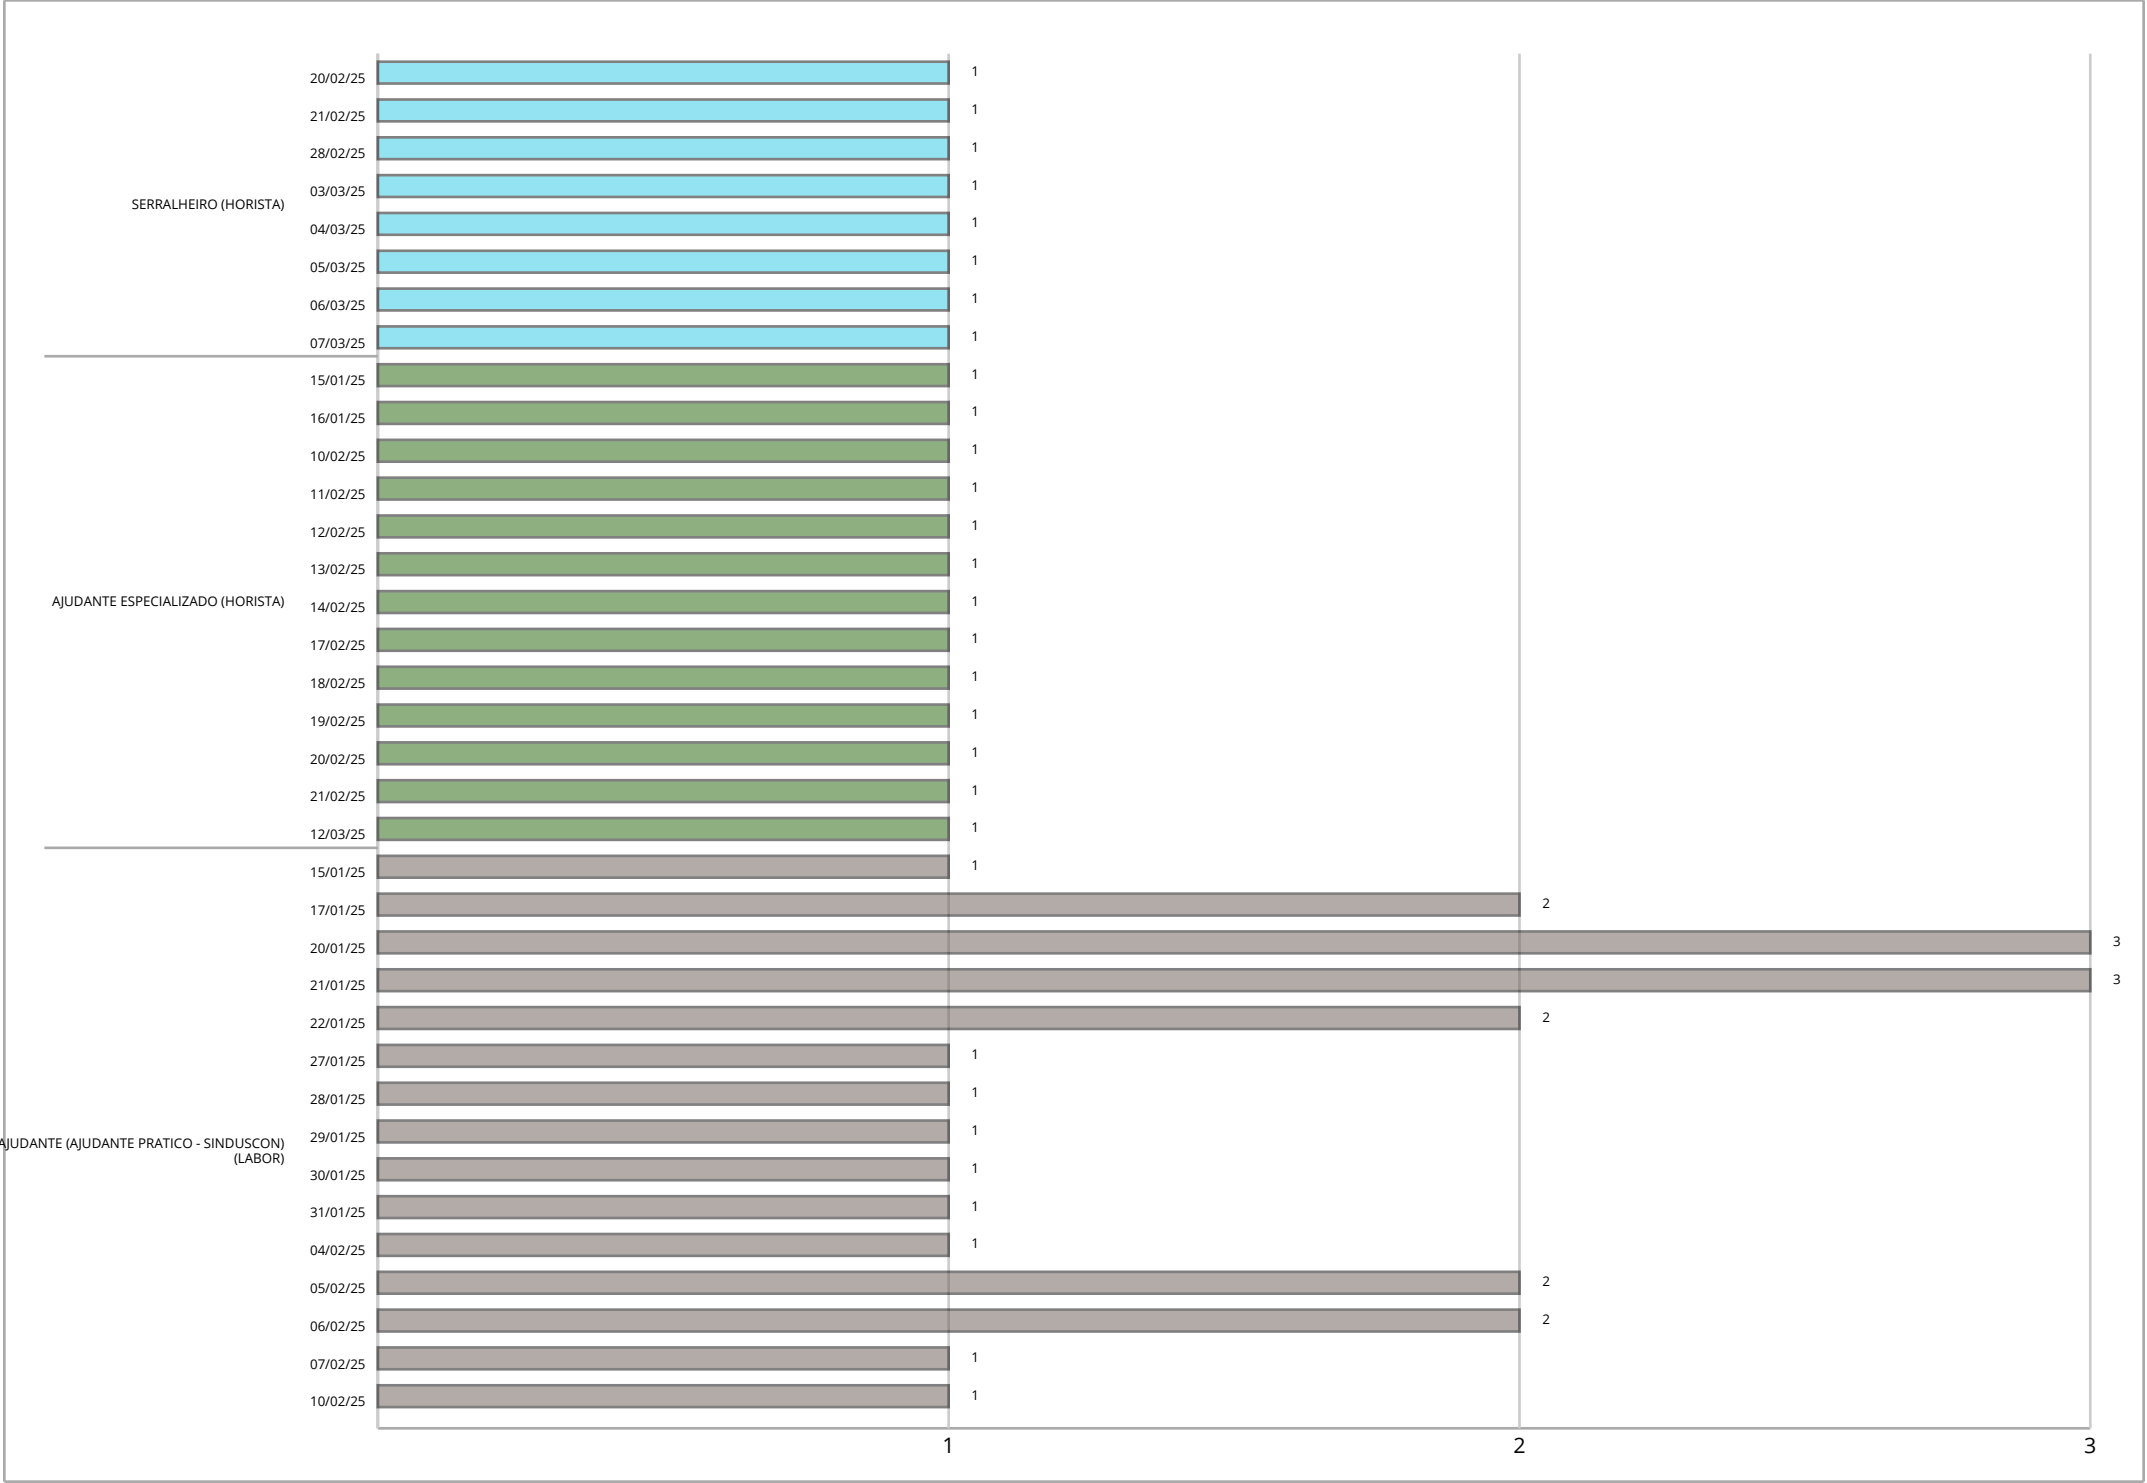

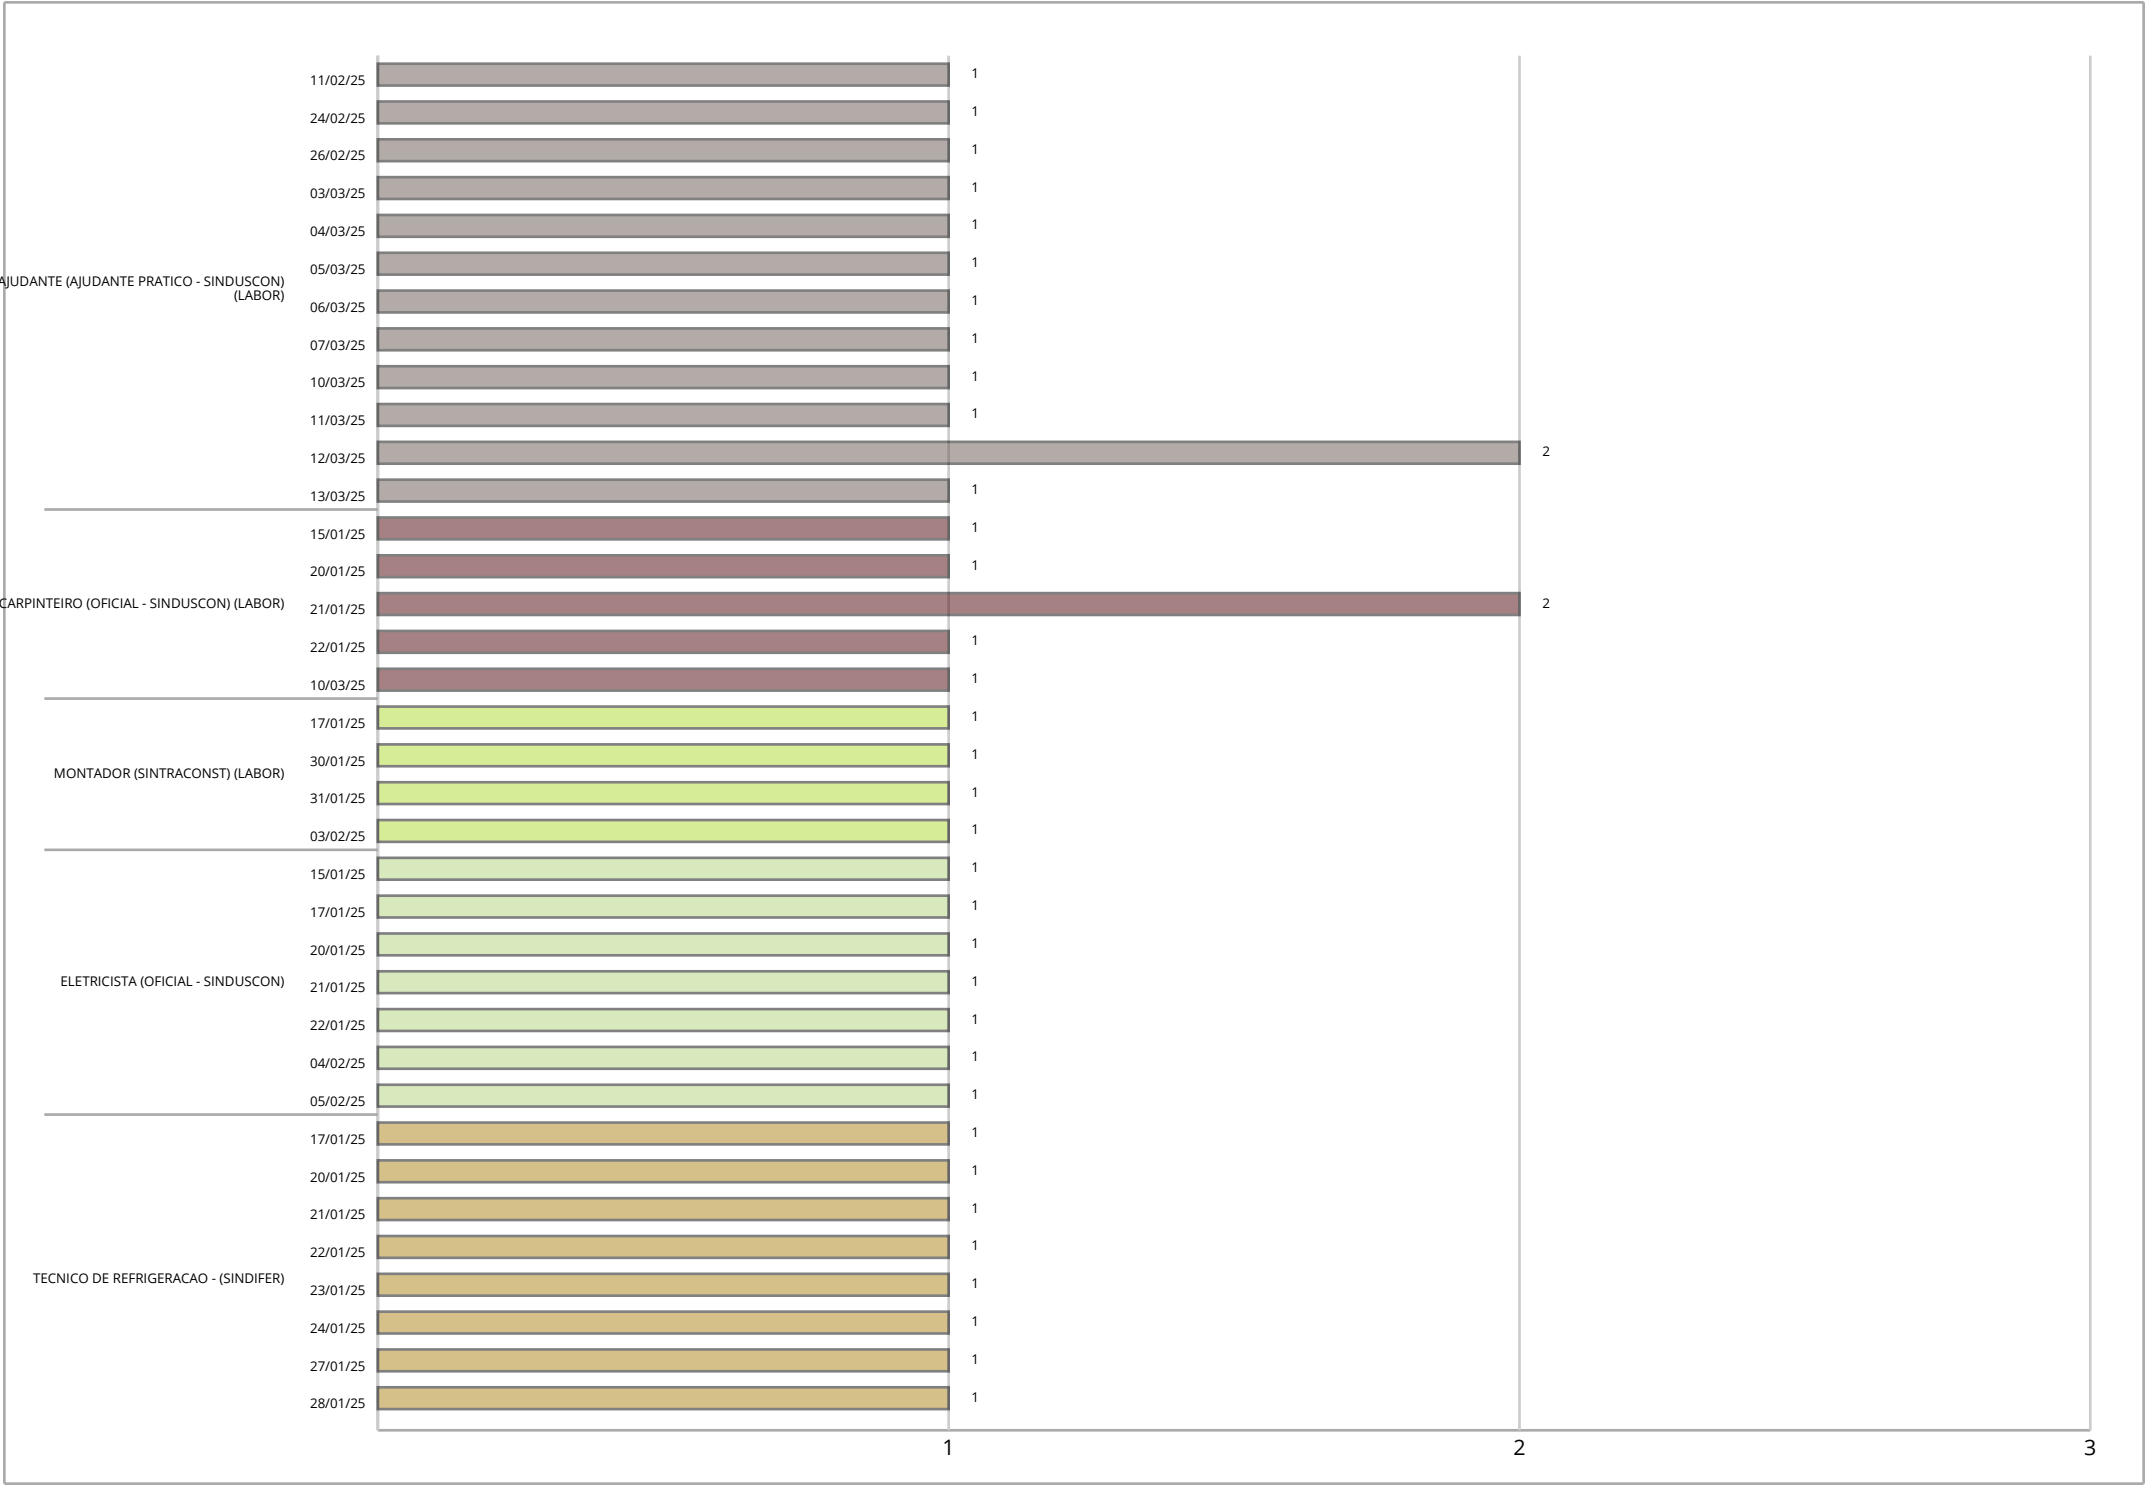



TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER)	29/01/25		1
	17/01/25		1
	20/01/25		1
	21/01/25		1
	22/01/25		1
MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER)	23/01/25		1
	24/01/25		1
	27/01/25		1
	28/01/25		1
	29/01/25		1
MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	15/01/25		1
	16/01/25		1
OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	15/01/25		1
PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	04/02/25		1
	05/02/25		1
	06/02/25		1
	07/02/25		1
	10/02/25		1
	11/02/25		1
	26/02/25		1
	03/03/25		1
	04/03/25		1
	05/03/25		1
	06/03/25		1
	07/03/25		1
	10/03/25		1
	11/03/25		1
	12/03/25		1
	13/03/25		1
	14/03/25		1
	17/03/25		1
	18/03/25		1
	19/03/25		1
	20/03/25		1
	21/03/25		1
	24/03/25		1
			1
			2
			3

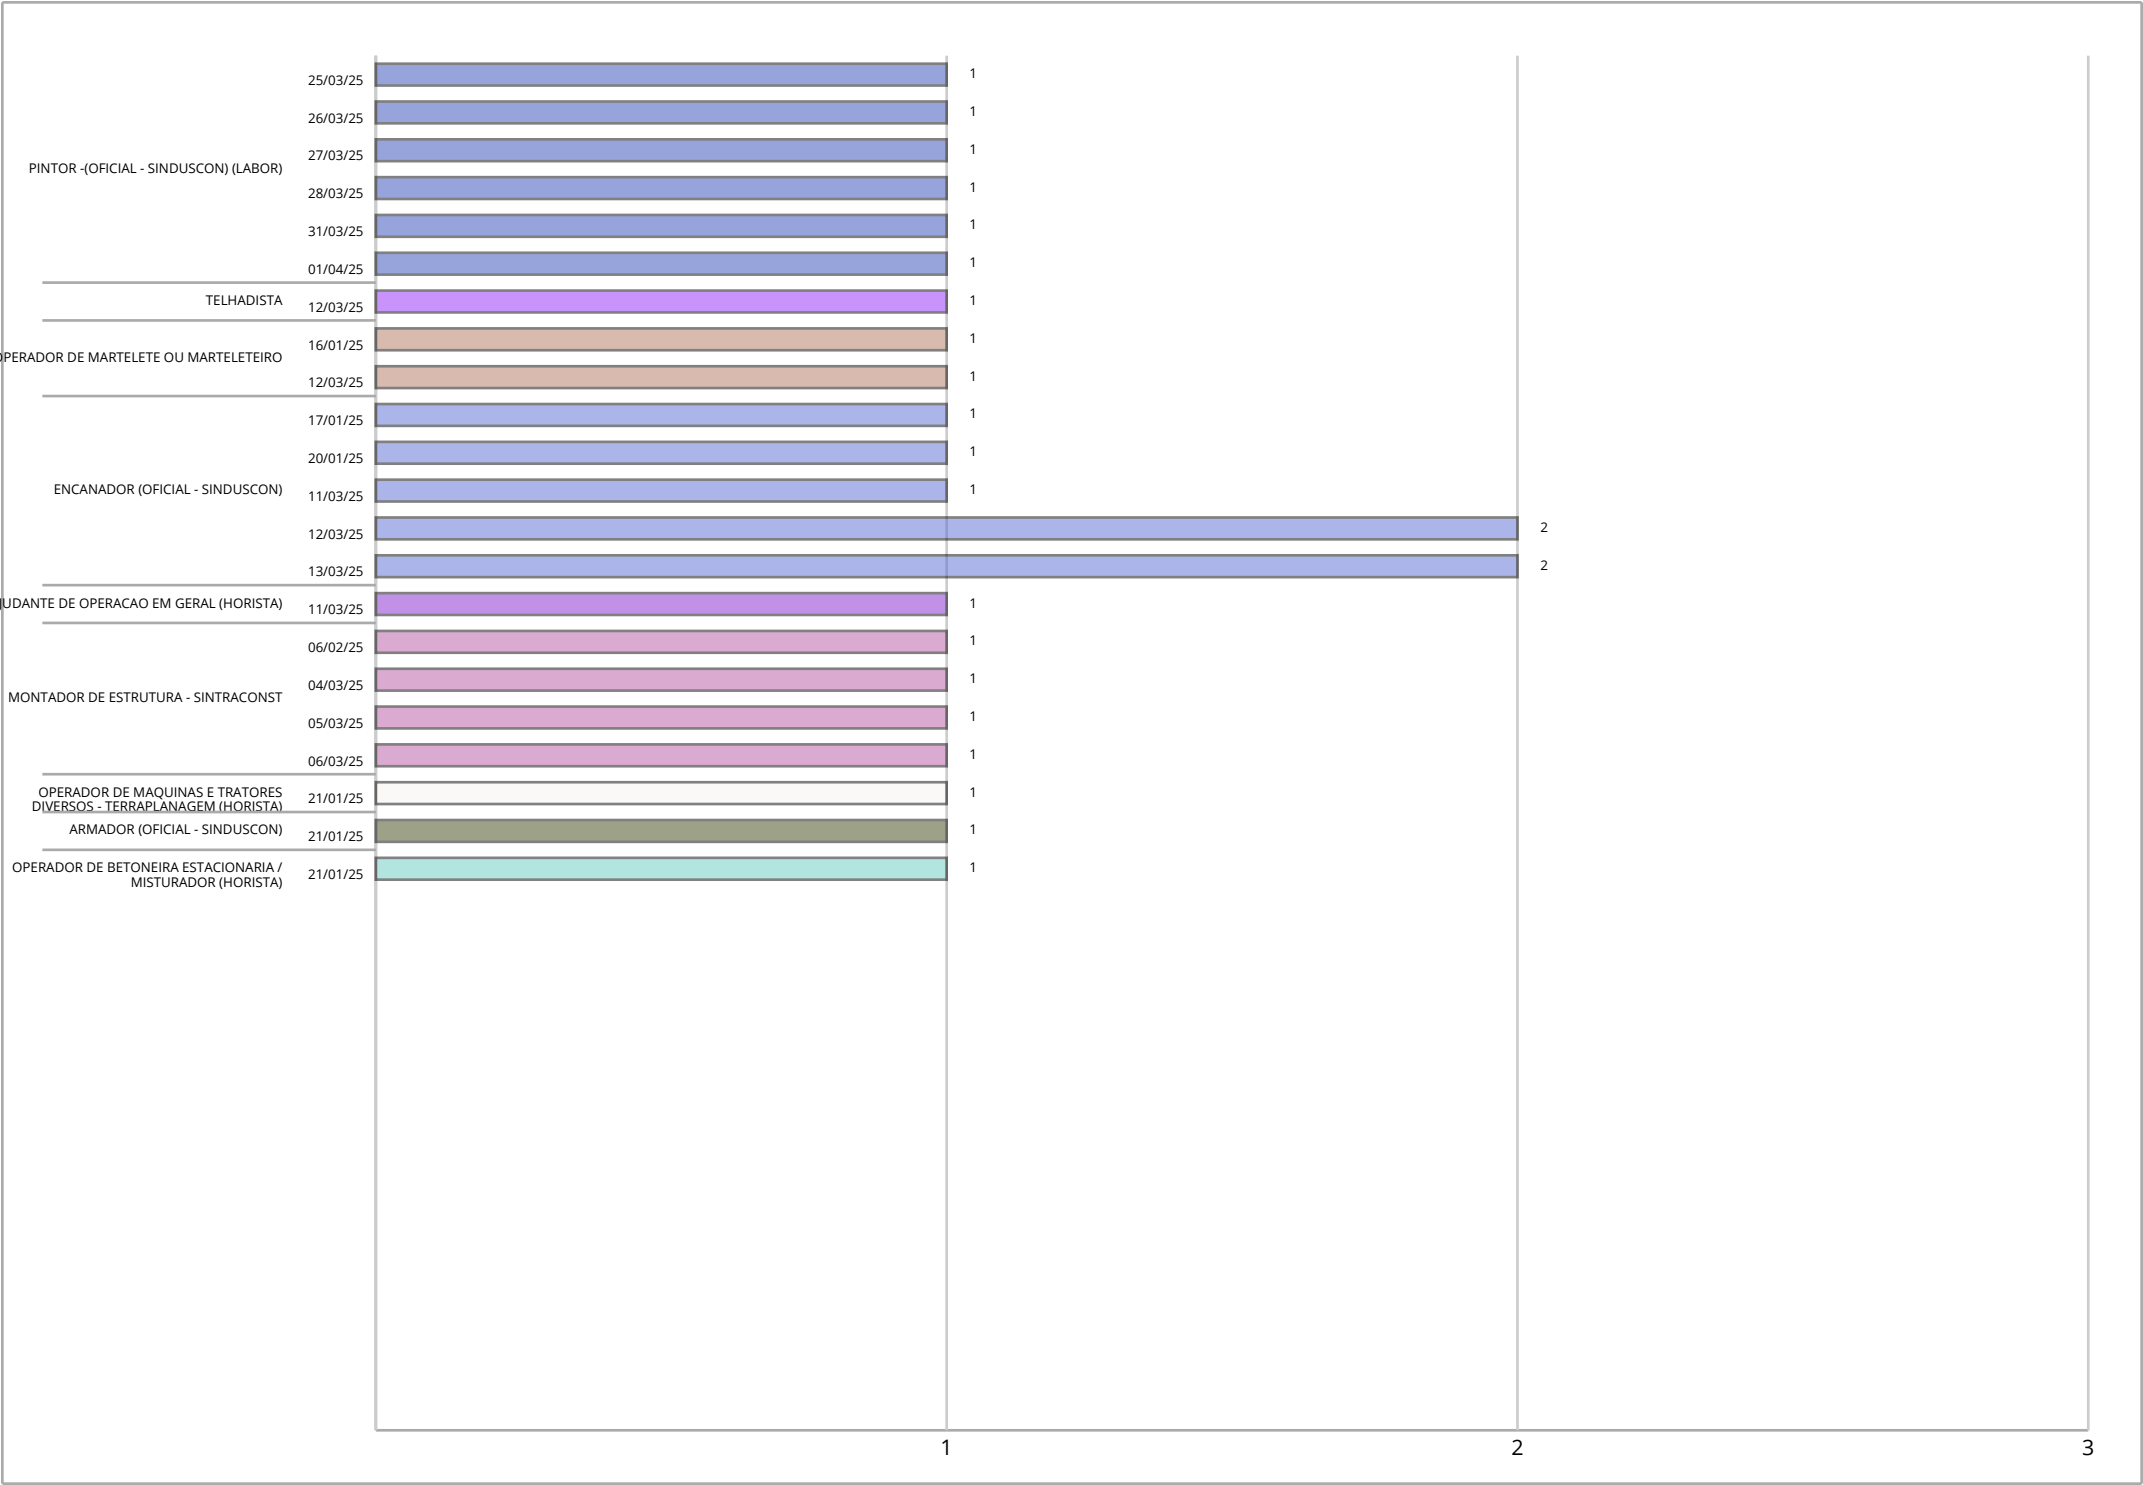


	OBRA: PJ CACH ITAP	INÍCIO PREVISTO: 13/01/2025	PRAZO ÚTIL: 75
	ENDEREÇO:	TÉRMINO PREVISTO: 25/04/2025	PRAZO CORRIDO: 103
	PROPRIETÁRIO:	RESP. TÉCNICO: Gilson Calegari Filho	ART/RRT DA OBRA:


HISTOGRAMA DE MATERIAIS

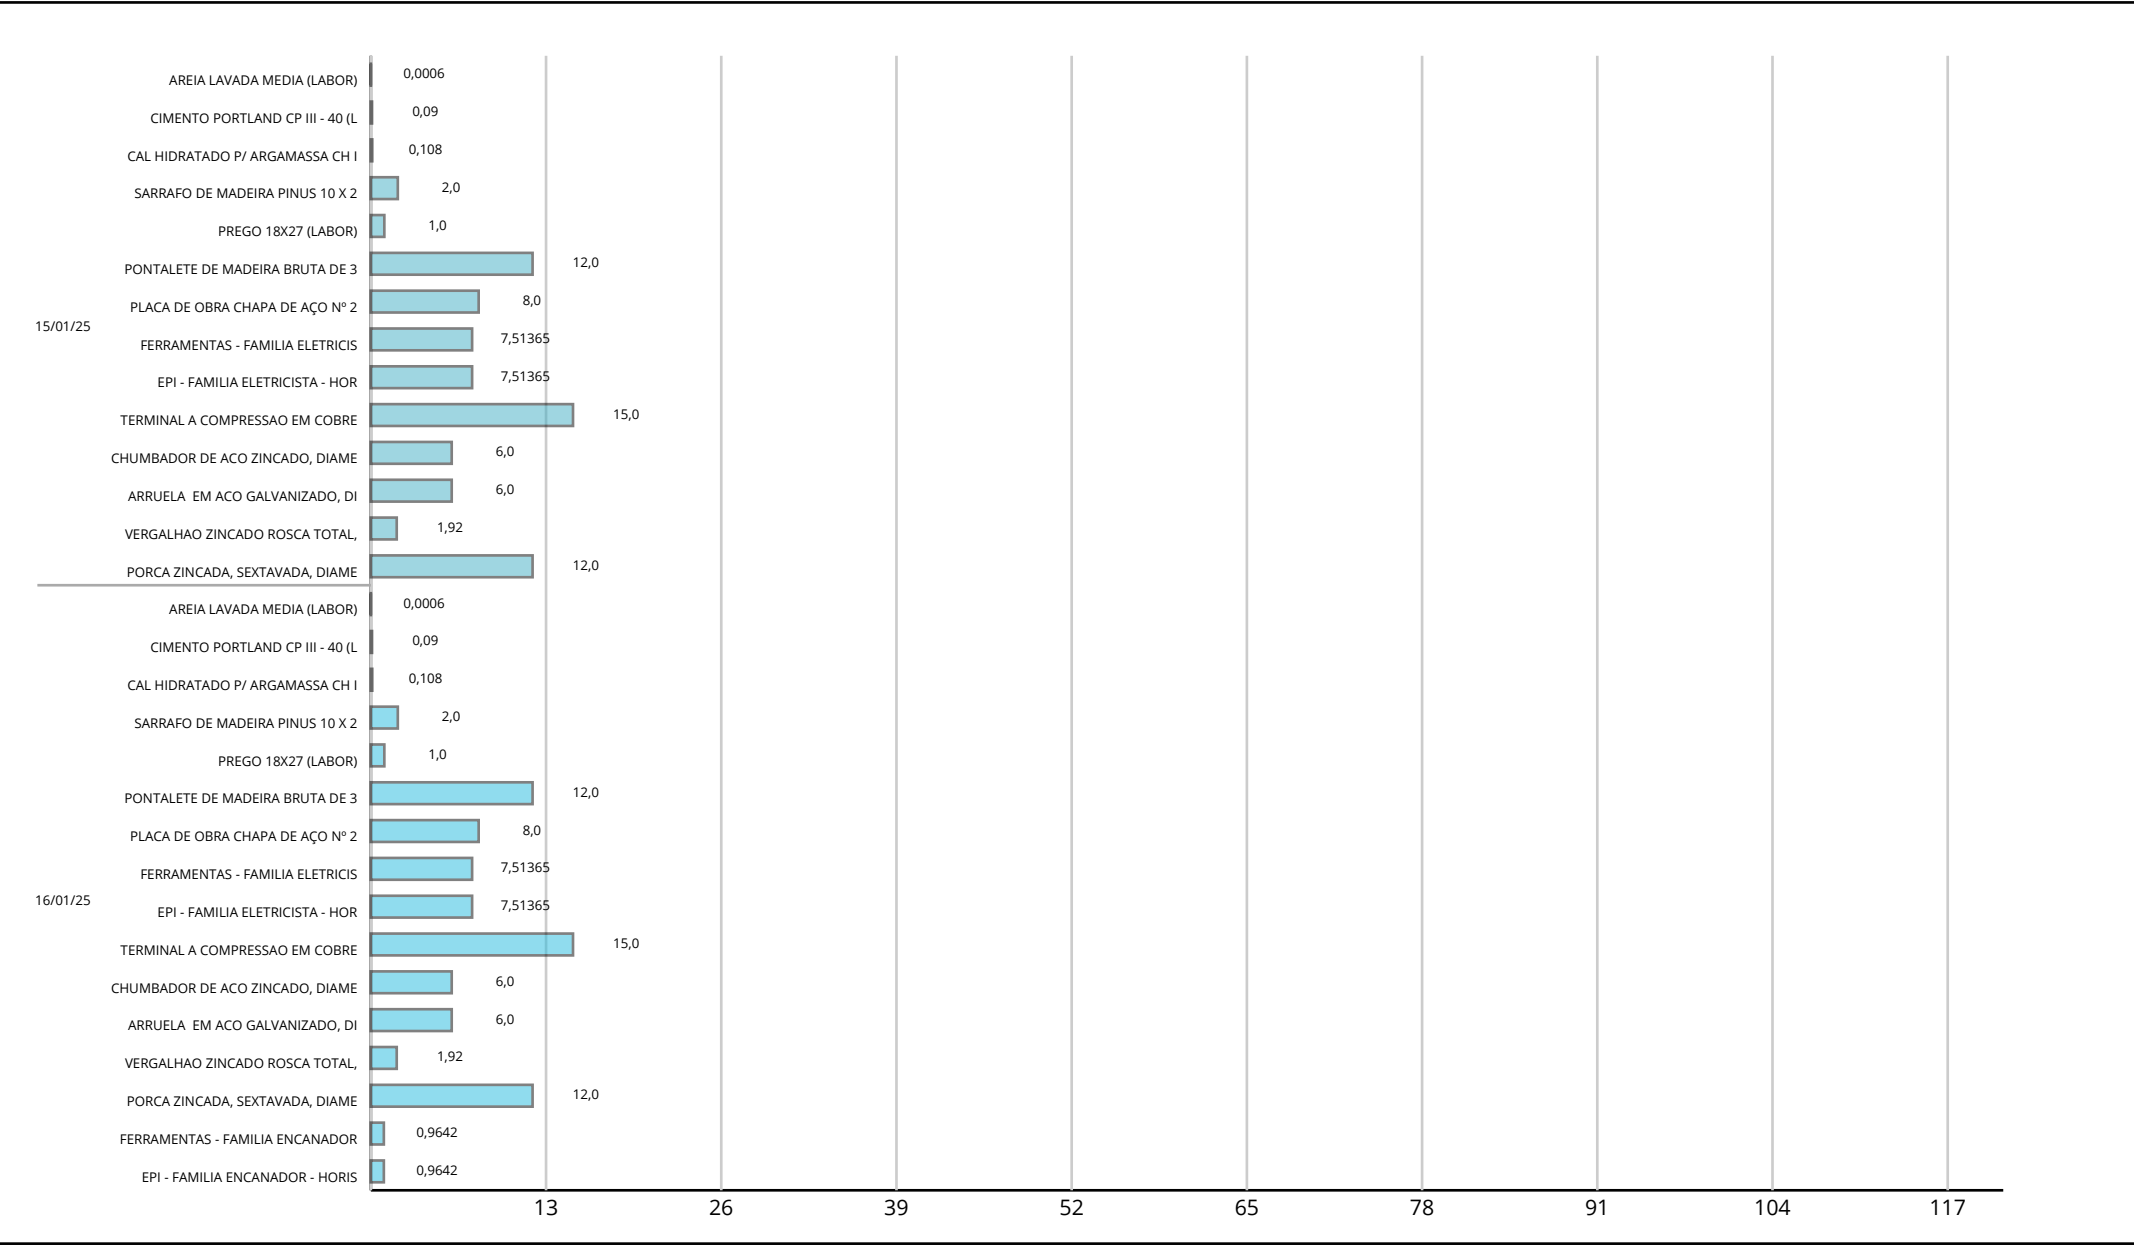


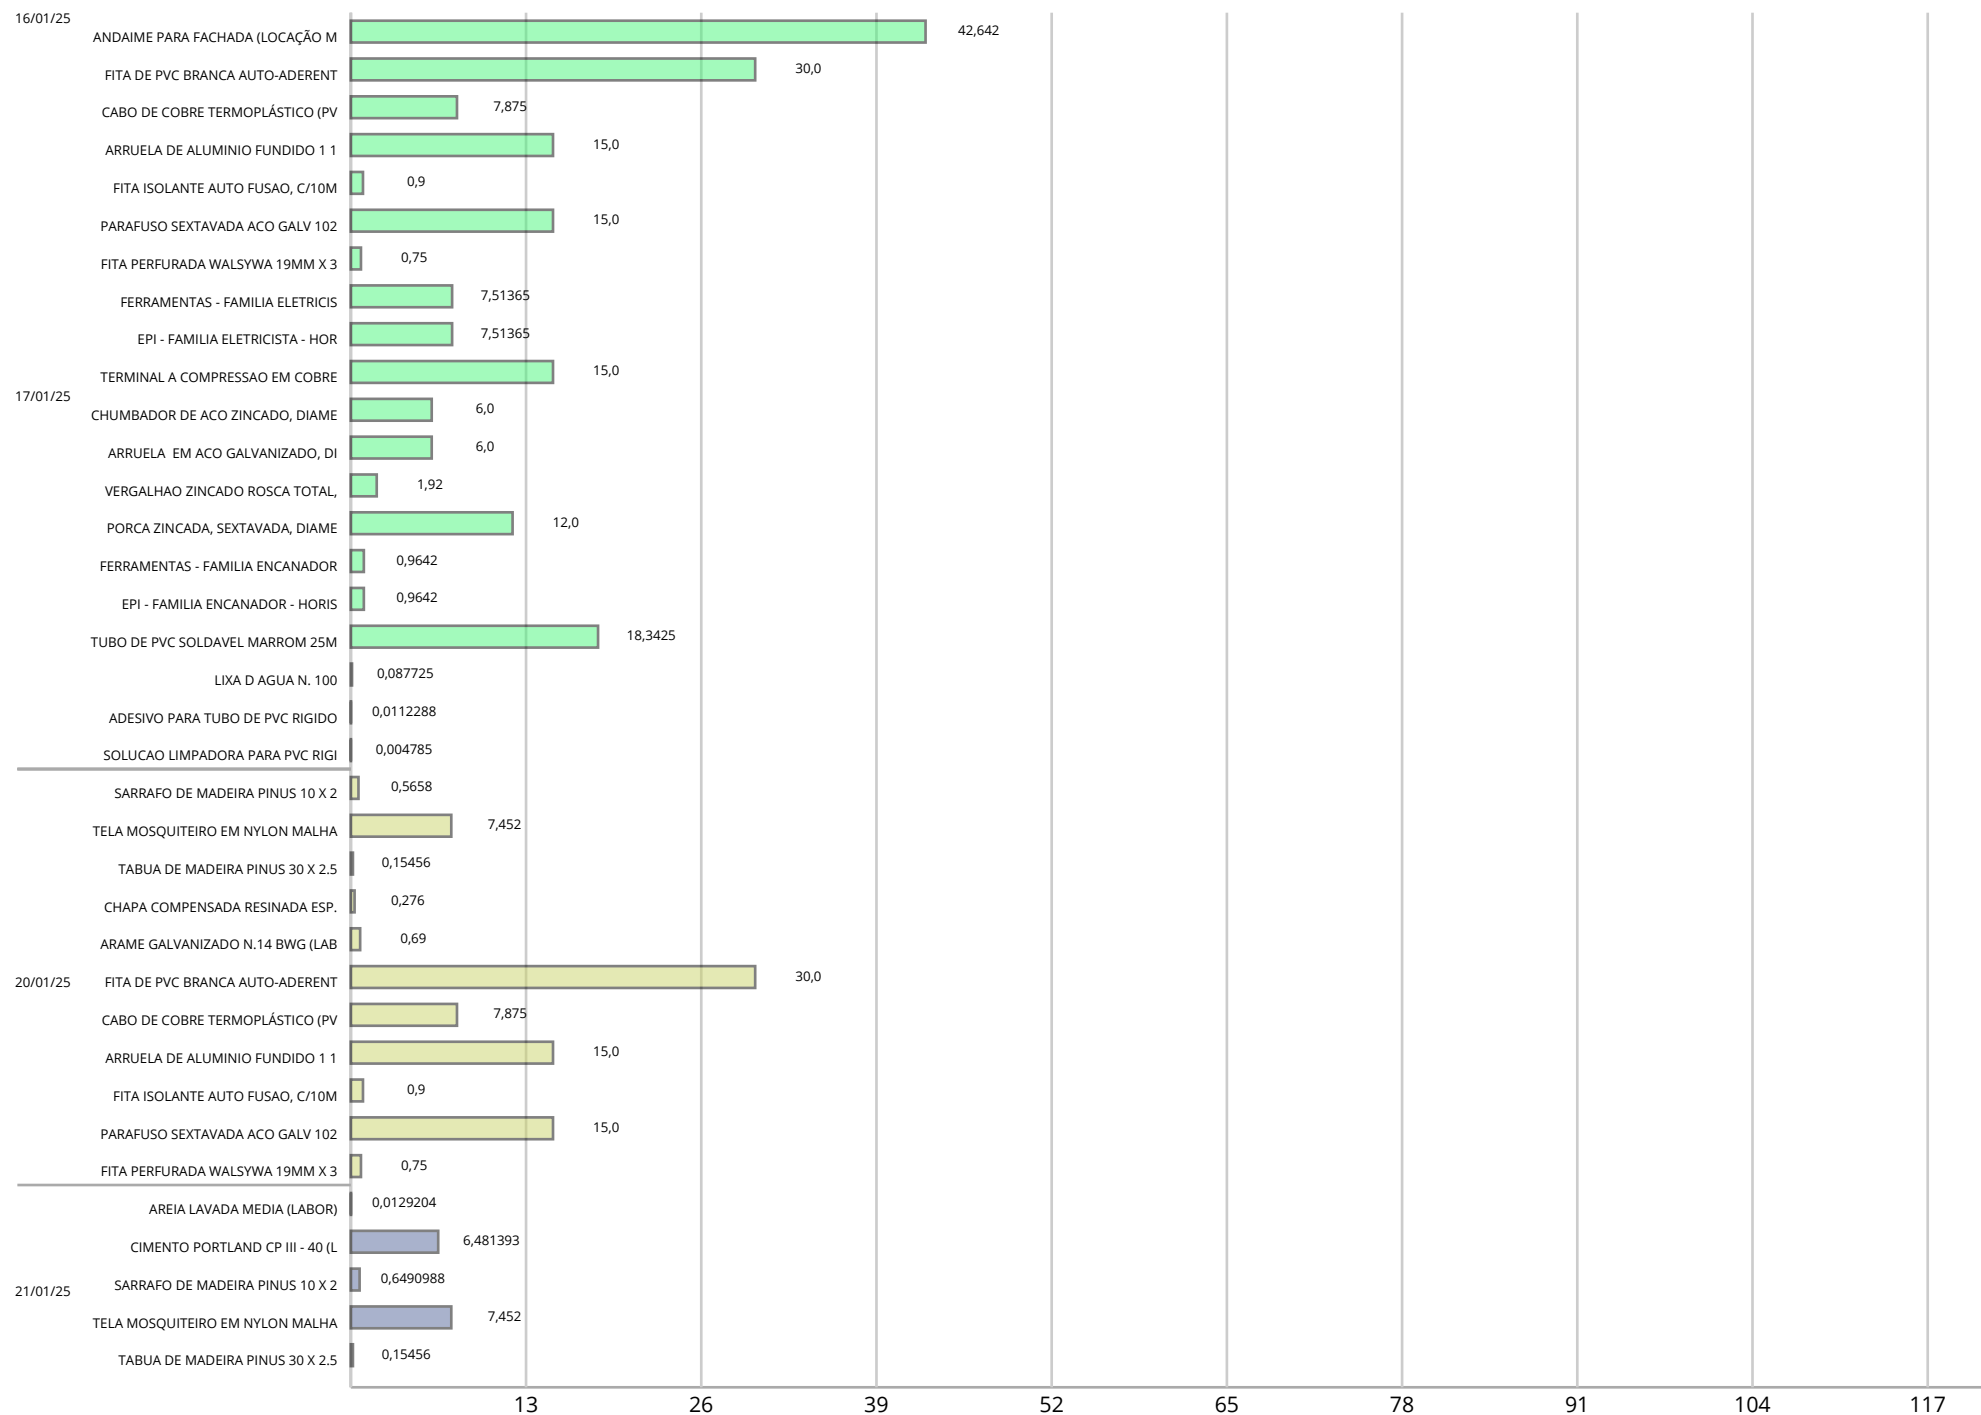


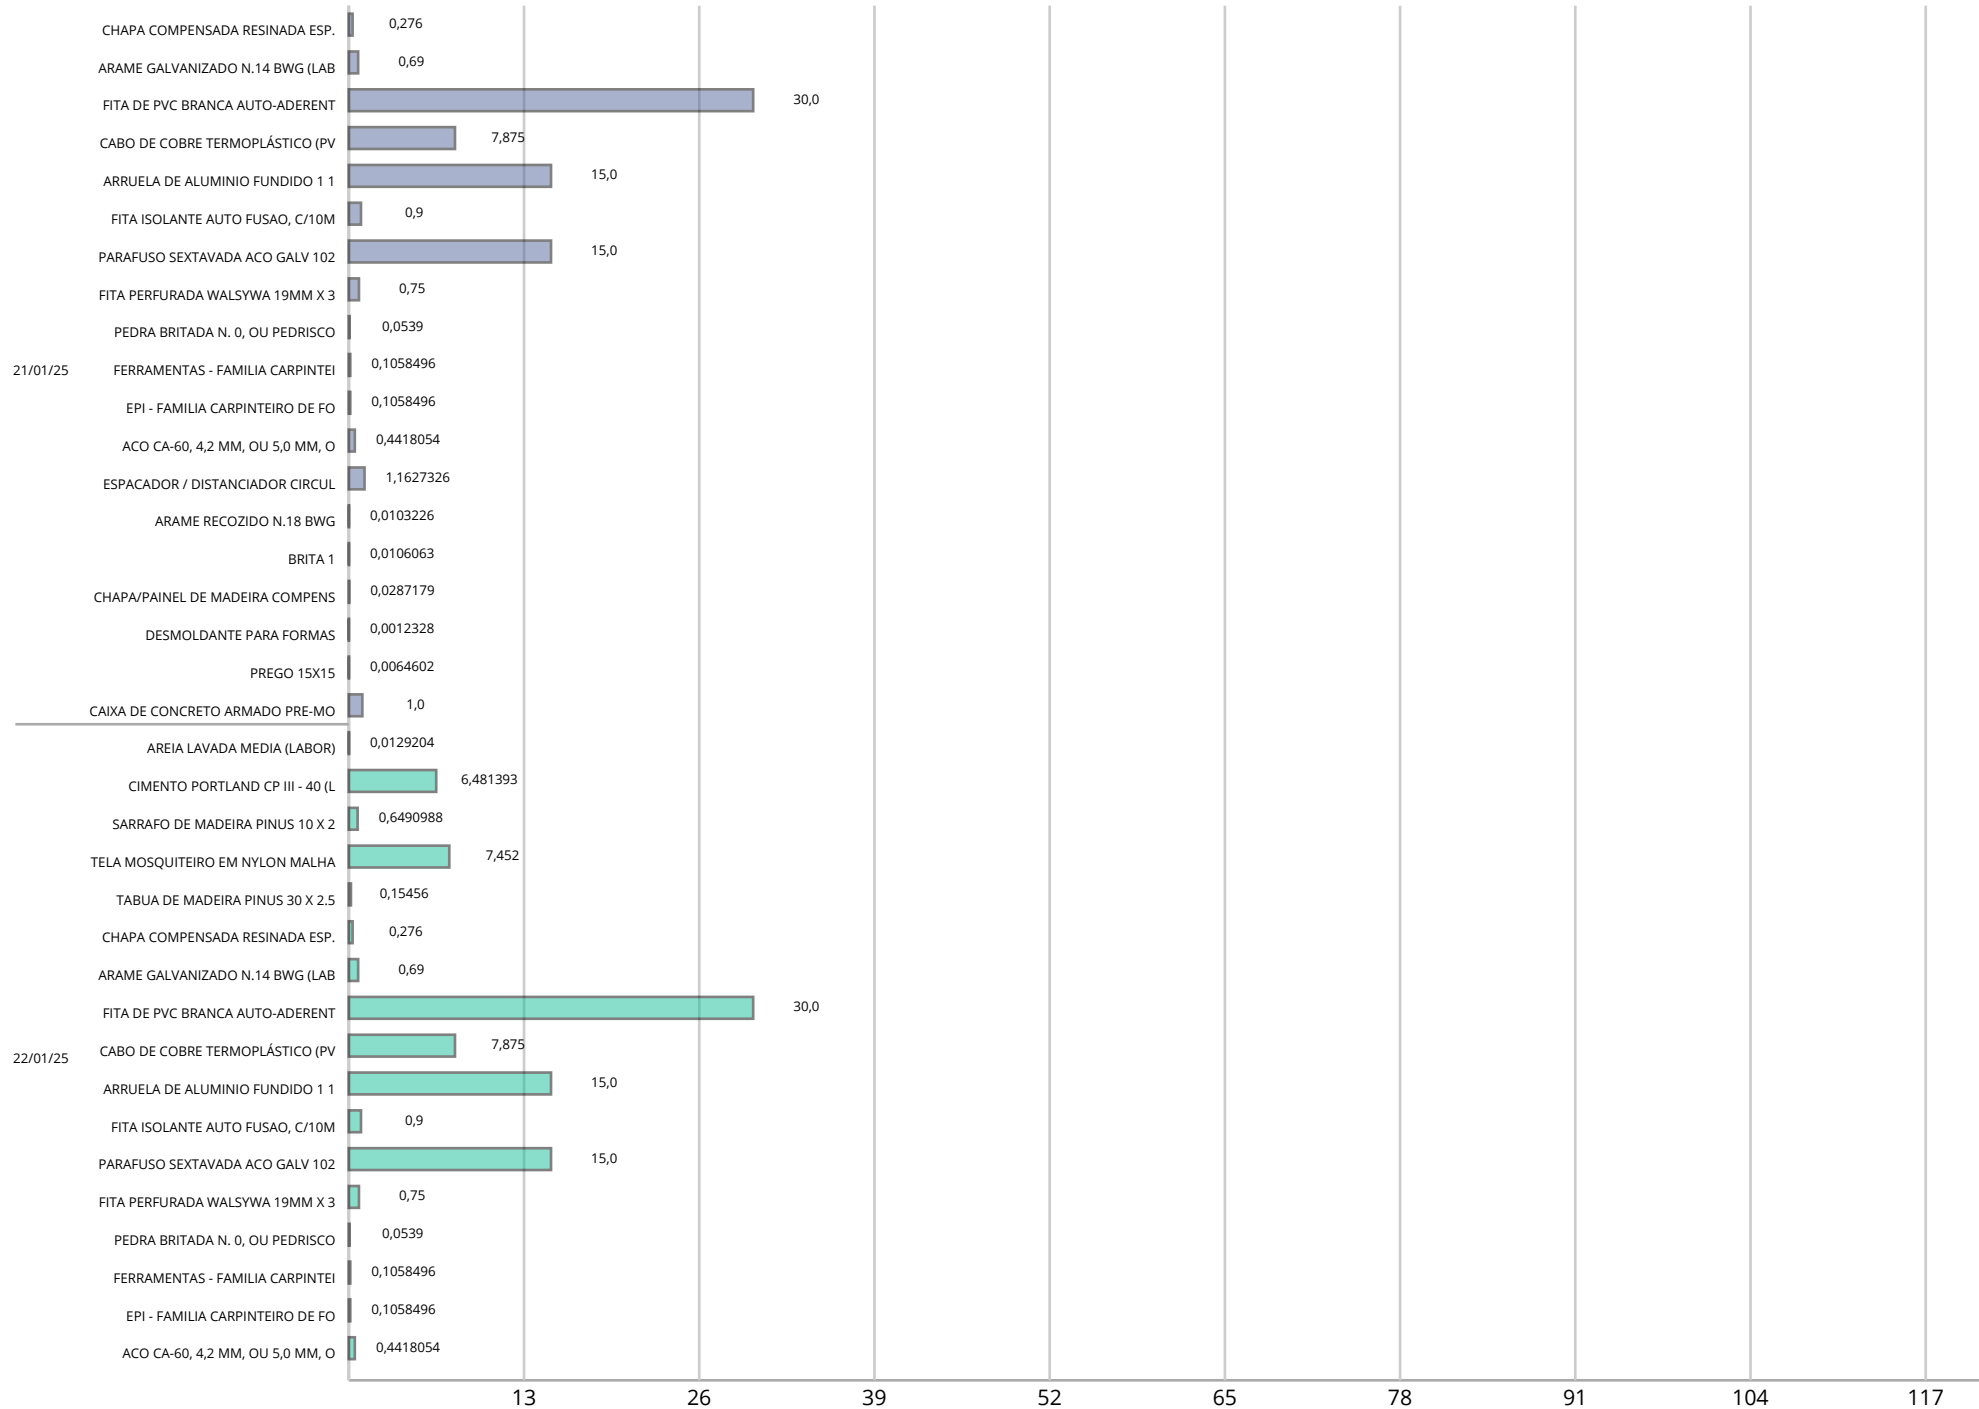




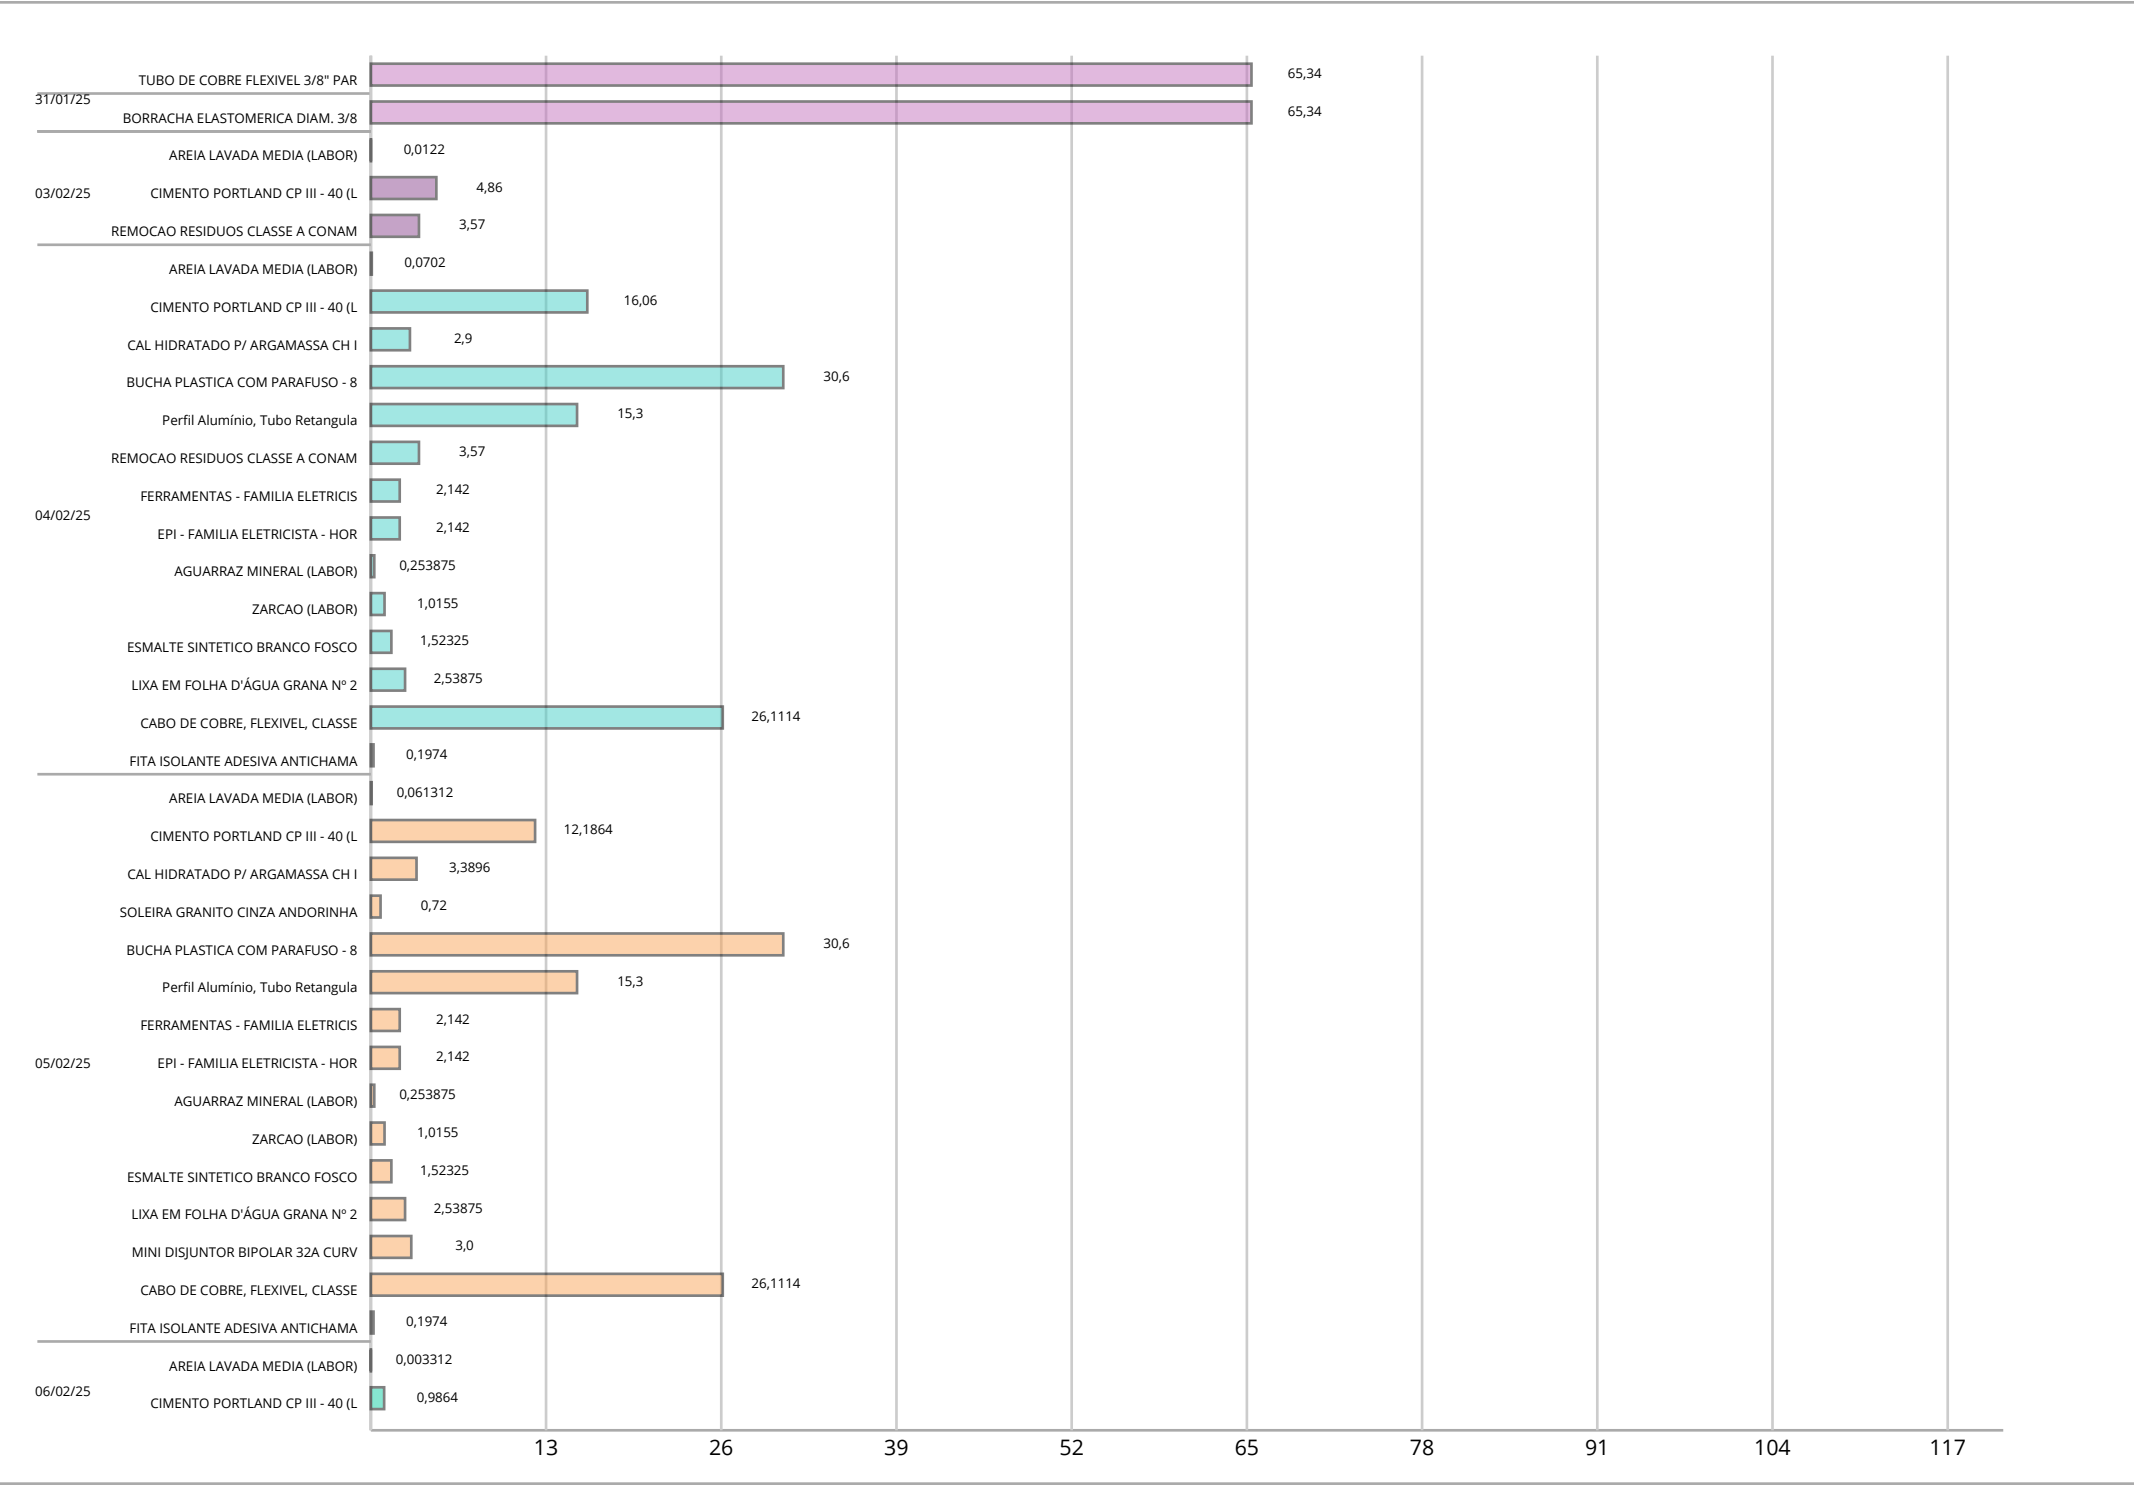


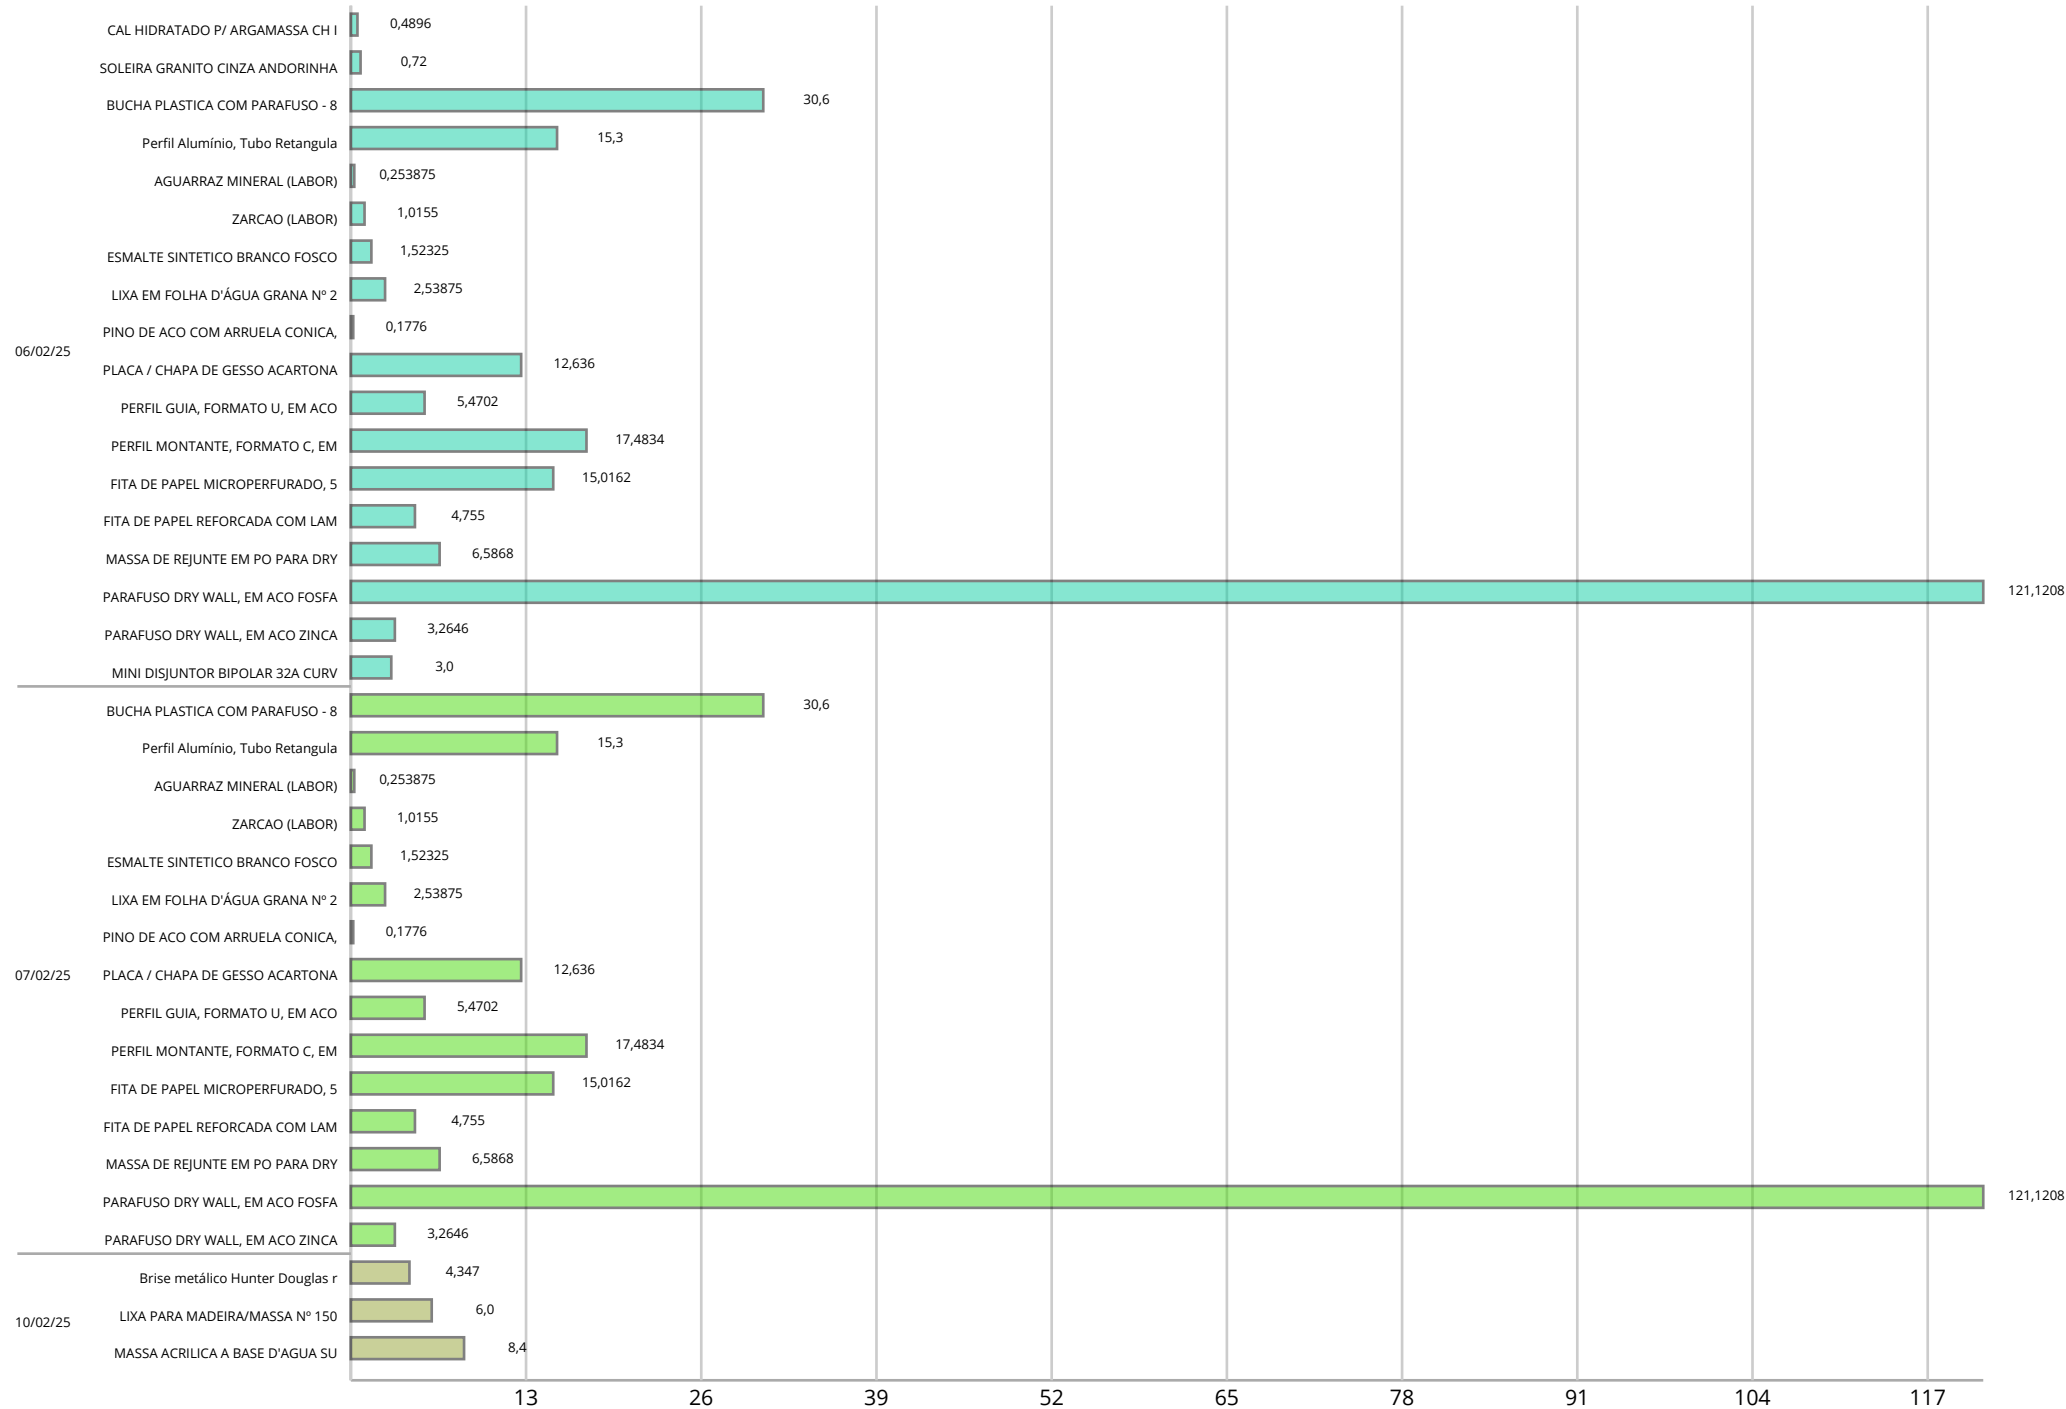

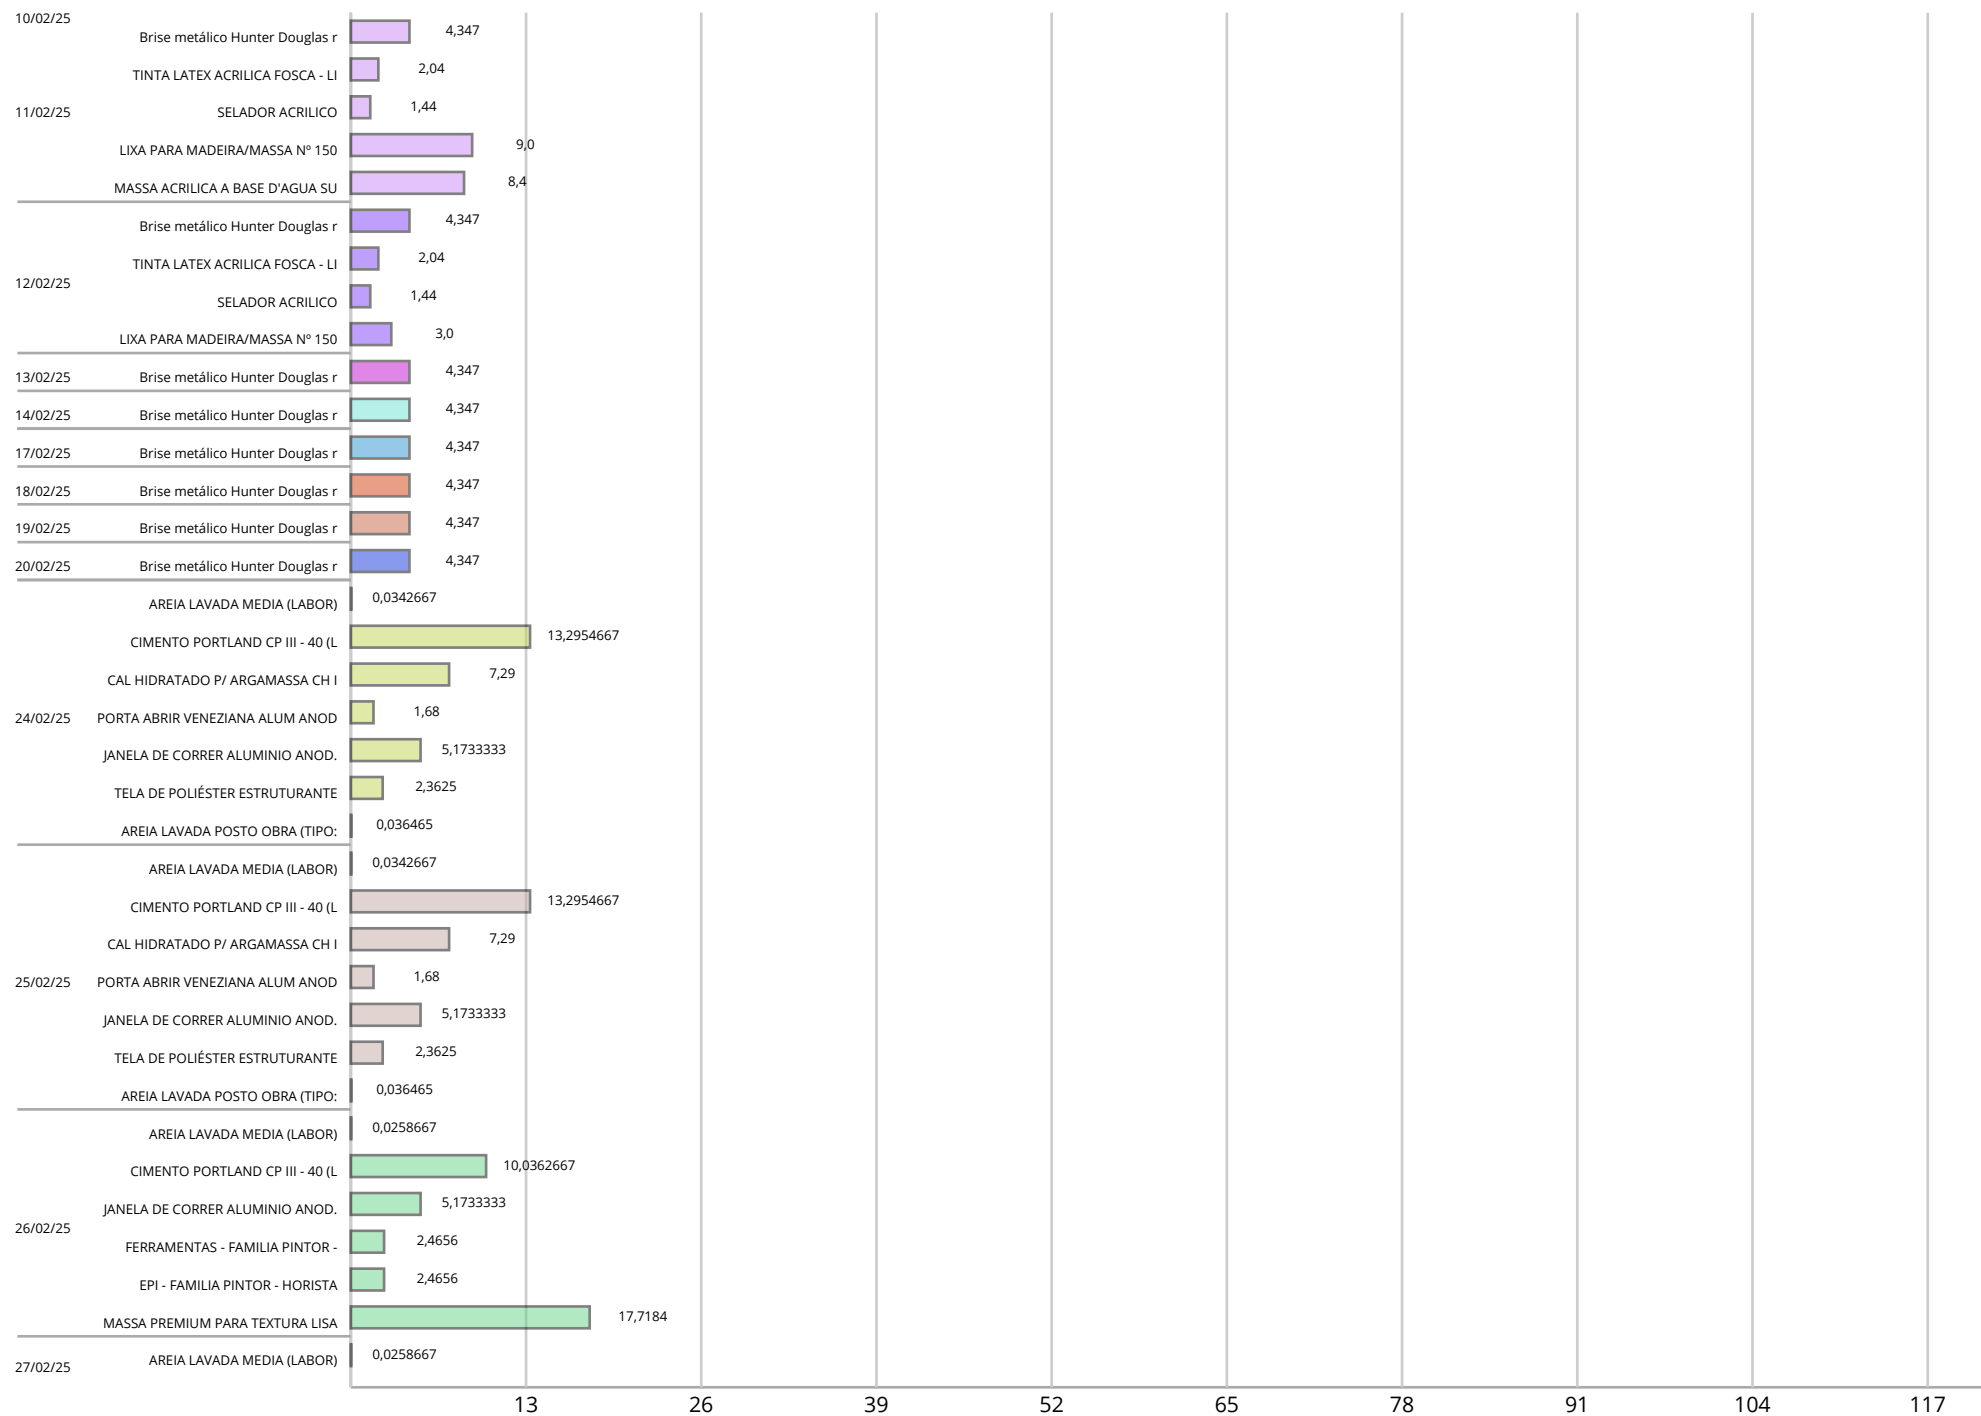

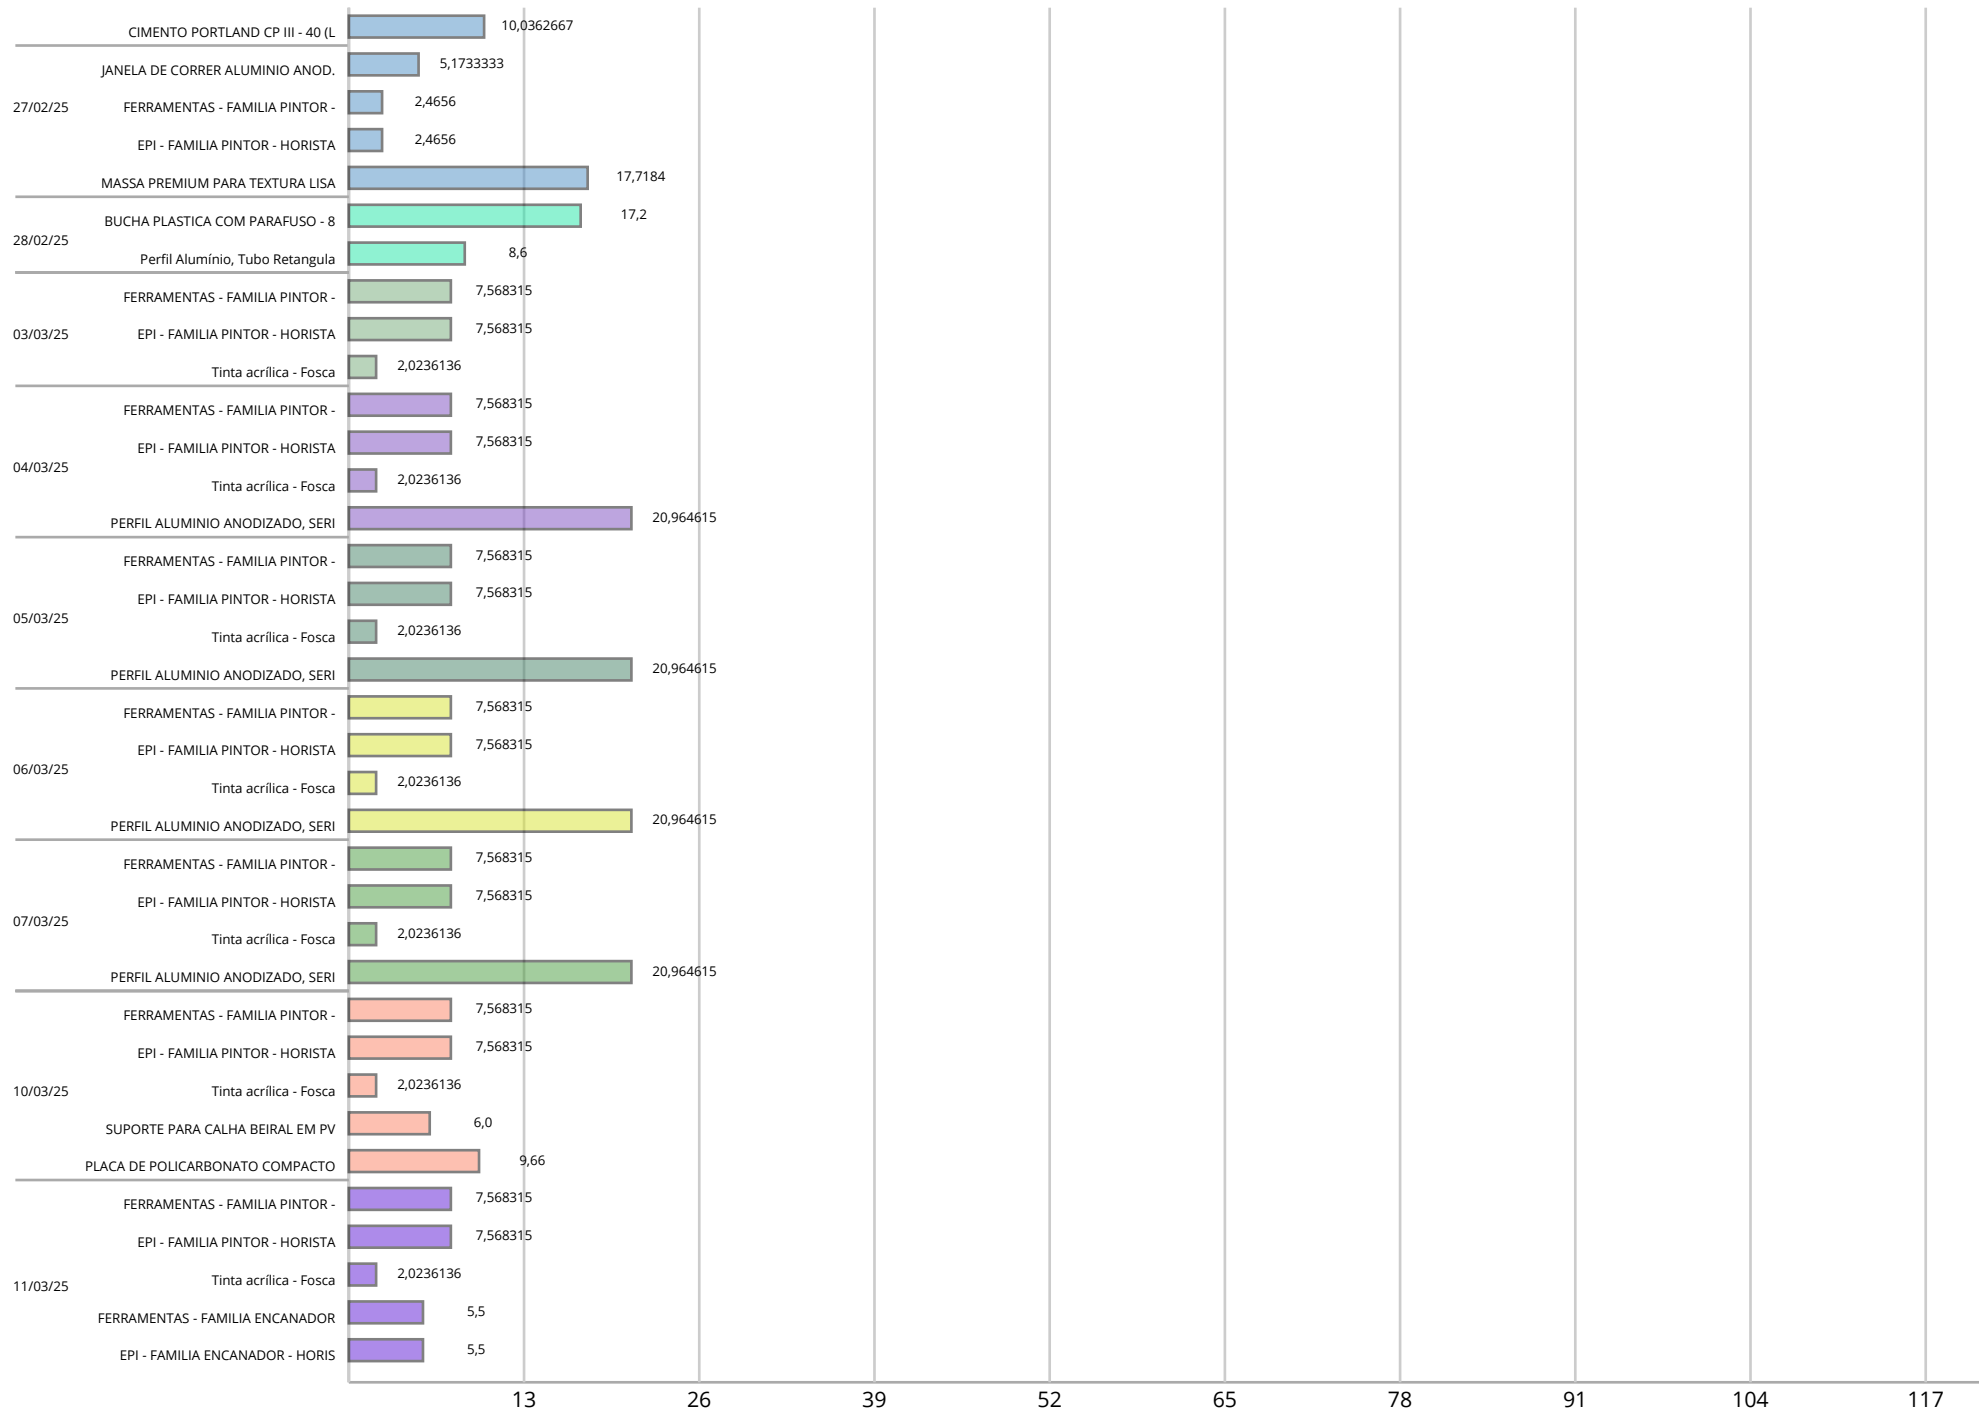



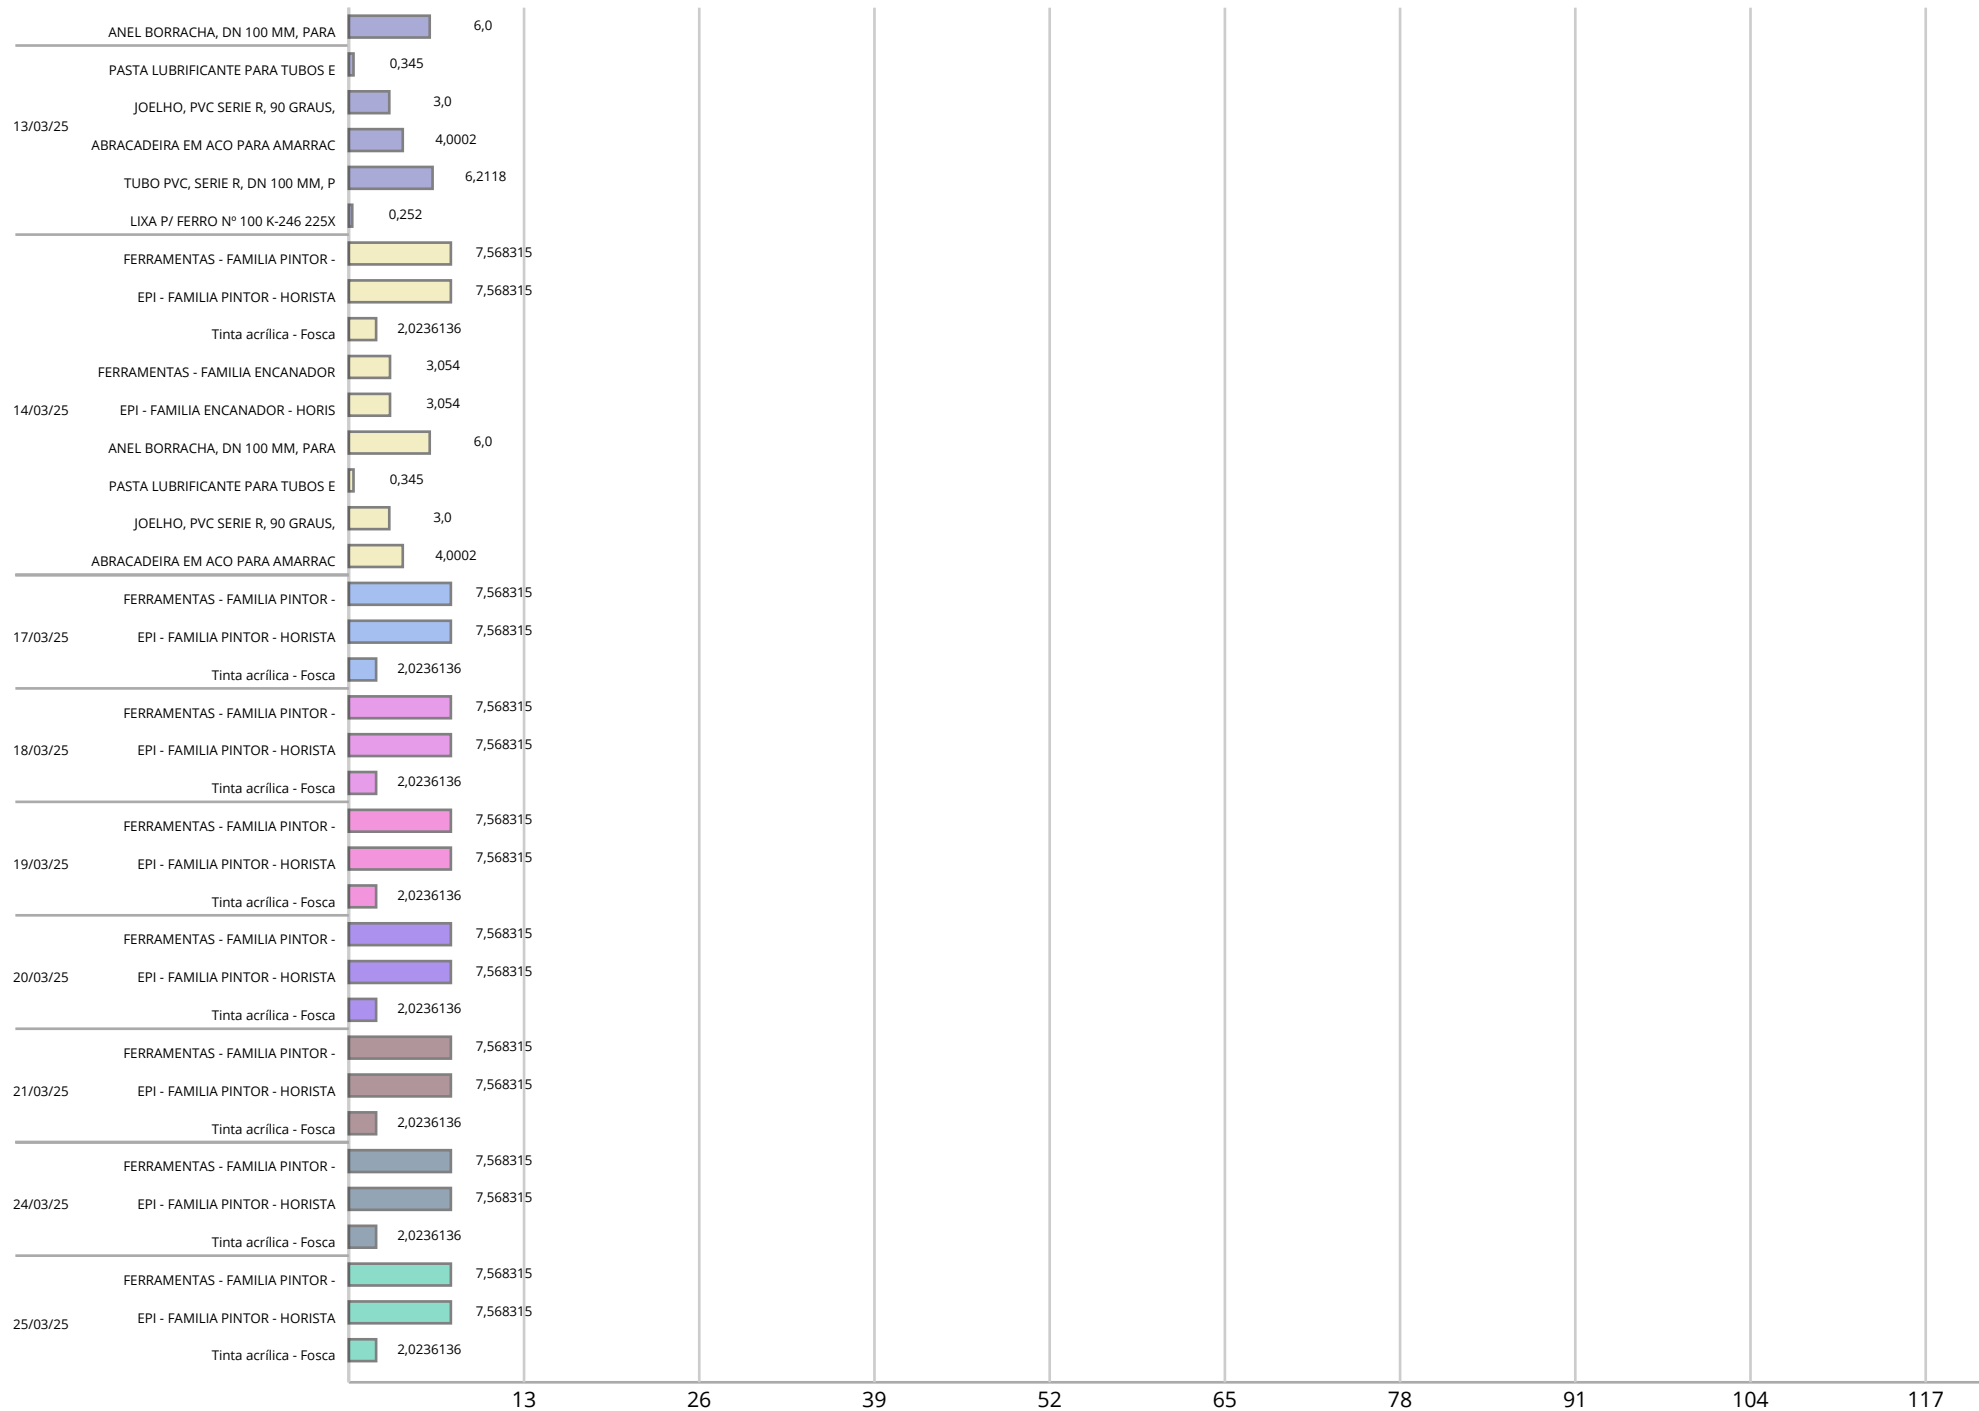

13

26

39

52

65

78

91

104

117
