


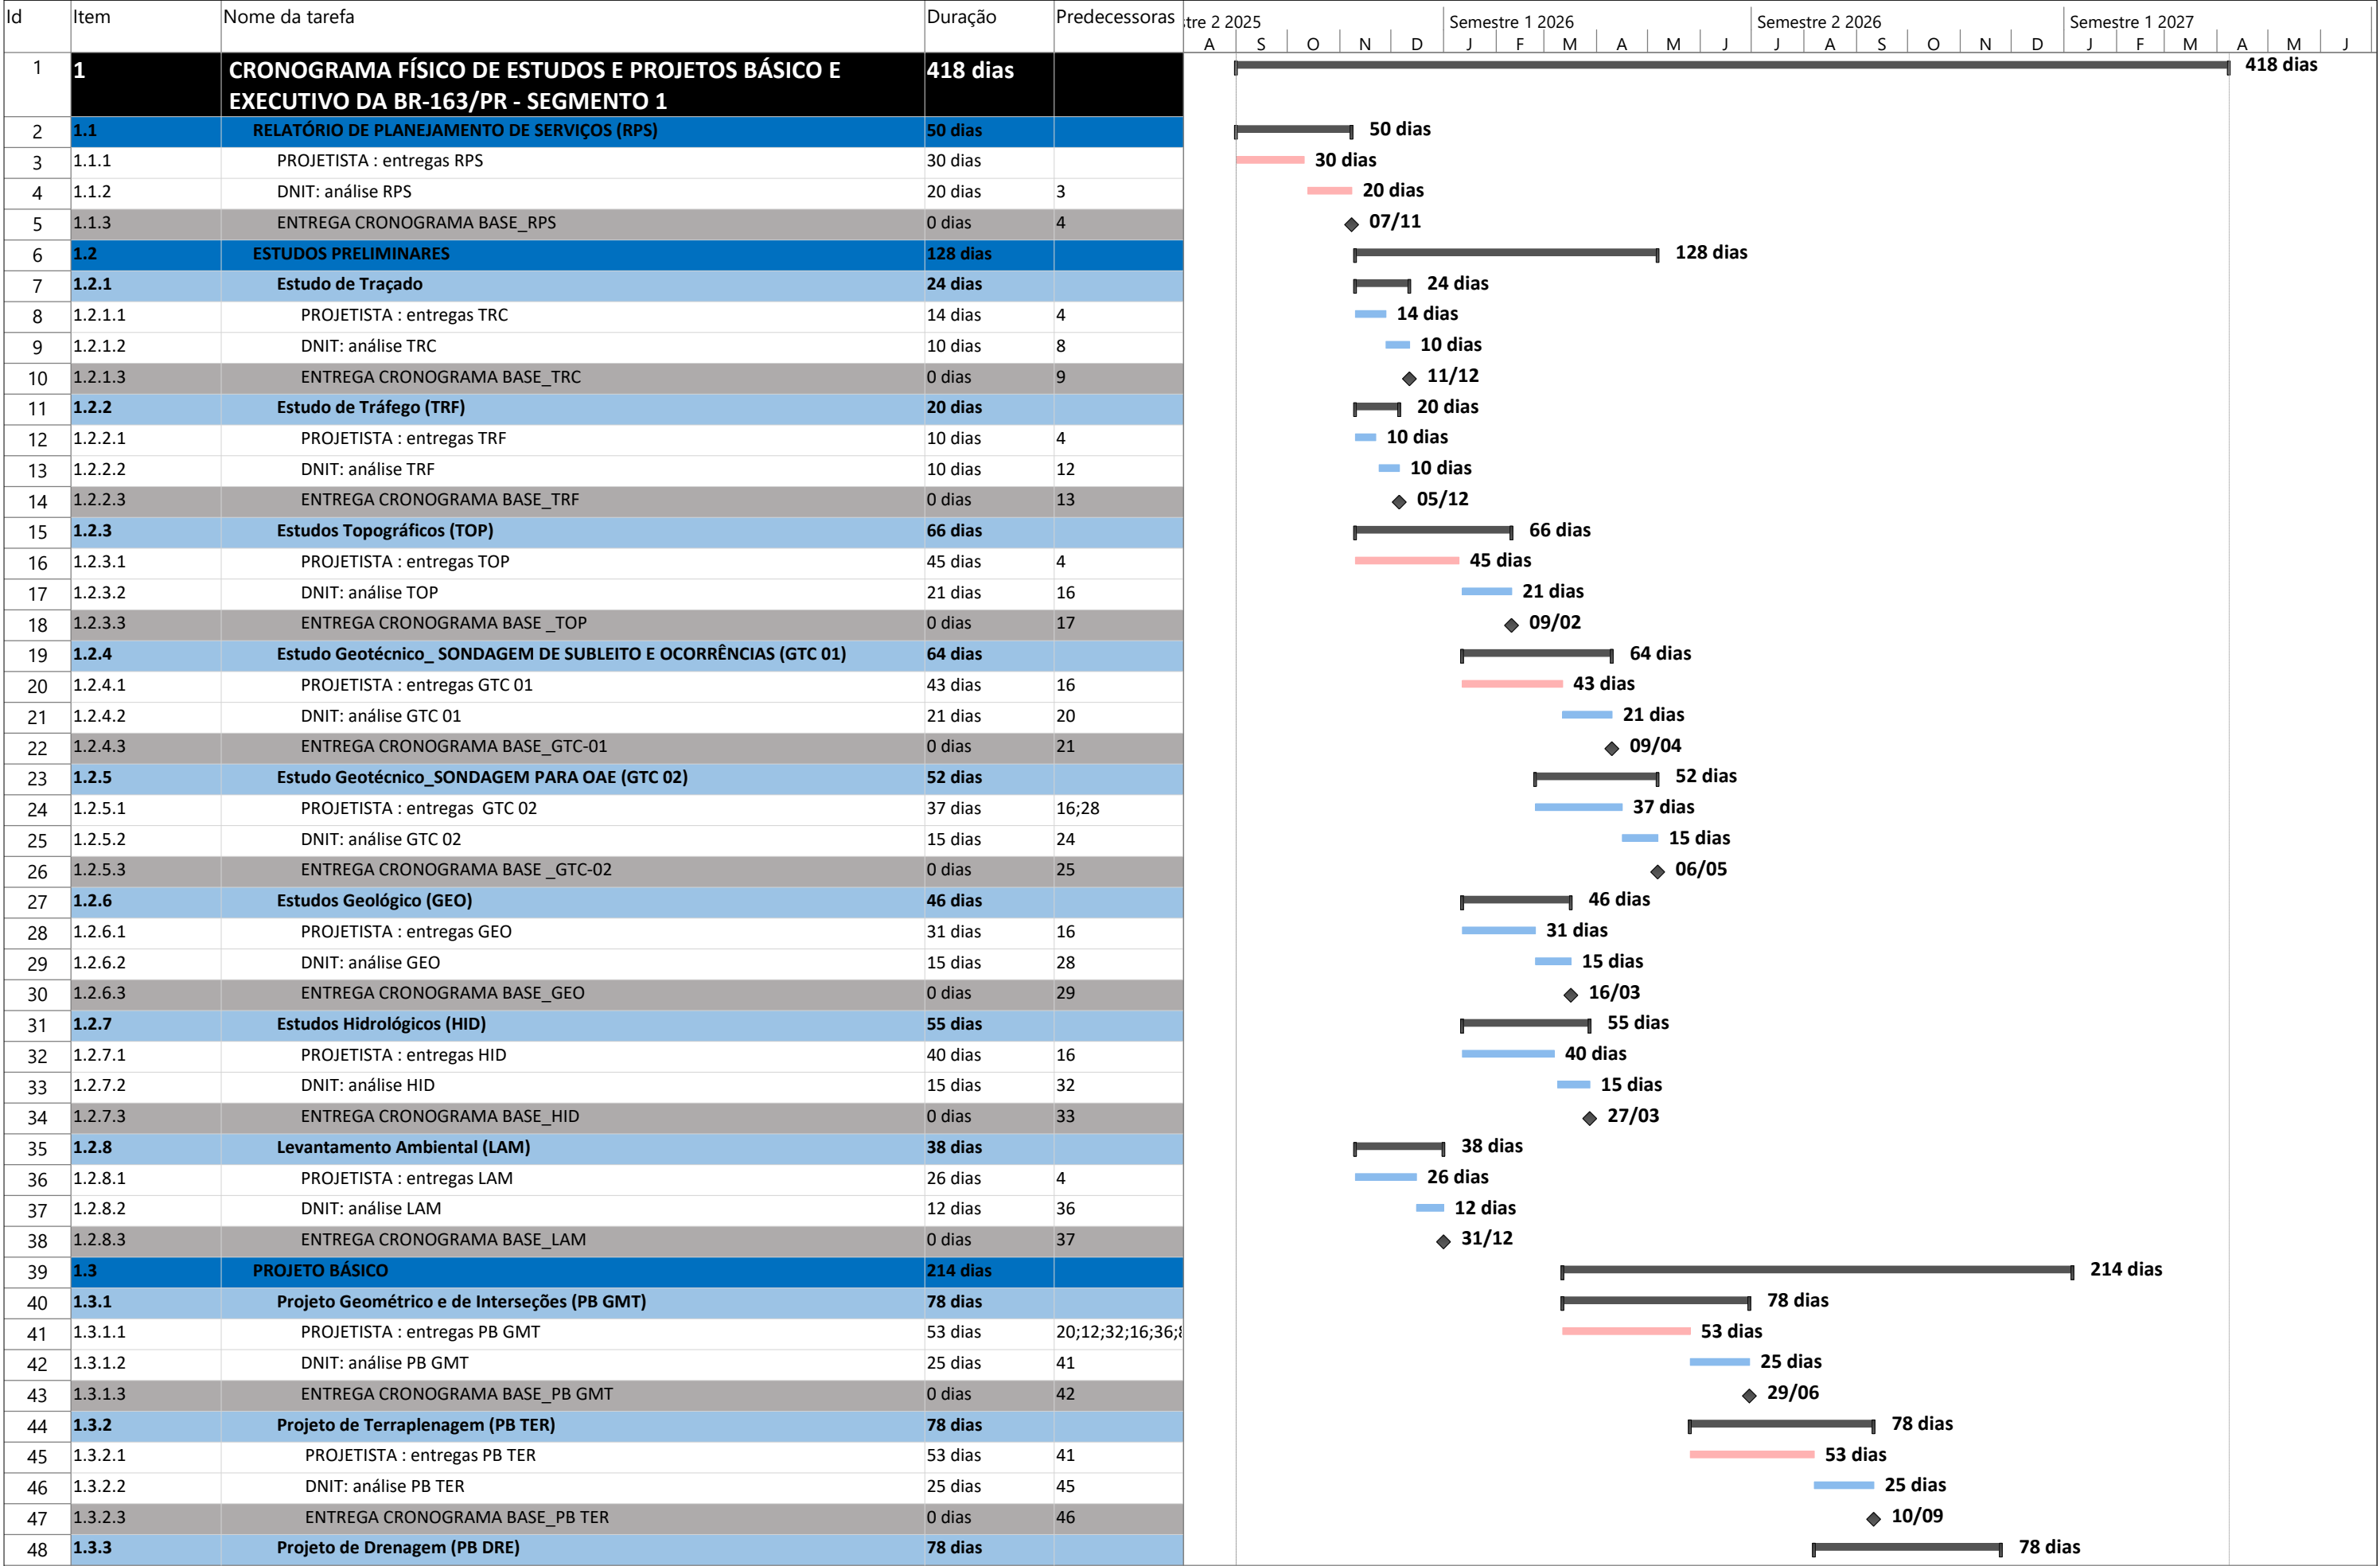

Id	Item	Nome da tarefa	Duração	Predecessoras	Semestre 2 2025					Semestre 1 2026					Semestre 2 2026					Semestre 1 2027				
					A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
49	1.3.3.1	PROJETISTA : entregas PB DRE	53 dias	41;45																				

Id	Item	Nome da tarefa	Duração	Predecessoras	Semestre 2 2025					Semestre 1 2026					Semestre 2 2026					Semestre 1 2027						
					A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M
98	1.4.2.1	PROJETISTA : entregas PE TER	25 dias	39																						
99	1.4.2.2	DNIT: análise PE TER	12 dias	98																						
100	1.4.2.3	ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PE TER	0 dias	99																						
101	1.4.3	Projeto de Drenagem (PE DRE)	37 dias																							
102	1.4.3.1	PROJETISTA : entregas PE DRE	25 dias	39																						
103	1.4.3.2	DNIT: análise PE DRE	12 dias	102																						
104	1.4.3.3	ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PE DRE	0 dias	103																						
105	1.4.4	Projeto de Pavimentação (PE PAV)	39 dias																							
106	1.4.4.1	PROJETISTA : entregas PE PAV	27 dias	39																						
107	1.4.4.2	DNIT: análise PE PAV	12 dias	106																						
108	1.4.4.3	ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PE PAV	0 dias	107																						
109	1.4.5	Projeto de Restauração / Reconstrução (PE RES)	39 dias																							
110	1.4.5.1	PROJETISTA : entregas PE RES	27 dias	57																						
111	1.4.5.2	DNIT: análise PE RES	12 dias	110																						
112	1.4.5.3	ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PE RES	0 dias	111																						
113	1.4.6	Projeto de Obras de Arte Especiais (PE OAE)	30 dias																							
114	1.4.6.1	PROJETISTA : entregas PE OAE	18 dias	61																						
115	1.4.6.2	DNIT: análise PE OAE	12 dias	114																						
116	1.4.6.3	ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PE OAE	0 dias	115																						
117	1.4.7	Projeto de Contenções (PB CON)	22 dias																							
118	1.4.7.1	PROJETISTA : entregas PB COM	12 dias	113TT																						
119	1.4.7.2	DNIT: análise PB COM	10 dias	118																						
120	1.4.7.3	ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PB COM	0 dias	119																						
121	1.4.8	Projeto de Obras Complementares (PE OCP)	26 dias																							
122	1.4.8.1	PROJETISTA : entregas PE OCP	16 dias	113TT																						
123	1.4.8.2	DNIT: análise PE OCP	10 dias	122																						
124	1.4.8.3	ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PE OCP	0 dias	123																						
125	1.4.9	Projeto de Sinalização e Segurança Viária (PE SIN)	20 dias																							
126	1.4.9.1	PROJETISTA : entregas PE SIN	10 dias	113TT																						
127	1.4.9.2	DNIT: análise PE SIN	10 dias	126																						
128	1.4.9.3	ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PE SIN	0 dias	127																						
129	1.4.10	Projeto de Componente Ambiental e Paisagismo (PE CAM)	21 dias																							
130	1.4.10.1	PROJETISTA : entregas PE CAM	11 dias	77																						
131	1.4.10.2	DNIT: análise PE CAM	10 dias	130																						
132	1.4.10.3	ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PE CAM	0 dias	131																						
133	1.4.11	Projeto de Iluminação (PB ILU)	45 dias																							
134	1.4.11.1	PROJETISTA : entregas PE ILU	30 dias	113TT																						
135	1.4.11.2	DNIT: análise PE ILU	15 dias	134																						
136	1.4.11.3	ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PE ILU	0 dias	135																						
137	1.4.12	Orçamento e Plano de Execução de Obra (PE ORC)	29 dias																							
138	1.4.12.1	PROJETISTA : entregas PE ORC	17 dias	94;98;102TI+10																						
139	1.4.12.2	DNIT: análise PE ORC	12 dias	138																						
140	1.4.12.3	ENTREGA CRONOGRAMA BASE_PE ORC	0 dias	139																						
