



MODELOS

MEMÓRIAS DE CÁLCULO – DIÁRIO DE OBRA – HISTOGRAMA DE FUNCIONÁRIOS

**MEMÓRIA DE CÁLCULO – Xª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
(MODELO)**

CONTRATADA:

CONTRATO:

OBRA:


LOGRADOURO:

Folha

2.2. Vigas Baldrame e Blocos

Viga Baldrame	Escav. (m³)	Apiloamento (m²)	Lastro de Brita (m³)	Forma (m²)	Concreto (m³)	Embasamento (m³)	Reaterro (m³)
VB101	0,72	1,31	0,07	1,57	0,16	0,10	0,46
VB102	0,72	1,31	0,07	1,57	0,16	0,10	0,46
VB107	0,77	1,40	0,07	1,68	0,17	0,11	0,49
VB108	0,77	1,40	0,07	1,68	0,17	0,11	0,49
A MEDIR	2,98	5,42	0,27	6,50	0,65	0,43	1,90

Croqui – Estacas executadas

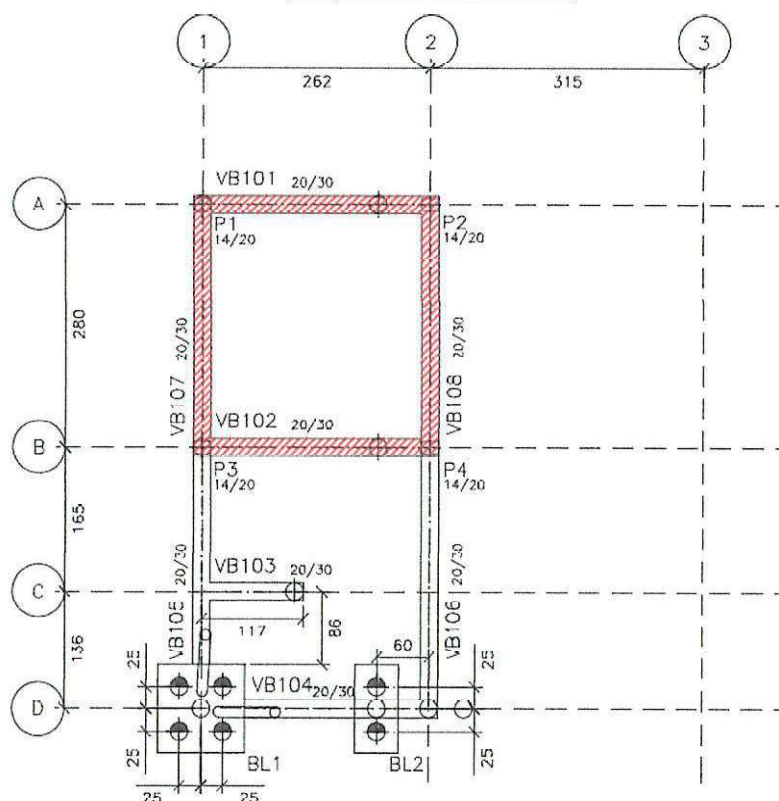

Legenda



Viga executada

**MEMÓRIA DE CÁLCULO – Xª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
(MODELO)**

CONTRATADA:

CONTRATO:

OBRA:

LOGRADOURO:


Folha

- INFRAESTRUTURA

Broca Diam = 20 cm

Elemento (Realizado)	Dimensões (m)	
	Diâmetro	Comprimento
E1	0,20	5,00
E2	0,20	5,00
E3	0,20	5,00
E4	0,20	5,00
A MEDIR		20,00

Croqui – Estacas executadas

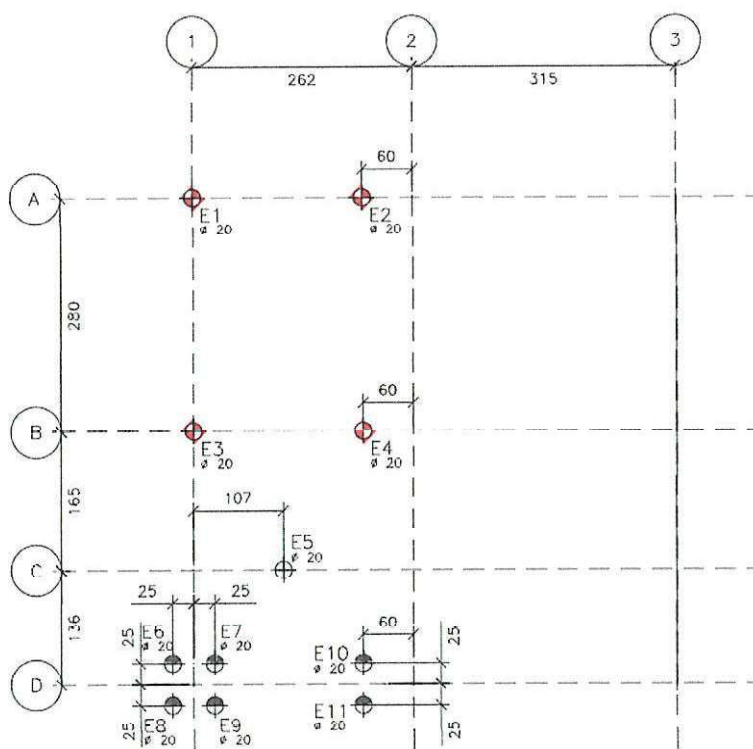

Legenda



Estacas executadas

MEMÓRIA DE CÁLCULO – Xª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
(MODELO)

CONTRATADA:

CONTRATO:

OBRA:

LOGRADOURO:

Folha

- ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Alvenaria (m²)	
Parede 15 cm	Parede 25 cm
20,00	47,45


- DIVISÓRIAS EM GRANITO

Divisória (m²)	
Separação Vasos	Mictórios
10,90	0,78





Quadro Resumo – Serviços a Medir

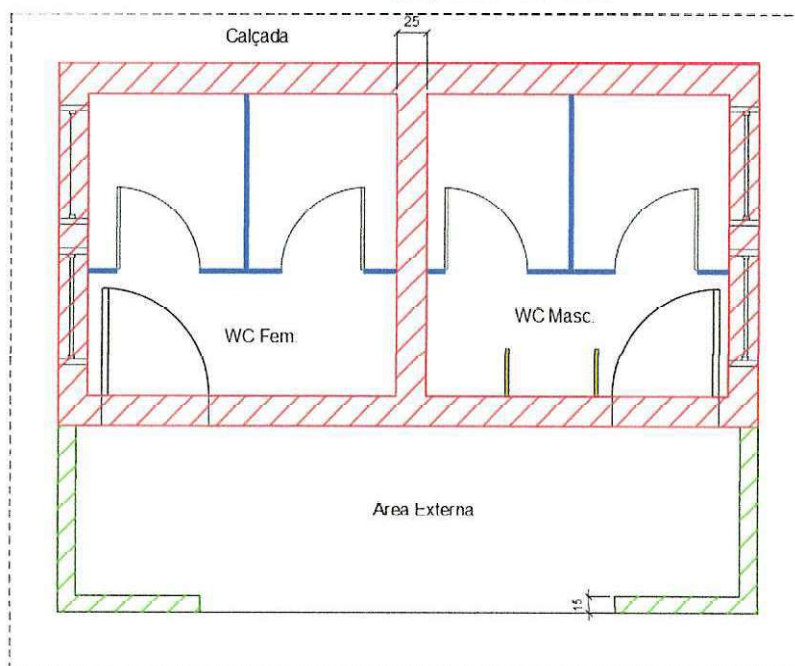Alvenaria (m²)		Divisória (m²)	
Parede 15 cm	Parede 25 cm	Separação Vasos	Mictórios
20,00	47,45	10,90	0,78

Croqui – Piso Assentado



Legenda

-  Parede 25 cm, altura 2,60 m
-  Parede 15 cm, altura 1,85 m
-  Divisória em granito – Sanitários
-  Divisória em granito – Mictórios

**MEMÓRIA DE CÁLCULO – Xª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
(MODELO)**

CONTRATADA:

CONTRATO:

OBRA:

LOGRADOURO:

Folha


- ESQUADRIAS / PEITORIL / SOLEIRAS

Código	Qdade	Dimensões (m)			Área (m²)		Peitoril (m)	Soleira (m)	Material	Tipo	Fechadura (Qdade)
		Largura	Altura	Peitoril	Unit.	Total					
PM 1	4	0,70	1,65	-	1,16	4,62		2,80	Madeir.	Abrir (1 folha)	4
PM 2	2	0,90	2,10	-	1,89	3,78		1,80	Madeira	Abrir (1 folha)	2
JA 1	4	1,00	0,60	1,80	0,60	2,40	4,00		Alumin.	Projetante	
TOTAL							4,00	4,60			6

Quadro Resumo – Serviços a Medir

Esquadrias				Peitoril (m)	Soleira (m)
Portas – Madeira (unid)		Fechadura (unid)	Janelas – Ferro (m²)		
Entrada	Divisórias				
2	4	6	2,40	4,00	4,60

Croqui – Esquadrias / Peitoris / Solteiras Instaladas

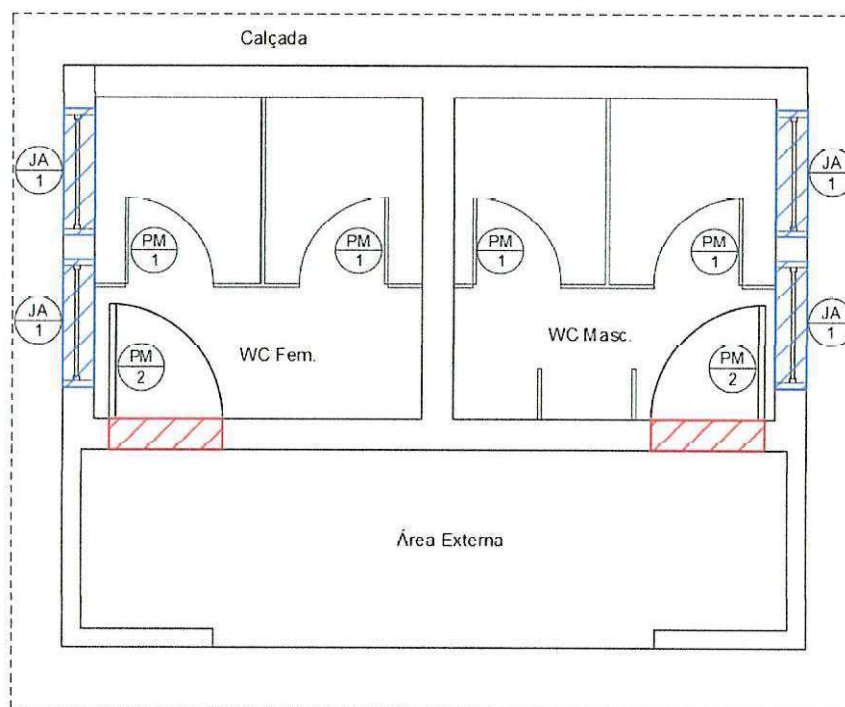

Legenda



Peitoril em granito



Soleira em granito

**MEMÓRIA DE CÁLCULO – Xª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
(MODELO)**

CONTRATADA:

CONTRATO:

OBRA:


LOGRADOURO:

Folha

- PISOS

Ambiente	Área Ambiente (m²)	Piso (m²)	
		Cerâmico	Intertravado (6 cm)
WC Fem.	6,63	6,63	-
WC Masc.	6,50	6,50	-
Área Externa	8,46	8,46	-
Calçada	9,72	-	9,72
A MEDIR		21,59	9,72

Croqui – Piso Assentado

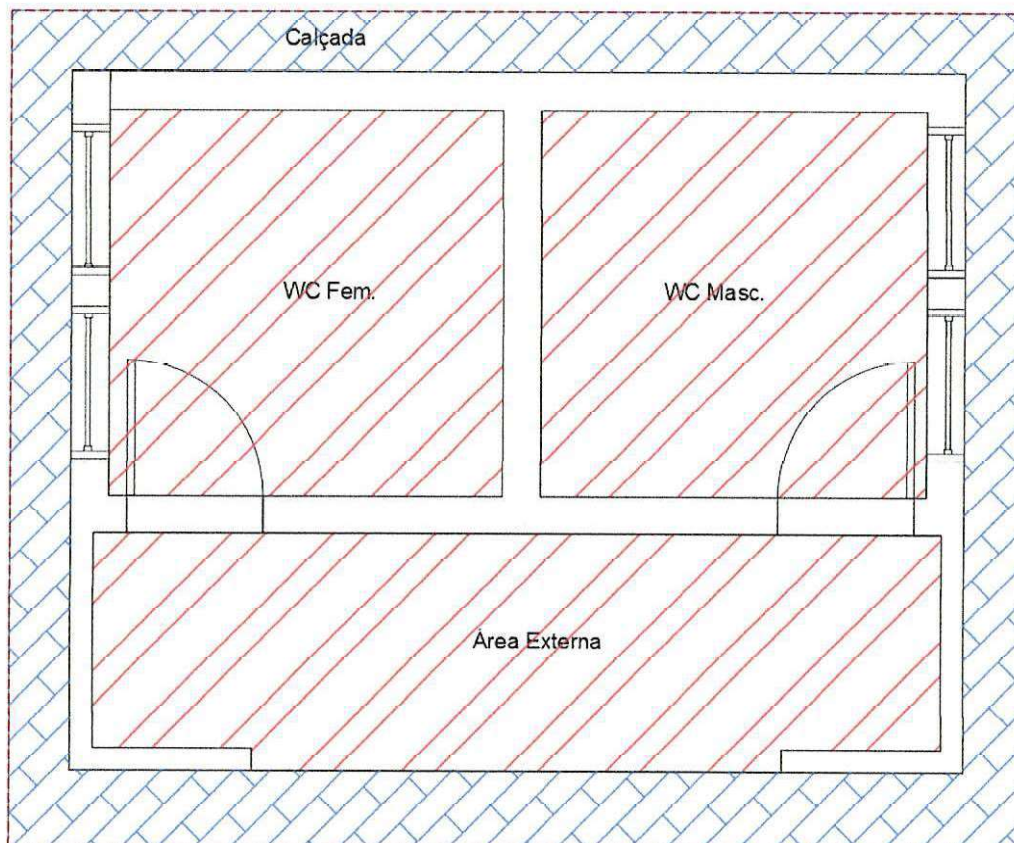

Legenda



Piso Cerâmico



Piso Intertravado

MEMÓRIA DE CÁLCULO – Xª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
(MODELO)

CONTRATADA:

CONTRATO:

OBRA:

LOGRADOURO:

Folha


- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Tubulações

Rede de esgoto

DN (mm)	50
Comprimento – A Medir (m)	0,65

Croqui – Rede de Esgoto Sanitário executada

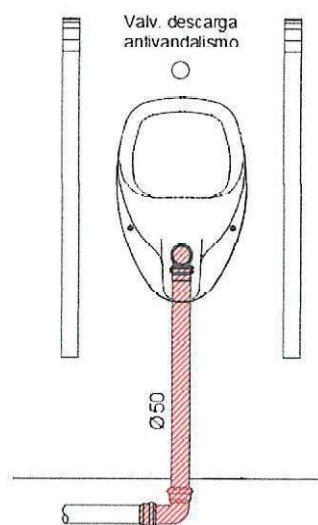

Legenda



Rede executada

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS



LOGOMARCA ONTRATADA

DIA	
NUMERO	
PRAZO (DIAS)	
DIAS DECORRIDOS	0
SALDO (DIAS)	0

OBRA:

CONTRATO: XXX/XXXX

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã		Manhã		Manhã		
Tarde		Tarde		Tarde		
Noite		Noite		Noite		

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS	EQUIPAMENTOS	DATA ENTREGA	DATA RECEBIDO
Nº Funcionários na Obra:			
		Visto	Visto

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - PREFEITURA


[illegible][illegible]

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Assinatura Fiscalização/Supervisão

MODELO - HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA

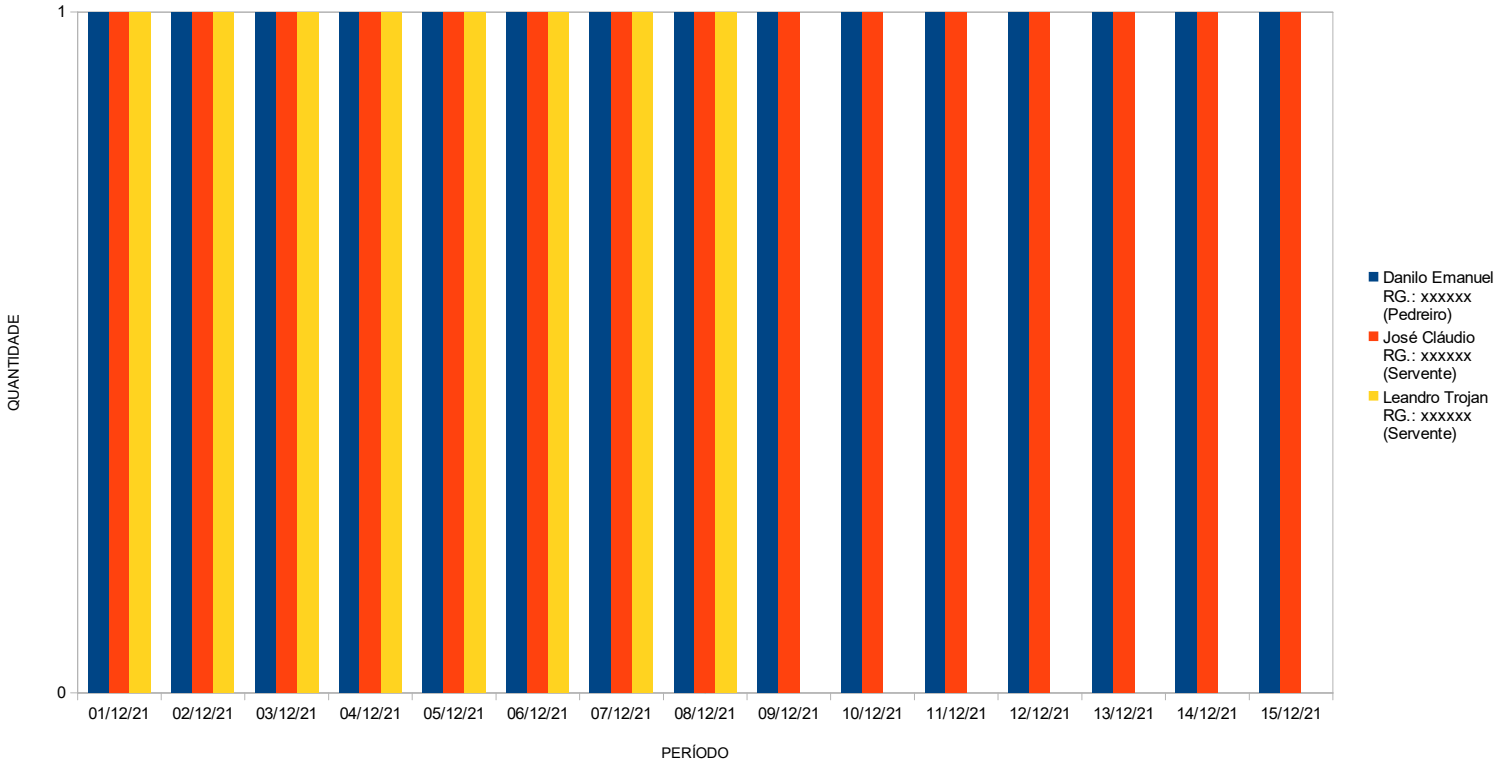

Período	01/12/21	02/12/21	03/12/21	04/12/21	05/12/21	06/12/21	07/12/21	08/12/21	09/12/21	10/12/21	11/12/21	12/12/21	13/12/21	14/12/21	15/12/21
Danilo Emanuel Profissão: xxxxxx Cargo (Pedreiro)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
José Cláudio RG.: xxxxxx (Servente)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Leandro Trojan RG.: xxxxxx (Servente)	1	1	1	1	1	1	1	1							
