



JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PB-DTI)

ANEXO Nº 6171412

ANEXO III - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E INVENTÁRIO (6171412)

1. Relatório fotográfico externo do container

1.1 Dimensões

O Container Datacenter da JFPB é fabricado em chapa de aço com as seguintes dimensões:

- a) Comprimento total (incluindo a parte de acoplamento das máquinas do sistema de refrigeração) – 9,00 metros;
- b) Comprimento do acoplamento das máquinas de refrigeração – 2,30 metros;
- c) Largura – 3,20 metros
- d) Altura – 3,15 metros





1.2 Gerador

a) Cummins de 80 KVa fabricação 2017 modelo C65D6 com tanque de combustível externo;







1.3 Sistema de Refrigeração

a) Composto por duas máquinas 7.5 TR e com insuflamento na parede frontal do corredor frio.

 gemelo tecnologia sob medida			GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Rua dos Manacás, 276, Sala 24, Jardim da Glória - Cotia - SP - CEP:06711-500 tel: 011-3831-3852 www.gemelo.com.br		
Modelo:			Nº série:		
APG-SC-26-17			SC261712001		
Capacidade térmica:	Vazão de evaporação:		Vazão de condensação:		
28KW	8.000 m³/h		16.000 m³/h		
Gás refrigerante:	Tipo de condensação:		Temperatura operação:		
R-410A	AR AMBIENTE		18°C a 35°C		
Tensão de trabalho:	Corrente máxima de operação:		Potência máxima de operação:		
380V - 3Ø	44,3A		29,15KVA		
Frequência:	Aquecimento:		Umidificador		
60Hz	12KW		150W		

1.4 Sistema de Combate a Incêndio

a) detectores de fumaça embaixo do piso elevado e no teto e cilindro de gás FM200;





1.5 Sistema UPS

a) composto dois nobreaks de 20 KVA, marca Delta, modelo HPH20K-B, com banco de 80 baterias em cada UPS, de 7 Ampères.

1.6 Sistema de controle e monitoramento


a) VESDA VLF







2. Inventário

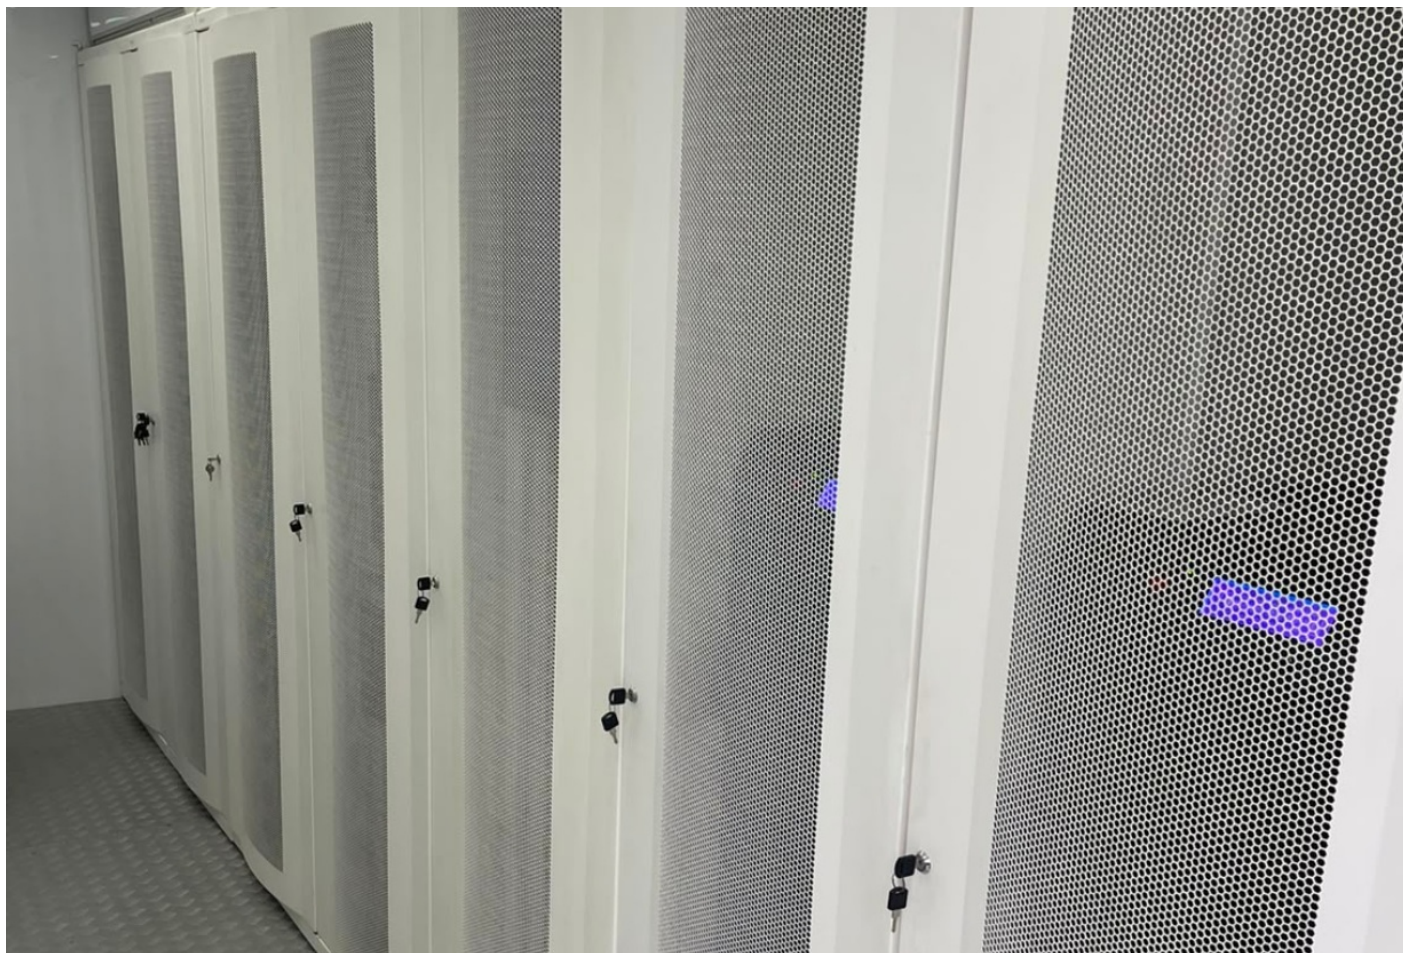

2.1. RACK01

- a) STORAGE ALL-FLASH;
- b) 3 SERVIDORES FISICOS de 1U;
- c) STORAGE NL-SAS
- d) STORAGE NL-SAS SATA
- e) 4 SWITCHES REDE SAN

2.2. RACK02

- a) TAPE LIBRARY LTO-8 COM 80 FITAS E 6 DRIVES;

- b) 2 APPLIANCES DE BACKUP;
- c) KVM.

2.3. RACK03

- a) 2 FIREWALLS CORPORATIVOS;
- b) NVR DE 8 CANAIS;
- c) 2 SWITCHES CORE DE 48 PORTAS;
- d) 2 ROTEADORES.

2.4. RACK04

- a) 8 NVRS CORPORATIVOS DE 32 CANAIS;
- b) 4 SERVIDORES FÍSICOS.

2.5. RACK05

- a) 2 SWITCHES SAN;
- b) 2 SWITCHES LAN CORE;
- c) 2 STORAGES ALL-FLASH;
- d) 2 SERVIDORES FÍSICOS.

2.6. RACK06 E RACK07

- a) UPS A E B DO DATACENTER.



Documento assinado eletronicamente por **HUGO ANDRADE CORREIA LIMA FILHO, DIRETOR DE DIVISÃO**, em 24/09/2026, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RUI NOBREGA DA SILVA LEAL, SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 25/09/2026, às 08:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6171412** e o código CRC **473490E4**.
