


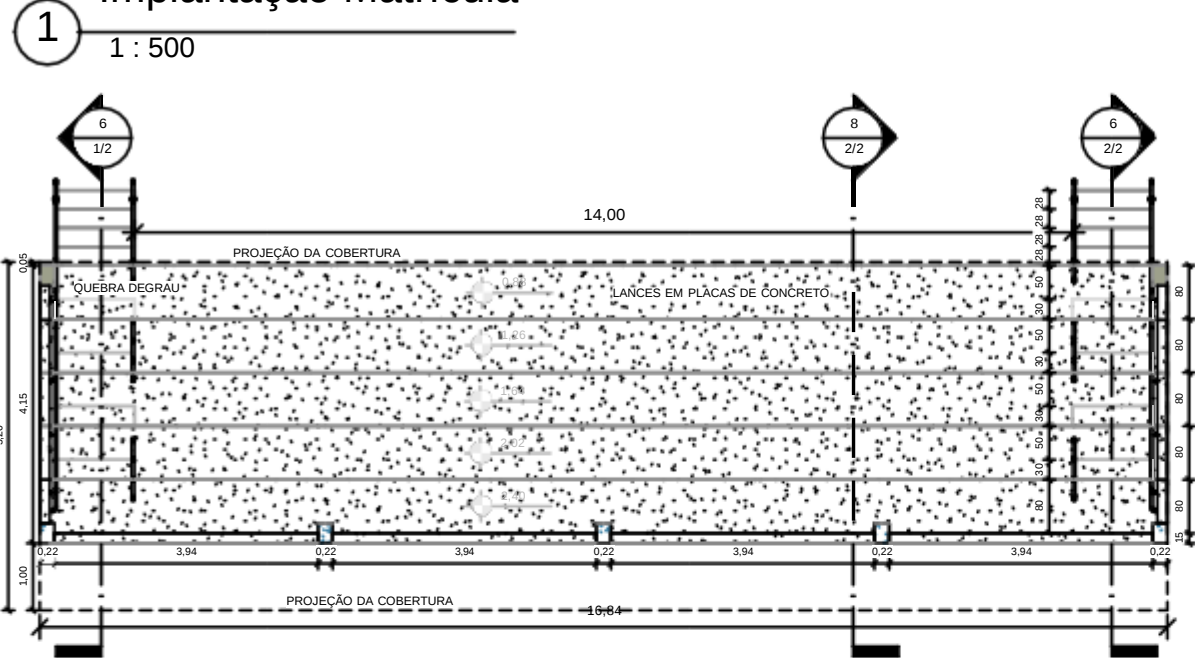
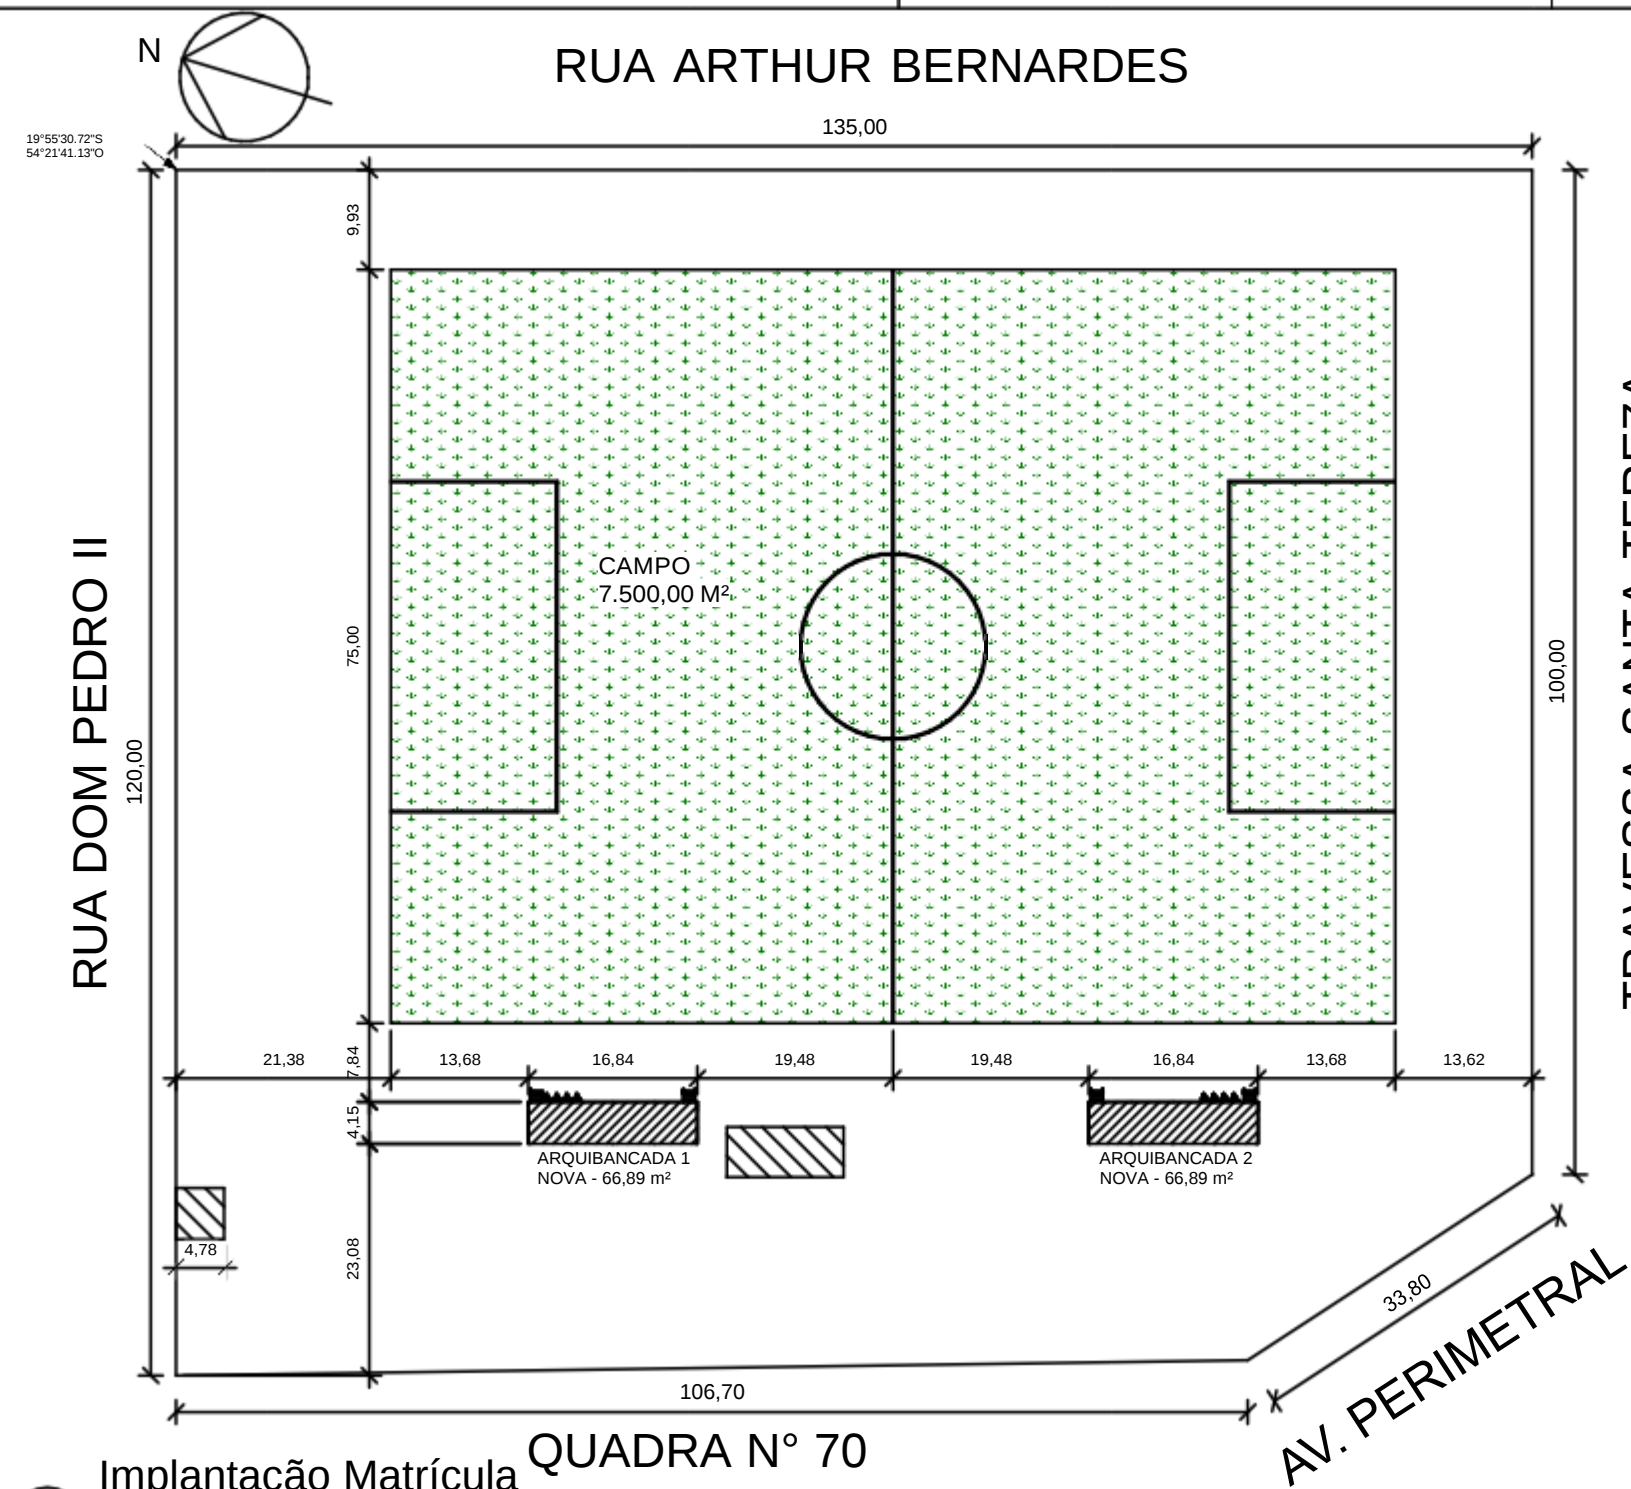
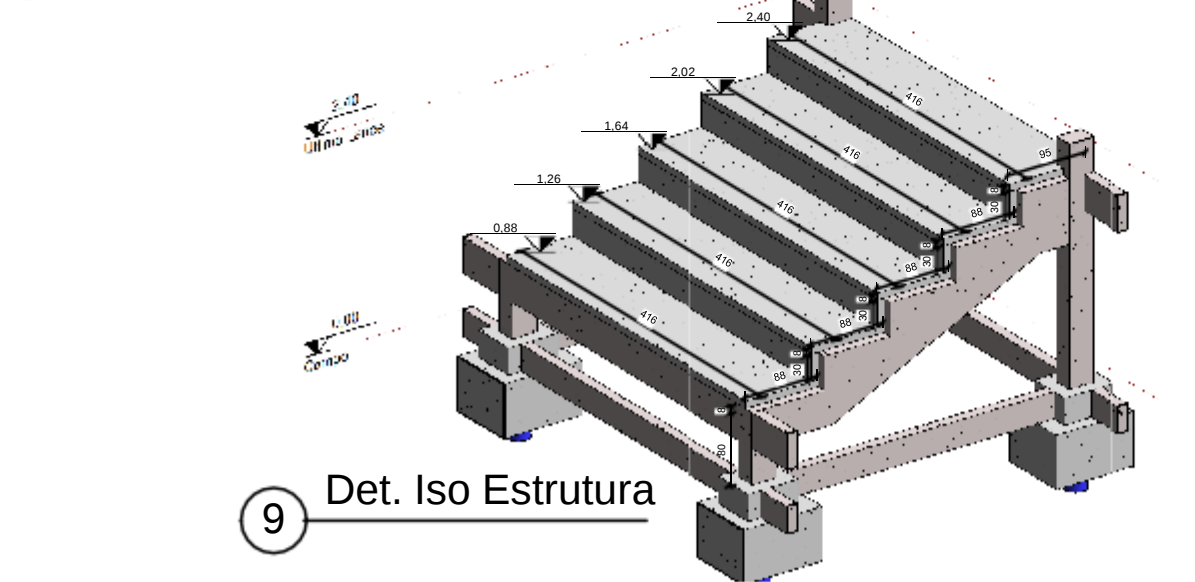


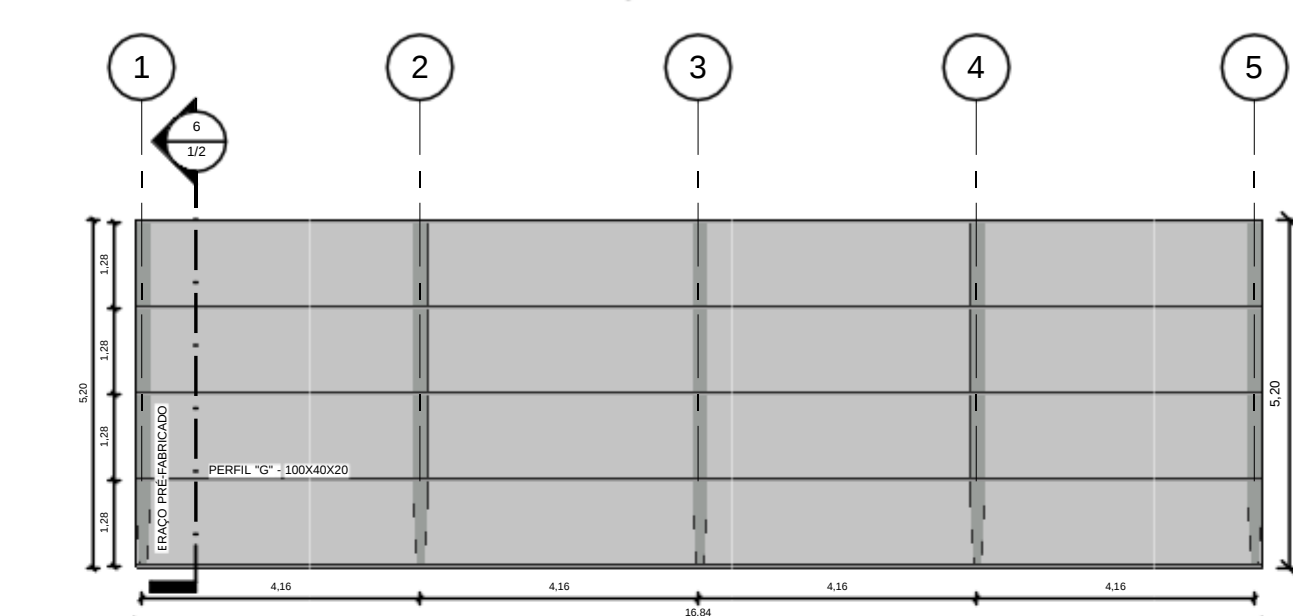


4 Planta Baixa
1 : 75

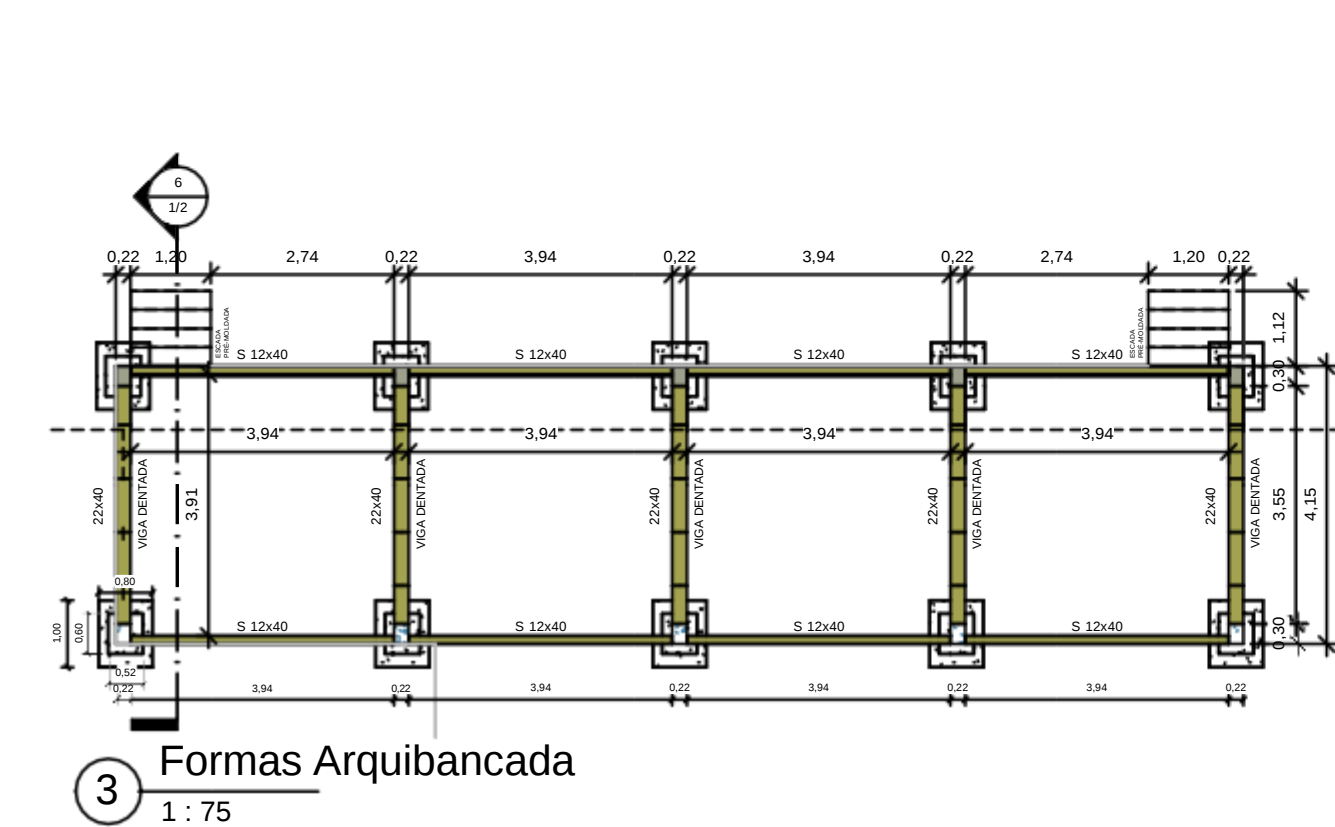


9 Det. Iso Estrutura

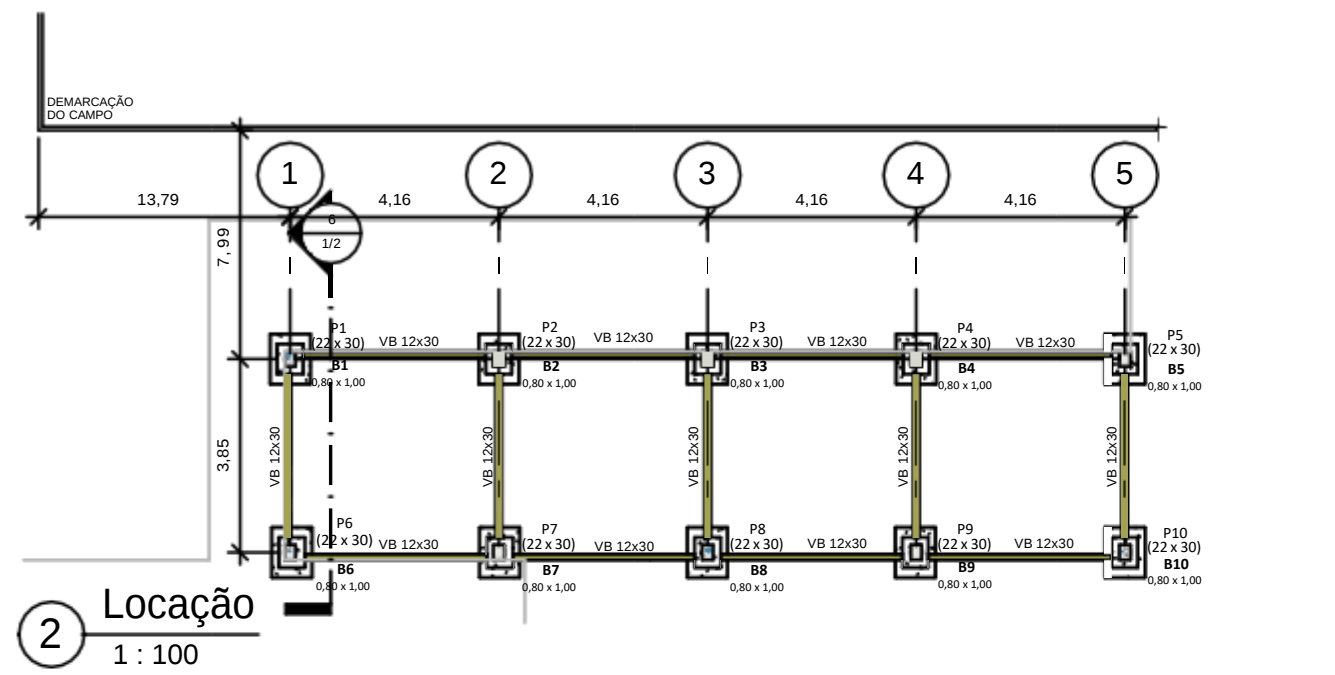

5 Cobertura
1 : 75

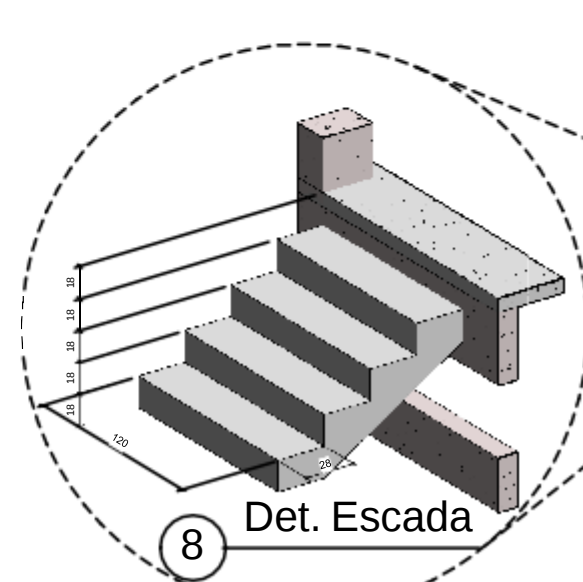

8 Det. Escada

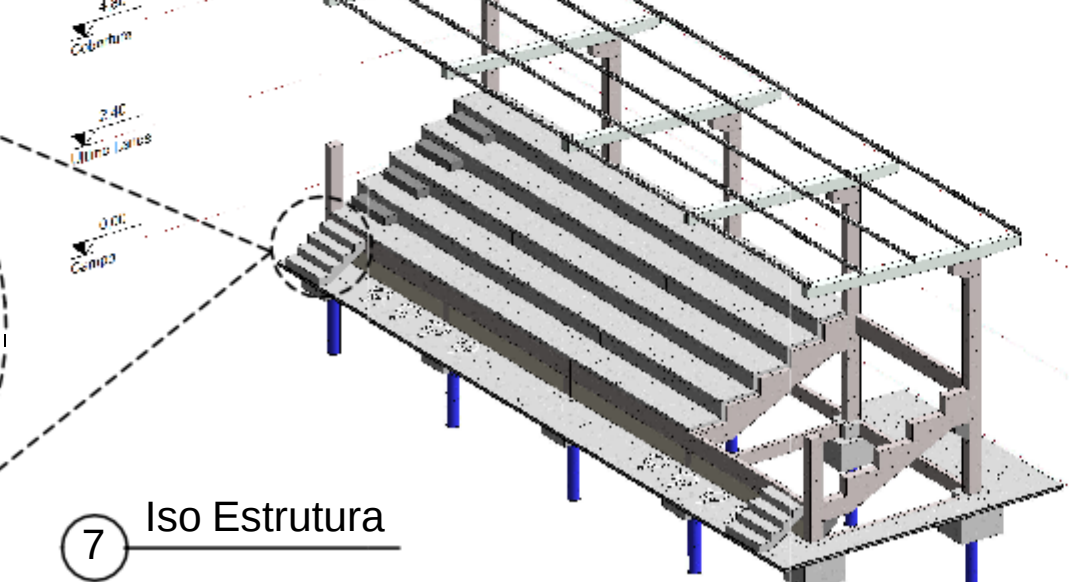

7 Iso Estrutura

Tabela de Vigas Dentadas			
Tipo	Comprimento	Volume	Contagem
22x40	3,90	4,75	10

Tabela de Blocos		
Tipo	Contagem	Volume
0,80 x 1,00	20	11,47 m³

Tabela de Placas		
Tipo	Contagem	Volume
8 cm Placa Laje de arquibancada	40	11,99 m³

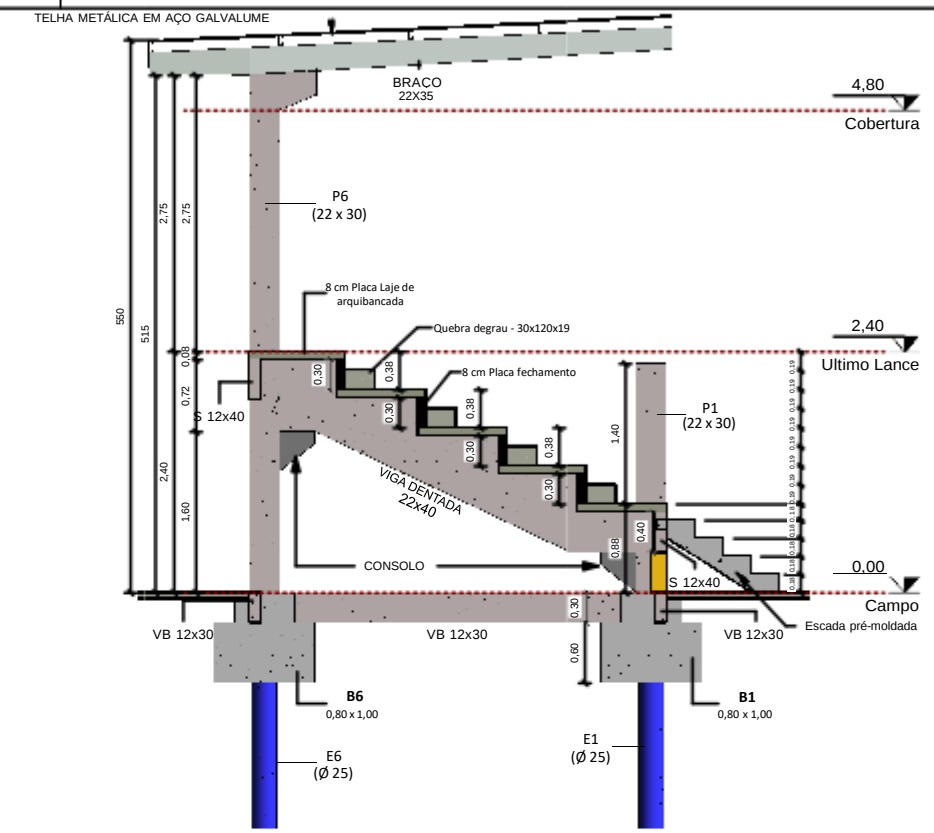


Tabela Broca			
Tipo	Comprimento	Contagem	Volume
Ø 25	4,00 m	20	3,93 m³

Tabela Pilar			
Tipo	Comprimento	Contagem	Volume
22 x 30	0,80 m	6	0,32 m³
22 x 30	2,28 m	4	0,60 m³
22 x 30	4,80 m	10	3,66 m³

Tabela de Vigas Pré moldada			
Tipo	Comprimento	Contagem	Volume
BRAÇO	5,20 m	10	2,66 m³

Tabela de Vigas			
Tipo	Comprimento	Volume	Contagem
S 12x40	3,94 m	3,02 m³	16
VB 12x30	3,25 m	1,17 m³	10
VB 12x30	3,94 m	2,09 m³	16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL	
LOCAL RUA DOM PEDRO II COM ARTHUR BERNARDES, BANDEIRANTES - MS	ÁREA CONSTRUÍDA 133,78 m² ÁREA DO TERREIRO 15853,00 m²
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO COSME PEREIRA LISBOA CAMPOS CREA nº 63.720/MS	PREFEITO EDERVAN GUSTAVO SPROTT CNPJ 03.501.491/0001-42
DISCIPLINA PROJETO ESTRUTURAL - PRÉ-FABRICADO	
CONTEÚDO IMPLANTAÇÃO - PLANTA BAIXA - CORTE - TABELAS	FOLHA 1/2
ESCALA Como indicado	DATA ABRIL/2022
CONTINUIDADE DE REFEIÇÃO 913611/2021	COORDENADAS 19°55'30.72"S 54°21'41.13"E
