
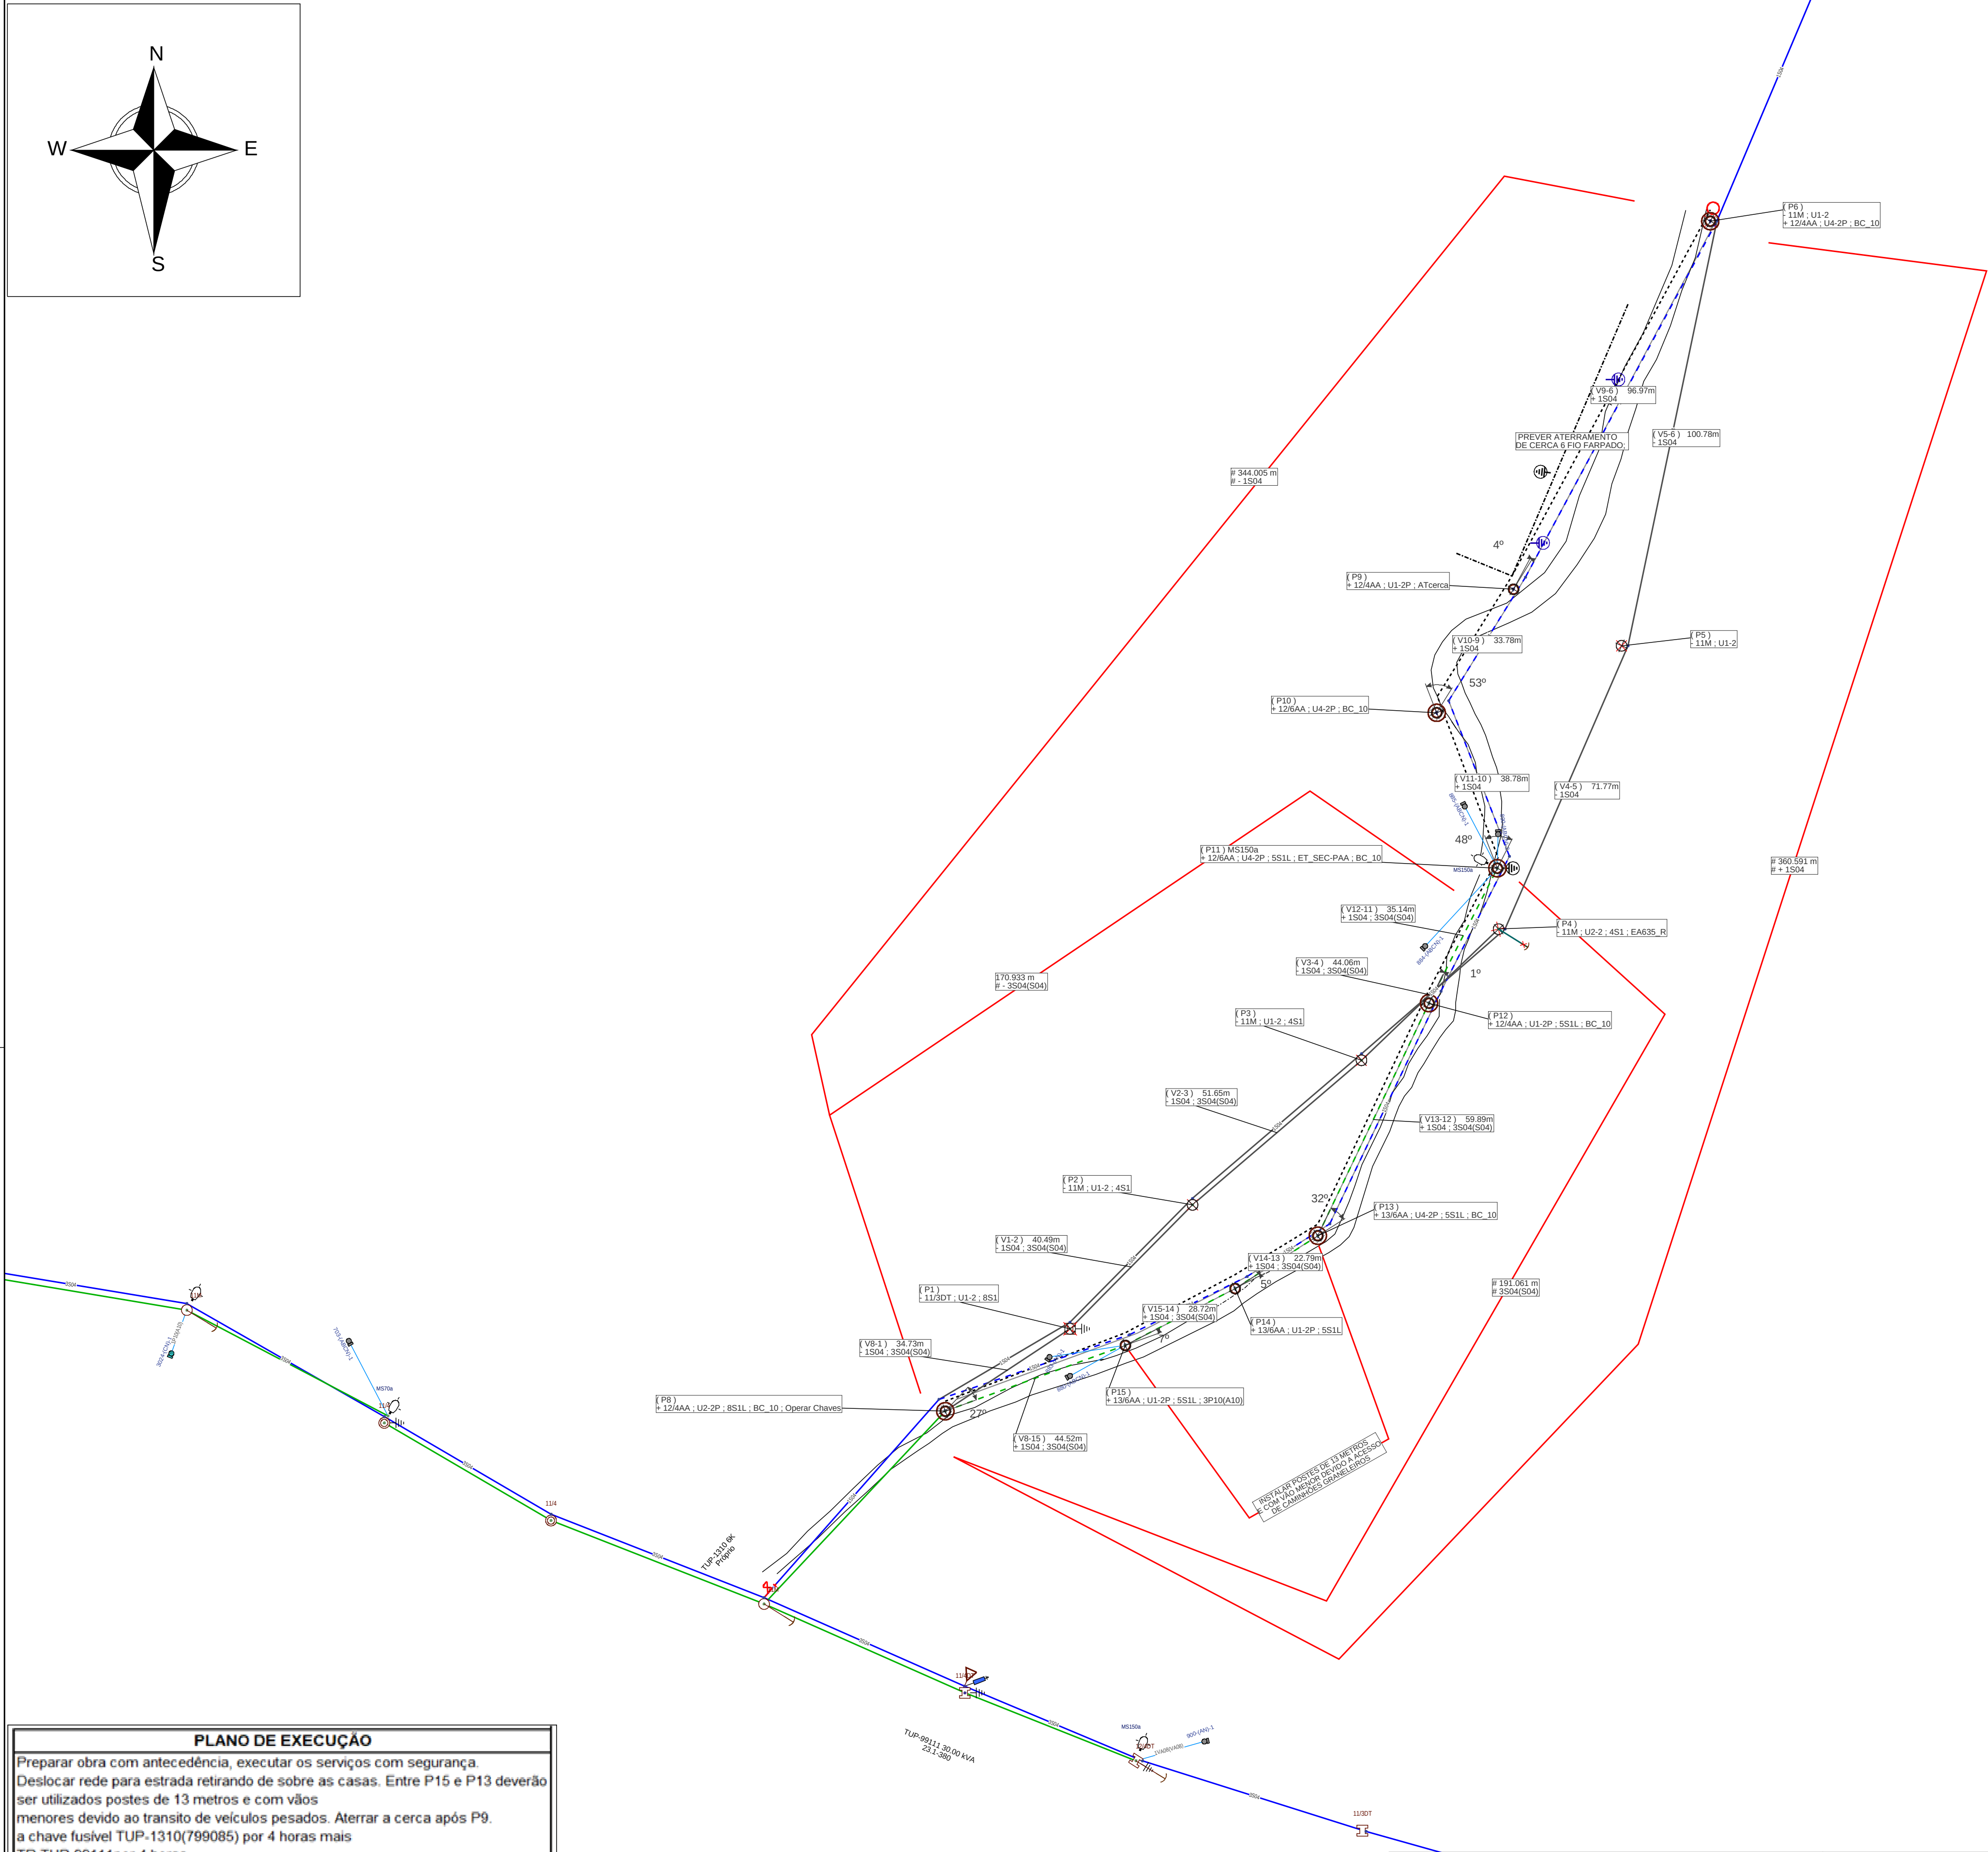




PLANO DE EXECUÇÃO					
Preparar obra com antecedência, executar os serviços com segurança. Deslocar rede para estrada retirando de sobre as casas. Entre P15 e P13 deverão ser utilizados postes de 13 metros e com vãos menores devido ao transito de veículos pesados. Aterrar a cerca após P9. a chave fusível TUP-1310(799085) por 4 horas mais TR TUP-99111por 4 horas.					
Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Abrir	Chave Fusível	799085	6	5	30
Abrir	Transformador	551241	7	5	35
Linha Viva?		Não	CHI TOTAL		65
☐ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)					


:::: GED POSTE AA 17464 ::::

****ATERRAMENTO URBANA****


- > RESISTÊNCIA IGUAL OU MENOR QUE 80 OHMS, FINALIZAR OBRA
- > RESISTÊNCIA ACIMA DE 80 OHMS, CONSULTAR A REDN

****ATERRAMENTO RURAL****

- > RESISTÊNCIA IGUAL OU MENOR QUE 50 OHMS, FINALIZAR OBRA
- > RESISTÊNCIA ACIMA DE 50 OHMS, CONSULTAR A REDN



William Maccari
Depto. Regional de Obras Metropolitana
Técnico de Projetos
CFT: 221762434-2

		Gerência de Serviços de Rede: VALE DO TAQUARI	
Município: Tupandi			
Cliente: PM TUPANDI			
Obra: REMOÇÃO DE REDE POSTE AFASTAMENTO - PODE			
Endereço: EST MORRO GAUCHO S/N1 95775-000 TUPANDI BR RS			
Responsável Técnico:	Escala: 1:850	Data: 27/04/2022	Nota: 300000947056
 Eng. Ederson Paulo Vogel CREA: RS195794	Classe de Isolção: 25kV	AL: SSC15	Folha 1
	Projeto: William Maccari	Projeto: 000006737543	Levantador: Juliano Gheno
