
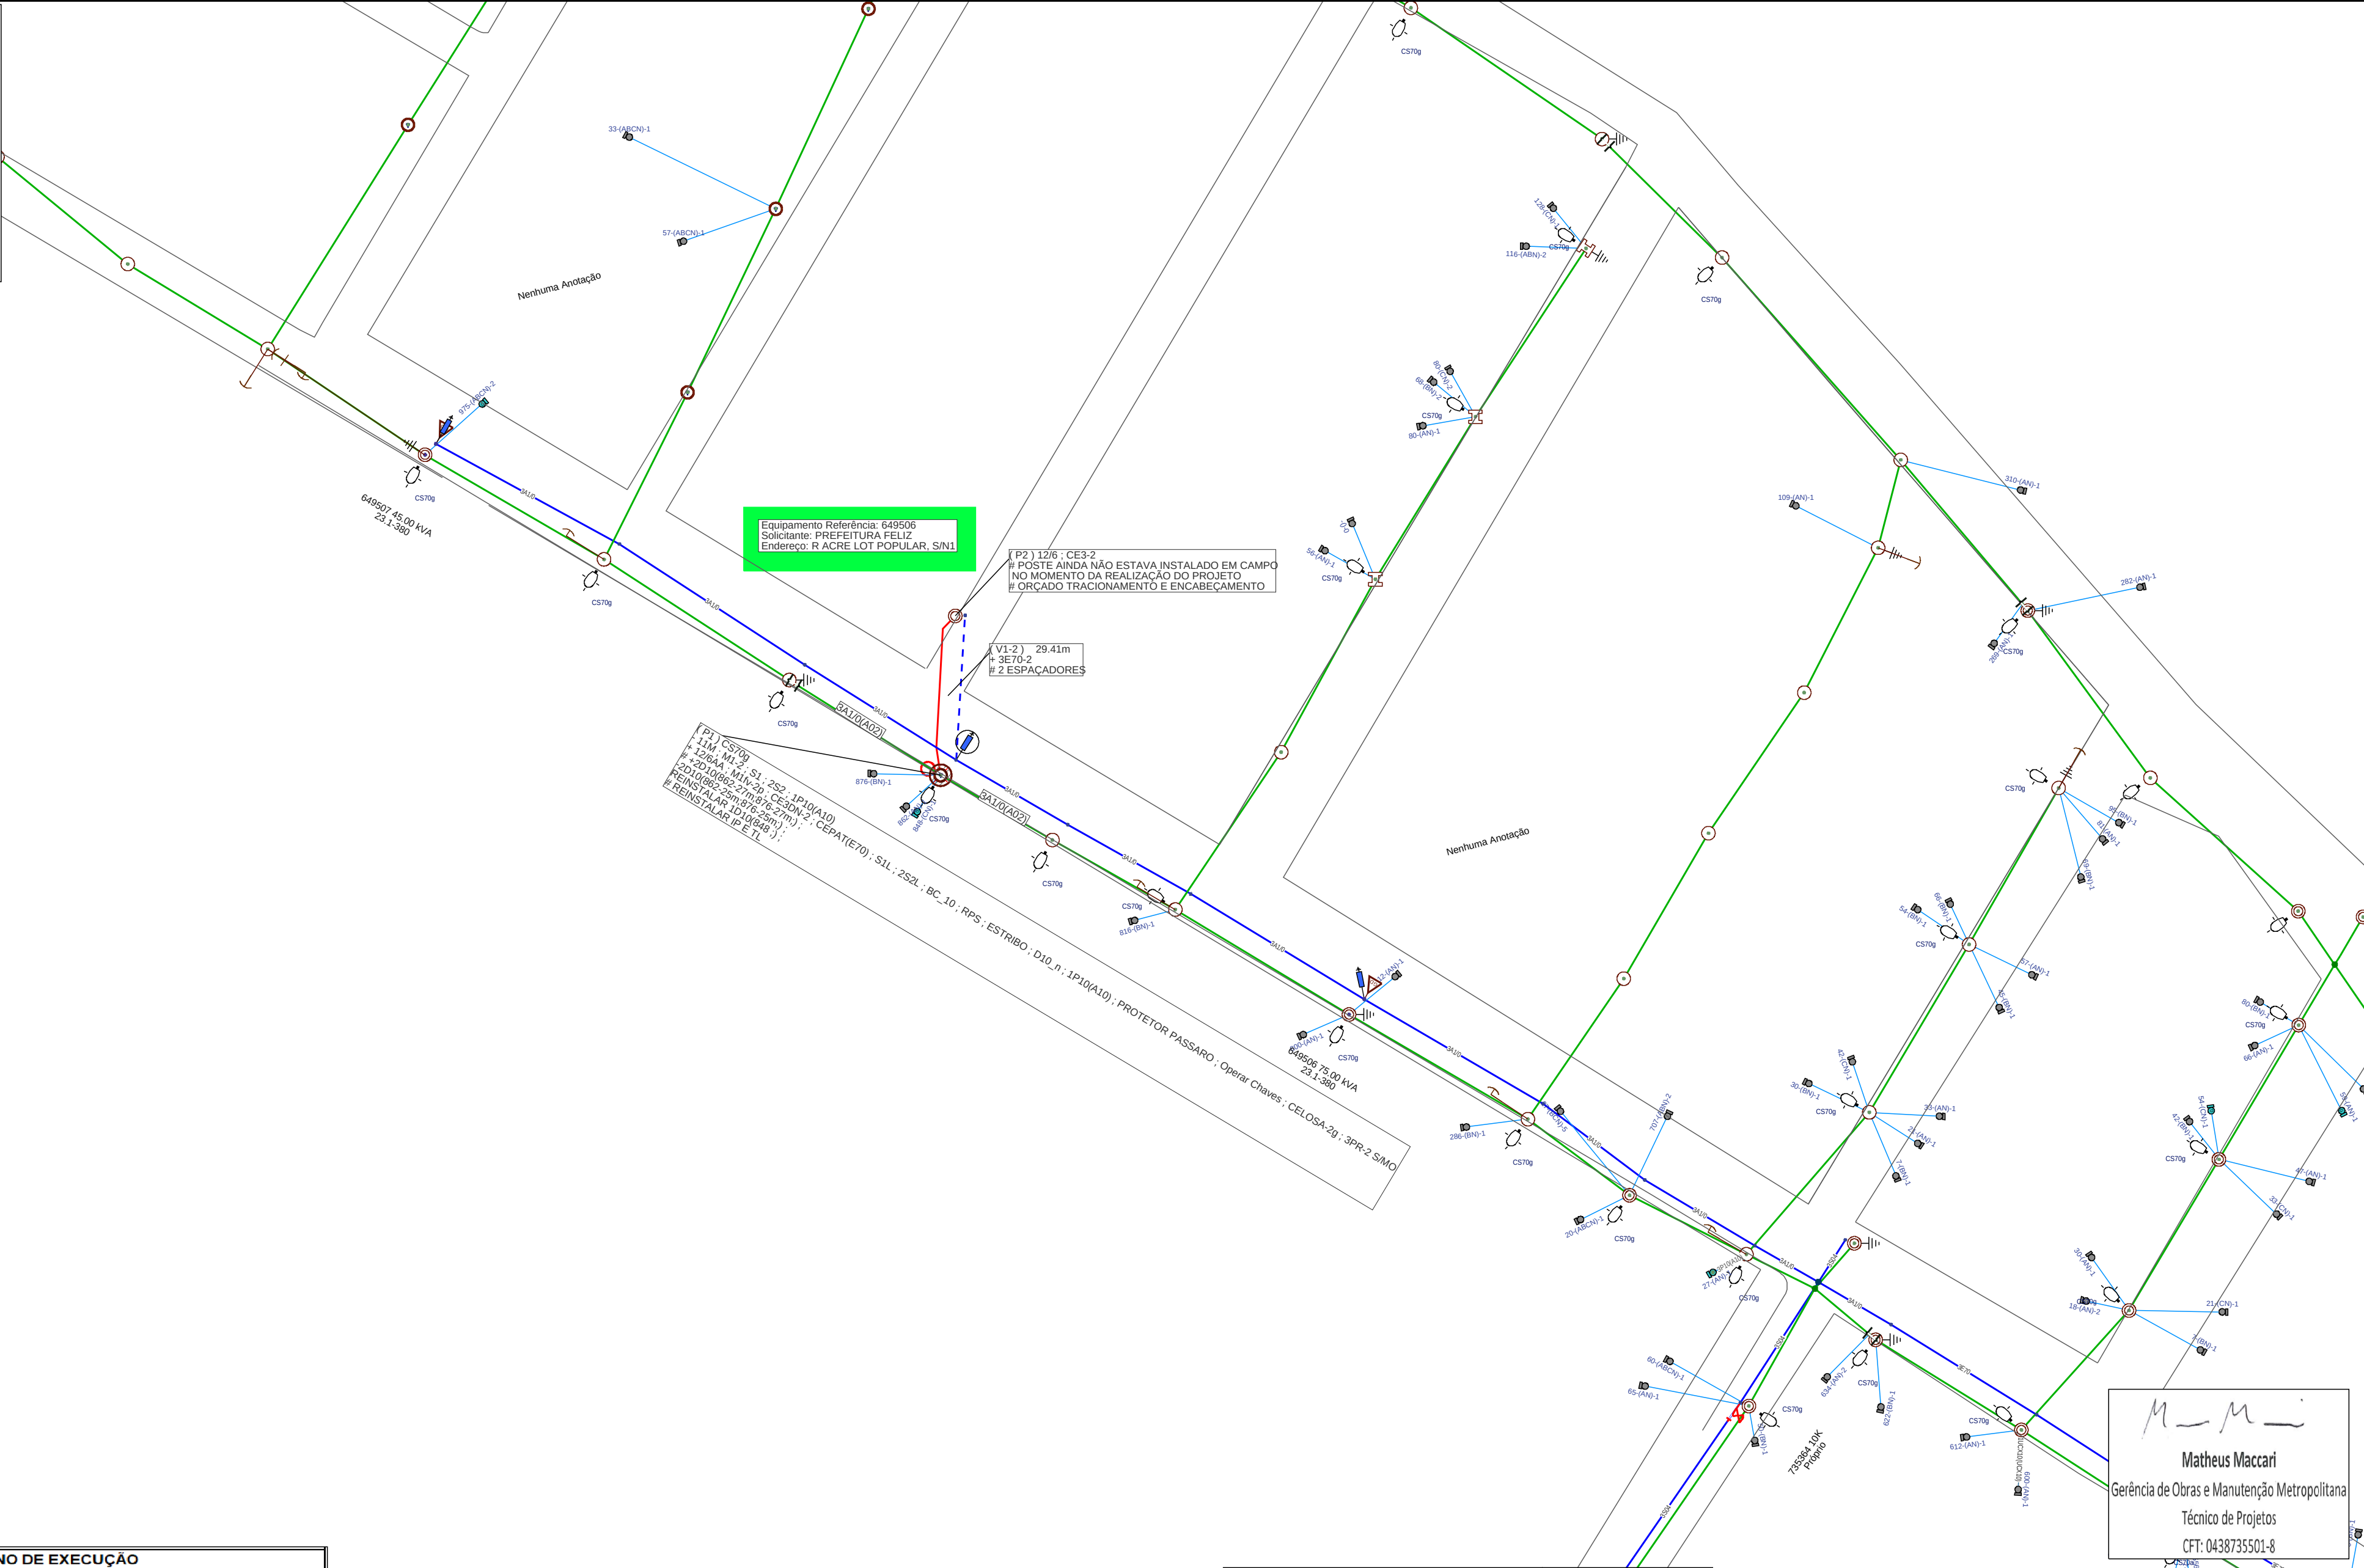




PLANO DE EXECUÇÃO					
Abrir cavas e preparar os postes ao lado das mesmas					
Realizar a obra em conjunto com a Z2 vinculada 4543530					
Desligar somente BT para a execução da obra					
Trabalhar com LV na MT					
Realizar a obra com cuidado, seguindo as normas de segurança					
A MO para operar o outro TR será orçado na nota Z2, pois para a Z1 não precisa desligar os dois, apenas 1.					
Ação	Equipamento	Número	Clientes	Duração	CHI
Desligar	Transformador	649506	48	4	192
Desligar	Transformador	649507	5	4	20
Linha Viva?		Sim	CHI TOTAL		212
☐ Poste novo a ser instalado (quando indicado em planta)					

:::: GED POSTE AA 17464 ::::

****ATERRAMENTO URBANA****
> RESISTÊNCIA IGUAL OU MENOR QUE 80 OHMS, FINALIZAR OBRA
> RESISTÊNCIA ACIMA DE 80 OHMS, CONSULTAR A REDN

****ATERRAMENTO RURAL****
> RESISTÊNCIA IGUAL OU MENOR QUE 50 OHMS, FINALIZAR OBRA
> RESISTÊNCIA ACIMA DE 50 OHMS, CONSULTAR A REDN

Gerência de Obras e Manutenção

Município: Feliz

Cliente: PREFEITURA FELIZ

Obra: LIGAÇÃO NOVA LOTEAMENTO

Endereço: R ENDEREÇO PROVISORIO S/N1 99999-999 FELIZ BR RS

Responsável Técnico: Eng. Ederson Paulo Vogel CREA: RS135794 ART: 10911826	Escala: 1:850 Classe de isolamento: 25kV Projetista: Matheus Maccari	Data: 08/02/2022 AL: FEL11 Projeto: 000006990223	Nota: 300000936475 Folha 1 Levantador: Andre Luis
--	--	--	---
