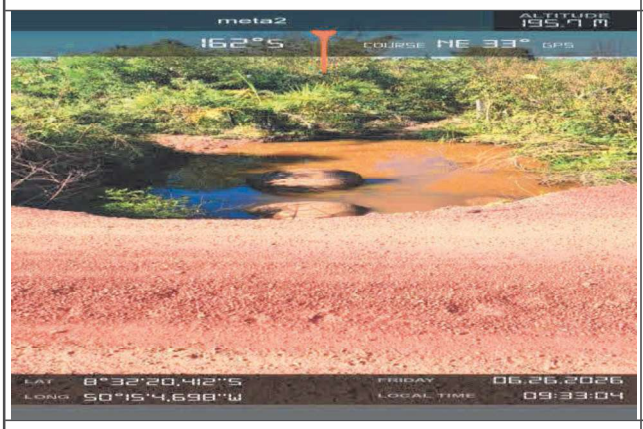
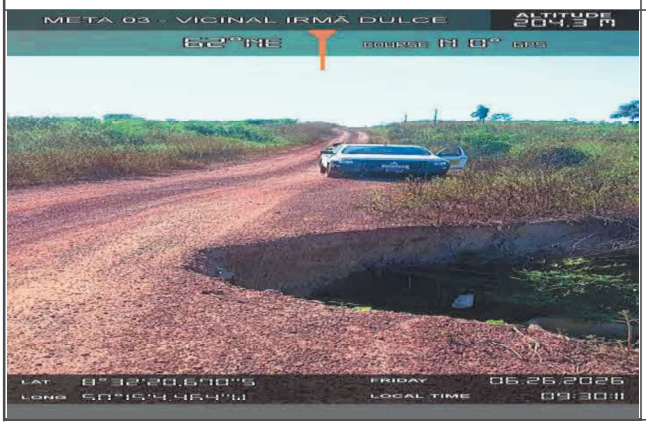
PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA MARIA DAS BARREIRAS
COM TRABALHO E SIMPLICIDADE FAZEMOS MAIS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:RESTABELECIMENTO EM RESPOSTA A DESASTRE	
META 1	**BSTC 100 : COORDENADA 8°33'53.10"S/ 50°16'22.20"W**
	OCORRÊNCIA : O BUEIRO EXISTENTE BSTC-100 FOI PARCIALMENTE DESTRUIDO PROPÕE-SUA RECONSTRUÇÃO PARCIAL COM EXECUÇÃO DE 3 M DE BUEIROS E BOCAS. 02
META 2	**BSTC 100: COORDENADAS -8°32'20.41"S/50°16'22.20"W**
	OCORRÊNCIA : O BUEIRO EXISTENTE BSTC-100 FOI PARCIALMENTE DESTRUIDO PROPÕE-SUA RECONSTRUÇÃO PARCIAL COM EXECUÇÃO COM EXECUÇÃO DE 3 M DE BUEIROS E BOCAS 02
META 3	**BSTC 100 : COORDENADA 8°32'28.10"S/ 50°15'04.75"W**
	OCORRÊNCIA : O BUEIRO EXISTENTE BSTC-100 FOI PARCIALMENTE DESTRUIDO PROPÕE-SUA RECONSTRUÇÃO PARCIAL COM EXECUÇÃO DE 3 M DE BUEIROS E BOCAS. 02
META 3	
	02

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA MARIA DAS BARREIRAS
COM TRABALHO E SIMPLICIDADE FAZEMOS MAIS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA:RESTABELECIMENTO EM RESPOSTA A DESASTRE


META 4



BSTC 100 COORDENADA 08º27'27.00"S, 50º47'10.00"W

OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI TOTAMENTE DANIFICADO PELA AÇÃ DA ENXURRADA,NÃO SUPORTANDO A VAZÃO DA ENXURRADA PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A DUPLICAÇÃO DA LINHA USANDO UMA LINHA BDTC-100. E BOCAS 02


META 5

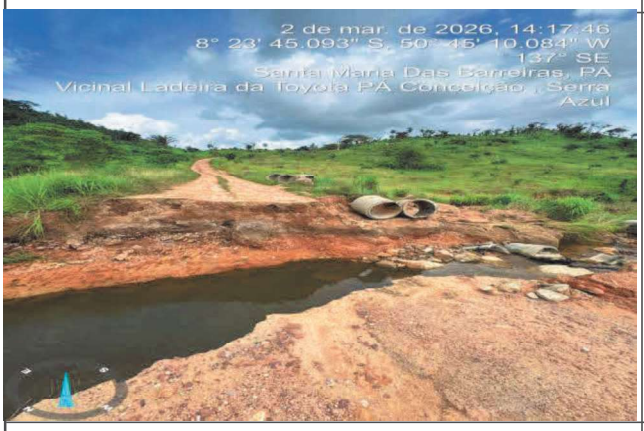

BSTC 100 COORDENADA 08º23'45.09"S, 50º45'10.08"W

OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI TOTAMENTE DANIFICADO PELA AÇÃ DA ENXURRADA,NÃO SUPORTANDO A VAZÃO DA ENXURRADA PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO CELULAR BSCC- 2,0X2,0 02


META 6

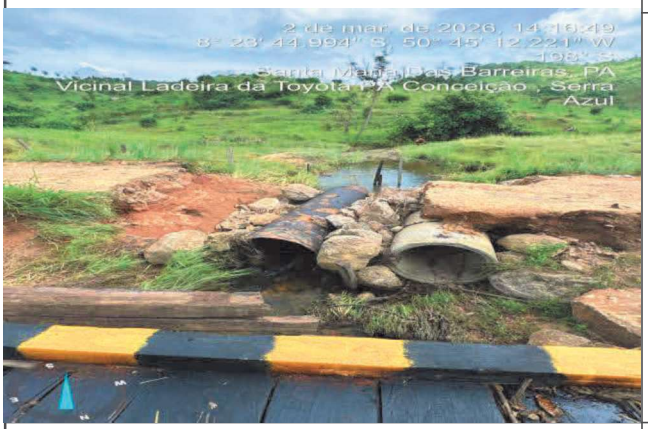

BDTC 100 COORDENADA 8º23'44.99's, 50º45'12.22"W

OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BDTC DE 100 FOI TOTAMENTE DANIFICADO PELA AÇÃ DA ENXURRADA,NÃO SUPORTANDO A VAZÃO DA ENXURRADA PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO CELULAR BSCC- 2,0X2,0 02

META 7



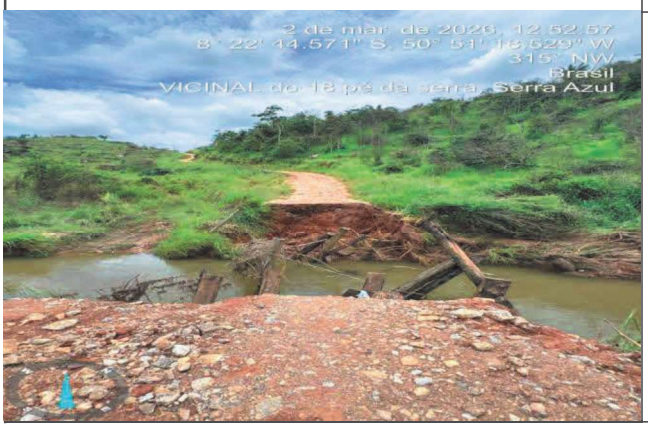


PONTE DE MADEIRA COORDENADA 8º22'44.57'S, 50º51'18.52"W

OCORRÊNCIA: A PONTE DE MADEIRA EXITENTE FOI TOTAMENTE DANIFICADA PELA AÇÃO ENXURRADA, . PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A SUA RECONSTRUÇÃO COM PONTE 10 M- COM BATE ESTACA 02

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA MARIA DAS BARREIRAS
COM TRABALHO E SIMPLICIDADE FAZEMOS MAIS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

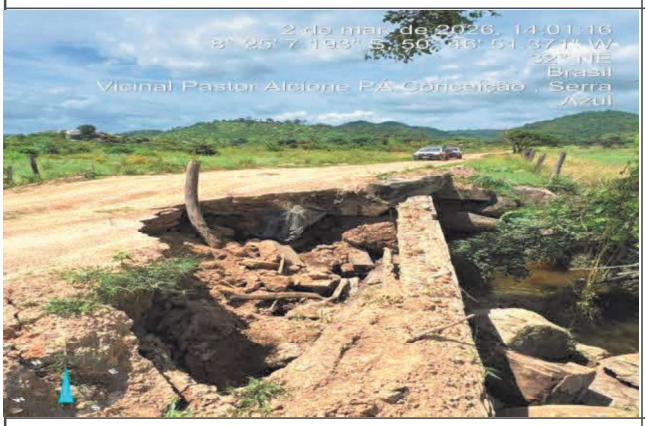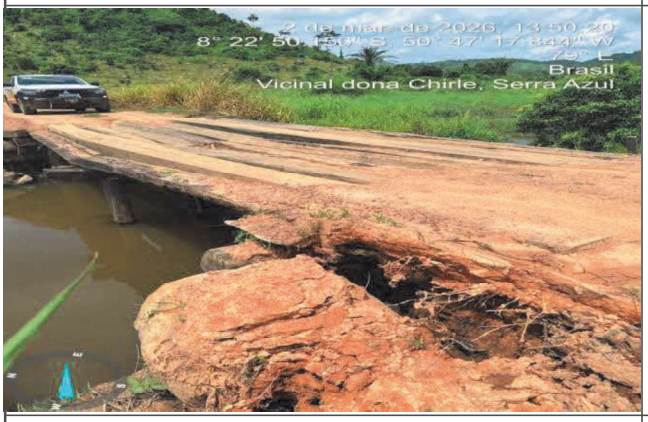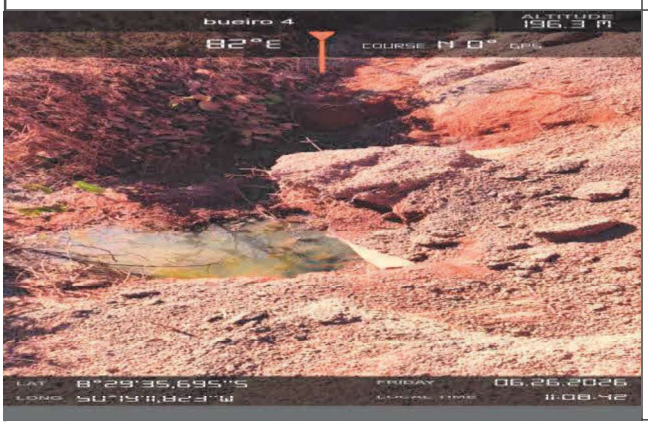OBRA:RESTABELECIMENTO EM RESPOSTA A DESASTRE	
META 8	**PONTE DE MADEIRA COORDENADA 8º25'07.19'S, 50º46'51.37"W**
	OCORRÊNCIA: A PONTE DE MADEIRA EXISTENTE FOI PARCIALMENTE DANIFICADA PELA AÇ DA ENXURRADA,NÃO SUPORTANDO A VAZÃO DA ENXURRADA PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A SUA RECONSTRUÇÃO PARCIAL 02
META 9	**PONTE DE MADEIRA COORDENADA 8º22'50.15'S, 50º47'17.84"W**
	OCORRÊNCIA: A PONTE DE MADEIRA EXISTENTE FICOU COMPROMETIDA PELA AÇÃO DA ENXURRADA,COM SOLAPAMENTO DA LINHA DE PILAR CENTRAL . PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A SUA RECONSTRUÇÃO COM PONTE 10 M- COM BATE ESTACA 02
META 10	**BSTC 100 COORDENADA 8º22'23.00'S, 50º50'43.05"W**
	OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI TOTALMENTE DANIFICADO PELA AÇ DA ENXURRADA,PERDENDO TODO O SEU CORPO. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO C A IMPLANTÇÃO DE UMA LINHA DE UM DIAMETRO SUPERIOR - BSTC-120 CM. 02
META 11	**BSTC 100 COORDENADA 8º29'35.65'S, 50º19'11.78"W**
	OCORRÊNCIA: O BUEIRO EXISTENTE BSTC DE 100 FOI PARCIALMENTE DANIFICADO PEL AÇÃO DA ENXURRADA,PERDENDO PARTE D0 O SEU CORPO. PROPÕE-SE SEU RESTABELECIMENTO COM A IMPLANTÇÃO DE UMA LINHA DE UM 2 MANILHAS BSTC-100 MAIS BOCAS 02

JONAS LIMA NERYS
Assinado de forma digital por JONAS LIMA NERYS
Dados: 2026.06.29 13:24:39 -03'00'
