Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA ITUIUTABA
Faz acontecer

CAPS II TIO DOC

Rede de Atenção Psicossocial



PROJETO TÉCNICO E VISUAL REFERENCIAL

CONTÊINER FARMÁCIA - 3 METROS

Anexo técnico referencial ao Termo de Referência

Secretaria Municipal de Saúde • Prefeitura de Ituiutaba

1. FINALIDADE E CONCEPÇÃO GERAL

Documento referencial para especificação, orçamento e execução do objeto

Finalidade. Este projeto consolida as características técnicas, funcionais e visuais mínimas do contêiner destinado à implantação de farmácia para atendimento das necessidades do CAPS II Tio Doc. A estrutura deverá proporcionar ambiente organizado para acondicionamento, controle e atendimento das demandas de medicamentos e para as atividades da assistência farmacêutica.

Natureza referencial. As perspectivas 3D, o layout e a disposição interna servem como referência visual e dimensional. São admitidos ajustes construtivos e estéticos tecnicamente justificados, desde que sejam preservadas as especificações mínimas, a funcionalidade, a identidade visual e a aprovação prévia da Administração.

Objeto resumido
Fornecimento de 01 unidade de contêiner destinado à farmácia, com aproximadamente 3,00 m de comprimento, incluindo acabamento interno e externo, iluminação, instalação elétrica preparada para os pontos de uso previstos, mobiliário, comunicação visual, entrega, descarga, posicionamento, montagem e instalação no local indicado pela Administração.

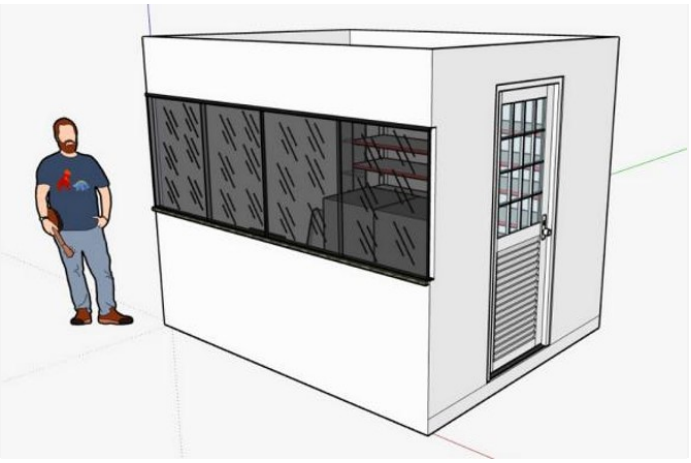


Figura 1. Vista externa de referência construtiva.



Figura 2. Perspectiva visual referencial com identidade proposta.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA
Dimensões externas	2,40 m (L) x 2,60 m (A) x 3,00 m (C).
Piso	Revestimento em piso vinílico, adequado ao uso interno e de fácil higienização.
Paredes	Com isolamento térmico e acústico.
Janela	01 unidade em vidro temperado, com referência dimensional de 3,00 m x 1,00 m.
Porta	01 unidade medindo 0,80 m x 2,10 m, modelo veneziana.
Iluminação	Sistema de iluminação interna incluído e entregue em funcionamento.
Instalação elétrica	Instalação elétrica interna completa, incluindo fiação, proteção, tomadas e pontos de alimentação compatíveis com a iluminação e com futura utilização de computador e aparelho de ar-condicionado. O computador e o aparelho de ar-condicionado não integram o fornecimento.
Instalação hidráulica	Não se aplica ao escopo do contêiner.
Acabamento interno	Cor cinza claro.
Acabamento externo	Cor azul, conforme padrão visual indicado pela Administração.
Comunicação visual	Aplicação das identidades visuais e elementos gráficos indicados neste projeto, mediante aprovação da arte final pela Administração.

3. LAYOUT INTERNO REFERENCIAL

Distribuição funcional mínima e mobiliário

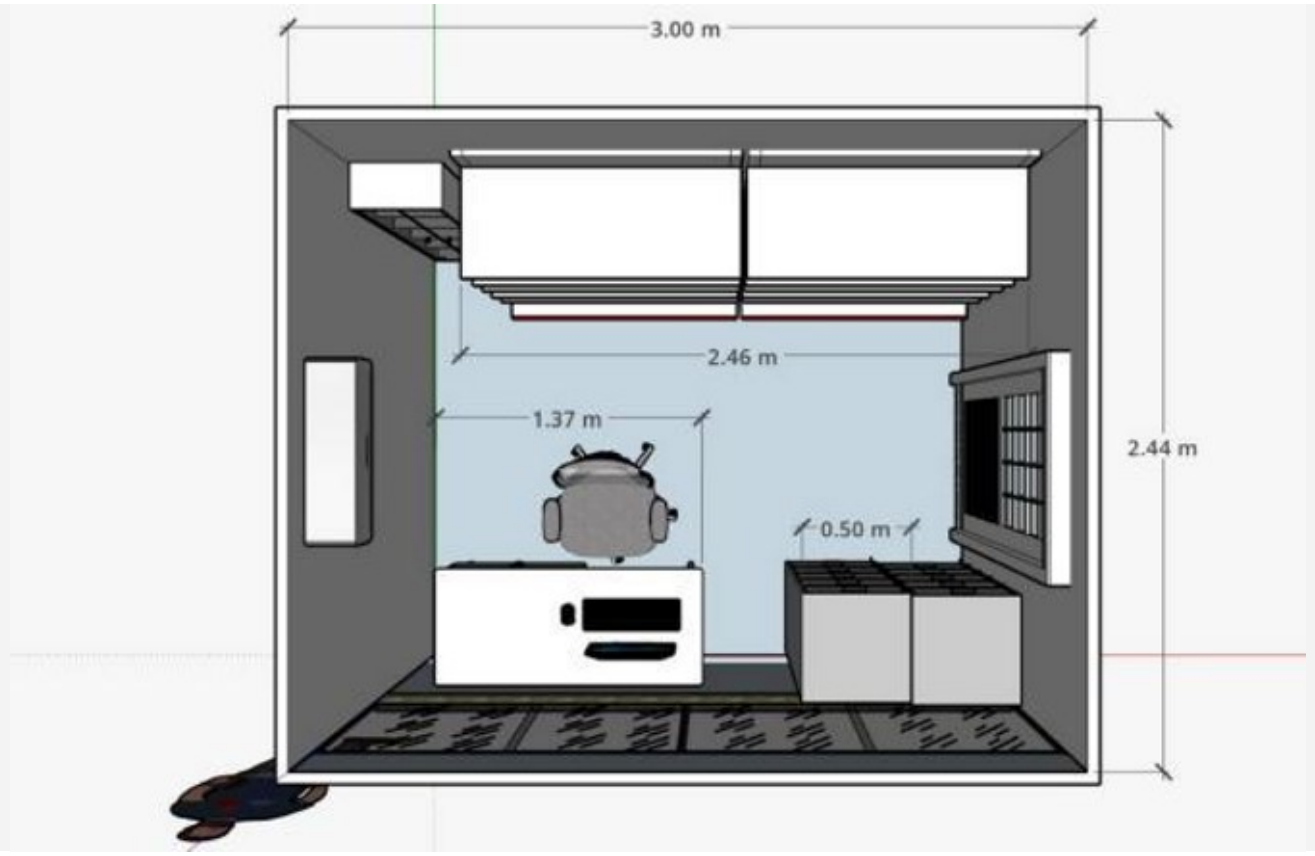


Figura 3. Planta de referência. Equipamentos eventualmente representados na imagem são apenas ilustrativos.

02 ARMÁRIOS MDF

Dimensionados e instalados de forma compatível com o espaço e com o layout de referência.

02 ARMÁRIOS METÁLICOS

Destinados à organização interna da farmácia, compatíveis com o espaço disponível.

MESA + CADEIRA

01 mesa em MDF de 1,00 x 0,60 m e 01 cadeira para posto de trabalho.

PONTOS ELÉTRICOS

Prever tomadas, fiação e proteção elétrica compatíveis com futura utilização de computador e ar-condicionado, sem fornecimento desses equipamentos.

4. IDENTIDADE VISUAL EXTERNA

Referência de composição gráfica do contêiner



Figura 4. Perspectiva visual referencial. A arte final deverá ser submetida à aprovação da Administração.



Orientação para execução da comunicação visual. O fornecedor deverá reproduzir a composição gráfica indicada neste projeto, utilizando os arquivos oficiais fornecidos pela Administração. Não será permitida alteração de logotipos, textos, cores institucionais ou proporções sem autorização. Antes da produção definitiva, deverá ser apresentada prova digital da arte para aprovação.

5. ENTREGA, DESCARGA E INSTALAÇÃO

1. Entrega do contêiner no local indicado pela Administração.
2. Descarga, movimentação e posicionamento da unidade, com os equipamentos necessários, inclusive caminhão munck quando exigido pelas condições do local.
3. Montagem e instalação dos componentes, mobiliário e iluminação.
4. Ligação elétrica do contêiner ao ponto de infraestrutura elétrica previamente disponibilizado no local.
5. Execução e teste dos pontos elétricos previstos, inclusive os destinados à futura utilização de computador e aparelho de ar-condicionado, sem fornecimento desses equipamentos.
6. Testes de funcionamento das instalações e orientação básica aos responsáveis pelo uso da estrutura.
7. Entrega final da unidade em condições de uso.

CONDIÇÕES PRÉVIAS DO LOCAL

O local deverá possuir condições de acesso para transporte, descarga e posicionamento do contêiner, infraestrutura elétrica externa compatível e base ou superfície adequada para apoio da estrutura. Eventuais obras civis, ampliações de rede elétrica, rede hidráulica, paisagismo ou outras adequações externas não previstas expressamente no objeto serão tratadas separadamente pela Administração.

6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E OBSERVAÇÕES FINAIS

- Atendimento integral às dimensões, materiais, acabamentos e quantitativos mínimos definidos neste projeto e no Termo de Referência.
- Integridade estrutural, acabamento sem danos aparentes e funcionamento da iluminação e das instalações elétricas.
- Mobiliário instalado e compatível com a área interna e o layout aprovado.
- Pontos elétricos, tomadas, fiação e proteções executados e testados, inclusive os previstos para futura utilização de computador e aparelho de ar-condicionado.
- Comunicação visual aplicada conforme arte final aprovada pela Administração.
- Posicionamento, instalação e testes concluídos no local indicado pela Administração.

CARÁTER REFERENCIAL DO PROJETO

Este documento não indica fabricante ou fornecedor específico. As imagens, perspectivas 3D e disposições internas têm caráter referencial. Equipamentos eventualmente representados nas imagens, como computador e aparelho de ar-condicionado, não integram o fornecimento deste projeto. A estrutura elétrica, contudo, deverá estar preparada para sua futura utilização. São admitidas soluções equivalentes ou superiores que atendam integralmente aos requisitos mínimos e sejam previamente aceitas pela Administração. Em caso de divergência, prevalecerão o Termo de Referência e o instrumento convocatório.

Garantia: deverá observar as exigências do Termo de Referência, do instrumento convocatório e da legislação aplicável, abrangendo o contêiner, componentes, mobiliário e instalações que efetivamente integrarem o fornecimento.
