Dênio Thomas Leal Ferreira
CREA-MG:57.412/D
Rua Antônio Wellerson , 790 - B. Santo Antônio - Manhuaçu - MG

Cliente: Prefeitura Municipal de Sericita
Obra: Construção de Local destinado à Feira Municipal
Local: Rua Primeiro de Março , 263 - Centro -Sericita-MG


MG N° /

Furo SP 02 Cota 0,00

SPT - Standart Penetration Test
Camadas - Classificação dos solos

30 cm finais
30 cm iniciais

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	Cota do N.A.	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Camadas - Classificação dos solos
	TC							
	TH			7	9			Silte Arenoso Cor Marrom , Pouco Fofo a Medianamente Compacto
				8	10		3,00	
				7	5		4,00	Silte Areno-Argiloso Cor Cinza , Fofo
		-5		4	3			
				24	28			Areia Grossa Pouco Siltosa com Pedregulho , Cor Variegada , Compacto a Muito Compacto
	CA			36	43			
				50	50		7,00	↑ Furo terminado e impenetrável a percussão com 7,00 m .Lav. de 10 min. -1ª 2 cm-, 2ª -2 cm , 3ª - 1 cm.
		-10						
		-15						
		-20						
		-25						
		-30						
		-35						

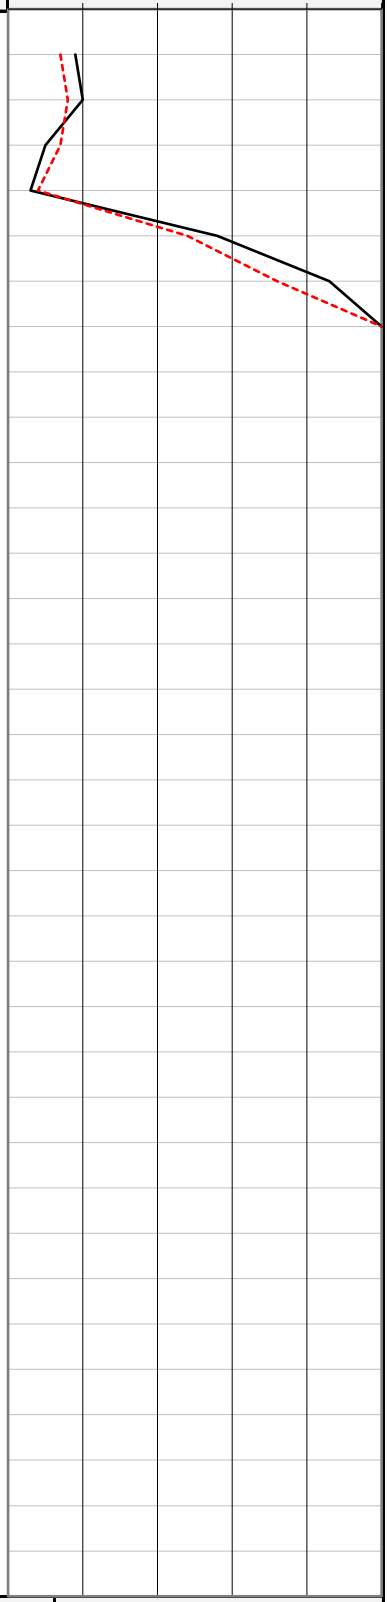

Profundidade nível d'agua				Amostrador		Revestimento Ø	2 3/8 "	Data	
Inicial	2,00	m	29/01/2026	Ø interno	1 3/8 "	Peso	65,0 kg	Inicio	29/01/2026
Final	2,00	m	30/01/2026	Ø externo	2 "	Altura de queda	75,0 cm	término	29/01/2026

Obs: .

Sondador	João Salvador	Eng°	Dênio	13/02/2020	Folha 01
