Nº	OBJETO	DESCRIÇÃO TR	CATMAT	UN	QTD ANUAL	VALOR	VALOR TOTAL
1	1 CONTAINER AMBULATÓRIO COMPLETO	Objeto: Fornecimento, montagem e entrega de Unidade Modular de Atendimento Médico (12,00 × 3 m) completa, climatização, rampa acessível NBR 9050 e varanda frontal de 4 m x 12 m.	629258	UN	1	R$ 205.705,00	R$ 205.705,00

Descrição completa:

1. Objeto, escopo geral e exclusões

Fornecimento, montagem, transporte e entrega de 01 unidade modular estacionária de atendimento médico com dimensões externas nominais de 12,00 m de comprimento por 3,00 m de largura (36,00 m² de projeção externa), com 02 consultórios, 01 recepção/atendimento, 02 banheiros, 01 depósito de material de limpeza (DML) e 01 depósito de apoio, climatização, instalações elétricas, hidráulicas completas, varandas de 4 m x 12 m e rampa de acesso.

Fornecimento integrado (turnkey/CIF Jataí-GO), incluindo estrutura metálica, isolamento, revestimentos, esquadrias, sistemas hidrossanitários, elétrica e lógica, iluminação, louças, metais, equipamentos, mobiliário indicado, projetos executivos com ART/RRT, frete e descarga. Permanecem excluídos chassi rodante, equipamentos veiculares, CFTV, televisor e bebedouro, salvo posterior determinação da contratante.

As marcas e modelos comerciais citados ao longo deste memorial constituem referências de qualidade e desempenho, admitindo-se produtos equivalentes ou superiores mediante comprovação por ficha técnica e catálogo do fabricante antes da fabricação

2. Compatibilização dimensional e quadro de ambientes

O quadro abaixo transcreve as cotas nominais da imagem de referência. Não representa área útil livre certificada: paredes, perfis, shafts e espessuras de acabamento devem ser descontados no levantamento executivo.

Ambiente	Medidas indicadas	Área nominal
Banheiro 01 (esquerda)	1,50 × 2,00 m	3,00 m²
DML (esquerda)	1,00 × 1,50 m	1,50 m²
Consultório 01	3,00 × 3,00 m	9,00 m²
Recepção/atendimento	2,00 × 3,00 m	6,00 m²
Consultório 02	3,00 × 3,00 m	9,00 m²
Banheiro 02 (direita)	1,50 × 2,00 m	3,00 m²
Depósito (direita)	1,00 × 1,50 m	1,50 m²

Soma das áreas nominais	—	33,00 m²
Projeção externa da unidade	12,00 × 3,00 m	36,00 m²

A divisão transversal entre banheiro e DML/depósito precisa ser dimensionada sem sobreposição de áreas. A diferença não deve ser distribuída automaticamente; fornecedor e responsável técnico deverão verificar a planta e produzir o modulo verificando todas as espessuras, dimensões livres, áreas reais e posições das portas e outros na sua produção

Acessibilidade: As áreas do banheiro tem que está inseridas e verificadas os giros, barras, louças, portas e rotas conforme ABNT NBR 9050 e exigências sanitárias.

A fabricação deverá respeitar rigorosamente o projeto executivo de layout (Anexo I), assegurando **9 m² de área útil em cada consultório** e dimensões livres internas de **1,50 × 2,00 m (3 m²) em ambos os sanitários acessíveis**, com portas internas posicionadas nas divisórias dos consultórios e abrindo para dentro dos consultórios (para fora dos sanitários), garantindo o giro livre de Ø 1,50 m (ABNT NBR 9050).

Ambiente / Compartimento	Comprimento Livre (m)	Largura Livre (m)	Área Útil Real (m²)	Acessos, Esquadrias e Parâmetro Normativo
Banheiro Acessível 01	1,50 m (150,00 cm)	2 m	**3 m²**	Porta (0,90 m) abrindo para dentro do Consultório 01; janela basculante posterior (0,80×0,80 m); giro Ø 1,50 m. Pias, sistema de troca de ar, vaso, barras e todos acessórios para atender a acessibilidade
Consultório Médico 01	3 m (300 cm)	3 m	**9 m²**	Lavatório de canto exclusivo com sistema hidráulico completo; janela frontal de correr (1,2×1,00 m); portas de entrada e WC 01 abrindo p/ o Consultório; Ar condicionado 9 mil btus; sistema de iluminação, 1 tomada em cada lado da parede com 3 entrada 10 A. tomadas,

DML (Material de Limpeza)	1,5 m (100,00 cm)	1,00 m	**1,5 m²**	Porta P2 (0,80 m) abrindo para lado externo do container do DML, tanque de serviço e exaustão mecânica direta ao exterior.
Atendimento Atendimento	2 m	3 m	**6 m²**	Porta principal frontal com rampa NBR 9050 janela posterior (1,20×1,00 Ar condicionado 9 mil btus; sistema de iluminação, 1 tomada em cada lado da parede com 3 entrada 10 A. tomadas,
Consultório Médico 02	3 m (300 cm)	3 m	**9 m²**	Porta 0,90, Lavatório de canto exclusivo com sistema hidráulico completo; janela frontal de correr (1,2×1,00 m); portas de entrada e WC 01 abrindo p/ o Consultório; Ar condicionado 9 mil btus; sistema de iluminação, 1 tomada em cada lado da parede com 3 entrada 10 A. tomadas,
Banheiro Acessível 02	1,50 m (150,00 cm)	2 m	**3 m²**	Porta (0,80 m) abrindo para dentro do Consultório 01; janela basculante posterior (0,80×0,80 m); giro Ø 1,50 m. Pias, sistema de troca de ar, vaso, barras e todos acessórios para atender a acessibilidade
Depósito	1,5 m	1,00 m	**1,5 m²**	Porta P2 (0,80 m) abrindo para lado externo do container do Deposito, 1 tomada 10 A no depósito, Sistema de exaustão direta mecânica ao com

				exterior
Cobertura externa	4 m	12 m	**48 m²**	A cobertura externa será feita nos mesmo padrões do container de ferragens e material.
Rampa				Rampa deverá ser produzida seguindo os padrão de acordo com as normas de acessibiliades

Pé-direito interno livre: O módulo acabado deverá apresentar altura interna livre (do piso vinílico e forro de ACM) de no mínimo **2,40**

1. Estrutura Metálica, Isolamento Termoacústico e Vedação

- **Estrutura principal:** Estrutura metálica autoportante dimensionada para transporte rodoviário, içamento por guindaste/Munck, cargas permanentes e sobrecargas de uso normativas. Perfis estruturais em aço carbono ou aço patinável com tratamento anticorrosivo completo (fundo epóxi/zinco)
- **Reforços estruturais internos:** Prever reforços metálicos próprios embutidos nos painéis para fixação de portas, janelas, lavatórios suspensos e de canto, barras de apoio de acessibilidade,. **Nenhuma fixação de** suportes de evaporadoras/condensadoras, extintores e estrutura do toldo **carga poderá depender apenas das chapas de ACM.**
- **Isolamento termoacústico contínuo (Paredes e Teto):**
  - **Opção A (PIR / PUR — Recomendada para manter paredes de 5,0 a 7,5 cm e largura livre de 3 m):** Núcleo de poliisocianurato (PIR) ou poliuretano (PUR) com **espessura mínima de 30 mm**, com resistência térmica comprovada $R \geq 1{,}25$ m²·K/W ($\lambda \leq 0{,}024$ W/(m·K)). Referência: painéis *Kingspan Isoeste*.
  - **Opção B (EPS):** Núcleo contínuo de poliestireno expandido (EPS) retardante à chama (Classe F), com **espessura mínima de 50 mm do isolante** e condutividade térmica máxima $\lambda \leq 0{,}040$ W/(m·K). Referência: placas *EPS Isorecort*. Exige-se comprovação de reação ao fogo do conjunto completo e manutenção das áreas úteis mínimas da Seção 2.

- **Revestimento interno e espaço técnico:** Paredes internas e teto revestidos em **painéis de ACM (Alumínio Composto) branco de 3 mm de espessura**, superfície lisa, impermeável e lavável, com juntas perfeitamente calafetadas. Prever espaço técnico (*shaft*/câmara) para passagem de eletrodutos e tubulações embutidas sem comprimir ou reduzir a espessura mínima do isolante térmico.
- **Estanqueidade e calafetação:** Selar todos os encontros, juntas e penetrações com selante elástico de poliuretano monocomponente de cura acelerada (referência *Sikaflex* ou equivalente). Realizar teste de estanqueidade em fábrica antes da expedição.

2. Cobertura Externa (Mesmo Material Utilizado no Container) e Rampa Acessível

- **Cobertura frontal Externa (Avanço mínimo de 4m):** Fornecimento e instalação de cobertura externa tipo na fachada frontal da unidade, com **projeção horizontal**

livre (avanço) mínima de 4 m, protegendo o acesso principal (patamar e rampa) e as janelas frontais dos consultórios.

- ***Estrutura de Apoio (Material):*** *Geralmente construída com perfis tubulares de aço.*
  Rampa externa e patamar de acesso (ABNT NBR 9050): Fornecimento de conjunto desmontável/acoplável de rampa metálica e patamar de acesso principal, dimensionado para vencer o desnível entre o solo e o piso interno do módulo:
  - Largura livre mínima de **1,20 m**, patamar plano de aproximação junto à porta principal (mínimo de 1,20 × 1,50 m livres) e inclinação máxima conforme NBR 9050 (até 8,33%).
  - Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo, piso em chapa antiderrapante ou revestimento tátil de alta aderência, guarda-corpo e **corrimão duplo em duas alturas (0,70 m e 0,92 m)** em ambos os lados, com seção circular (Ø 30 a 45 mm), prolongamento de 30 cm nas extremidades e bordas recurvadas.

3. Base, Contrapiso e Revestimentos de Piso Clínico

Atenção: Fica expressamente **vedada a aplicação de piso de alumínio xadrez** no interior da unidade, por incompatibilidade com os requisitos de assepsia da Vigilância Sanitária (ANVISA RDC 50).

- **Base estrutural:** Contrapiso em **compensado naval de no mínimo 15 mm de espessura**, resistente à água e fungos, fixado à grelha metálica do chassi por parafusos tipo francês com cabeça embutida. Todas as furações e juntas devem ser calafetadas com massa rígida bicomponente e regularizadas com massa de preparação compatível, além de proteção inferior contra umidade.
- **Consultórios 01/02 e Atendimento:** Piso vinílico heterogêneo comercial colado, padrão amadeirado, **espessura total mínima de 3,0 mm e camada de uso mínima de 0,50 mm** (referência *Tarkett Ambienta Series* ou equivalente).
- **Sanitários 01/02 e DML:** Piso vinílico homogêneo em manta de **2,0 mm de espessura**, com **juntas termossoldadas**, rodapé hospitalar curvo (*cove former*) subindo na parede e arremates estanques nos ralos (referência *Tarkett iQ Granit* em manta ou equivalente aprovado para áreas molhadas, com resistência ao escorregamento comprovada). Executar impermeabilização elástica sobre a base naval antes da colagem da manta.

4. Esquadrias (Portas e Janelas em Todos os Ambientes)

- **Portas (Alumínio ou Aço Protegido):** Estrutura em perfis de duralumínio ou aço galvanizado com pintura eletrostática/PU branca, superfícies lisas e laváveis, quadros soldados com reforços nos cantos superiores e ferragens anticorrosivas:
  - *Portas dos Banheiros Acessíveis 01 e 02 (02 unidades):* Folha nominal de **0,90 × 2,10 m**, instaladas nas paredes divisórias internas entre cada banheiro e seu respectivo consultório (junto à fachada frontal), com **abertura para fora do sanitário e para dentro do respectivo consultório** (folha encostando paralelamente na parede frontal do consultório quando aberta, conforme

planta CAD no Anexo I). Equipadas com puxador horizontal em ambas as faces, maçaneta tipo alavanca de fácil acionamento e revestimento inferior resistente a impactos (0,40 m de altura).

- *Portas Internas dos Banheiros 01 e 02 (02 unidades):* Folha nominal de **0,90 × 2,10 m**, instaladas nas divisórias internas junto à parede frontal, com **abertura para dentro dos respectivos consultórios.** Lembrando que o banheiro 2 terá 2 portas de 0,9, acesso para consultório 2 e para área externa.
- *Portas Internas dos Consultórios 01 e 02 (02 unidades):* Folha nominal de **0,80 a 0,90 × 2,10 m**, instaladas nas divisórias internas junto à parede frontal, com **abertura para dentro dos respectivos consultórios**
- *Porta do DML — P2 (01 unidade):* Folha nominal de **0,80 × 2,10 m**, instalada na parede frontal do DML com **abertura para dentro do DML** (encostando na divisória esquerda).
- *Porta de Acesso Principal — Atendimento (01 unidade):* Folha com **vão livre mínimo de 0,90 × 2,10 m**, voltada para o patamar da rampa acessível NBR 9050.

- **Janelas dos Consultórios 01 e 02 (02 unidades — Fachada Frontal):** 01 janela de correr em alumínio branco por consultório (dimensão de **1,60 × 1,10 m a 1,80 × 1,10 m**), instalada na parede frontal entre os giros das portas internas, com vidro de segurança, controle visual para privacidade (película jateada ou persiana lavável) e tela mosquiteira removível.
- **Janela do Atendimento (01 unidade — Fachada Posterior):** 01 janela de correr ou maxim-ar em alumínio branco (dimensão de referência de **1,20 × 1,10 m**) na parede posterior do Atendimento (conforme planta CAD), garantindo iluminação e ventilação natural à recepção.
- **Janelas dos Sanitários 01 e 02 (02 unidades — Fachada Posterior):** 01 janela por sanitário em alumínio branco, abertura basculante ou maxim-ar, vidro de segurança translúcido, dimensão de referência de **0,80 × 0,80 m** e peitoril de 1,60 m, mantida mesmo com a presença dos exaustores mecânicos.

5. Louças, Metais Sanitários e Lavatórios de Canto dos Consultórios

Regra crítica de acessibilidade e higiene: Nos dois sanitários e no DML é **terminantemente proibido instalar gabinetes ou armários de MDF** sob os lavatórios ou tanques. Nos consultórios, adota-se **lavatório suspenso de canto** para otimizar a área livre de circulação e atendimento.

Local de Aplicação	Qtd. Total	Especificação Técnica e Referência Comercial
Consultórios 01 e 02 (Lavatórios de Canto)	02 conj.	01 **lavatório suspenso de canto** exclusivo para higiene das mãos por consultório, em louça branca (referência *Deca Montecarlo L.17.17 / Icasa / Celite de canto*) ou cuba de canto em aço inox AISI 304, instalado no vértice junto à parede hidráulica do sanitário, equipado com **torneira temporizada automática** ***Docol PressMatic Compact* (17160606 / SAP 90171606006)**, sifão cromado/metálico, dispenser de sabonete/álcool em inox, porta-papel toalha e lixeira a pedal de 20 L.
Sanitários 01 e 02 (Lavatórios)	02 un.	Lavatório de louça branca **suspenso, sem gabinete de MDF e sem coluna até o piso**. Referência: *Deca Vogue Plus L.51.17* com suporte/coluna suspensa metálica compatível, instalado com altura de 0,78 a 0,80 m e vão livre inferior de 0,73 m (NBR 9050).
Sanitários 01 e 02 (Torneiras)	02 un.	Torneira de mesa temporizada cromada, acionamento hidromecânico leve compatível com uso acessível e fechamento automático. Referência: *Docol*

Sanitários 01 e 02 (Bacias)	02 un.	Bacia sanitária de louça branca elevada, lavatório mais baixo seguindo as normas de acessibilidade, apoiadores em todos lados para atender a acessibilidade, com assento sem abertura frontal e válvula/caixa de descarga com acionamento acessível. Referência: *Deca Conforto P.510.17*.
Sanitários 01 e 02 (Barras e Kits)	02 kits	Barras de apoio em **aço inox AISI 304** fixadas em reforços estruturais (NBR 9050) + espelho, papeleira, saboneteira líquida, dispenser de papel-toalha em inox/ABS e lixeira de 20 L com pedal em aço inox.
DML (Tanque de Limpeza)	01 conj.	Tanque de serviço em aço inox AISI 304 ou louça branca, com torneira de parede, sifão, válvula e suportes laváveis para utensílios (**sem armário de MDF**).

6. Exaustão Mecânica e Climatização

- **Exaustão mecânica (Sanitários 01, 02, DML, Depósito — 04 unidades):** Instalar 01 exaustor em cada sanitário e 01 no DML. Referência: *Ventokit New Classic 80* (vazão nominal de 80 m³/h, conexão Ø 100 mm) ou equivalente que garanta a vazão efetiva após perdas de carga. Descarga direta e individual para o exterior com veneziana externa antirretorno e vedação contra chuva (proibido descarregar no forro, interior de paredes ou próximo a tomadas de ar).
- **Climatização (Consultórios 01, 02 e Atendimento — 03 unidades):** Fornecimento e instalação completa de **03 aparelhos de ar-condicionado tipo Split Inverter, capacidade mínima de 9.000 BTU/h cada** (frio ou quente/frio, 220 V), incluindo suportes externos anticorrosivos para as condensadoras, tubulação de cobre isolada embutida, dreno embutido e circuito elétrico dedicado por aparelho.
- **Renovação de ar clínica:** Prever tomada/insuflamento de ar externo filtrado (filtragem mínima G4) para renovação de ar dos consultórios, independente da recirculação dos aparelhos split e sem transferência de ar dos sanitários ou DML.

7. Instalações Elétricas, Lógica, Iluminação LED e Combate a Incêndio

- **Rede elétrica embutida e condutores 100% cobre:** Toda a distribuição interna deverá ser embutida em eletrodutos alojados no espaço técnico das paredes e do teto, com caixas e tampas acessíveis (vedado o uso de canaletas aparentes ou condutores soltos no isolamento). Utilizar **exclusivamente condutores de cobre eletrolítico antichama** (isolação 750 V / 0,6/1 kV conforme NBR 5410 — **proibido o uso de condutores de alumínio**).
- **Quadros de distribuição e conexão externa (Padrão Jataí-GO — 220 V / 380 V):**
  - *Quadro de Distribuição Geral (QDG) interno:* Com barramento de cobre, disjuntor geral, circuitos independentes para iluminação, tomadas de uso geral, tomadas específicas e cada aparelho de ar-condicionado, dispositivos DR (diferencial residual) para áreas molhadas/clínicas, DPS (proteção contra surtos) e barramento de aterramento/equipotencialização da carcaça metálica.
  - *Quadro externo de entrada e cabo de 25 m:* Gabinete metálico estanque externo contendo 01 tomada industrial de engate rápido tipo *Steck*, 01 voltímetro (escala 0 a 440 V com chave seletora) e disjuntor de proteção geral, acompanhado de **extensão de 25 metros em cabo PP multipolar** com plugues industriais *Steck* compatíveis.
- **Pontos de tomadas e lógica (RJ45):** Prever no mínimo 04 tomadas 2P+T (220 V) e 02 pontos de dados (RJ45 Cat.6 em eletroduto separado de energia) por consultório e no setor de atendimento, além dos pontos dedicados para climatização e exaustão.
- **Iluminação em LED e Segurança contra Incêndio:**

- *Consultórios 01 e 02:* Painel LED de luz difusa, branco neutro (4.000 K), 34 W e fluxo mínimo de 4.260 lm (referência *Philips SmartBright RC048B LED42S/840* ou equivalente), instalado sem comprimir o isolamento térmico.
- *Atendimento:* Painel LED branco de 18 W, 4.000 K (referência *Avant Fit Sobrepor* ou equivalente).
- *Sanitários e DML:* Painel LED branco de 12 a 18 W, 4.000 K (referência *Avant Painel Quadrado Sobrepor*, utilizando luminária estanque IP65 onde houver exposição a vapor/respingos).
- *Circulação externa (sob o toldo):* Luminárias LED estanques **IP65**, luz branca neutra (4.000 K), distribuídas na fachada frontal para iluminar a rampa e o acesso principal.
- *Emergência e Extintores:* Blocos autônomos de iluminação de emergência em LED + sinalização fotoluminescente de saída e **02 (dois) extintores de incêndio portáteis de 4 kg tipo Pó Químico Seco ABC** instalados em suportes de parede.

8. Mobiliário, Testes de Recebimento e Planilha de Cotação

O fornecimento inclui todo o mobiliário fixo e solto abaixo listado, entregue montado e travado para transporte. Os móveis de MDF são **restritos aos dois consultórios** (confeccionados em MDF com revestimento melamínico texturizado/branco interna e externamente, bordas seladas em PVC e gavetas com corrediças metálicas e trava):

Item	Descrição Resumida do Escopo para Proposta Comercial	Unid.	Qtd.
01	**Módulo Habitacional Metálico 12,00 × 3 m:** Estrutura em aço anticorrosivo com pintura PU branca, isolamento contínuo (PIR 30 mm Kingspan ou EPS 50 mm Isorecort), revestimento interno ACM 3 mm branco, piso naval 15 mm + vinílico Tarkett Ambienta (3 mm) e Tarkett iQ Granit em manta soldada (2 mm), esquadrias completas (05 janelas + portas com giro conforme CAD), instalações elétricas 100% cobre (QDG + entrada Steck + cabo PP 25 m), hidrossanitárias e iluminação LED Philips/Avant completa.	Unid.	01
02	**Cobertura Externa Frontal (Avanço de 4 m): Metálico** de alta resistência (tipo Durasol®), estrutura em aço galvanizado	Conj.	01
03	**Rampa e Patamar de Acesso Externo (ABNT NBR 9050):** Estrutura metálica acoplável antiderrapante com guarda-corpo e corrimão duplo em duas alturas.	Conj.	01
04	**Climatização e Exaustão:** 03 aparelhos Split Inverter 9.000 BTU/h instalados + sistema de renovação de ar dos consultórios + 04 exaustores Ventokit New Classic 80 (sanitários, depósito e DML).	Conj.	01
05	**Louças, Metais e Acessibilidade:** 02 bacias Deca Conforto P.510.17, 02 lavatórios suspensos Deca Vogue Plus L.51.17 (sanitários, sem MDF), **02 lavatórios suspensos de canto (consultórios 01 e 02)**, 04 torneiras temporizadas Docol PressMatic Compact (sanitários e consultórios), 01 tanque inox/louça (DML), barras de apoio inox AISI 304, espelhos, dispensers.	Conj.	01

Item	Descrição Resumida do Escopo para Proposta Comercial	Unid.	Qtd.
06	**Mobiliário Clínico e Administrativo Completo:** • *Consultórios 01 e 02 (total dos 2 ambientes):* 02 armários/gabinetes de apoio e 02 armários aéreos em MDF melamínico, 02 mesas de trabalho, 02 macas clínicas inox estofadas laváveis, 04 mochos clínicos e 04 cadeiras fixas de interlocutor. • *Atendimento / Recepção:* 01 bancada de atendimento com superfície lavável (sem armário de MDF), 01 cadeira giratória com rodízios e 04 cadeiras de espera. • *Segurança:* 02 extintores PQS ABC 4 kg + iluminação e sinalização de emergência.	Conj.	01
07	**Comunicação Visual, Projetos Executivos (ART/RRT), Frete CIF e Descarga na UFJ (Jataí-GO):** Plotagem externa conforme arte da UFJ, entrega técnica com testes de estanqueidade, escoamento e elétrica, manuais em português, desenhos *as-built* e garantia mínima de 12 meses.	Serv.	01


9. Referências Comerciais Consultadas e Condições de Cotação


As referências abaixo (consultadas em 15/10/2026) orientam o padrão de qualidade exigido pela Universidade Federal de Jataí. Eventuais marcas equivalentes propostas pelo fornecedor deverão ser expressamente identificadas na proposta comercial acompanhadas de catálogo técnico:

- **Isolamento Termoacústico e Vedação:** Painéis *PIR Kingspan Isoeste* (30 mm, R ≥ 1,25 m²·K/W) ou placas *EPS Isorecort* (50 mm retardante à chama); selante poliuretano *Sikaflex*; lona de toldo *Durasol® / Sansuy*.
- **Revestimentos Vinílicos de Piso:** *Tarkett Ambienta Series* (3,0 mm / camada de uso 0,50 mm) para consultórios e atendimento; *Tarkett iQ Granit* em manta homogênea (2,0 mm termossoldada) para sanitários e DML.
- **Louças, Metais e Exaustão:** Lavatório suspenso *Deca Vogue Plus L.51.17* (sanitários); lavatório de canto *Deca Montecarlo L.17.17 / Celite / Icasa* (consultórios); bacia sanitária acessível *Deca Conforto P.510.17*; torneira temporizada *Docol PressMatic Compact* (cód. 17160606 / SAP 90171606006); exaustor *Ventokit New Classic 80*.
- **Iluminação LED:** Painel *Philips SmartBright RC048B LED42S/840* (34 W, 4.260 lm, 4.000 K) nos consultórios; *Avant Fit Sobrepor* (18 W, 4.000 K) no atendimento; *Avant Painel Quadrado Sobrepor* (12–18 W, 4.000 K) nos sanitários e DML.

Requisitos obrigatórios da proposta comercial: respeitando o layout do Anexo I (consultórios com 9 m² com lavatório de canto, janelas em todos os ambientes previstos e sanitários acessíveis com 1,50 × 2m e portas abrindo para dentro dos consultórios), informar prazo de fabricação e entrega (referência: até 90 dias corridos), validade mínima da proposta de 30 dias e discriminar o valor global com frete CIF e descarga inclusos para o campus da UFJ em Jataí-GO.

REFERÊNCIA VISUAL.

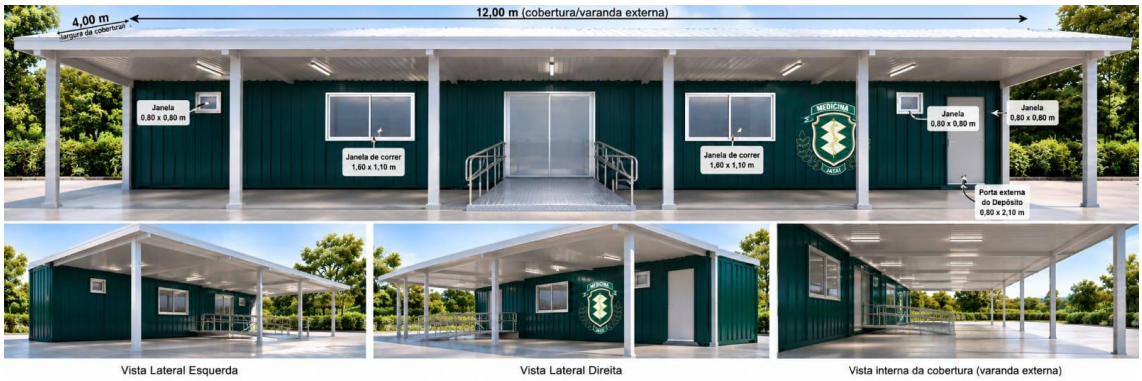

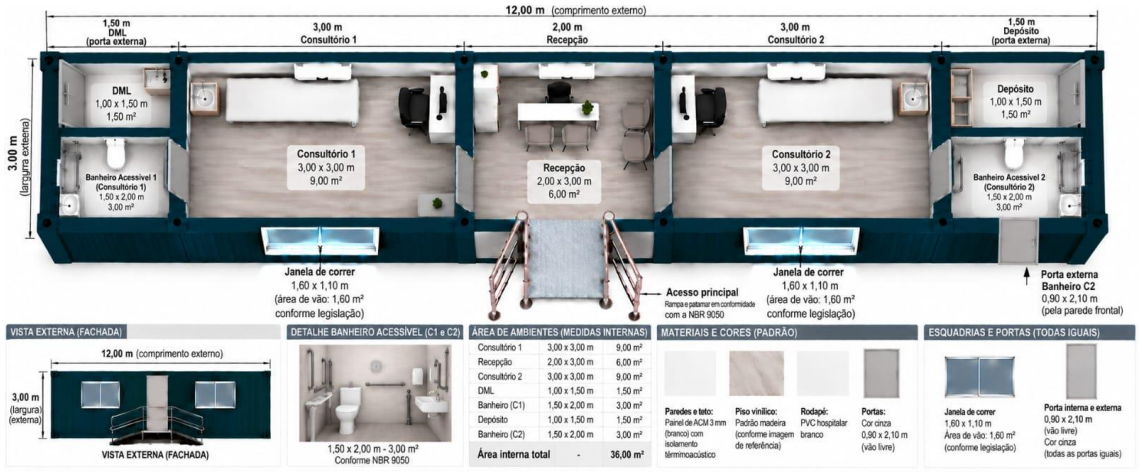

1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.[A3]
