

PLACA – PL2D – PLANTA

ESC. 1:25

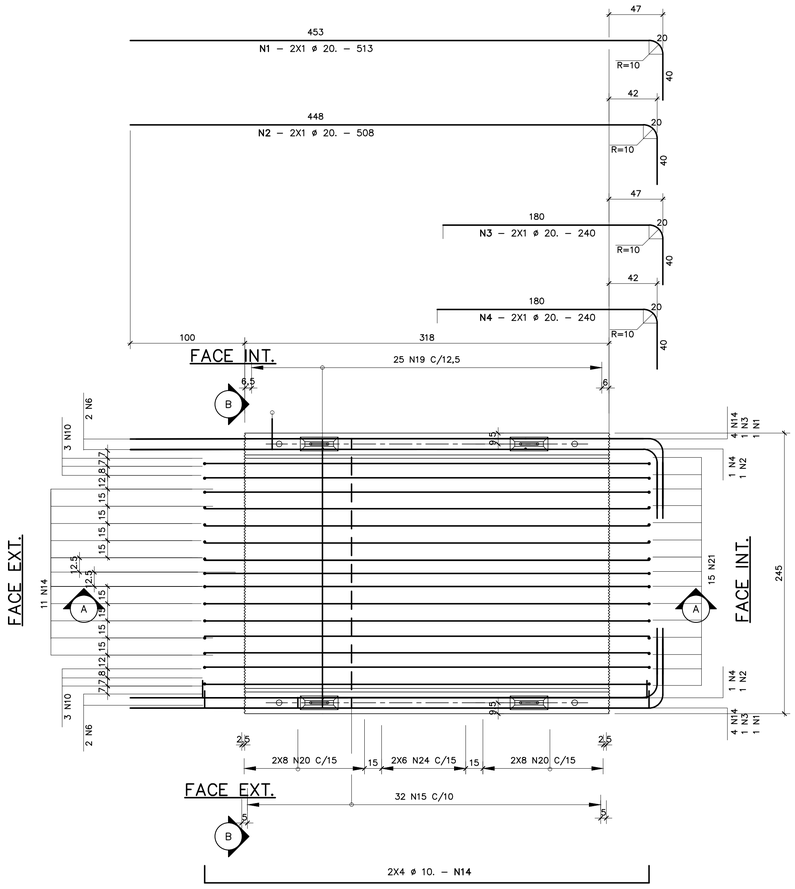


ESQUEMA DE MONTAGEM DAS PLACAS

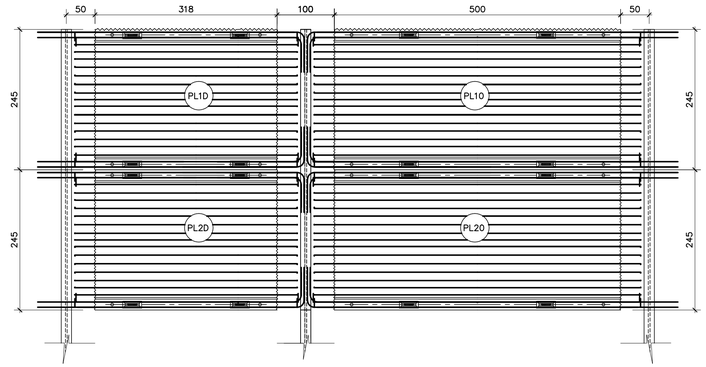


CORTE A–A

ESC. 1:25

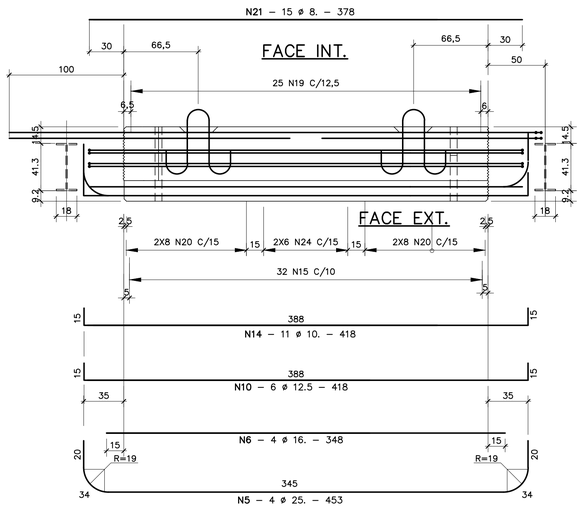

CORTE B–B

ESC. 1:25

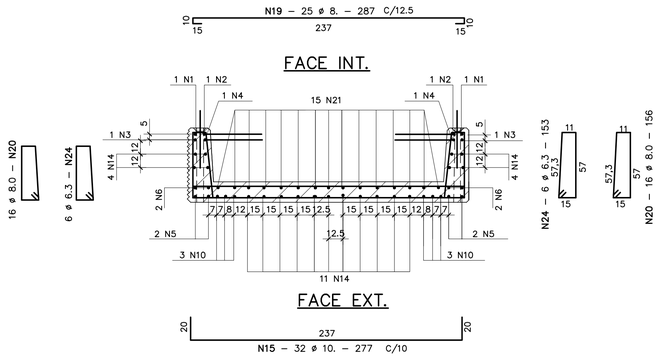

LISTA DE FERROS

N	Ø	Q	COMPRIMENTOS	
			UNIT(cm)	TOTAL(m)
1	20.	2	513	10,26
2	20.	2	508	10,16
3	20.	2	240	4,80
4	20.	2	240	4,80
5	25.	4	453	18,12
6	16.	4	348	13,92
7	–	–	–	–
8	–	–	–	–
9	–	–	–	–
10	12,5	6	418	25,08
11	–	–	–	–
12	–	–	–	–
13	–	–	–	–
14	10.	19	418	79,42
15	10.	32	277	88,64
16	–	–	–	–
17	–	–	–	–
18	–	–	–	–
19	8.	25	287	71,75
20	8.	32	156	49,92
21	8.	15	378	56,70
22	–	–	–	–
23	–	–	–	–
24	6,3	12	153	18,36

RESUMO CA–50

Ø	COMPR.(m)	MASSA(kg)
25.	18,12	72
20.	30,02	75
16.	13,92	22
12,5	25,08	25
10.	168,06	105
8.	178,37	71
6,3	18,36	4
PESO TOTAL:		374 kg

LEGENDA

NOTAS

1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - CONCRETO fck ≥ 45MPa.
3 - COBRIMENTO: 4cm, EXCETO ONDE INDICADO.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

inicial	A	26/02/14	MM	VG	Desenho original
Emissão	Tipo	Data	Revisado por	Resp. Técnico	Descrição

TIPOS DE EMISSÃO				
	A - Preliminar	C - Para conhecimento	E - Para construção	G - Cancelado
	B - Para liberação	D - Para cotação	F - Conf. construído	

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

APROVAÇÃO DO INEA

PROJETO EXECUTIVO PARA AS OBRAS DE CONTROLE DE INUNDAÇÕES E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO CÓRREGO D'ANTAS E RIO BENGALAS - MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ

GARAMBONE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

Projeto: PLACAS PRÉ-MOLDADAS PL2D ARMADURA RIO BENGALAS

Responsável pelo projeto: VICENTE GARAMBONE FILHO | CREA: RJ16.661-D | Visto:

Ecologus Engenharia Consultiva

Número do INEA: DRM-BH00-PNF-FBE-0-ECO-E-036-DE | Data: 26/02/2014 | Prancha: 01/01

Número do Projeto: INE06-RB-ET-PE-DE-036-R0 | Escala: INDICADA
