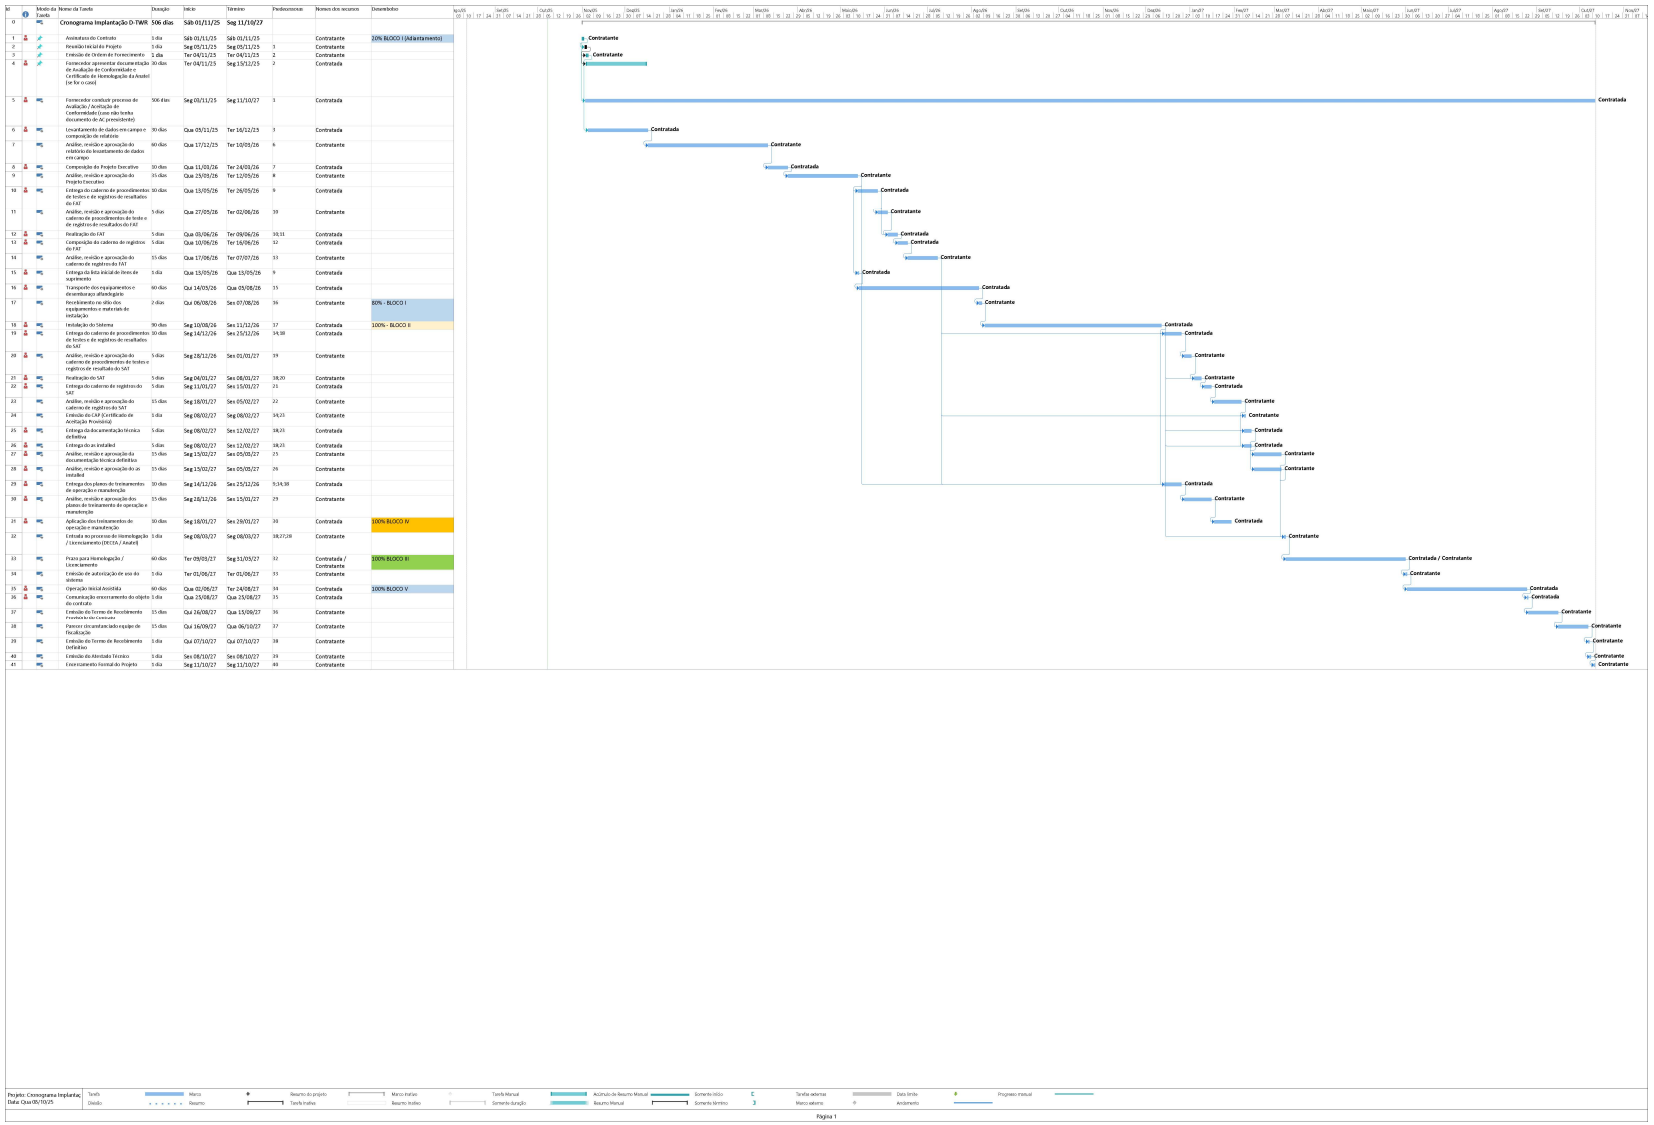

Id	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes dos recursos	Desembolso
0		Cronograma Implantação D-TWR	506 dias	Sáb 01/11/25	Seg 11/10/27			
1		Assinatura do Contrato	1 dia	Sáb 01/11/25	Sáb 01/11/25		Contratante	20% BLOCO I (Adiantamento)
2		Reunião Inicial do Projeto	1 dia	Seg 03/11/25	Seg 03/11/25	1	Contratante	
3		Emissão de Ordem de Fornecimento	1 dia	Ter 04/11/25	Ter 04/11/25	2	Contratante	
4		Fornecedor apresentar documentação de Avaliação de Conformidade e Certificado de Homologação da Anatel (se for o caso)	30 dias	Ter 04/11/25	Seg 15/12/25	2	Contratada	
5		Fornecedor conduzir processo de Avaliação / Aceitação de Conformidade (caso não tenha documento de AC preexistente)	506 dias	Seg 03/11/25	Seg 11/10/27	1	Contratada	
6		Levantamento de dados em campo e composição de relatório	30 dias	Qua 03/11/25	Ter 16/12/25	3	Contratada	
7		Análise, revisão e aprovação do relatório do levantamento de dados em campo	60 dias	Qua 17/12/25	Ter 10/03/26	6	Contratante	
8		Composição do Projeto Executivo	30 dias	Qua 11/03/26	Ter 24/03/26	7	Contratada	
9		Análise, revisão e aprovação do Projeto Executivo	15 dias	Qua 25/03/26	Ter 12/05/26	8	Contratante	
10		Entrega do caderno de procedimentos de testes e de registros de resultados do FAT	30 dias	Qua 13/05/26	Ter 26/05/26	9	Contratada	
11		Análise, revisão e aprovação do caderno de procedimentos de teste e de registros de resultados do FAT	5 dias	Qua 27/05/26	Ter 02/06/26	10	Contratante	
12		Realização do FAT	5 dias	Qua 03/06/26	Ter 09/06/26	10,11	Contratada	
13		Composição do caderno de registros do FAT	5 dias	Qua 10/06/26	Ter 16/06/26	12	Contratada	
14		Análise, revisão e aprovação do caderno de registros do FAT	15 dias	Qua 17/06/26	Ter 07/07/26	13	Contratante	
15		Entrega da lista inicial de itens de suprimento	1 dia	Qua 13/05/26	Qua 13/05/26	9	Contratada	
16		Transporte dos equipamentos e documentação aferidos/pelo	60 dias	Qui 14/05/26	Qua 05/08/26	15	Contratada	
17		Recebimento no sítio dos equipamentos e materiais de instalação	2 dias	Qui 06/08/26	Sex 07/08/26	16	Contratante	80% - BLOCO I
18		Instalação do Sistema	90 dias	Seg 10/08/26	Sex 11/12/26	17	Contratada	100% - BLOCO II
19		Entrega do caderno de procedimentos de testes e de registros de resultados do SAT	10 dias	Seg 14/12/26	Sex 25/12/26	14,18	Contratada	
20		Análise, revisão e aprovação do caderno de procedimentos de testes e registros de resultado do SAT	5 dias	Seg 28/12/26	Sex 01/01/27	19	Contratante	
21		Realização do SAT	5 dias	Seg 04/01/27	Sex 08/01/27	18,20	Contratante	
22		Entrega do caderno de registros do SAT	5 dias	Seg 11/01/27	Sex 15/01/27	21	Contratada	
23		Análise, revisão e aprovação do caderno de registros do SAT	15 dias	Seg 18/01/27	Sex 05/02/27	22	Contratante	
24		Emissão do CAP (Certificado de Aceitação Provisória)	1 dia	Seg 08/02/27	Seg 08/02/27	14,23	Contratante	
25		Entrega da documentação técnica definitiva	5 dias	Seg 08/02/27	Sex 12/02/27	18,23	Contratada	
26		Entrega do as installed	5 dias	Seg 08/02/27	Sex 12/02/27	18,23	Contratada	
27		Análise, revisão e aprovação da documentação técnica definitiva	15 dias	Seg 15/02/27	Sex 05/03/27	25	Contratante	
28		Análise, revisão e aprovação do as installed	15 dias	Seg 15/02/27	Sex 05/03/27	26	Contratante	
29		Entrega dos planos de treinamentos de operação e manutenção	30 dias	Seg 14/12/26	Sex 25/12/26	9;14;18	Contratada	
30		Análise, revisão e aprovação dos planos de treinamento de operação e manutenção	15 dias	Seg 28/12/26	Sex 15/01/27	29	Contratante	
31		Aplicação dos treinamentos de operação e manutenção	10 dias	Seg 18/01/27	Sex 29/01/27	30	Contratada	100% BLOCO IV
32		Emissão no processo de Homologação / Licenciamento (ERTEA / Anatel)	1 dia	Seg 08/03/27	Seg 08/03/27	18,27,28	Contratante	
33		Prazo para Homologação / Licenciamento	60 dias	Ter 09/03/27	Seg 31/05/27	32	Contratada / Contratante	100% BLOCO III
34		Emissão de autorização de uso do sistema	1 dia	Ter 01/06/27	Ter 01/06/27	33	Contratante	
35		Operação Inicial Assistida	60 dias	Qua 02/06/27	Ter 24/08/27	34	Contratada	100% BLOCO V
36		Comunicação encerramento do objeto do contrato	1 dia	Qua 25/08/27	Qua 25/08/27	35	Contratada	
37		Emissão do Termo de Recebimento Provisório do Contrato	15 dias	Qua 26/08/27	Qua 15/09/27	36	Contratante	
38		Parecer circunstanciado equipe de fiscalização	15 dias	Qui 16/09/27	Qua 06/10/27	37	Contratante	
39		Emissão do Termo de Recebimento Definitivo	1 dia	Qui 07/10/27	Qui 07/10/27	38	Contratante	
40		Emissão do Atestado Técnico	1 dia	Sex 08/10/27	Sex 08/10/27	39	Contratante	
41		Encerramento Formal do Projeto	1 dia	Seg 11/10/27	Seg 11/10/27	40	Contratante	

SDMMO202600482

Assinado com senha por EDUARDO LUIZ GRENTESKI, LEANDRO DE CARVALHO MIGUEZ e ADARCLER DURANGE OLIVEIRA.
Documento Nº: 547712.3271966-3490 - consulta à autenticidade em https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=547712.3271966-3490

SIGA
