
RUA SÃO SALVADOR (ENTRE A RUA BARÃO DO RIO BRANCO E RUA MARTIN LUTERO)


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT. PROJETO INICIAL		MEDIÇÃO 01	MEDIÇÃO 02	MEDIÇÃO 03	MEDIÇÃO 04	MEDIÇÃO 05	MEDIÇÃO 06	MEDIÇÃO 07	TOTAL EXECUTADO CONTRATO ANTERIOR		SALDO DE CONTRATO
											QUANTITATIVO EXECUTADO	PERCENTUAL EXECUTADO	
DRENAGEM													
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m³	10,80		-	10,80	-	-	-	-	-	10,80	100,00%	-
Reaterro e apiloamento mecânico	m³	3,57		-	3,57	-	-	-	-	-	3,57	100,00%	-
Reaterro Sem Apiloamento	m³	5,35		-	5,35	-	-	-	-	-	5,35	100,00%	-
Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	15,00		-	15,00	-	-	-	-	-	15,00	100,00%	-
B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m	un.	4,00		-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	25,00%	3,00

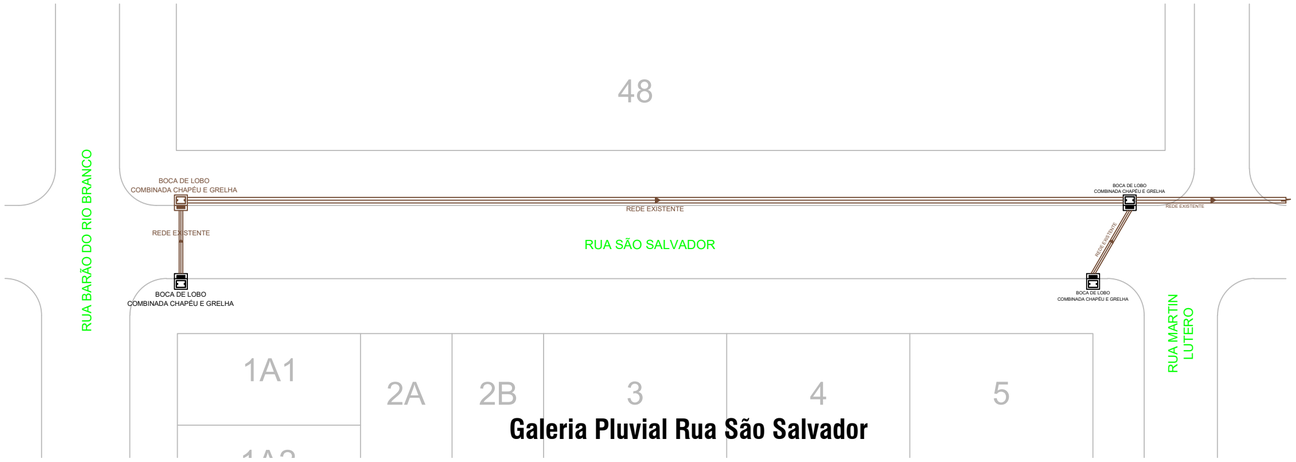

Galeria Pluvial Rua São Salvador

QUANTITATIVO
RUA SÃO SALVADOR

ESCAVAÇÃO DE VALAS ..... 0,00 m³
REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO ..... 0,00 m³
REATERRO SEM APILOAMENTO ..... 0,00 m³
CORPO DE BSTC Ø 0,40 ..... 0,00 m
CORPO DE BSTC Ø 0,60 ..... 0,00 m
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA ..... 3,00 un

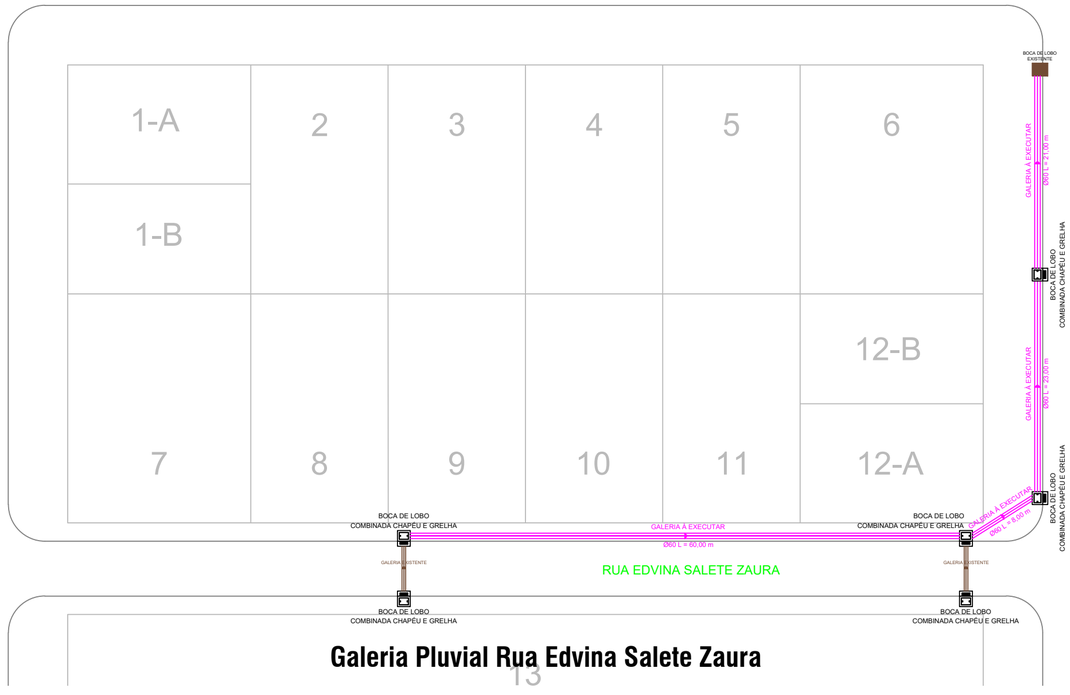

Galeria Pluvial Rua Edvina Salete Zaura

QUANTITATIVO
RUA EDVINA SALETE ZAURA

ESCAVAÇÃO DE VALAS ..... 107,52 m³
REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO ..... 30,94 m³
REATERRO SEM APILOAMENTO ..... 44,92 m³
CORPO DE BSTC Ø 0,40 ..... 0,00 m
CORPO DE BSTC Ø 0,60 ..... 112,00 m
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA ..... 6,00 un

RUA EDVINA SALETE ZAURA (ENTRE A RUA DOS IMIGRANTES E RUA BARÃO DO RIO BRANCO)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT. PROJETO INICIAL		MEDIÇÃO 01	MEDIÇÃO 02	MEDIÇÃO 03	MEDIÇÃO 04	MEDIÇÃO 05	MEDIÇÃO 06	MEDIÇÃO 07	TOTAL EXECUTADO CONTRATO ANTERIOR		SALDO DE CONTRATO
											QUANTITATIVO EXECUTADO	PERCENTUAL EXECUTADO	
DRENAGEM													
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m³	114,72		-	7,20	-	-	-	-	-	7,20	6,28%	107,52
Reaterro e apiloamento mecânico	m³	32,72		-	1,78	-	-	-	-	-	1,78	5,45%	30,94
Reaterro Sem Apiloamento	m³	49,08		-	4,16	-	-	-	-	-	4,16	8,48%	44,92
Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	10,00		-	10,00	-	-	-	-	-	10,00	100,00%	-
Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação	m	112,00		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	112,00
B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m	un.	6,00		-	-	-	2,00	-	-	-2,00	-	0,00%	6,00

PROJETO DE GALERIA PLUVIAL

IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA

Rua São Salvador e Rua Edvina Salete Zaura - CÉU AZUL-PR

APROVAÇÕES / OBSERVAÇÕES:

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
CNPJ: 76.206.473/0001-01

PROJETO:

GUSTAVO FRANCESCHINI
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 126178/D
g.franceschini@hotmail.com
(45)98403-8697

PROJETO:

ÁREA: 1.640,25 m²

CONTEUDO:

Projeto de Galeria Pluvial das Ruas São Salvador e Edvina Salete Zaura.

FORMATO: A2

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2026

PRANCHA: 02/02

A APROVAÇÃO DO PRESENTE PROJETO PERANTE A PREFEITURA NÃO RECONHECE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL.

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Gustavo Franceschini (20/07/2026 07:57:10). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026072007571061

Documento assinado eletronicamente por:
Gustavo Franceschini (20/07/2026 07:57:10)

Nome/controle do arquivo:
2026072007571061.pdf

Solicitações de assinatura:
Nenhuma solicitação registrada

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026072007571061
