

RUA COLOMBO (ENTRE A RUA NITERÓI E RUA SÃO SALVADOR)


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT. PROJETO INICIAL		MEDIÇÃO 01	MEDIÇÃO 02	MEDIÇÃO 03	MEDIÇÃO 04	MEDIÇÃO 05	MEDIÇÃO 06	MEDIÇÃO 07	TOTAL EXECUTADO CONTRATO ANTERIOR QUANTITATIVO EXECUTADO	TOTAL EXECUTADO CONTRATO ANTERIOR PERCENTUAL EXECUTADO	SALDO DE CONTRATO
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO													
Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m²	1201,08		-	-	-	-	-	240,22	120,11	360,33	30,00%	840,75
Lastro de Brita	m³	28,25		-	-	-	-	-	5,65	2,83	8,48	30,00%	19,78
Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m³	7,78		-	-	-	-	-	1,56	0,78	2,334	30,00%	5,45
Formas de madeira compensada resinada	m²	10,00		-	-	-	-	-	2,00	1,00	3,00	30,00%	7,00
Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m²	941,78		-	-	-	-	-	188,36	94,18	282,54	30,00%	659,24
PISO PODOTÁTIL, ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	m²	107,30		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	107,30
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	m²	152,00		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	152,00

RUA BENTO GONÇALVES (ENTRE A RUA IRMÃ CARMELITA MARIA CECILIA DE JESUS E RUA BELO HORIZONTE + 72,00m)


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT. PROJETO INICIAL		MEDIÇÃO 01	MEDIÇÃO 02	MEDIÇÃO 03	MEDIÇÃO 04	MEDIÇÃO 05	MEDIÇÃO 06	MEDIÇÃO 07	TOTAL EXECUTADO CONTRATO ANTERIOR QUANTITATIVO EXECUTADO	TOTAL EXECUTADO CONTRATO ANTERIOR PERCENTUAL EXECUTADO	SALDO DE CONTRATO
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO													
Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m²	1482,25		-	-	-	-	-	296,45	207,52	503,97	34,00%	978,29
Lastro de Brita	m³	34,99		-	-	-	-	-	7,00	4,90	11,90	34,00%	23,09
Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m³	9,48		-	-	-	-	-	1,90	1,33	3,22	34,00%	6,26
Formas de madeira compensada resinada	m²	10,00		-	-	-	-	-	2,00	1,40	3,40	34,00%	6,60
Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m²	1166,35		-	-	-	-	-	233,27	163,29	396,56	34,00%	769,79
PISO PODOTÁTIL, ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	m²	130,35		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	130,35
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	m²	185,55		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	185,55

RUA BELO HORIZONTE (ENTRE A RUA COLOMBO E RUA BENTO GONÇALVES)


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT. PROJETO INICIAL		MEDIÇÃO 01	MEDIÇÃO 02	MEDIÇÃO 03	MEDIÇÃO 04	MEDIÇÃO 05	MEDIÇÃO 06	MEDIÇÃO 07	TOTAL EXECUTADO CONTRATO ANTERIOR QUANTITATIVO EXECUTADO	TOTAL EXECUTADO CONTRATO ANTERIOR PERCENTUAL EXECUTADO	SALDO DE CONTRATO
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO													
Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m²	1103,82		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.103,82
Lastro de Brita	m³	25,94		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	25,94
Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m³	7,21		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	7,21
Formas de madeira compensada resinada	m²	10,00		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	10,00
Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m²	864,65		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	864,65
PISO PODOTÁTIL, ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	m²	95,52		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	95,52
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	m²	143,65		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	143,65

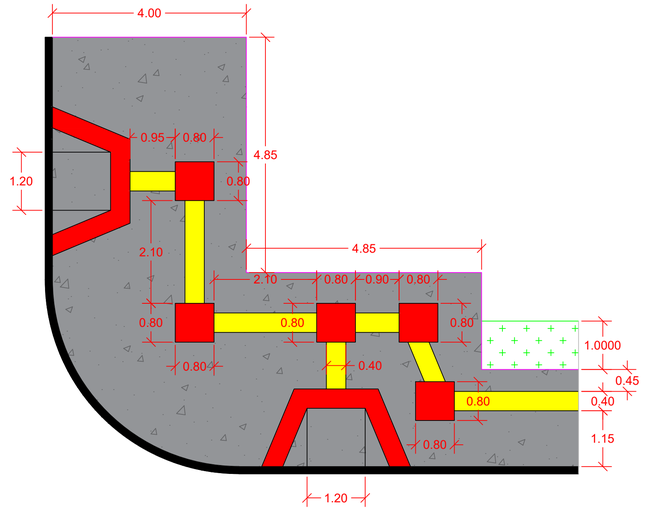

Detalhe de Implantação de Calçadas



Detalhe do Meio Fio

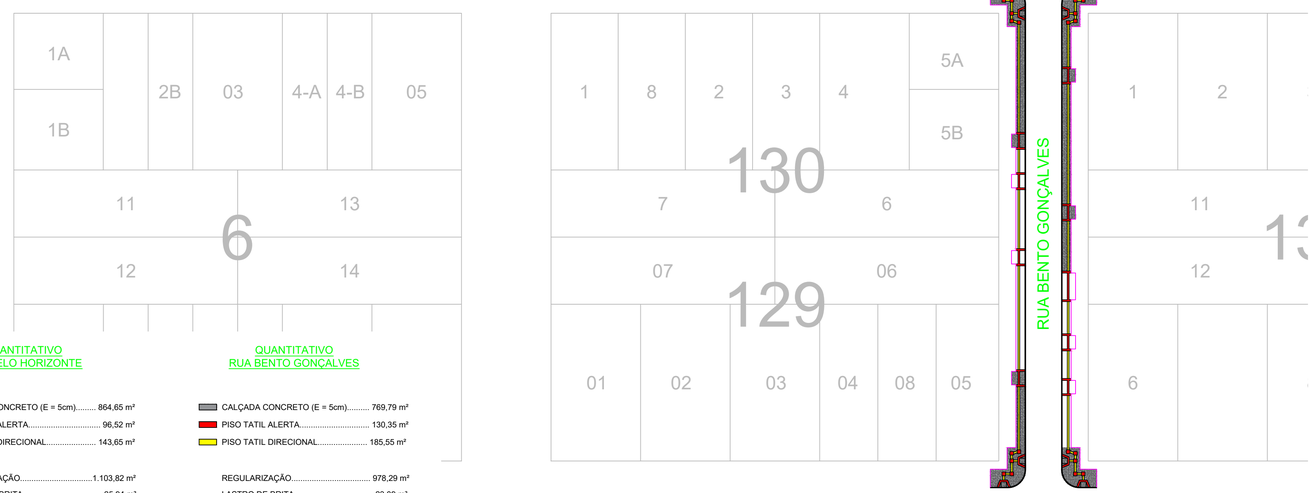

QUANTITATIVO
RUA COLOMBO

- CALÇADA CONCRETO (E = 5cm)..... 659,24 m²
- PISO TATIL ALERTA..... 107,30 m²
- PISO TATIL DIRECIONAL..... 152,00 m²

REGULARIZAÇÃO..... 840,75 m²
LASTRO DE BRITA ..... 19,78 m³
COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ..... 5,45 m³
FORMA DE MADEIRA ..... 7,00 m²

QUANTITATIVO
RUA BELO HORIZONTE

- CALÇADA CONCRETO (E = 5cm)..... 864,65 m²
- PISO TATIL ALERTA..... 96,52 m²
- PISO TATIL DIRECIONAL..... 143,65 m²

REGULARIZAÇÃO..... 1.103,82 m²
LASTRO DE BRITA ..... 25,94 m³
COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ..... 7,21 m³
FORMA DE MADEIRA ..... 10,00 m²

QUANTITATIVO
RUA BENTO GONÇALVES

- CALÇADA CONCRETO (E = 5cm)..... 769,79 m²
- PISO TATIL ALERTA..... 130,35 m²
- PISO TATIL DIRECIONAL..... 185,55 m²

REGULARIZAÇÃO..... 978,29 m²
LASTRO DE BRITA ..... 23,09 m³
COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ..... 6,26 m³
FORMA DE MADEIRA ..... 6,60 m²

Implantação de Calçadas

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS

IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS

Rua Colombo, Rua Belo Horizonte e Rua Bento Gonçalves - CÉU AZUL-PR

APROVAÇÕES / OBSERVAÇÕES:

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
CNPJ: 76.206.473/0001-01

PROJETO:
GUSTAVO FRANCESCHINI
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 126178/D
g.franceschini@hotmail.com
(45)98403-8697

PROJETO:

ÁREA: 3.788,15 m²

ESCALA: INDICADA

DATA: JUNHO/2026

CONTEUDO:
Projeto de Implantação de Calçadas das Ruas Colombo, Belo Horizonte e Bento Gonçalves.

FORMATO: A1

PRANCHA: 01/02

A APROVAÇÃO DO PRESENTE PROJETO PERANTE A PREFEITURA NÃO RECONHECE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL.

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Gustavo Franceschini (20/07/2026 07:56:42). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026072007564297

Documento assinado eletronicamente por:
Gustavo Franceschini (20/07/2026 07:56:42)

Nome/controle do arquivo:
2026072007564297.pdf

Solicitações de assinatura:
Nenhuma solicitação registrada

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026072007564297
