RUA COLOMBO (ENTRE A RUA NITERÓI E RUA SÃO SALVADOR)


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT. PROJETO INICIAL		MEDIÇÃO 01	MEDIÇÃO 02	MEDIÇÃO 03	MEDIÇÃO 04	MEDIÇÃO 05	MEDIÇÃO 06	MEDIÇÃO 07	TOTAL EXECUTADO CONTRATO ANTERIOR QUANTITATIVO EXECUTADO	TOTAL EXECUTADO CONTRATO ANTERIOR PERCENTUAL EXECUTADO	SALDO DE CONTRATO
DRENAGEM													
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m³	152,84		111,37	17,28	-	-	-	-	-	128,65	84,28%	23,99
Reaterro e apiloamento mecânico	m³	45,02		35,60	2,63	-	-	-	-	-	38,24	84,93%	6,78
Reaterro Sem Apiloamento	m³	67,52		58,40	3,95	-	-	-	-	-	57,35	84,94%	10,17
Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	56,00		32,00	24,00	-	-	-	-	-	56,00	100,00%	-
Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação	m	117,00		91,68	0,32	-	-	-	-	-	92,00	78,63%	25,00
B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m	un.	10,00		-	1,00	-	5,00	-	-	6,00	-	0,00%	10,00

RUA BELO HORIZONTE (ENTRE A RUA COLOMBO E RUA BENTO GONÇALVES)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT. PROJETO INICIAL		MEDIÇÃO 01	MEDIÇÃO 02	MEDIÇÃO 03	MEDIÇÃO 04	MEDIÇÃO 05	MEDIÇÃO 06	MEDIÇÃO 07	TOTAL EXECUTADO CONTRATO ANTERIOR QUANTITATIVO EXECUTADO	TOTAL EXECUTADO CONTRATO ANTERIOR PERCENTUAL EXECUTADO	SALDO DE CONTRATO
DRENAGEM													
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m³	30,24		29,00	1,24	-	-	-	-	-	30,24	100,00%	-
Reaterro e apiloamento mecânico	m³	9,98		8,50	1,48	-	-	-	-	-	9,98	100,00%	-
Reaterro Sem Apiloamento	m³	14,98		14,00	0,98	-	-	-	-	-	14,98	100,00%	-
Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	42,00		40,00	2,00	-	-	-	-	-	42,00	100,00%	-
B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m	un.	12,00		-	2,00	-	4,00	-	-	6,00	-	0,00%	12,00

RUA BENTO GONÇALVES (ENTRE A RUA IRMÃ CARMELITA MARIA CECILIA DE JESUS E RUA BELO HORIZONTE + 72,00m)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT. PROJETO INICIAL		MEDIÇÃO 01	MEDIÇÃO 02	MEDIÇÃO 03	MEDIÇÃO 04	MEDIÇÃO 05	MEDIÇÃO 06	MEDIÇÃO 07	TOTAL EXECUTADO CONTRATO ANTERIOR QUANTITATIVO EXECUTADO	TOTAL EXECUTADO CONTRATO ANTERIOR PERCENTUAL EXECUTADO	SALDO DE CONTRATO
DRENAGEM													
Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m³	161,52		77,76	40,56	-	-	-	-	-	118,32	73,25%	43,20
Reaterro e apiloamento mecânico	m³	49,77		25,60	9,89	-	-	-	-	-	35,50	71,32%	14,27
Reaterro Sem Apiloamento	m³	74,65		38,40	14,85	-	-	-	-	-	53,25	71,33%	21,40
Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	121,00		28,00	33,00	-	-	-	-	-	61,00	50,41%	60,00
Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação	m	77,50		60,00	17,50	-	-	-	-	-	77,50	100,00%	-
B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m	un.	12,00		-	2,00	-	6,00	-	-	-	8,00	66,67%	4,00

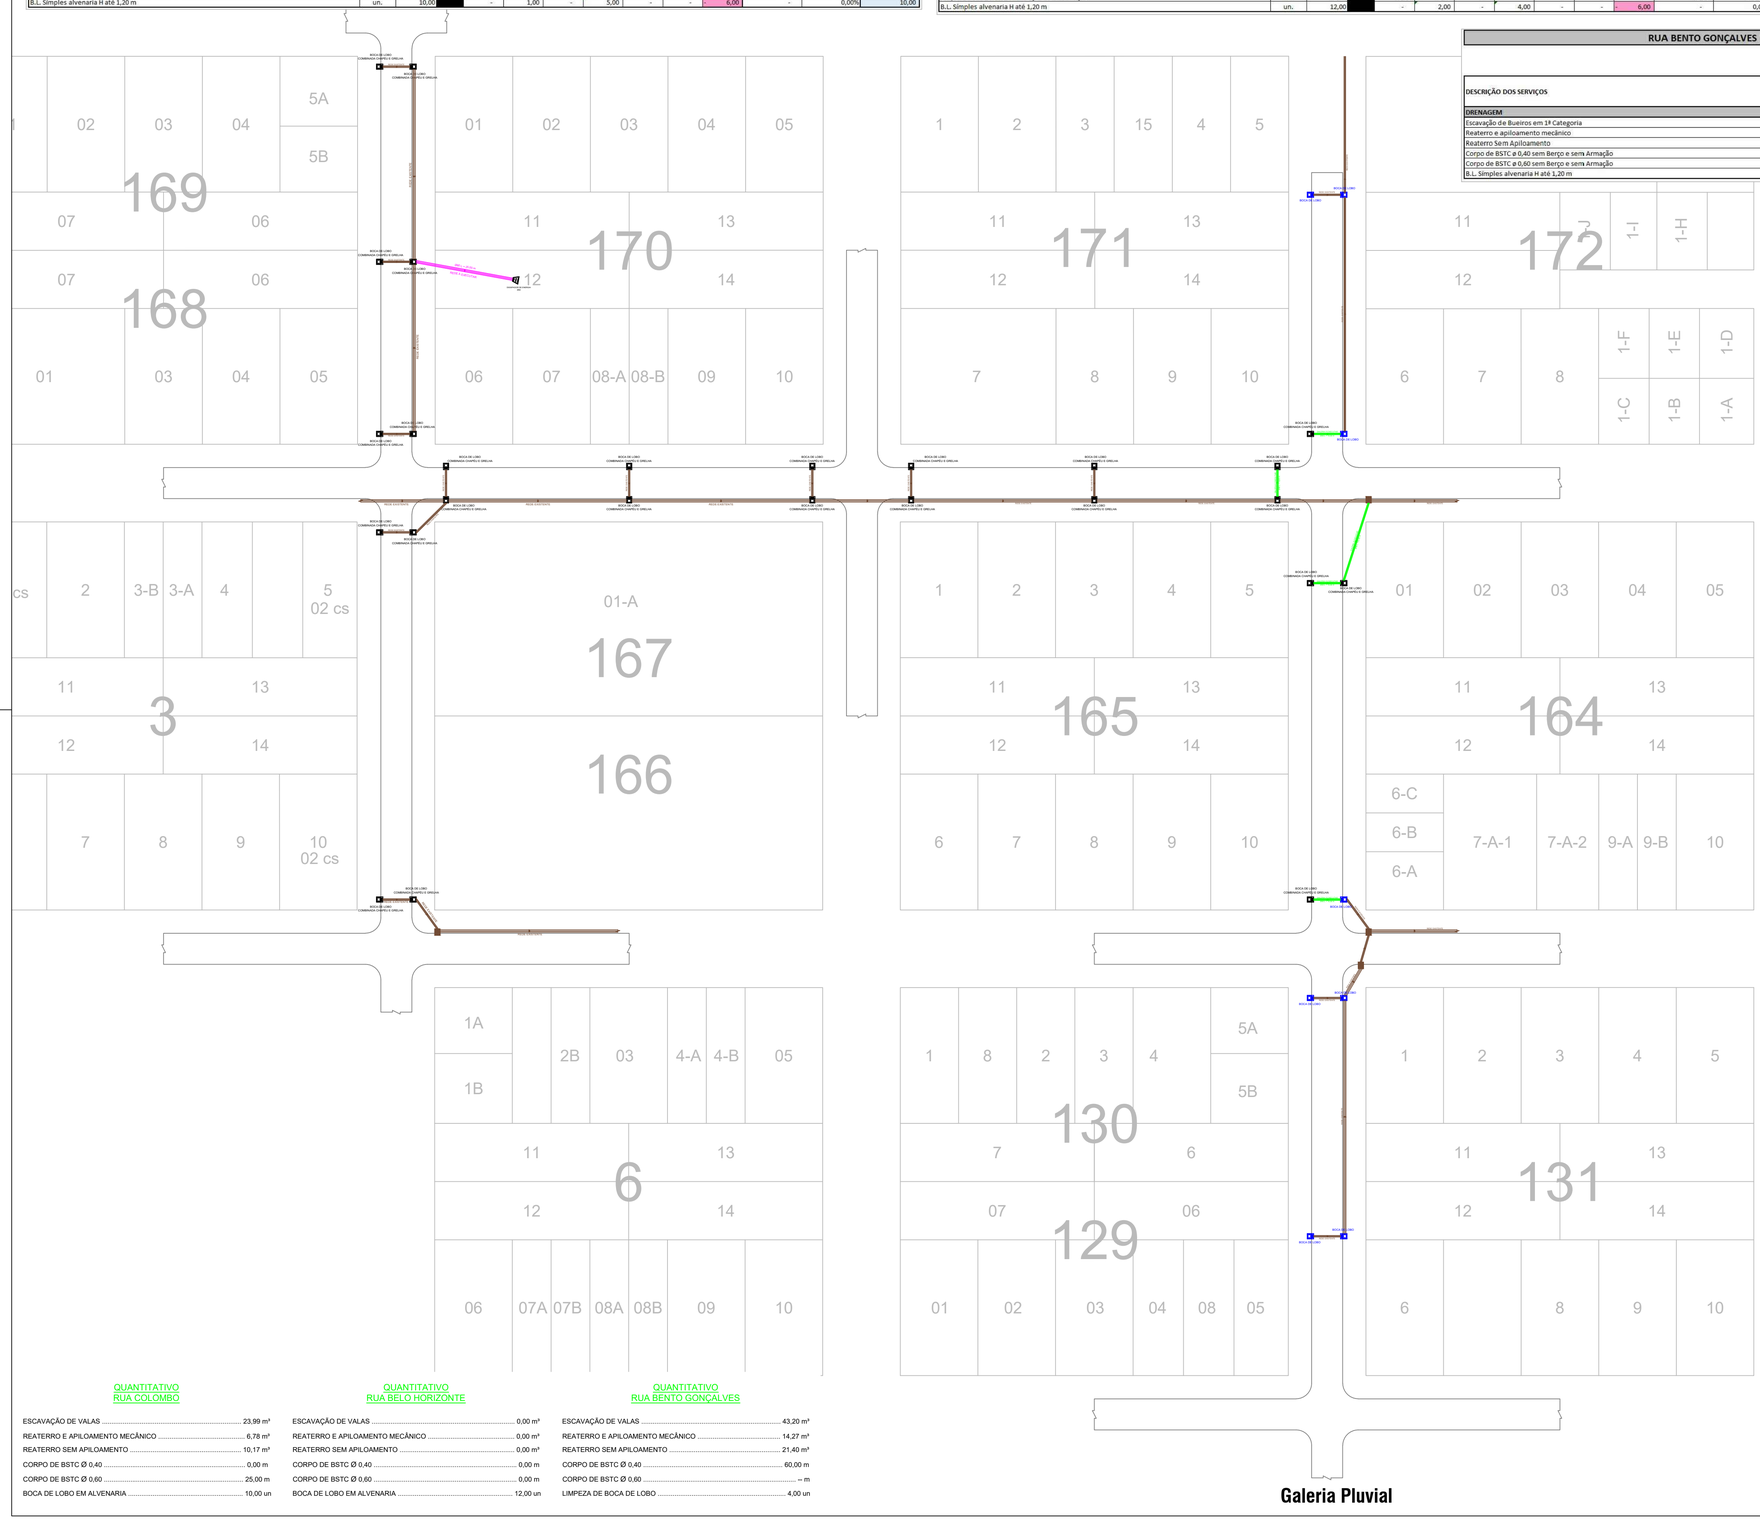

Galeria Pluvial

QUANTITATIVO
RUA COLOMBO

ESCAVAÇÃO DE VALAS	23,99 m³
REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO	6,78 m³
REATERRO SEM APILOAMENTO	10,17 m³
CORPO DE BSTC Ø 0,40	0,00 m
CORPO DE BSTC Ø 0,60	25,00 m
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA	10,00 un

QUANTITATIVO
RUA BELO HORIZONTE

ESCAVAÇÃO DE VALAS	0,00 m³
REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO	0,00 m³
REATERRO SEM APILOAMENTO	0,00 m³
CORPO DE BSTC Ø 0,40	0,00 m
CORPO DE BSTC Ø 0,60	0,00 m
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA	12,00 un

QUANTITATIVO
RUA BENTO GONÇALVES

ESCAVAÇÃO DE VALAS	43,20 m³
REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO	14,27 m³
REATERRO SEM APILOAMENTO	21,40 m³
CORPO DE BSTC Ø 0,40	60,00 m
CORPO DE BSTC Ø 0,60	-- m
LIMPEZA DE BOCA DE LOBO	4,00 un

PROJETO DE GALERIA PLUVIAL

IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA

Rua Colombo, Rua Belo Horizonte e Rua Bento Gonçalves - CÉU AZUL-PR

APROVAÇÕES / OBSERVAÇÕES:

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
CNPJ: 76.206.473/0001-01

PROJETO:

GUSTAVO FRANCESCHINI
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 126178/D
g.franceschini@hotmail.com
(45)98403-8697

PROJETO:

ÁREA: 6.172,93 m²

CONTEUDO:
Projeto de Galeria Pluvial das Ruas Colombo, Belo Horizonte e Bento Gonçalves.

FORMATO: A1

ESCALA: INDICADA

PRANCHA: 01/02

DATA: JUNHO/2026

A APROVAÇÃO DO PRESENTE PROJETO PERANTE A PREFEITURA NÃO RECONHECE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL.

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Gustavo Franceschini (20/07/2026 07:57:03). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026072007570310

Documento assinado eletronicamente por:
Gustavo Franceschini (20/07/2026 07:57:03)

Nome/controle do arquivo:
2026072007570310.pdf

Solicitações de assinatura:
Nenhuma solicitação registrada

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026072007570310
