Relatório de Seções Transversais



TRECHO 1

Estaca: 9+500,00

Área de Corte: 0,42m2
Área de Aterro: 0,00m2
Volume Acumulado: 3.190,13m3
Cota Projeto: 151,751m

PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO	1	2	3	4	33
	DIST	2,500	2,500	3,000	3,223	3,276
	COTA	151,701m	151,701m	151,691m	151,487m	151,567m

PLATAFORMA ACABADA LADO	PTO	1	2	3	4	33

DIREITO	DIST	2,500m	2,500m	3,000m	3,223m	3,325m
	COTA	151,701m	151,701m	151,691m	151,487m	151,639m

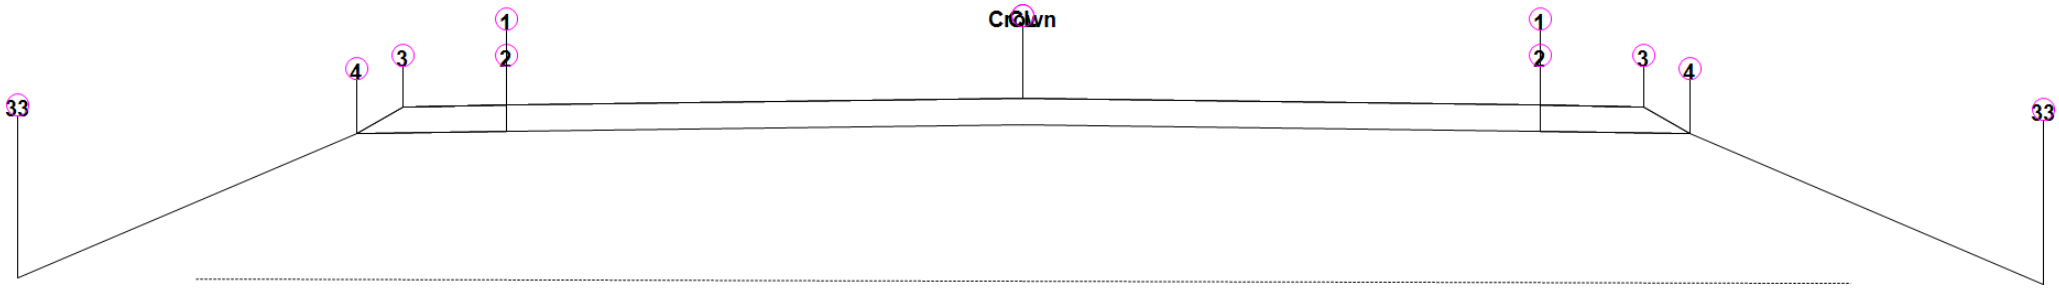

TRECHO 1

Estaca: 9+520,00

Área de Corte: 0,00m2
Área de Aterro: 8,61m2
Volume Acumulado: 3.108,20m3
Cota Projeto: 152,817m

PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO	1	2	3	4	33
	DIST	2,500	2,500	3,000	3,223	4,863
	COTA	152,767m	152,767m	152,757m	152,552m	151,459m

PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO	1	2	3	4	33
	DIST	2,500m	2,500m	3,000m	3,223m	4,934m
	COTA	152,767m	152,767m	152,757m	152,552m	151,412m

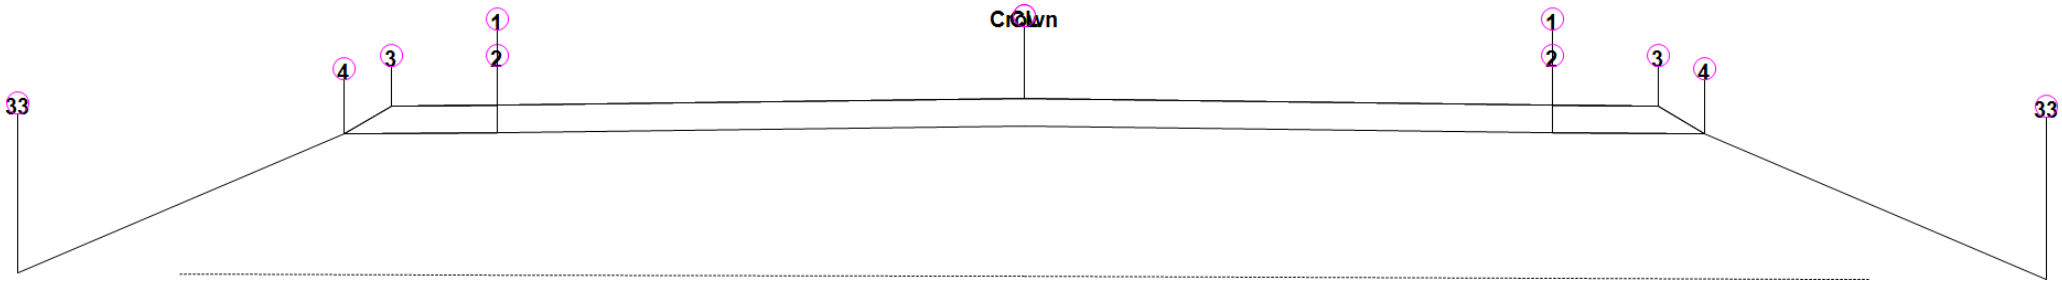

TRECHO 1

Estaca: 9+520,84

Área de Corte: 0,00m2
Área de Aterro: 8,12m2
Volume Acumulado: 3.101,18m3
Cota Projeto: 152,750m

PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO	1	2	3	4	33
	DIST	2,500	2,500	3,000	3,223	4,770
	COTA	152,700m	152,700m	152,690m	152,486m	151,454m

PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO	1	2	3	4	33
	DIST	2,500m	2,500m	3,000m	3,223m	4,841m
	COTA	152,700m	152,700m	152,690m	152,486m	151,407m

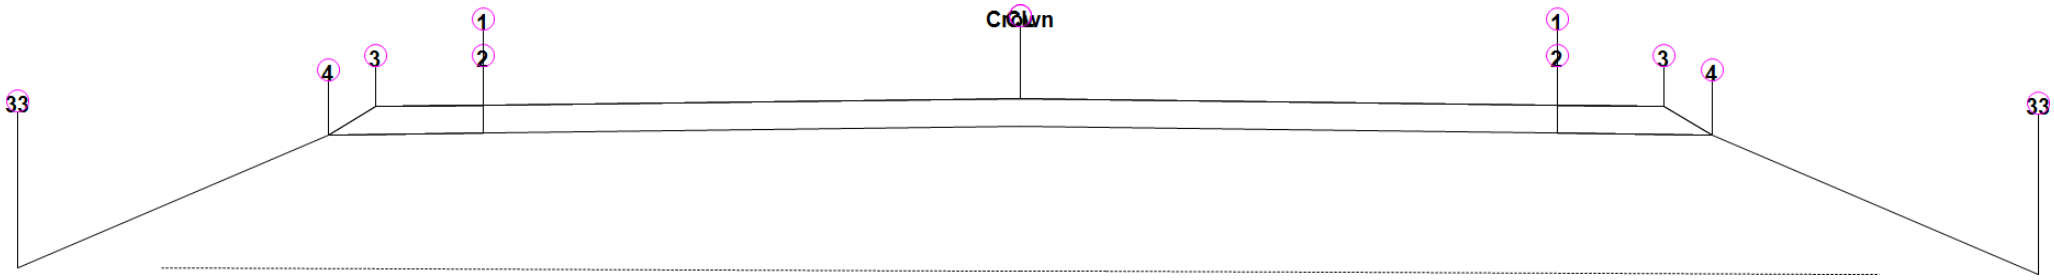

TRECHO 1

Estaca: 9+521,74

Área de Corte: 0,00m2
Área de Aterro: 7,59m2
Volume Acumulado: 3.094,07m3
Cota Projeto: 152,679m

PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO	1	2	3	4	33
	DIST	2,500	2,500	3,000	3,223	4,668
	COTA	152,629m	152,629m	152,619m	152,414m	151,451m

PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO	1	2	3	4	33
	DIST	2,500m	2,500m	3,000m	3,223m	4,742m
	COTA	152,629m	152,629m	152,619m	152,414m	151,401m

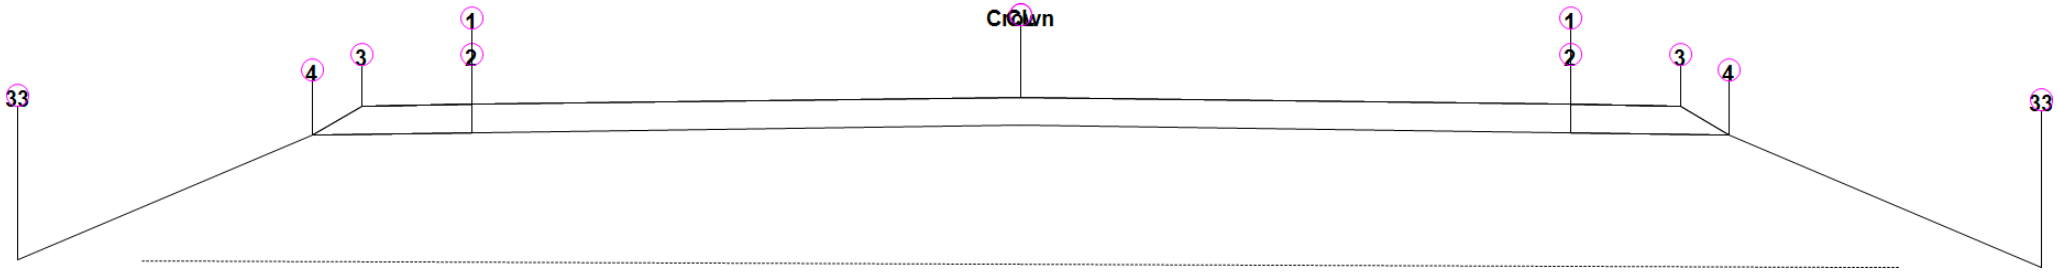

TRECHO 1

Estaca: 9+522,65

Área de Corte: 0,00m2
Área de Aterro: 7,05m2
Volume Acumulado: 3.087,44m3
Cota Projeto: 152,607m

PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO	1	2	3	4	33
	DIST	2,500	2,500	3,000	3,223	4,565
	COTA	152,557m	152,557m	152,547m	152,343m	151,448m

PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO	1	2	3	4	33
	DIST	2,500m	2,500m	3,000m	3,223m	4,643m
	COTA	152,557m	152,557m	152,547m	152,343m	151,396m



TRECHO 1

Estaca: 9+540,00

Área de Corte: 0,34m2
Área de Aterro: 0,00m2
Volume Acumulado: 3.029,21m3
Cota Projeto: 151,448m

PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO	1	2	3	4	33
	DIST	2,500	2,500	3,000	3,223	3,262
	COTA	151,398m	151,398m	151,388m	151,184m	151,243m

PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO	1	2	3	4	33
	DIST	2,500m	2,500m	3,000m	3,223m	3,269m
	COTA	151,398m	151,398m	151,388m	151,184m	151,253m

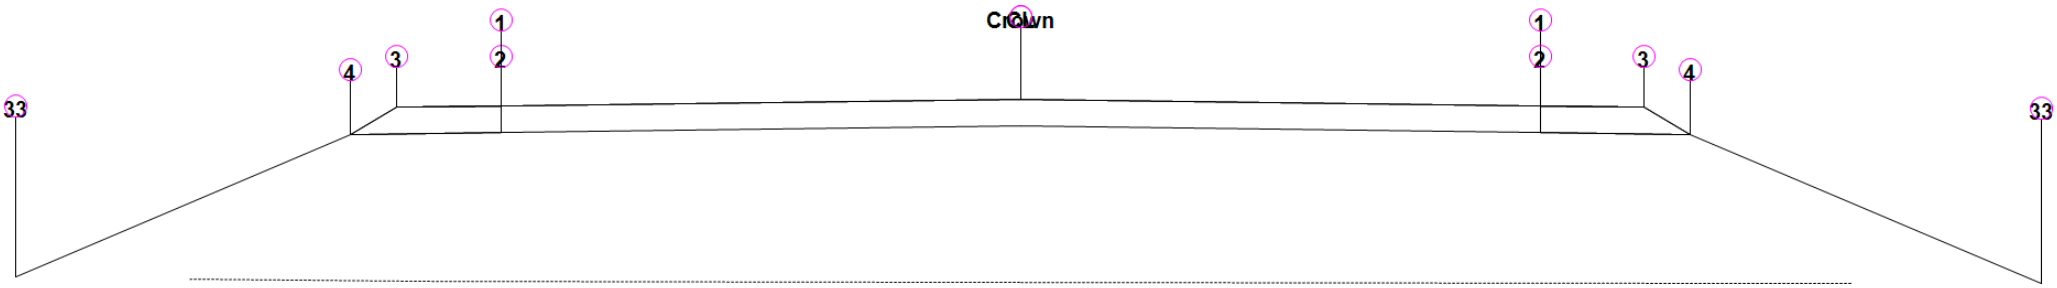

TRECHO 1

Estaca: 9+560,00

Área de Corte: 0,00m2
Área de Aterro: 8,59m2
Volume Acumulado: 2.946,63m3
Cota Projeto: 152,103m

PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO	1	2	3	4	33
	DIST	2,500	2,500	3,000	3,223	4,835

	COTA	152,053m	152,053m	152,043m	151,839m	150,764m

PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO	1	2	3	4	33
	DIST	2,500m	2,500m	3,000m	3,223m	4,911m
	COTA	152,053m	152,053m	152,043m	151,839m	150,713m

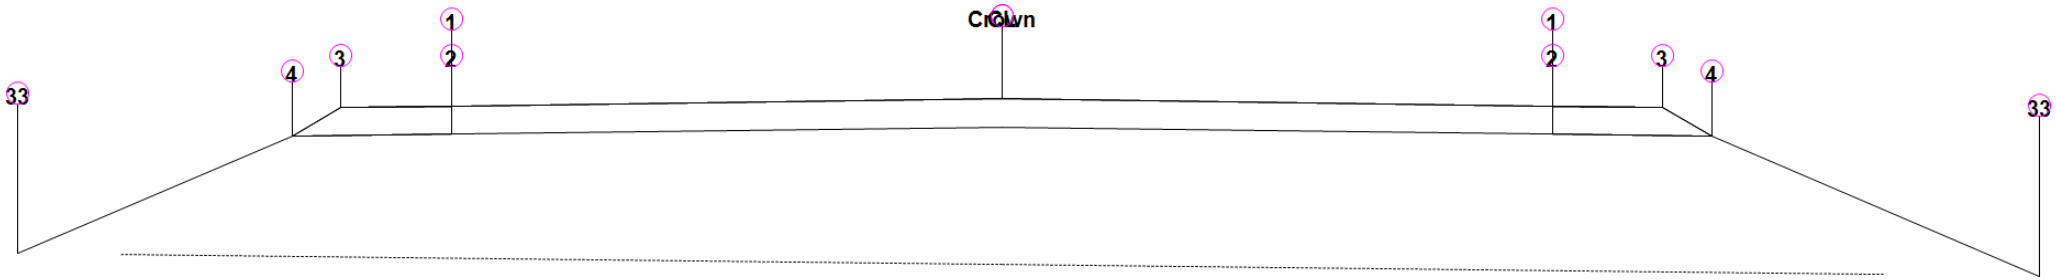

TRECHO 1

Estaca: 9+563,44

Área de Corte: 0,00m2
Área de Aterro: 6,95m2
Volume Acumulado: 2.919,91m3
Cota Projeto: 151,958m

PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO	1	2	3	4	33
	DIST	2,500	2,500	3,000	3,223	4,468
	COTA	151,908m	151,908m	151,898m	151,694m	150,863m

PLATAFORMA ACABADA LADO	PTO	1	2	3	4	33
	DIST	2,500m	2,500m	3,000m	3,223m	4,709m

DIREITO	COTA	151,908m	151,908m	151,898m	151,694m	150,703m



TRECHO 1

Estaca: 9+569,83

Área de Corte: 0,00m2
Área de Aterro: 2,74m2
Volume Acumulado: 2.888,76m3
Cota Projeto: 151,641m

PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO	1	2	3	4	33
	DIST	2,500	2,500	3,000	3,223	3,763
	COTA	151,591m	151,591m	151,581m	151,377m	151,017m

PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO	1	2	3	4	33
	DIST	2,500m	2,500m	3,000m	3,223m	3,820m
	COTA	151,591m	151,591m	151,581m	151,377m	150,979m



TRECHO 1

Estaca: 9+576,22

Área de Corte: 0,34m2
Área de Aterro: 0,00m2
Volume Acumulado: 2.881,07m3
Cota Projeto: 151,422m

PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO	1	2	3	4	33
	DIST	2,500	2,500	3,000	3,223	3,248
	COTA	151,372m	151,372m	151,362m	151,158m	151,196m

PLATAFORMA ACABADA LADO DIREITO	PTO	1	2	3	4	33
	DIST	2,500m	2,500m	3,000m	3,223m	3,284m
	COTA	151,372m	151,372m	151,362m	151,158m	151,249m



TRECHO 1

Estaca: 9+580,00

Área de Corte: 0,34m2
Área de Aterro: 0,00m2
Volume Acumulado: 2.882,34m3
Cota Projeto: 151,552m

PLATAFORMA ACABADA LADO ESQUERDO	PTO	1	2	3	4	33
	DIST	2,500	2,500	3,000	3,223	3,248
	COTA	151,502m	151,502m	151,492m	151,288m	151,326m

PLATAFORMA ACABADA LADO	PTO	1	2	3	4	33

DIREITO	DIST	2,500m	2,500m	3,000m	3,223m	3,284m
	COTA	151,502m	151,502m	151,492m	151,288m	151,379m
