


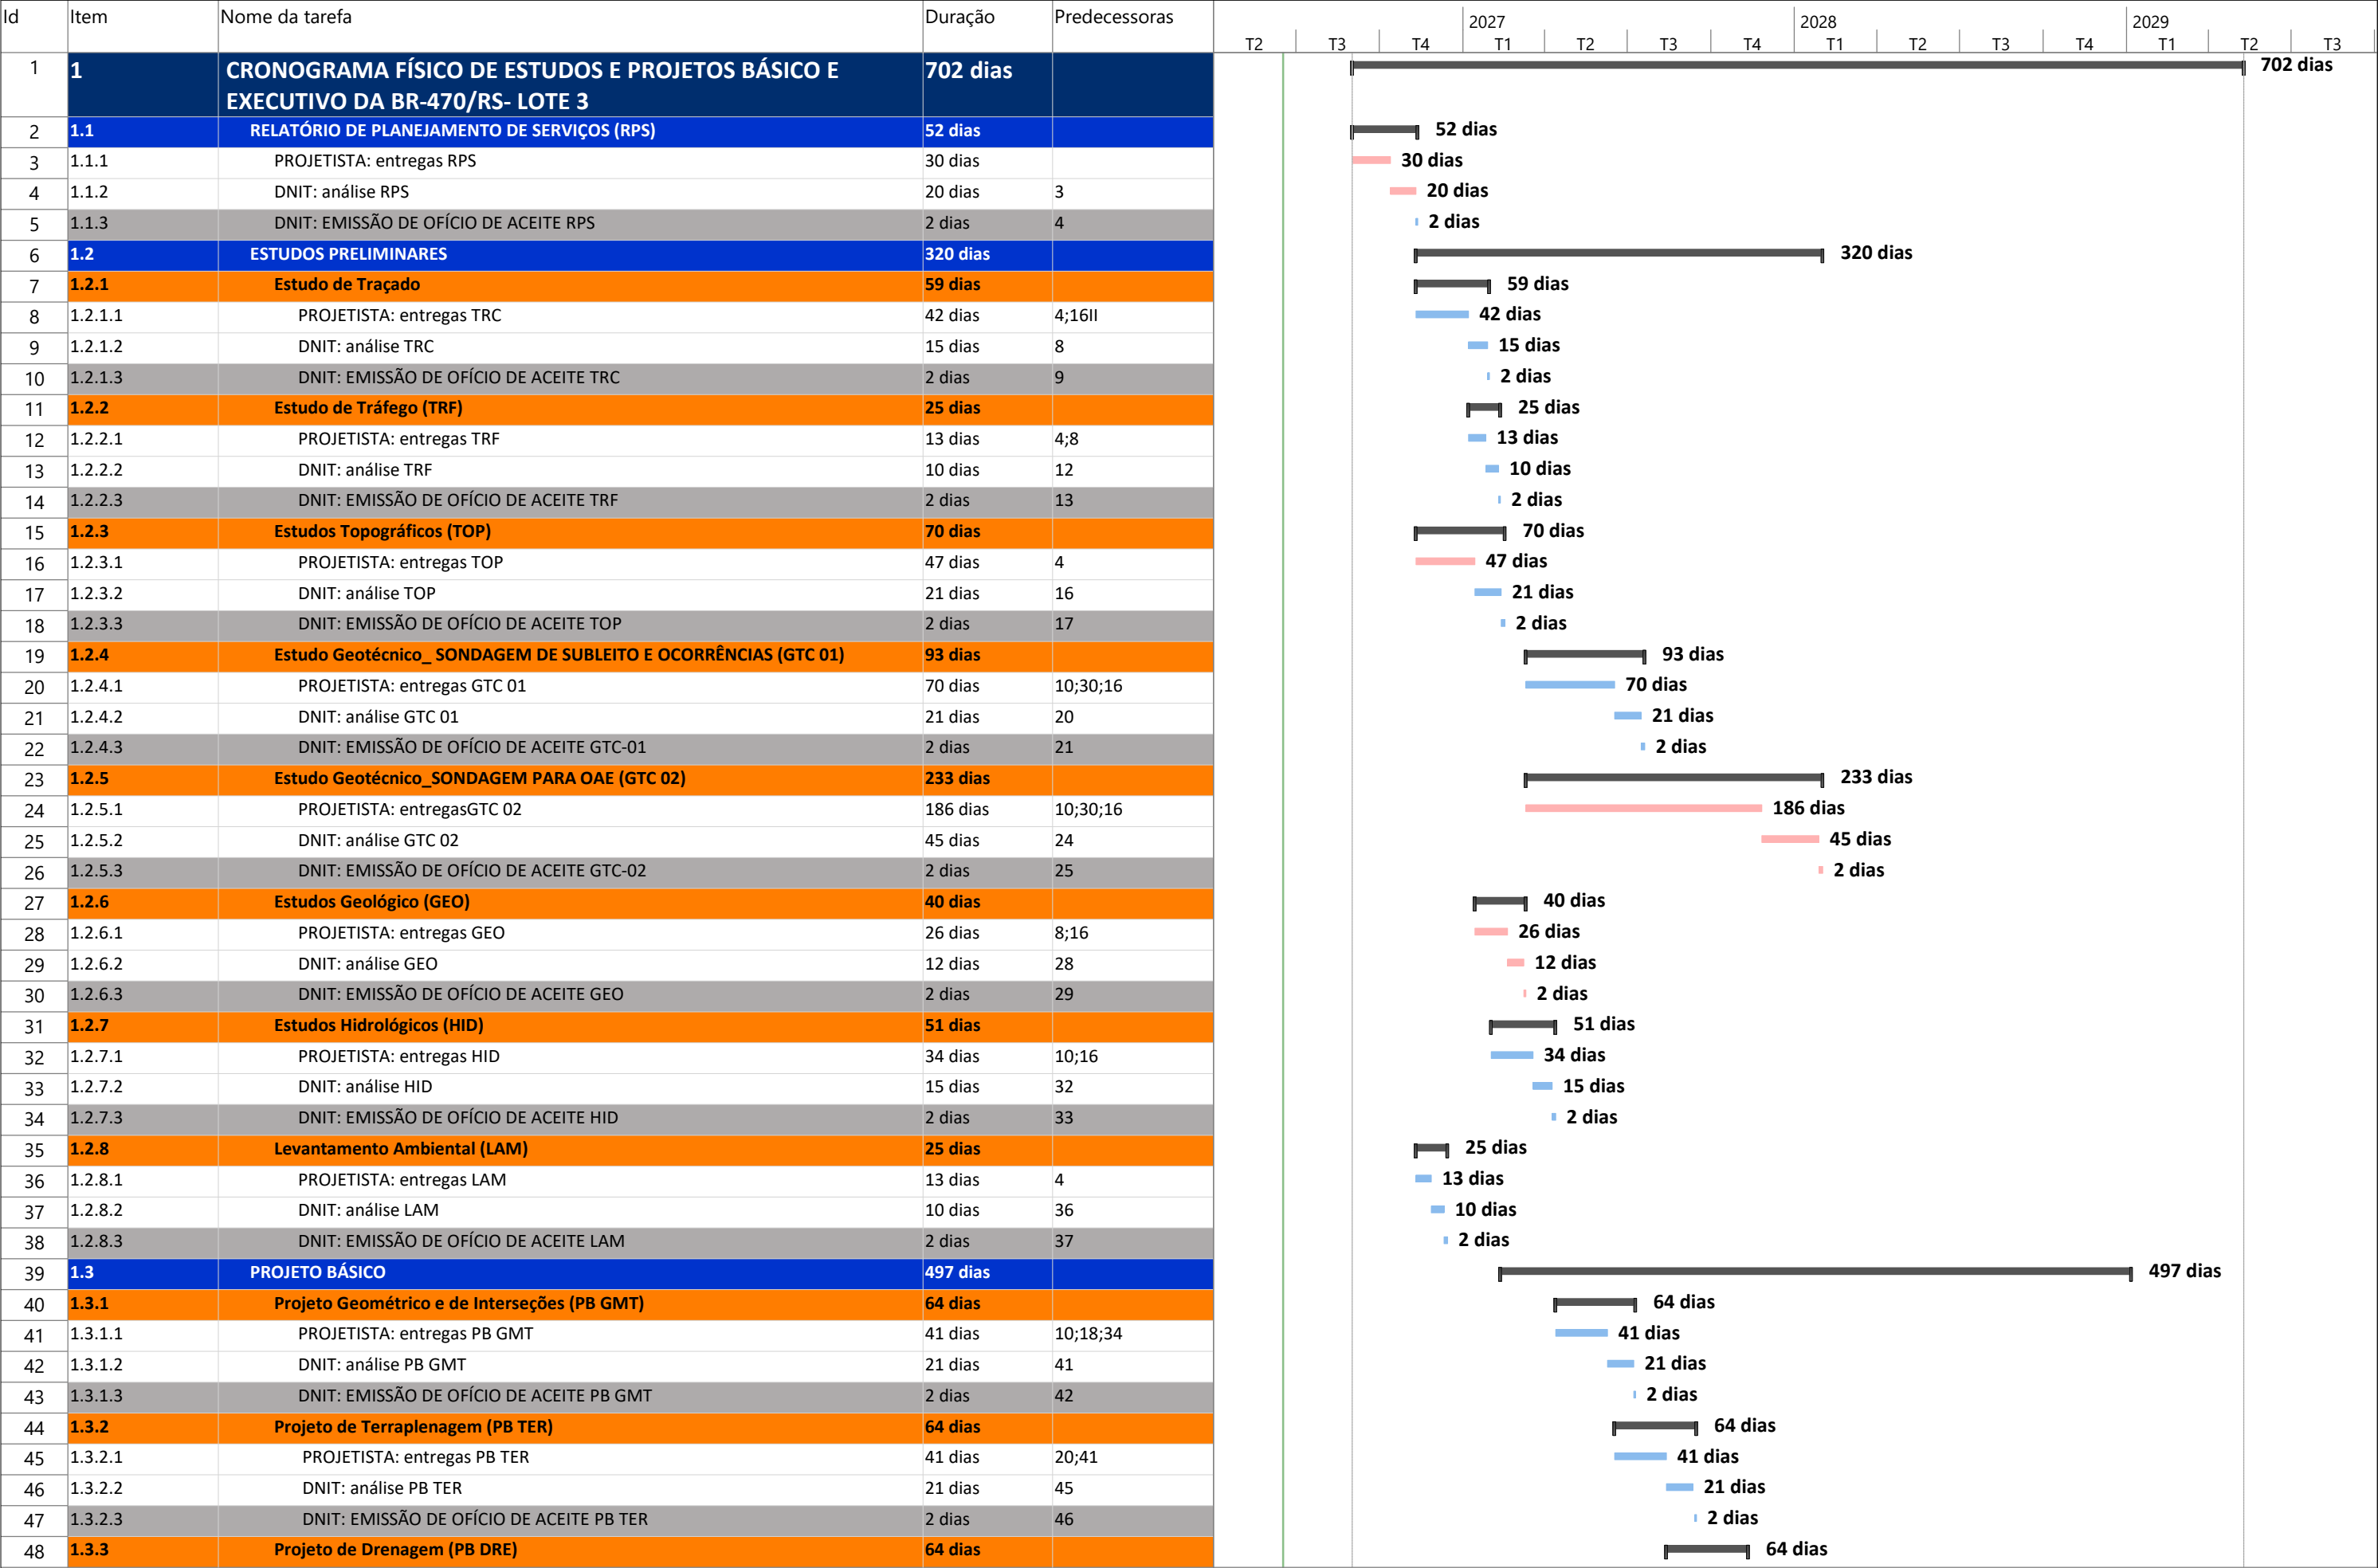

Id	Item	Nome da tarefa	Duração	Predecessoras	2027																	2028				2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
49	1.3.3.1	PROJETISTA: entregas PB DRE	41 dias	34;41;45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Id	Item	Nome da tarefa	Duração	Predecessoras					2027					2028				2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
98	1.3.15.2	DNIT: 1ª análise PB FED	0 dias	97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Id	Item	Nome da tarefa	Duração	Predecessoras				2027				2028				2029		
					T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3
147	1.4.12.2	DNIT: análise PE ILU	12 dias	146														
148	1.4.12.3	DNIT: EMISSÃO DE OFÍCIO DE ACEITE PE ILU	2 dias	147														
149	1.4.13	Orçamento e Plano de Execução de Obra (PE ORC)	54 dias															
150	1.4.13.1	PROJETISTA: entregas PE ORC	31 dias	102TI+20 dias;106TI														
151	1.4.13.2	DNIT: análise PE ORC	21 dias	150														
152	1.4.13.3	DNIT: EMISSÃO DE OFÍCIO DE ACEITE PE ORC	2 dias	151														
153	1.4.14	Modelo Federado (PE FED)	0 dias															
154	1.4.14.1	PROJETISTA: 1ª entrega PE FED	0 dias	129TT														
155	1.4.14.2	DNIT: 1ª análise PE FED	0 dias	154														
156	1.4.14.3	DNIT: EMISSÃO DE OFÍCIO DE ACEITE PE FED	0 dias	155														

12 dias

2 dias

54 dias

31 dias

21 dias

2 dias

14/06

14/06

14/06

14/06
