


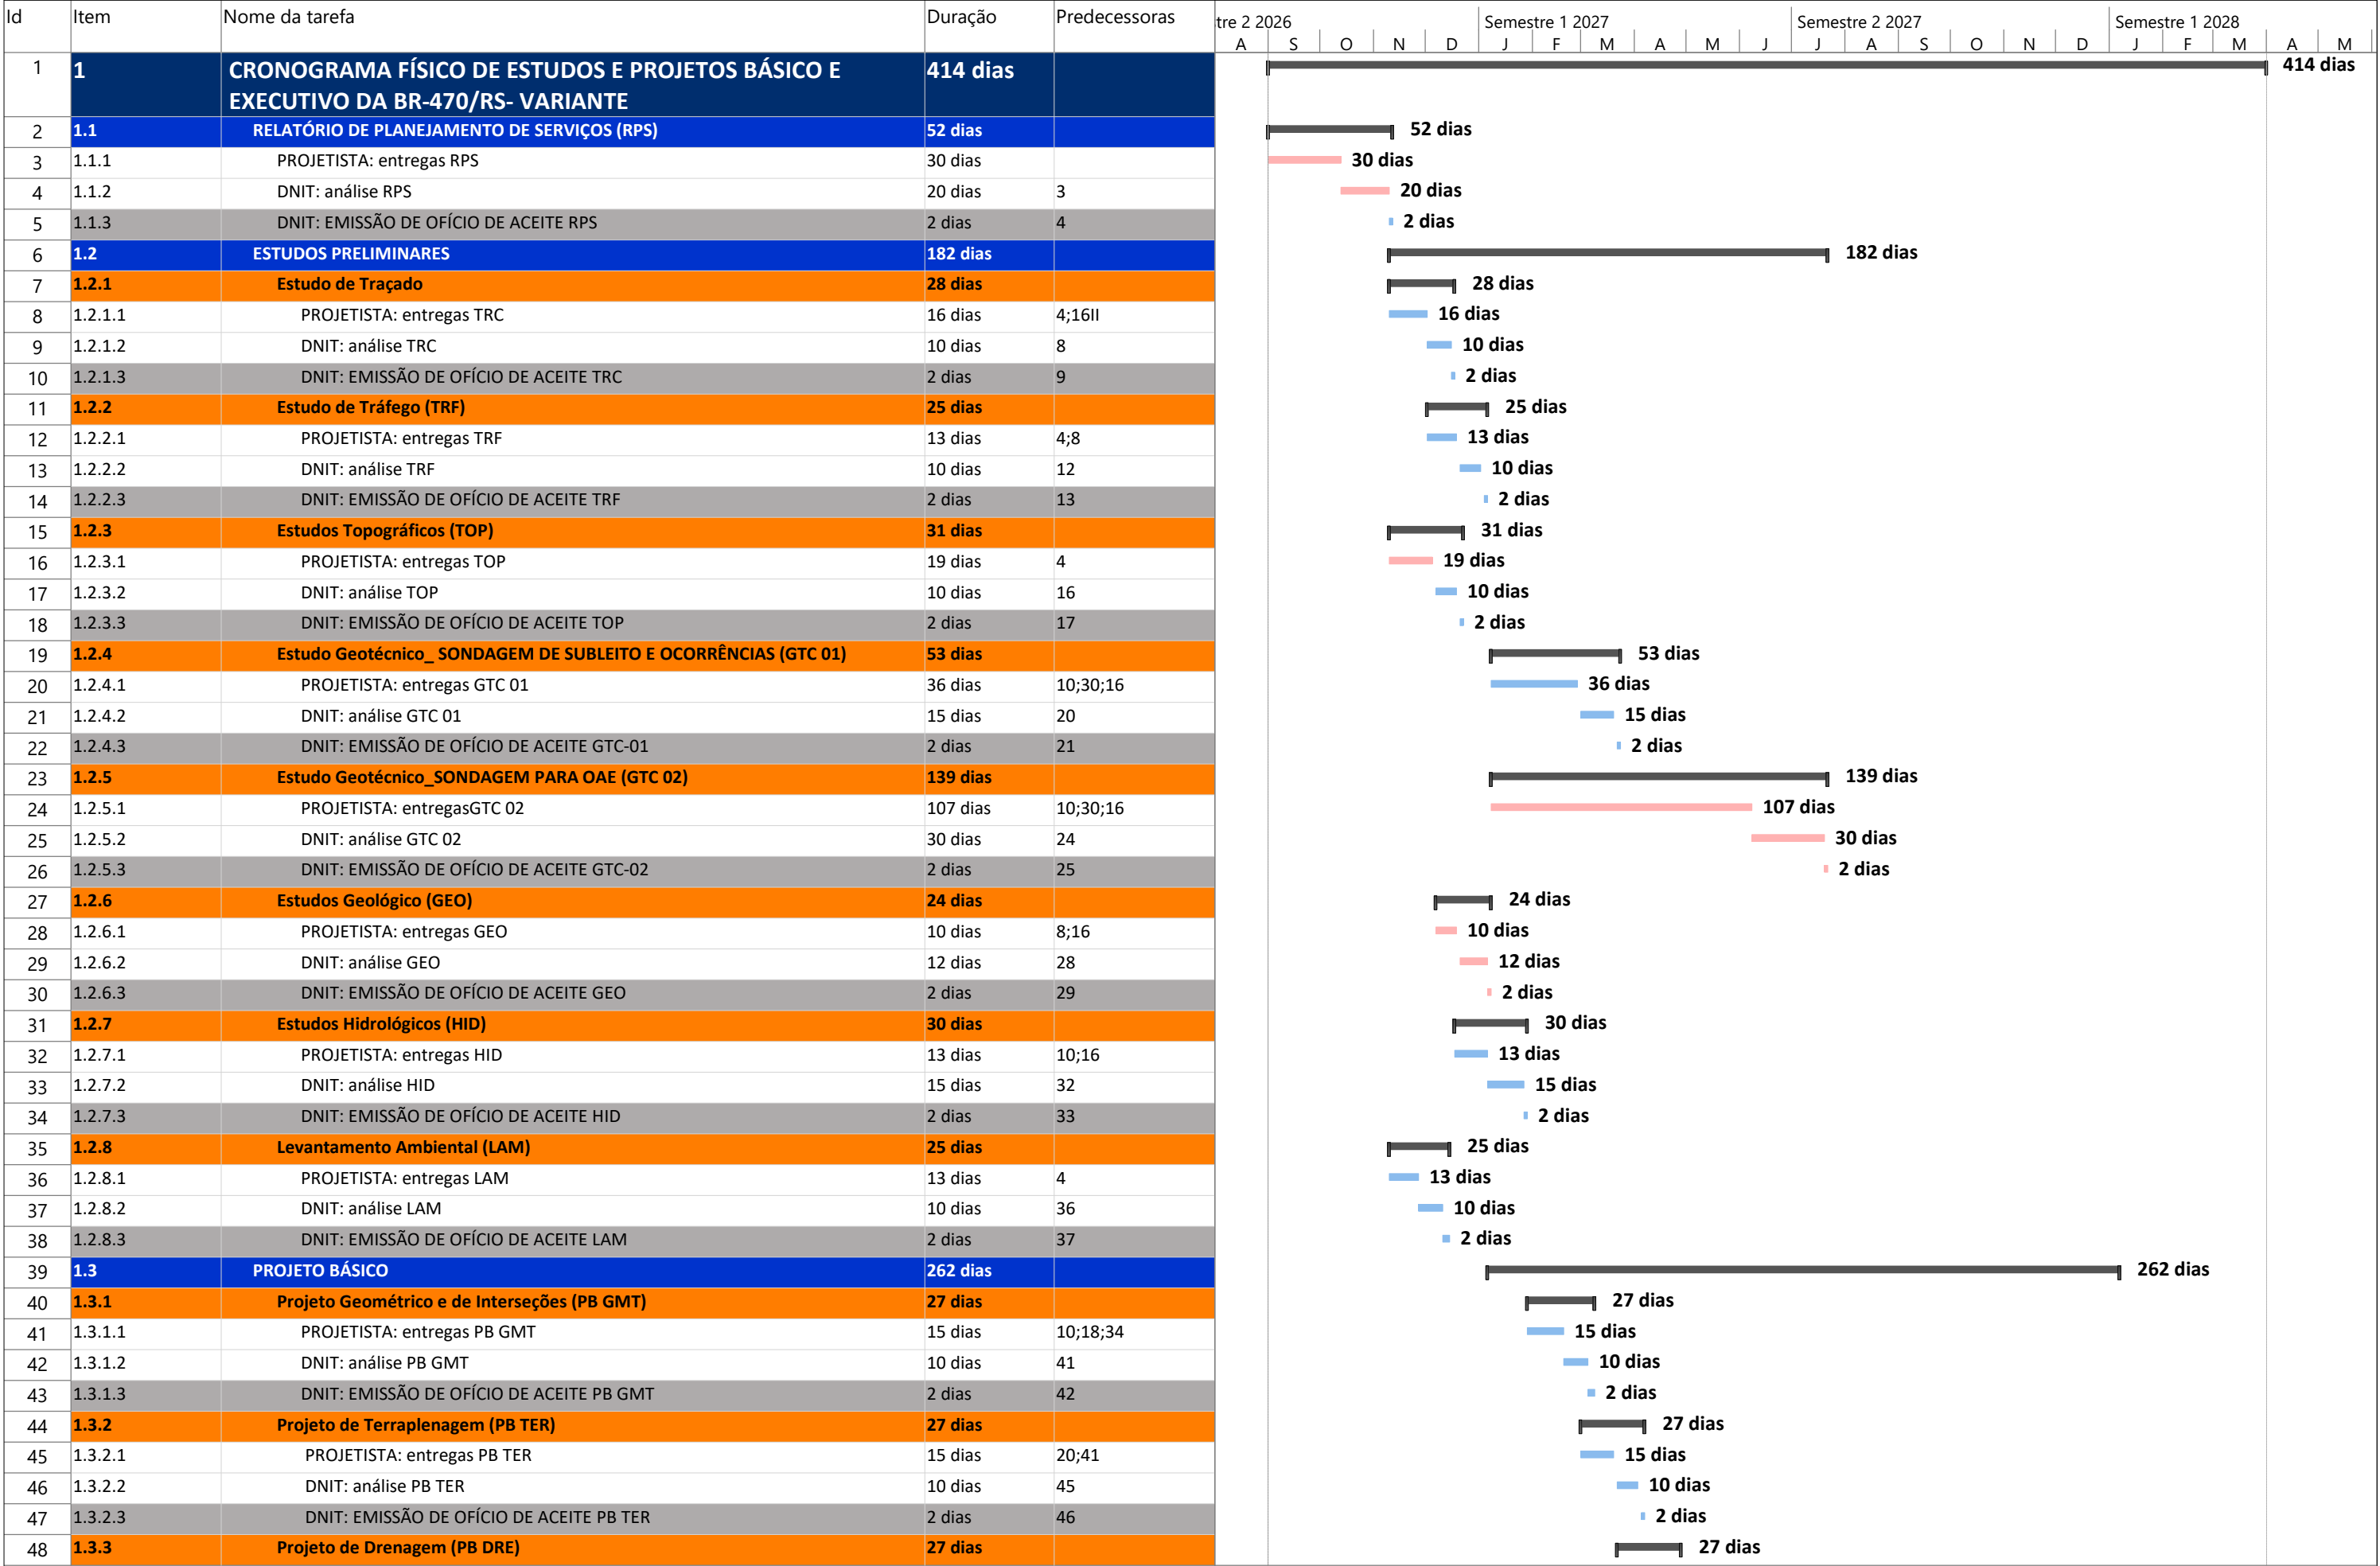

[illegible]

Id	Item	Nome da tarefa	Duração	Predecessoras	Semestre 2 2026					Semestre 1 2027					Semestre 2 2027					Semestre 1 2028								
					A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M		
147	1.4.12.2	DNIT: análise PE ILU	10 dias	146																							 10 dias	
148	1.4.12.3	DNIT: EMISSÃO DE OFÍCIO DE ACEITE PE ILU	2 dias	147		 2 dias																						
149	1.4.13	Orçamento e Plano de Execução de Obra (PE ORC)	24 dias			 24 dias																						
150	1.4.13.1	PROJETISTA: entregas PE ORC	12 dias	102TI+20 dias;106TI		 12 dias																						
151	1.4.13.2	DNIT: análise PE ORC	10 dias	150		 10 dias																						
152	1.4.13.3	DNIT: EMISSÃO DE OFÍCIO DE ACEITE PE ORC	2 dias	151		 2 dias																						
153	1.4.14	Modelo Federado (PE FED)	0 dias																									
154	1.4.14.1	PROJETISTA: 1ª entrega PE FED	0 dias	129TT																								
155	1.4.14.2	DNIT: 1ª análise PE FED	0 dias	154																								
156	1.4.14.3	DNIT: EMISSÃO DE OFÍCIO DE ACEITE PE FED	0 dias	155																								

10 dias

2 dias

24 dias

12 dias

10 dias

2 dias

21/07

21/07

21/07

21/07
