



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP Nº 125/2025/SAOR/SINFRA-MT

Processo Administrativo nº: SINFRA-PRO-2025/22004

Órgão: SAOR/SINFRA-MT

Número da Unidade Orçamentária: 25101

Unidade Administrativa Demandante: Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias (SAOR)

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar a melhor solução para supri-la no mercado, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

I. OBJETO DO ESTUDO E ESPECIFICAÇÕES GERAIS

O objeto do estudo destina-se a Contratação de empresa de engenharia para a execução da obra de Construção da Ponte de Concreto Pré-Moldado Protendido sobre o Rio Roosevelt (PT02657), localizada na Rodovia MT-313, dimensionada em 330,60 m e largura de 8,80m, localizada nos municípios de Aripuanã/MT e Rondonândia/MT.

II.1. LOCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL

A obra de construção da ponte sobre Rio Roosevelt (PT02657), localiza-se na Rodovia MT-313; sob as seguintes Coordenadas: Latitude 10º 21' 55.44" S; Longitude 60º 36' 20,52" O, nos municípios de Aripuanã/MT e Rondonândia/MT.

Vide Mapa de Situação – item 7.1.

II.2. NATUREZA E FINALIDADE DO OBJETO CONTRATUAL

A ponte será de concreto armado e protendido, de modo a propiciar a diminuição do tempo de viagem e depreciação do veículo, melhorará o sistema de segurança e conforto do usuário.

Levando-se em conta os aspectos da construção de ponte em concreto armado com vigas longarinas em pré-moldado protendido, vislumbra-se a sua caracterização como **obra comum de engenharia** visto que: i) os serviços a serem executados não são dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito; ii) existem contratações similares feita pela Administração Pública, em execução

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



HASH: 3d34da5c8a4c145588c8840e590ab6703716470b41a177090e57319c0213b7. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquilicoes.sapiag.mt.gov.br/lowbee-pub/#validar/88LLFFFO-5TRP-UBST. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em: 28/04/2026, GABRIEL CEZAR ALMEIDA MIRANDA DE CARVALHO em: 28/04/2026, STILLLAC VAZ DE CAMPOS em: 28/04/2026, Jumaado em: 28/04/2026 14:10:00 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202639254A



**Governo do Estado de Mato Grosso****SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística**

ou concluídas; iii) os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura são frequentemente empregados; iv) os padrões de desempenho e qualidade são aferidos através de especificações técnicas usuais (entre estas destaca-se as elaboradas pelo DNIT); v) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatório.

II. CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO SIGILO DESTE DOCUMENTO

As informações contidas no presente estudo poderão estar disponíveis para qualquer interessado, pois não se caracterizam como sigilosas na forma da Lei nº 12.527/2011.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A necessidade da construção de ponte de concreto, no trecho da rodovia em questão é garantir condições adequadas de trafegabilidade, proporcionando fluidez, segurança viária e conforto dos usuários. A implantação da ponte beneficiará diretamente a população dos municípios de Aripuanã/MT e Rondolândia/MT e adjacências, promovendo o desenvolvimento regional, redução de custos de transporte e a melhoria na qualidade de vida dos usuários.

2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

A atual contratação está alinhada com o Planejamento da Administração e está inserido no Plano de Contratações Anual 2026, no item 5110 – Construções de pontes de concreto, conforme link: <https://pncp.gov.br/app/pca/57356434000146/2026/1>.

Também importa informar que a contratação pretendida está também alinhada com o “Programa Mais MT”. Este programa foi lançado pelo Governo do Estado de Mato Grosso em 28 de outubro de 2020 e regulamentado através do Decreto nº 829 em 22 de fevereiro de 2021.

O “Mais MT” se trata de um amplo programa de investimentos públicos em obras e ações que objetivam atender todas as regiões do Estado de Mato Grosso, proporcionando melhor qualidade de vida aos mato-grossenses, além de gerar emprego e renda.

O eixo de infraestrutura é o que concentra o maior volume de investimentos do Programa Mais MT no Estado e compreende:

- I. Melhorar a malha rodoviária estadual, com novas pavimentações, restauração e conservação de rodovias;
- II. Construir pontes de concreto de pequeno, médio e grande porte;
- III. Promover a concessão de 2.000km (dois mil quilômetros) de rodovias estaduais;

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



HASH: 3d34da5c8e4c145588c8840e590ab6703716470b41a177080a57319c0213b7. Documento assinado digitalmente, valide em <https://equicoes.sapiag.mt.gov.br/filowbee-pub/#/validar/88LLFF5FO-5TRP-UBST>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em: 28/04/2026, GABRIEL CEZAR ALMEIDA MIRANDA DE CARVALHO em: 28/04/2026, STILLIAC VAZ DE CAMPOS em: 28/04/2026, Jumaado em: 28/04/2026 14:10:00 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP2026392544





Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

- IV. Implantar o Programa Mato Grosso Iluminado com o auxílio dos municípios, para adequar a iluminação pública em LED;
- V. Melhorar a infraestrutura dos aeroportos do Estado de Mato Grosso.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os serviços serão prestados por empresa de engenharia, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referência.

O objeto a ser contratado possui escopo predefinido, com prazo de execução previsto em cronograma físico financeiro, estabelecido no projeto executivo.

Os requisitos abaixo foram cuidadosamente avaliados, não havendo especificações capazes de macular o caráter competitivo da seleção.

2.1. Requisitos técnicos da contratação

Para correta execução do objeto devem ser observados os seguintes requisitos:

- a) A ponte a ser executada deverá abraçar as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificações técnicas;
- b) A metodologia executiva a ser adotada deverá estar em conformidade com as normas técnicas vigentes;
- c) A definição do orçamento e do prazo de execução da obra estão delineados na planilha orçamentária e no cronograma físico-financeiro 480 (quatrocentos e oitenta) dias, visualizados no projeto executivo, Volume 4 - Orçamento;
- d) Deverá ser apresentado comprovação de aptidão técnica, consistente, pela apresentação de uma ou mais certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução de obra ou serviço com características similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnico Profissional;
- e) Deverá ser apresentado, por parte da contratada, Atestado de Capacidade Técnico Operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com características similares ao objeto a ser contratado;
- f) A avaliação técnica profissional e técnica operacional descritos abaixo foram definidos em observância à Instrução Normativa (IN) nº 108/MT de 01/02/2008 e, na Instrução Normativa nº 58/DNIT/SEDE de 17/09/2021, conforme segue:

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



HASH: 3d34da5c8a4c145588c8840e590ab6703716470b41a177080a57319c0213b7. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aqueicoes.scpag.mt.gov.br/lowbee-pub/#validar/88LLFFQO5TRPUBST>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em: 28/04/2026, GABRIEL CEZAR ALMEIDA MIRANDA DE CARVALHO em: 28/04/2026, STILAC VAZ DE CAMPOS em: 28/04/2026, Jumaado em: 28/04/2026 14:10:00 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202639254A





Govorno do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

- Para efeito de Capacidade Técnico Profissional, serão exigidos itens de obras / serviços idênticos àqueles pontuados para a Capacidade Técnico Operacional, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos (IN nº 58/DNIT/SEDE, Art. 2º).
- A exigência de Capacidade Técnica Operacional se restringe:
 - I) Ao item de maior relevância global (são aqueles que constituem o escopo da licitação, representando o “objeto final licitado” ou a “obra em sua totalidade”, tais com a “extensão total pavimentada” e “comprimento de OAE e vão livre mínimo” - IN nº 58/DNIT/SEDE, Art. 4º § 1º);
 - II) Aos itens de maior relevância técnica e financeira contidas no objeto a ser licitado (curva ABC), em número máximo de 8 (oito) itens, e não superior a 50% (cinquenta por cento) das quantidades licitadas para o serviço específico (IN nº 58/DNIT/SEDE, Art. 4º e IN nº 108/MT, Art. 1º). Os itens de serviço de maior relevância técnica e financeira são aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento) do orçamento total do objeto (IN nº 58/DNIT/SEDE, Art. 4º, § 2º e IN nº 108/MT, Art.2º).
- É vedado o somatório de atestados, para o atendimento dos itens de “maior relevância global” (vide Art. 5º da IN 58/2021/DNIT).
 - ✓ Esta restrição, para “maior relevância global”, se justifica: De acordo com o Acordão nº 2.760/2012 - Plenário, “quando o aumento de quantitativos do serviço acarretar, incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do objeto ou uma desproporção entre as quantidades e prazos para a sua execução, capazes de ensejar maior capacidade operativa e gerencial da licitante e de potencial comprometimento acerca da qualidade ou da finalidade almejada na contratação da obra ou serviço”.
 - ✓ Tome-se como exemplo a construção de uma ponte. A expertise técnica necessária para construir uma ponte de 1.000m não é a mesma de uma ponte de 100 metros. De nada adianta a empresa provar que já construiu 100 pontes de 10 metros cada: ainda que, no total, representem a mesma extensão, não significa que possui a competência necessária para construir uma única ponte de 1.000m.
Daí a finalidade da vedação ao somatório de atestados: a empresa deverá provar já ter executado os serviços de maior dimensão numa única contratação, e não por meio de diversas contratações separadas.
Já decidiu o TCU: “Nesse contexto, entendeu a medida razoável pois, em vista da complexidade e do ineditismo dos estudos a serem exigidos do vencedor da licitação, a soma da execução de vários pequenos serviços, de baixa complexidade e valores, não

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



HASH: 3d34da5e8e4c145588c8840e590ab6703716470b41a177080a57319c0213b7. Documento assinado digitalmente, valide em <https://equicoes.sapiag.mt.gov.br/lowbee-pub/#validar/88LLFFO-5TRP-U8ST>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em: 28/04/2026, GABRIEL CEZAR ALMEIDA MIRANDA DE CARVALHO em: 28/04/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em: 28/04/2026, Jumaado em: 28/04/2026. 14:10:00 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202639254A





Gov. do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
comprovaria que o licitante possui a experiência necessária para bem cumprir o objeto da licitação.” (Acórdão n. 2.032/2020 – Plenário).

• **Exigência de Capacidade Técnica Operacional;**

Item I - Maior relevância global mínimo a ser comprovada:
Comprimento da OAE (Ponte sobre o Rio Roosevelt) = 330,60 m;
Comprimento mínimo da OAE a ser comprovado = 165,30 m
Maior vão livre da OAE entre pilares = 30,00 m
Vão livre da OAE mínimo entre pilares a ser comprovado = 15,00 m

Item II – Parcelas de maior relevância técnica a ser comprovada:

Parcelas de Maior Relevância Técnica					
Item	Serviço	Unid.	Quantitativo orçado	Quantitativo a ser comprovado	Relevância
01	Armação em aço CA-50 – fornecimento, preparo e colocação	kg	343.801,40	171.900,70	16,65%
02	Concreto estrutural confecção e lançamento (fck= 25MPa, 30MPa, 40MPa)	m³	2.482,11	1.241,06	7,29 %
03	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm	m²	14.779,74	7.389,87	6,22%
04	Estaca raiz perfurada na rocha – confecção	m	1.072,60	536,30	6,04%
05	Escoramento suspenso com madeira de OAE	m³	1.969,55	984,775	5,46%

Considerando que as parcelas de maior relevância técnica da presente contratação correspondem às atividades estruturais que compõem o núcleo principal do objeto, não será admitida a comprovação de qualificação técnica por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, nos termos do art. 67, §9º, da Lei nº 14.133/2021.

A vedação justifica-se pelo fato de que tais atividades demandam comprovação direta da capacidade técnico-operacional da licitante, sendo imprescindível que a empresa responsável pela execução do contrato possua experiência comprovada na realização dessas parcelas, de modo a assegurar a adequada execução do objeto e a mitigação de riscos técnicos inerentes à obra.

2.2. Requisitos de sustentabilidade

A empresa contratada deverá utilizar na execução das obras as boas práticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-se, dentre outros, os critérios ambientais indicados abaixo:

- Uso produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações da ANVISA.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



HASH: 3d34da5e8e4c145588c8840e590ab6703716470b41a177080a57319c0213b7. Documento assinado digitalmente, valide em https://auicoices.sapiag.mt.gov.br/lowbee-pub/#validar/88LLFF5FO-5TRP-U8ST. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em: 28/04/2026, GABRIEL CEZAR ALMEIDA MIRANDA DE CARVALHO em: 28/04/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em: 28/04/2026, Jumiado em: 28/04/2026 14:10:00 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202639254A





Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

- Implementação de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia elétrica e água, bem como redução de resíduos sólidos.
- Sempre que possível, fazer uso de energia renovável.
- Classificação e destinação adequada dos resíduos recicláveis produzidos durante a execução dos serviços. Especificamente para papéis e latas de alumínio deve-se contatar as Associações e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais recicláveis.
- Práticas de redução de consumo de papel, utilizando o padrão frente-verso na impressão de relatórios e outros documentos, bem como utilize a fonte ecológica recomendada pela Advocacia Geral de União, disponível no endereço eletrônico: www.agu.gov.br/econfont.
- Adoção de uso preferencialmente de papel não clorado na impressão de documentos e relatórios.
- Adoção de práticas de substituição de copos descartáveis por copos definitivos.
- Adoção de prática de destinação final das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo a Resolução CONAMA Nº 257/1999.
- Atendimento aos padrões indicados pela Resolução CONAMA Nº 20/1994 quando da aquisição e utilização de equipamentos de limpeza que gerem ruídos em seu funcionamento.
- Adoção e promoção de medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de proteção individuais – EPI's necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades.
- Consideração nas pesquisas de preços para aquisições e serviços contemplados no escopo da contratação, empresas que tenham certificação ambiental.
- Estímulo à troca de informações entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou virtuais.

2.3. Requisitos normativos que disciplinam os serviços a serem contratados

- a) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
- b) Decreto Estadual nº 1.525/2022 – Regulamenta a Lei nº 14.133/2021, no âmbito da Administração Pública estadual direta, autárquica e fundacional do Estado de Mato Grosso;
- c) Normas da ABNT, Especificações de Serviço e Normas do DNIT, e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais.
- d) Instrução Normativa nº 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



HASH: 3d34da5e8e4c145588e8840e590ab6703716470b41a177080a57319c0213b7. Documento assinado digitalmente, valide em <https://equicoes.sapiag.mt.gov.br/lowbee-pub/#/validar/88LLFFFO-5TRP-U8ST>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 28/04/2026, GABRIEL CEZAR ALMEIDA MIRANDA DE CARVALHO em 28/04/2026, STILLIAC VAZ DE CAMPOS em 28/04/2026, Jumiado em 28/04/2026, 14:10:00 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202639254A





Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

- e) Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Os quantitativos dos serviços correlacionados ao objeto a ser licitado estão detalhados em Projeto Executivo, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra pretendida, possibilitando a elaboração dos custos, em conformidade com as Normas, Procedimentos, Instruções e Especificações de Serviços e, Manuais Técnicos em vigor do DNIT e normas técnicas da ABNT.

Os serviços, especificações, quantidades, propostos para construção da ponte em questão, podem ser observados no Projeto Executivo “Volume Único”.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

O Estado de Mato Grosso possui extensa malha rodoviária estadual, caracterizada por longas distâncias, elevado fluxo de veículos de carga e contínuo processo de implantação, pavimentação e adequação de rodovias. Nesse contexto, a existência de pontes de madeira, muitas delas já em avançado estado de degradação, representa fator limitante à segurança viária, à fluidez do tráfego e ao desenvolvimento regional.

A SINFRA/MT vem adotando, de forma sistemática, soluções estruturais definitivas e padronizadas, compatíveis com o aumento da demanda de tráfego e com a capacidade técnica do mercado regional, priorizando obras com maior durabilidade, menor necessidade de manutenção e maior confiabilidade operacional.

O mercado de obras de infraestrutura no Estado apresenta ampla disponibilidade de empresas qualificadas para execução de pontes em concreto, com domínio técnico consolidado, utilização de métodos construtivos usuais e observância às normas técnicas do DNIT e da ABNT.

5.1 Análise técnica das alternativas avaliadas

Foram consideradas as principais alternativas técnicas conhecidas para atendimento da necessidade de transposição do curso d’água, avaliadas sob os aspectos de segurança, trafegabilidade, durabilidade, economicidade no ciclo de vida e compatibilidade com a realidade estadual, a saber:

- Recuperação ou reforço da ponte de madeira existente – analisada e descartada por não representar solução definitiva para os problemas identificados, visto que não elimina as

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



HASH: 3d34da5c8e4c145588c8840e590ab6703716470b41a177080a57319c0213b7. Documento assinado digitalmente, valide em https://equicoes.simplag.mt.gov.br/lowbee-pub/#/validar/88LLFFQO5TRPUBST. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em: 28/04/2026, GABRIEL CEZAR ALMEIDA MIRANDA DE CARVALHO em: 28/04/2026, STILAC VAZ DE CAMPOS em: 28/04/2026, Jumiado em: 28/04/2026 14:10:00 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRA/MT/202639254A





Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

limitações estruturais relativas à capacidade de carga, à largura da plataforma e às condições de segurança, além de demandar manutenções periódicas e frequentes. Considerando as distâncias, a dificuldade de obtenção de materiais adequados e a necessidade recorrente de mobilização de equipes, essa solução resultaria em custos continuados e risco de interrupções na trafegabilidade, contrariando os princípios da eficiência, economicidade e planejamento de longo prazo.

- Substituição por ponte mista (madeira/concreto ou aço/concreto) – embora tecnicamente possível, mostrou-se incompatível com a realidade do Estado. Trata-se de solução que demanda maior complexidade construtiva, mão de obra especializada e domínio técnico específico. Tal cenário pode comprometer a competitividade do certame, elevar riscos contratuais e dificultar a manutenção futura da estrutura, não se mostrando vantajosa sob os aspectos técnico, econômico e operacional.
- Adoção de soluções modulares ou provisórias - foram avaliadas e descartadas por apresentarem caráter temporário e limitações estruturais, não sendo compatíveis com rodovias estaduais em processo de expansão, pavimentação e aumento do volume de tráfego. A adoção desse tipo de solução poderia implicar a necessidade de futura substituição por estrutura definitiva, gerando duplicidade de investimentos e afrontando o princípio da eficiência administrativa.

5.2. Fundamentação da escolha adotada – Ponte de concreto

Com base em estudos hidrológicos, verificou-se que as soluções definitivas tecnicamente adequadas para a transposição do curso d'água são a implantação de ponte de concreto armado e protendido. Essa solução apresenta-se como mais adequada, por se tratar de tecnologia amplamente consolidada, normatizada, com elevada durabilidade, menor necessidade de manutenção e plena capacidade de atendimento ao tráfego atual e futuro da rodovia.

A solução técnica adotada consiste na implantação de ponte em concreto armado e protendido, tecnologia amplamente consolidada e padronizada no âmbito da Administração Pública, utilizada de forma reiterada pela SINFRA/MT em obras similares, bem como por órgãos federais e estaduais de infraestrutura rodoviária, encontrando-se integralmente normatizada pelo DNIT e ABNT.

A escolha da solução observa critérios técnicos objetivos, alinhados ao planejamento estratégico do Estado de Mato Grosso, garantindo segurança viária, trafegabilidade contínua e suporte ao desenvolvimento socioeconômico regional, atendendo de forma definitiva à necessidade pública

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



HASH: 3d34da5e8e4c145588c8840e590ab6703716470b41a177090a57319c0213b7. Documento assinado digitalmente, valide em <https://equicoes.seplag.mt.gov.br/lowbee-pub/#validar/88LLFFQO5TRPUBST>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em: 28/04/2026, GABRIEL CEZAR ALMEIDA MIRANDA DE CARVALHO em: 28/04/2026, STILAC VAZ DE CAMPOS em: 28/04/2026, Jumaado em: 28/04/2026 14:10:00 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202639254A





Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

identificada. Ressalta-se que a solução adotada se encontra alinhada ao Plano de Contratação Anual e ao Programa Mais MT.

5.3. Diretrizes para a contratação

A presente contratação adotará como regime de execução a **empreitada por preço unitário** (art. 6º, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021), e se justifica por se tratar de uma obra rodoviária, onde estão previstos serviços como: estaca raiz, pilares e travessas de apoio em concreto armado, longarinas com vigas pré-moldadas – cujos quantitativos embora definidos em projeto executivo, estão sujeitos a variações decorrentes de condições geotécnicas e hidráulicas identificadas durante a execução.

A empreitada por preço unitário mostra-se mais adequada por permitir o efetivo controle das medições pela fiscalização, assegurando que os pagamentos ocorram exclusivamente em função dos serviços efetivamente executados, mensurados por unidade de medida, mitigando riscos de desequilíbrio econômico-financeiro e resguardando o interesse público. Esse regime confere maior transparência e segurança jurídica na eventual necessidade de ajustes quantitativos, sem comprometer o planejamento da contratação ou impor ônus indevido ao erário.

A modalidade de licitação adotada será a **Concorrência Eletrônica**, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. A escolha fundamenta-se no enquadramento do objeto como obra de engenharia, no valor estimado da contratação e na necessidade de assegurar ampla competitividade, considerando a existência de mercado consolidado de empresas aptas à execução desse tipo de obra.

O critério de julgamento da licitação será o de **Menor Preço**.

5.4. Audiência ou consulta pública

Não foi realizada audiência pública para a presente contratação, tendo em vista que o objeto não configura alteração significativa de traçado ou implantação de nova diretriz viária, mas sim a melhoria de infraestrutura já consolidada.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Os quantitativos, delineado em projeto, foram determinados pelo levantamento dos serviços, realizados de acordo com o Projeto Executivo. Os preços unitários adotados, foram os do DNIT / SICRO. As especificações dos serviços, conforme Projeto, obedecerão às normativas do DNIT. O orçamento foi elaborado baseado nas normativas vigentes da SINFRA e DNIT. O Resumo dos Preços está estabelecido no quadro visualizado a seguir:

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



HASH: 3d34da5c8e4c145588c8840e590ab6703716470b41a177080a57319c0213b7. Documento assinado digitalmente, valide em https://equicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/88LLFF5FO-5TRP-U8ST. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em: 28/04/2026, GABRIEL CEZAR ALMEIDA MIRANDA DE CARVALHO em: 28/04/2026, STILLIAC VAZ DE CAMPOS em: 28/04/2026, LUMADO em: 28/04/2026, JUMADO em: 28/04/2026, STHEFANY ANDRADE.



SINFRA/PRO-2025/22004





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

		CONSÓRCIO FCK/PROJECTA		QUADRO RESUMO	
Obra: Ponte de concreto pré-moldado e protendido Rodovia: MT-313 Local: Rio Roosevelt - PT02657 Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã) Extensão: 330,60 m Largura: 8,8 m		Referência: Tabela SICRO/MT (abril/2025) BDI com desoneração= 30,57% BDI sem desoneração= 25,50%			
Ítem	Descrição	Pr. Unit. com deson	%	Pr. Unit. sem deson	%
I	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PROTENDIDO				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	568.364,22	1,75%	550.524,46	1,72%
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.936.364,00	5,95%	1.875.620,00	5,87%
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.337.810,00	7,18%	2.411.365,00	7,54%
4.0	INFRAESTRUTURA	6.930.668,11	21,29%	6.795.323,51	21,26%
5.0	MESOESTRUTURA	1.687.735,31	5,19%	1.667.437,89	5,22%
6.0	SUPERESTRUTURA	11.162.475,31	34,30%	10.984.768,42	34,36%
7.0	ACABAMENTO	124.111,61	0,38%	121.196,33	0,38%
8.0	SINALIZAÇÕES	8.644,24	0,03%	8.386,28	0,03%
9.0	DEMOLIÇÃO DA PONTE DE MADEIRA	178.057,75	0,55%	180.607,14	0,56%
10.0	PASSAGEM DE FAUNA	40.053,75	0,12%	39.392,37	0,12%
11.0	TRANSPORTE	4.904.752,02	15,07%	4.742.420,56	14,83%
II	ENCABEÇAMENTO DA PONTE				
1.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 1.182.205,47	3,63%	R\$ 1.150.735,86	3,60%
2.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 227.657,34	0,70%	R\$ 220.825,77	0,69%
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 350.969,76	1,08%	R\$ 340.773,13	1,07%
4.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 49.205,60	0,15%	R\$ 48.274,29	0,15%
5.0	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 287.894,75	0,88%	R\$ 278.535,77	0,87%
6.0	CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - PAISAGISMO	R\$ 570.145,98	1,75%	R\$ 552.063,17	1,73%
Área total da ponte		330,6 x 8,8 = 2909,28 m ²			
Preço total por m ²		R\$ 11.187,34		R\$ 10.988,37	
TOTAL RIO ROOSEVELT - PT02657		32.547.115,22	100,00%	31.968.249,95	100,00%

O valor total estimado para construção da ponte em concreto sobre o Rio Roosevelt (PT02657) é de R\$ 31.968.249,95 (Trinta e um milhões, novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), data base: abr / 2025, sem desoneração.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O objeto composto pelos serviços previstos através do projeto executivo, contempla o levantamento de campo, memória de cálculo (detalhamento dos quantitativos e preços estimados),

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



HASH: 3d34da5e8e4c145588e8840e590ab6703716470b41a177080e57319c0213b7. Documento assinado digitalmente, valide em https://auaisicoes.sajplog.mt.gov.br/lowbee-pub/#/validar/88LLFF5FO-5TRP-UGST. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em: 28/04/2026, GABRIEL CEZAR ALMEIDA MIRANDA DE CARVALHO em: 28/04/2026, STILAC VAZ DE CAMPOS em: 28/04/2026, Jumaado em: 28/04/2026 14:10:00 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRA-PRO-2025/22004





Gov. do Estado de Mato Grosso


SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

além das especificações. Todos os serviços elencados no projeto, deverão seguir fielmente as Normas Técnicas vigentes e Especificações de Serviços do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devidamente atualizadas. As intervenções deverão manter o padrão de qualidade e apresentar a melhor prática executiva.

No projeto executivo estão caracterizadas as seguintes informações:

- **Infraestrutura:** A fundação prevista será em estaca raiz, com dimensões e profundidade estabelecida em projeto.
- **Mesoestrutura:** A mesoestrutura será composta por pilares circulares, travessas de apoio em e os aparelhos elastoméricos.
- **Superestrutura:** é constituída de um sistema estrutural integral composto por tramos em vigas pré-moldadas com geometria em “I” justapostos. Apoiados sobre elas estão pré-lajes destinadas a receber as armaduras e concreto da laje.
- **Materiais previstos:** Os materiais a serem empregados na construção da ponte, de acordo com o projeto estrutural, terão as seguintes características: a) Concreto estrutural: Infraestrutura (25 MPa); Mesoestrutura (25 MPa); Superestrutura – Lajes, Barreira, Transversina (30 MPa); Superestrutura – Longarinas (40 MPa); b) Aço CA-50; c) Cordoalhas para protensão CP 190 RB; d) Aparelhos de apoio (Neoprene fretado).

7.1. Localização e fotos da ponte objeto de contratação

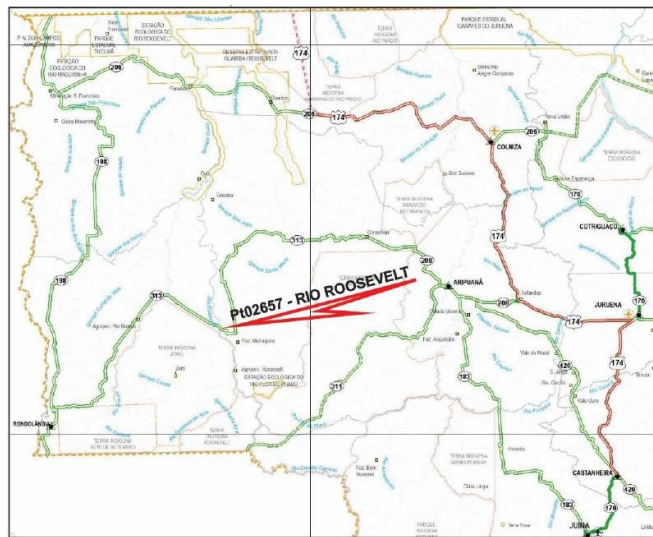

Mapa de Situação – Ponte sobre o Rio Roosevelt (PT02657).

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



HASH: 3d34d4e5c8e4d145588c884d6590ab6703716470b41a177080e57319c0213b7. Documento assinado digitalmente, valide em <https://autenticacoes.sapiag.mt.gov.br/filowbee/pub/#/validar/88LLLF5FO-5TRP-U8ST>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 28/04/2026, GABRIEL CEZAR ALMEIDA MIRANDA DE CARVALHO em 28/04/2026, STILLLAC VAZ DE CAMPOS em 28/04/2026, Juntado em 28/04/2026 14:10:00 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202639254A





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

7.2. Relatório fotográfico



HASH: 3d34da5c8a4c145588c8840e590ab6703716470b41a177080a57318c0213b7. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquilicoes.sapiag.mt.gov.br/lowbee-pub/#/validar/881LFF5Q-5TRP-U8ST>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 28/04/2026, GABRIEL CEZAR ALMEIDA MIRANDA DE CARVALHO em 28/04/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 28/04/2026, Jumaado em 28/04/2026 14:10:00 por STHEFANY ANDRADE.



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRACAP202639254A



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 28/04/2026 às 14:26:06.
Documento Nº: 36490285-9678 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36490285-9678>





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Latitude: -10.365399
Longitude: -60.624134
Elevação: 116.891184 m
Precisão: 7.0 m
Tempo: 13-09-2025 09:24
Nota: MT 313 - PT02657



Latitude: -10.365395
Longitude: -60.606077
Elevação: 117.264479 m
Precisão: 6.25 m
Tempo: 13-09-2025 09:21
Nota: MT 313 - PT02657



Latitude: -10.365392
Longitude: -60.620445
Elevação: 121.314110 m
Precisão: 6.5 m
Tempo: 13-09-2025 09:24
Nota: MT 313 - PT02657

7.3. Identificação e Titularidade da Ponte Objeto de Contratação

Ponte sobre o Rio Roosevelt						
PT	Rodovia	Coordenadas		Comprimento	Largura	Município
		Latitude	Longitude			
02657	MT-313	10° 21' 55,44" S	54° 9' 30,53" O	330,60 m	8,80 m	Rondolândia e Aripuanã / MT

7.4. Natureza e finalidade da obra de engenharia

O objeto da contratação envolve a execução de 01 (uma) ponte de concreto, caracterizada como **obra de engenharia**, nos termos do art.6º, item XII, da Lei 14.133/2001, tendo em vista ser a

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso



mt.gov.br

HASH: 3d34da5e894d145588e8840d6590ab6703716470b41a177080a57318c0213b7. Documento assinado digitalmente, valide em https://aqueicoes.saplog.mt.gov.br/lowbee-pub/#/validar/88LLFFQO5TRPUBST. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 28/04/2026, GABRIEL CEZAR ALMEIDA MIRANDA DE CARVALHO em 28/04/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 28/04/2026, Jumaado em 28/04/2026 14:10:00 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRA/PRO-2025/22004





Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

atividade, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza e acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Há de ser esclarecido preliminarmente que a execução obra (construção de uma ponte) se trata de um projeto com serviços indivisíveis. Não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes, visto que o atraso em uma etapa executiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e da entrega dos serviços. Importa afirmar que a mesma empresa contratada, executa todos os serviços previstos e, portanto, não teria sentido subdividi-los perdendo-se assim o ganho em escala.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS

O crescimento populacional e econômico na região, onde será construída a ponte (objeto de contratação), aumentou significativamente.

Urge a necessidade da construção da ponte em concreto, resultando em uma proposta mais eficiente de deslocamento que a existente, visto que a ponte existente já não supre as contribuições de tráfego que lhe são atribuídas, aumentando o risco de acidentes.

Pretende-se com a futura licitação da ponte em concreto:

- A garantia da trafegabilidade contínua e segura dos usuários dessas rodovias;
- A diminuição do tempo de viagem para os transeuntes;
- A redução dos custos operacionais dos veículos;
- O melhoramento da infraestrutura rodoviária;
- O desenvolvimento regional, aumento do acesso a saúde, escolas e emprego.

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

No processo licitatório deverá a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n.14.133 de 2021 acerca da participação no procedimento. A empresa contratada deverá, dentre outras singularidades:

- Observar as diretrizes quanto a execução de obras e serviços de engenharia, bem como obedecer às normas correlatas relacionadas ao objeto da contratação;

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



HASH: 3d34da5c8a4c145588c8840e590ab6703716470b41a177080a57319c0213b7. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aqueicoes.sajplog.mt.gov.br/lowbee/pub/#/validar/88LLFFFO-5TRP-UBST>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em: 28/04/2026, GABRIEL CEZAR ALMEIDA MIRANDA DE CARVALHO em: 28/04/2026, STILAC VAZ DE CAMPOS em: 28/04/2026, Jumaado em: 28/04/2026 14:10:00 por STEHFANY ANDRADE.



SINFRACAP202639254A





Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

- Executar o contrato conforme o projeto, as especificações contidas no Termo de Referência e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta;
- Manter o padrão de qualidade e apresentar a melhor prática executiva;
- Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorrência irregular que se verifique no local dos serviços;
- Prestar esclarecimentos ou informações quando solicitado pela CONTRATANTE.

Será providenciado pela administração, dentre outras particularidades:

- Publicação do Edital;
- Indicação de futuro fiscal dos serviços a serem executadas com o fulcro de garantir a qualidade dos serviços, a realização das medições mensais e o cumprimento integral do contrato;
- Capacitação dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalização e gestão contratual.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Há um projeto em fase de contratações cujo objeto é a Execução dos Serviços necessários para a manutenção, corretivas rotineiras e preventivas periódicas, nas rodovias não pavimentadas MT-198 e MT-313, LOTE ÚNICO: Rodovia MT-198, trecho fim PU Rondolândia / Entr. MT-313, com extensão de 15,04 km, e Rodovia MT-313, trecho Entr. MT-198 / KM 228,96, com extensão de 228,96 km, com total de 244,00 km de extensão, localizada nos municípios de Rondolândia/MT e Aripuanã/MT.

12. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

O procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o interesse público, tal conceito vai além do mero cotejo de menores preços, para analisar os benefícios do processo torna-se necessário avaliar os impactos positivos e negativos na aquisição quanto:

- A observância de normas e critérios de sustentabilidade;
- O emprego apurado dos recursos públicos;
- À conservação e gestão responsável de recursos naturais;
- Ao uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;
- À remoção apropriada dos resíduos conforme normas de Controle de Transporte de Resíduos;
- À observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como INMETRO e ABNT.

Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



HASH: 3d34da5c8a4c145588c8840e590ab6703716470b41a177080a57319c0213b7. Documento assinado digitalmente, valide em <https://equilibras.seplag.mt.gov.br/validar/88LLFFFO-5TRP-U8ST>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 28/04/2026, GABRIEL CEZAR ALMEIDA MIRANDA DE CARVALHO em 28/04/2026, STILLLAC VAZ DE CAMPOS em 28/04/2026, Juntado em 28/04/2026 14:10:00 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP2026392544





Gov. do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

4- Estimativa inadequada de quantitativo do objeto a ser licitado.	Pouco provável	Falha no atendimento das necessidades da área demandante do serviço. Impossibilidade de aditivo contratual (acréscimo ou supressão).	Baixo	Adequado levantamento das reais necessidades da área demandante do serviço. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Análise de possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão.
5- Fracasso da licitação	Pouco provável	Atrasos da execução do objeto com aumento da demanda de tráfego não atendido. Comprometimento do desenvolvimento e segurança da região.	Baixo	Realizar o adequado levantamento das necessidades de execução com preços compatíveis e atualizados ao valor de mercado. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Formar grupo de trabalho com conhecimento técnico e com experiência, com conhecimento do e condições necessárias em editais.
6- Impugnação do edital	Pouco provável	Atraso na contratação da empresa e consequente dificuldades para o setor demandante.	Baixo	Elaborar o edital corretamente. Atentar às normas e legislações vigentes ao elaborar o edital. Compatibilizar informações com o Termo de Referência.	Treinamento da equipe de apoio.

Fase – Gestão contratual e execução do objeto contratado

RISCO	ESCALA DE PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DO IMPACTO	ESCALA DE IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL
1- Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato.	Raro	Falha no atendimento das necessidades da obra. Solução diversa da proposta nos instrumentos convocatórios.	Baixo	Fiscalização mensal a ser realizada pela CONTRATANTE. Determinação clara do objeto contratual. Capacitar a equipe de fiscalização do contrato para identificar fraudes com maior facilidade.	Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais.
2- Atrasos na execução do contrato ou baixa produtividade.	Pouco provável	Aumento do custo e demora na entrega da obra. Descontinuidade dos serviços.	Baixo	Fiscalização mensal, trimestral ou semestral a ser realizada pela CONTRATANTE.	Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação das penalidades contratuais.
3- Períodos de chuva fora da previsibilidade Local.	Pouco provável	Aumento de custos e atraso no cronograma por caso fortuito ou força maior.	Baixo	NÃO HÁ.	Caberá ao CONTRATANTE análise das circunstâncias e ações possíveis.
4- Contratação de empresa sem capacidade de executar o Contrato.	Pouco provável	Dificuldades na execução contratual, com o não cumprimento adequado do objeto.	Baixo	Realizar análise criteriosa da qualificação técnica e econômico-financeira da empresa.	Avaliar adequadamente a empresa.



HASH: 3d34da5c8a4d145588c8840e590ab6703716470b41a177080a57319c0213b7. Documento assinado digitalmente, valide em https://auaisicoes.saplag.mt.gov.br/lowbee/pub/#/validar/88LLFFFO-5TRP-UBST. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em: 28/04/2026, GABRIEL CEZAR ALMEIDA MIRANDA DE CARVALHO em: 28/04/2026, STILLLAC VAZ DE CAMPOS em: 28/04/2026, Jumiado em: 28/04/2026 14:10:00 por: STHEFANY ANDRADE.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRACAP202639254A





Gov. do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

5- Execução do objeto em desacordo com o contrato.	Raro	Não atendimento da demanda do órgão.	Baixo	Realização de gestão e fiscalização adequada.	Capacitação da equipe de fiscalização.
6- Falta de pagamento à contratada.	Raro	Insatisfação da contratada. Descumprimento contratual.	Baixo	Realizar a análise prévia do orçamento. Realizar gerenciamento e controle do orçamento destinado ao contrato.	Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato e capacidade de desembolso do órgão.

Critérios para a avaliação dos riscos (escala probabilidade / impacto - Decreto Estadual nº 1.525/2022)

Art. 328. § 4º Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de probabilidade:

I - **raro**: acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência;

II - **pouco provável**: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo;

III - **provável**: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte;

IV - **muito provável**: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte;

V - **praticamente certo**: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Art. 328. § 5º Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de impacto:

I - **muito baixo**: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado;

II - **baixo**: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado;

III - **médio**: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;

IV - **alto**: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;

V - **muito alto**: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

As experiências anteriores indicam que a contratação apresenta viabilidade e alta probabilidade de alcance dos resultados pretendidos.

A SINFRA não possui em seu quadro de servidores profissionais habilitados, em quantitativo suficiente, para a execução das obras em questão, de modo que para suprir tal necessidade torna-se imprescindível a contratação de serviços especializados, para atendimento da demanda exarada.

Considerando:

- A necessidade da construção da ponte de concreto sobre o Rio Roosevelt (PT02657), na Rodovia MT-313, Trecho: Km 99 – Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/Aripuanã), dimensionada com comprimento de 330,60m e largura de 8,80m, localizada nos municípios de Aripuanã e Rondolândia / MT;
- As obrigações institucionais da SINFRA/MT;

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



HASH: 3d34da5c8a4c145588c8840e590ab6703716470b41a177090a57319c0213b7. Documento assinado digitalmente, valide em https://auicoes.sapiag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/88LLFFFO-5TRP-UJST. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em: 28/04/2026, GABRIEL CEZAR ALMEIDA MIRANDA DE CARVALHO em: 28/04/2026, STILAC VAZ DE CAMPOS em: 28/04/2026, Jumiado em: 28/04/2026 14:10:00 por STEFFANY ANDRADE.



SINFRACAP2026392544





Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

- c) A necessidade de garantir a trafegabilidade constante e segura na rodovia em pauta;
- d) Todo o exposto e apresentado neste Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Declara-se a necessidade e viabilidade de contratação dos serviços indicados neste ETP.

Cuiabá, 28 de abril de 2026.

**Eng.ª Ana Carolina Alves Xavier Piazza
Topanotti**
Analista de Desenvolvimento Econômico e
Social/SINFRA-MT

**Eng.º Gabriel Cezar Almeida. Miranda de
Carvalho**
Superintendente de Execução e Fiscalização
de Obras III
SUEF III/SAOR/SINFRA

Eng.º Stillac Vaz de Campos
Secretário Adjunta de Obras Rodoviárias
SAOR/SINFRA-MT

HASH: 3d34dan5c8a4d145588c884d6590ab6703716470b41a177080a57319c0213b7. Documento assinado digitalmente, valide em <https://equicoes.saplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/88LLFFQO5TRPUBST>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 28/04/2026, GABRIEL CEZAR ALMEIDA MIRANDA DE CARVALHO em 28/04/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 28/04/2026. Juntado em 28/04/2026 14:10:00 por STHEFANY ANDRADE.



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRACAP202639254A

