

Processo Administrativo Licitatório Eletrônico (e-PAL) n. 0129/2024-e

**MAPA DE RISCOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA CENTRAL DE COMPRAS
PÚBLICAS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA –
CINCATARINA**

O MAPEAMENTO DE RISCOS TEM COMO OBJETIVO PREVER OS POSSÍVEIS RISCOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO LICITATÓRIO DE NOTEBOOKS, TABLETS E GABINETE DE RECARGA, BUSCANDO ANTEVER DIFICULDADES ENFRENTADAS PELO CINCATARINA, ESPECIALMENTE NA FALHA OU AUSÊNCIA DO SERVIÇO ALMEJADO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.

Inovação e Modernização na Gestão Pública

MAPA DE RISCOS DA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS

1. MAPA DE RISCO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

A Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) trouxe a obrigatoriedade da implementação da gestão de riscos nas contratações públicas, o que representou uma evolução nessas contratações, por meio do foco no planejamento e do uso de mecanismos de governança.

Diante desse contexto, a Central de Compras Públicas do CINCATARINA, desenvolve a gestão dos riscos dos processos licitatórios do consórcio com o objetivo de mapear os eventos de riscos, suas causas, consequências e controles, bem como medidas preventivas e de contingências.

Em busca de boa governança, identificação de riscos e excelência nos processos, a gestão de riscos foi implementada e incorporada aos processos licitatórios do consórcio público a partir de 2023. Desde então, o mapeamento vem sendo continuamente aprimorado, resultando em um documento cada vez mais consistente e fundamentado.

O Mapa de Risco é uma ferramenta de análise que irá gerar um documento, utilizado para identificar os principais riscos intrínsecos ao processo de licitação, com ações que viabilizam controle, prevenção e mitigação dos impactos.

A atualização das informações contidas no Mapa de Risco é contínua, pois todo o processo da gestão de riscos prossegue durante a licitação, com ênfase para: monitoramento dos riscos e das medidas tomadas, comunicação e documentação das informações inerentes à gestão de riscos.

O Mapa de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

Assinado eletronicamente por THIAGO MATHEUS VIEIRA OLIVEIRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cincatarina-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/c33e4b9e-b0f7-4811-99ae-cf8dcdff57e6>.

1) Durante a fase de planejamento a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

2) Durante a fase de Seleção do Fornecedor, os empregados públicos devem proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Riscos;

3) Durante a fase de Execução do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do gestor, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Riscos, seguindo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Desse modo, este documento apresenta os riscos comumente enfrentados nos processos licitatórios, bem como suas principais causas, consequências e controles, que foram identificados pelo gestor de riscos e pelos gestores das gerências que englobam a Central de Compras Públicas.

2. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS DA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS

As principais referências teóricas utilizadas na elaboração deste mapeamento de riscos são a metodologia COSO-ERM (COSO, 2007), a norma ABNT ISO 31000:2009 (ABNT, 2009) e o Manual de Gestão de Riscos do TCU (SEPLAN, 2020).

2.1. OBJETOS DA GESTÃO DE RISCO

São objetos da gestão de riscos os objetivos, resultados, metas, processo de trabalho, atividades, projeto, informações, integridade e ética, iniciativa ou ação de plano institucional, do mesmo modo como os recursos que dão suporte à realização dos objetivos do CINCATARINA.

3. PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS

Para realizar a gestão de riscos de quaisquer objetos, as seguintes etapas podem ser seguidas:

- Estabelecimento de contexto;
- Identificação dos riscos;
- Análise dos riscos;
- Avaliação dos riscos;
- Tratamento dos riscos;
- Comunicação e consulta com partes interessadas;
- Monitoramento;
- Melhoria contínua.

Na figura abaixo, tem esquematizado o processo de gestão de riscos:

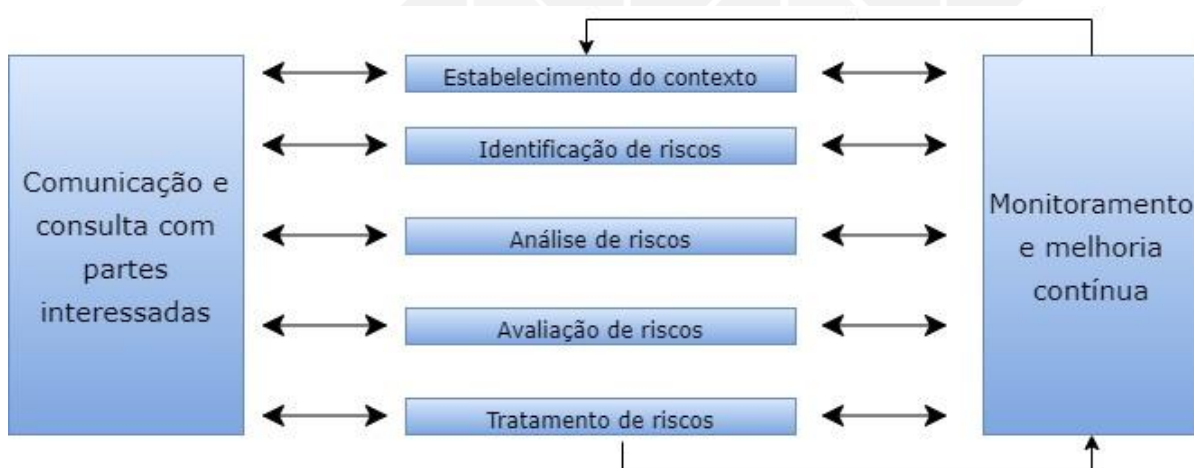


Figura 1: Processo de Gestão de Riscos (ISO 31000 – Adaptado)

3.1. ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO

Consiste em compreender o ambiente externo e interno no qual o objeto de gestão de riscos se encontra inserido e em identificar parâmetros e critérios a serem considerados no processo de gestão de riscos.

Identificar as fases de trabalho relevantes no processo de licitação nas gerências de Planejamento das Contratações, Seleção dos Fornecedores e de Execução de Contratos para o alcance dos objetivos e resultados da Central de Compras Públicas.

Assim como, identificar e envolver os gestores nesse processo como especialistas em suas áreas de trabalho, definindo os objetos de identificação de risco mais importante para a sua gerência.

3.2. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

Para cada risco identificado é necessário definir a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

O processo de identificação de riscos pode ser realizado com a combinação de diferentes ferramentas. Na elaboração do presente documento foi utilizada ferramentas como reuniões, questionários e o preenchimento de uma tabela (Tabela 1) por parte do gestor de risco e dos gestores das gerências do consórcio público.

MAPA DE RISCOS DO PROCESSO LICITATÓRIO										
O presente mapeamento de riscos tem como objetivo prever os possíveis riscos envolvidos no objeto do processo licitatório, buscando antever dificuldades enfrentadas pelo CINCATARINA, especialmente na falha ou ausência do serviço almejado, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021.										
1. Informações do Processo										
Objeto:	XXXXXXXXXX									
Processo Administrativo Licitatório (PAL) nº:	XXXX/2024									
2. Mapeamento dos Riscos										
Fase de Análise: Planejamento da Contratação										
Risco 01:										
Causa:										
Controle:										
Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto		Muito Alto
Dano 1:										
Dano 2:										
Id	Ação Preventiva								Responsável	
1										
2										
Id	Ação de Contingência								Responsável	
1										
2										

Tabela 1 – Mapa de Riscos dos Processos Licitatórios do CINCATARINA

3.3. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS

Esta etapa tem por finalidade avaliar os eventos de riscos identificados considerando os seus componentes (causas e consequências). Os eventos devem ser avaliados sob a perspectiva de probabilidade e impacto, e o resultado dessas duas variáveis será o que chamamos de nível de risco.

As causas se relacionam à probabilidade de o evento ocorrer e as consequências ao impacto, caso o evento se materialize. Podemos definir o nível de risco com a seguinte equação:

$$\text{NÍVEL DE RISCO} = \text{PROBABILIDADE} \times \text{IMPACTO} \text{ (NR = P x I)}$$

O nível de risco é o resultado da multiplicação da PROBABILIDADE pelo IMPACTO

Tabela 2: Equação nível de risco

Executa-se também uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos, por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, utilizando como referência a classificação da tabela a seguir:

Classificação	Valor
Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	5
Alto	8
Muito Alto	10

Tabela 3: Classificação de escala da probabilidade e do impacto

A descrição da probabilidade é:

Muito Baixa: Evento raro. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nem o histórico, nem as circunstâncias indicam essa possibilidade;

Baixa: Evento improvável. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, mas o histórico e as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade;

Média: Evento possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois o histórico e as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade;

Alta: Evento provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade;

Muito Alta: Evento esperado. Exceto em situações excepcionais, o evento deve ocorrer, pois as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.

A descrição dos impactos é:

Muito Baixo: Impacto nulo ou insignificante, comprometendo minimamente o alcance do objetivo/resultado, com mínima necessidade de recuperação;

Baixo: Impacto pouco relevante, comprometendo em alguma medida o alcance do objetivo/resultado, com pequena necessidade de recuperação;

Médio: Impacto relevante, comprometendo moderadamente o alcance do objetivo/resultado, com razoável necessidade de recuperação;

Alto: Impacto muito relevante, comprometendo significativamente o alcance do objetivo/resultado, mas com possibilidade de recuperação;

Muito Alto: Impacto catastrófico, comprometendo total ou quase totalmente o alcance do objetivo/resultado, com remota ou nenhuma possibilidade de recuperação.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme o resultado da multiplicação entre a probabilidade e o impacto, tal qual resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A Matriz Probabilidade x Impacto (5x5), utilizada neste documento, é o instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco inerente e residual, e é representada pela tabela a seguir:

MATRIZ DE RISCOS					
IMPACTO	RISCO MÉDIO (10)	RISCO MÉDIO (20)	RISCO ALTO (50)	RISCO MUITO ALTO (80)	RISCO CRÍTICO (100)
	RISCO BAIXO (8)	RISCO MÉDIO (16)	RISCO ALTO (40)	RISCO MUITO ALTO (60)	RISCO MUITO ALTO (80)
	RISCO BAIXO (5)	RISCO MÉDIO (10)	RISCO MÉDIO (25)	RISCO ALTO (40)	RISCO ALTO (50)
	RISCO MUITO BAIXO (2)	RISCO BAIXO (4)	RISCO MÉDIO (10)	RISCO MÉDIO (16)	RISCO MÉDIO (20)
	RISCO MUITO BAIXO (1)	RISCO MUITO BAIXO (2)	RISCO BAIXO (5)	RISCO BAIXO (8)	RISCO MÉDIO (10)
	PROBABILIDADE				

Tabela 4: Matriz Probabilidade x Impacto (5x5)

Todo evento de risco categorizado, relacionado à determinada atividade, deverá ser avaliado quanto à probabilidade e ao impacto, a fim de mensurar-se o nível de risco. Destaca-se que a aferição ocorre considerando os controles preexistentes, sendo então calculado o risco residual.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz *Probabilidade x Impacto*. Caso o risco se enquadre nas regiões azul, verde ou amarela, seu nível de risco será entendido, respectivamente, como muito baixo, baixo e médio. Nesse caso, admite-se a aceitação ou a adoção de medidas preventivas.

Se estiver nas regiões alaranjada e vermelha, entende-se como nível de risco alto e muito alto, respectivamente, e, nesse caso, admite-se a adoção de medidas preventivas. Já na região vermelha escura, o nível de risco é considerado crítico, sendo obrigatória a adoção de ações para que o risco atinja uma classificação inferior.

Quanto às ações pertinentes no mapa de risco, a ação preventiva se dará com o intuito de observar com antecedência o risco e concluir sobre as prováveis consequências. Já a ação de contingência tem o caráter de definir as estratégias de como a Central de Compras do CINCATARINA irá responder a eventos importantes que afetam os planos originais.

3.4. TRATAMENTO DOS RISCOS E AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES

Nos processos internos da Central de Compras Públicas do CINCATARINA, há certos controles internos que auxiliam a gerenciar os riscos e garantem o cumprimento dos objetivos organizacionais.

Para cada evento de risco é verificado se existe controles internos implantados que contenham ferramentas de defesa em oposição à causa/consequência evidenciadas. O tratamento de riscos, compreende o planejamento e a realização de ações para modificar o nível do risco.

O nível do risco pode ser modificado por meio de medidas de resposta ao risco que tem como objetivo mitigar, transferir ou evitar esses riscos. E somente devem ser objeto de tratamento os riscos priorizados. O tratamento dos riscos deve seguir os seguintes passos:

- Identificar as causas e consequências dos riscos priorizados;

- Levantadas as causas e consequências, registrar as possíveis medidas de resposta ao risco;
- Avaliar a viabilidade da implantação dessas medidas (custo-benefício, viabilidade técnica, tempestividade, efeitos colaterais do tratamento etc.);
- Decidir quais serão implementadas;
- Elaborar plano de implementação das medidas para inclusão nos planos institucionais.

3.5. MONITORAMENTO DOS RISCOS E MELHORIA CONTÍNUA

O monitoramento dos riscos é uma atividade imprescindível para o efetivo gerenciamento dos riscos, pois compreende o acompanhamento e a verificação do desempenho ou da situação dos elementos da gestão de riscos.

Essa atividade está a cargo das gerências que compõem a Central de Compras Públicas, em que cada gestor irá verificar e monitorar os riscos de forma contínua ou periódica em sua respectiva gerência. Caso haja alguma modificação no nível do risco existente ou o surgimento de um novo risco, a gerência de Planejamento das Contratações deverá ser informada, e o mapa de riscos será devidamente atualizado.

Assim sendo, a melhoria contínua compreende o aperfeiçoamento ou ajuste de aspectos da gestão de riscos avaliados no monitoramento, relacionando os resultados do monitoramento sobre a efetividade do tratamento dos riscos.

3.6. COMUNICAÇÃO E CONSULTA COM PARTES INTERESSADAS

Relaciona-se à identificação das partes interessadas e ao compartilhamento de informações relativas à gestão de riscos sobre determinado objeto. Comunicar riscos entre as gerências é fornecer as informações relativas ao risco e ao seu tratamento para todos aqueles que possam interferir por esse risco.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

4.1. CATEGORIAS DOS RISCOS

Os riscos podem ser identificados e agrupados em categorias para facilitar o seu gerenciamento. Abaixo algumas sugestões de categorias:

- **Estratégicos:** Associado a tomadas de decisões avessas à missão, à visão, aos valores ou ao cumprimento dos objetivos organizacionais do consórcio público;

- **Operacional:** Associado a falhas, deficiências, inadequações, eventos externos, decisões judiciais ou administrativas, inseguranças ou danos, em relação a processos internos, pessoas, infraestruturas, sistemas, cidadãos, serviços ou produtos, que comprometam as atividades da gerência, afetam a eficácia ou a eficiência do desempenho organizacional ou ocasionem perdas;

- **Orçamentário:** Associado a incapacidades ou gestões ineficazes ou ineficientes do consórcio público, em relação a disposições ou execuções de recursos orçamentários ou financeiros, ou a fatores externos financeiros, que comprometam a realização das atividades ou afetem negativamente o equilíbrio das contas públicas;

- **Reputação ou Imagem:** Associado a eventos com o potencial de causar perdas de credibilidade do CINCATARINA junto ao público interno e externo, em função de erros no processo de comunicação institucional;

- **Conformidade Legal:** Associado a alterações ou problemas na interpretação, no conhecimento ou na observância de dispositivos jurídicos (inclusive jurisprudenciais ou contratuais), ou ainda a demandas judiciais ou administrativas, que comprometam as atividades ou os interesses do consórcio público ou afetem o cumprimento efetivo do ordenamento jurídico;

- **Integridade:** Associado a corrupções, fraudes, irregularidades, desvios éticos ou de conduta ou improbidades, que comprometam os valores, os padrões ou os objetivos organizacionais ou afetem a gestão dos recursos e das atividades da gerência.

5. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento:

Assinado eletronicamente por THIAGO MATHEUS VIEIRA OLIVEIRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cincatarina-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/c33e4b9e-b0f7-4811-99ae-cf8dcdff57e6>.

Id	Risco	Relacionado (à): ¹	Responsável: ²	P ³	I ⁴	Nível de Risco (P x I) ⁵
R01	Ausência de Estudo Técnico Preliminar (não elaborado ou não adicionado ao processo eletrônico)	Operacional	Planejamento da Contratação	1	10	10
R02	Estudo Técnico Preliminar e os descritivos não possuírem a devida profundidade e embasamento científico	Operacional	Planejamento da Contratação	5	10	50
R03	Falha nos elementos descritivos do objeto licitado	Estratégico	Planejamento da Contratação	2	5	10
R04	Erro na relação orçamento/descriptivo (atribuir a um determinado item, na Lista Inicial, valor referente a outro produto)	Estratégico	Planejamento da Contratação	2	8	16
R05	Possuir falha na realização da pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral	Estratégico	Planejamento da Contratação	5	10	50
R06	Não realizar procedimento público de Intenção de Registro de Preço (IRP)	Estratégico	Planejamento da Contratação	1	10	10
R07	Termo de Referência Incompleto ou Inconsistente	Estratégico	Planejamento da Contratação	5	10	50
R08	Ausência de validação (ou validação insuficiente) do Termo de Referência pelos supervisores	Estratégico	Planejamento da Contratação	2	5	10
R09	Contratação com preço acima da média do mercado	Estratégico	Planejamento da Contratação	2	10	20
R10	Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação	Estratégico	Planejamento da Contratação	8	10	80
R11	Diminuição de fornecedores após quantificações irreais de produtos ou serviços	Estratégico	Planejamento da Contratação	5	8	40
R12	Falha na comunicação com setores técnicos do CINCATARINA que auxiliarão os empregados lotados no Planejamento de Licitações a elaborar os documentos do processo licitatório	Estratégico	Planejamento da Contratação	5	8	40
R13	Aliciamento de empregados por empresas mal-intencionadas	Estratégico	Planejamento da Contratação	2	10	20

R14	Folha de dados apresentar inconsistências	Estratégico	Planejamento da Contratação	2	8	16
R15	Falhas no processo ou na elaboração do edital	Estratégico	Planejamento da Contratação	2	10	20
R16	Habilitar uma empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa	Estratégico	Seleção do Fornecedor	2	8	16
R17	Impugnação do edital na Elaboração do Ato Convocatório	Estratégico	Seleção do Fornecedor	2	8	16
R18	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações	Estratégico	Seleção do Fornecedor	2	10	20
R19	Adjudicação ou homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa	Estratégico	Seleção do Fornecedor	2	8	16
R20	Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato	Estratégico	Seleção do Fornecedor	2	10	20
R21	Falta de capacidade técnico operacional da empresa contratada	Estratégico	Seleção do Fornecedor	2	10	20
R22	Contratação de Empresa Inidônea	Estratégico	Seleção do Fornecedor	2	8	16
R23	Análise imprecisa de amostras	Estratégico	Seleção do Fornecedor	2	10	20
R24	Análise imprecisa da habilitação	Estratégico	Seleção do Fornecedor	2	10	20
R25	Contratar um objeto acima do valor estimado	Estratégico	Seleção do Fornecedor	2	8	16
R26	Contratar um objeto abaixo do valor estimado	Estratégico	Seleção do Fornecedor	8	10	80
R27	Contratar fornecedor que possua débitos com a União, Estado, Município	Estratégico	Seleção do Fornecedor	2	10	20
R28	Elaboração de Cadastro Reserva de Fornecedores com informações erradas/inexistentes	Estratégico	Seleção do Fornecedor	1	10	10
R29	Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade	Estratégico	Seleção do Fornecedor	5	8	40
R30	Não apresentação de amostra para pré-qualificação	Estratégico	Seleção do Fornecedor	2	10	20
R31	Ausência da publicação do edital de chamada pública	Estratégico	Seleção do Fornecedor	1	10	10
R32	Não realizar reanálise de preços dos produtos	Estratégico	Seleção do Fornecedor	2	8	16
R33	Não cadastrar no sistema as sanções existentes emitidas pelos municípios do estado de Santa Catarina dos fornecedores quando observado na consulta do CEIS/CNEP	Estratégico	Seleção do Fornecedor	1	10	10

R34	Não cadastrar no sistema as opções do item para o município fazer a escolha no momento da contratação	Estratégico	Seleção do Fornecedor	5	5	25
R35	A folha de dados do item não se encontra disponível no sistema quando o descritivo a prevê	Estratégico	Seleção do Fornecedor	5	5	25
R36	Folha de dados com alguma informação divergente	Estratégico	Seleção do Fornecedor	1	5	5
R37	Não cadastrar no sistema o múltiplo do item quando for pertinente	Estratégico	Seleção do Fornecedor	2	5	10
R38	Não incluir código no edital de chamada pública para pré-qualificação de bens	Estratégico	Seleção do Fornecedor	1	10	10
R39	Aprovar um item erroneamente no edital de chamada pública para pré-qualificação de bens	Estratégico	Seleção do Fornecedor	1	10	10
R40	Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando	Estratégico	Seleção do Fornecedor	5	10	50
R41	Baixa adesão dos municípios no momento de quantificar suas Intenções de Registro de Preços	Estratégico	Seleção do Fornecedor	8	10	80
R42	Erros no Cadastro da Requisição ao Compras	Estratégico	Seleção do Fornecedor	1	10	10
R43	Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato	Operacional	Execução do Contrato	1	8	8
R44	Não apresentação de garantias de execução contratual	Operacional	Execução do Contrato	5	8	40
R45	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais	Operacional	Execução do Contrato	1	8	8
R46	Execução em desacordo com o contrato	Operacional	Execução do Contrato	8	10	80
R47	Contratos com deficiência em cláusulas e regramento	Operacional	Execução do Contrato	2	10	20
R48	Indisponibilidade no sistema de Gestão de Serviços e Contratos Públicos - GESCON	Operacional	Execução do Contrato	2	10	20
R49	Falta de feedback da efetividade da contratação e dos problemas identificados no processo licitatório ou na execução do contrato	Operacional	Execução do Contrato	8	8	64
R50	Município fazer a solicitação dentro do	Operacional	Execução do Contrato	8	8	64

	sistema e não anexar a nota de empenho					
R51	Fornecedor não dar o recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) dentro do prazo previsto em edital	Operacional	Execução do Contrato	8	8	64
R52	Fornecedor não anexar a Nota Fiscal e o comprovante de entrega dentro do sistema	Operacional	Execução do Contrato	5	8	40
R53	Município não dar o recebimento provisório e definitivo dentro do sistema	Operacional	Execução do Contrato	8	8	64
R54	Fornecedor não entregar dentro do prazo estabelecido	Operacional	Execução do Contrato	10	10	100
R55	Não realizar o acompanhamento dos preços registrados nas ARP e contratos	Operacional	Execução do Contrato	5	5	25
R56	Não bloquear o item quando é solicitado pedido de reequilíbrio ou cancelamento	Operacional	Execução do Contrato	5	8	40
R57	Não tratar de forma célere os pedidos de reequilíbrios e cancelamentos enviados para as empresas	Operacional	Execução do Contrato	8	10	80
R58	Não dar retorno para os municípios quando solicitam um prazo de entrega	Operacional	Execução do Contrato	5	10	50
R59	Punições dada por municípios que afetem a compra do CINCATARINA	Reputação ou Imagem	Execução do Contrato	5	8	40

Tabela 5 – Síntese dos riscos identificados e classificados

Legenda: P – Probabilidade; I - Impacto

¹ A qual natureza o risco está associado.

² A qual processo interno o risco está associado.

³ Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000, item 2.19)

⁴ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000, item 2.1).

⁵ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000, item 2.23 e IN SGD/ME n 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII).

6. RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MAPA DE RISCOS DO PROCESSO LICITATÓRIO											
O presente mapeamento de riscos tem como objetivo prever os possíveis riscos envolvidos no objeto do processo licitatório, buscando antever dificuldades enfrentadas pelo CINCATARINA, especialmente na falha ou ausência do serviço almejado, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021.											
1. Informações do Processo											
Objeto:					NOTEBOOKS, TABLETS E GABINETE DE RECARGA						
Processo Administrativo Licitatório (PAL) nº:					0129/2024						
2. Mapeamento dos Riscos											
Fase de Análise: Planejamento da Contratação											
Risco 01:		Ausência de Estudo Técnico Preliminar (não elaborado ou não adicionado ao processo eletrônico)									
Causa:		Falta de conhecimento, capacitação insuficiente ou esquecimento de upload									
Controle:		Treinamento/capacitação e Checklists									
Probabilidade:		X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Induz à contratação que não produz resultados capazes de atender a necessidade do CINCATARINA ou dos entes da federação consorciados.									
Dano 2:		Desperdício de recursos públicos (financeiro, pessoal).									
Ação Preventiva											
Id		Ação Preventiva								Responsável	
1		Possuir controle interno dos processos com suas respectivas necessidades documentais								Planejamento das Contratações	
2		Treinamentos e orientações periódicas para a equipe sobre procedimentos licitatórios								Planejamento das Contratações	
Ação de Contingência											
Id		Ação de Contingência								Responsável	
1		Detecção de falha e paralisação no processo para elaboração do Estudo Técnico Preliminar								Planejamento das Contratações / Seleção do Fornecedor	
2		Elaborar ou fazer o upload do Estudo Técnico Preliminar								Planejamento das Contratações / Seleção do Fornecedor	
Fase de Análise: Planejamento da Contratação											
Risco 02:		Estudo Técnico Preliminar e os descritivos não possuem a devida profundidade e embasamento científico									
Causa:		Falta de informações, metodologia inadequada, equipe insuficiente, mau treinamento									
Controle:		Seguir modelos padrões validados e assessoramento jurídico									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Soluções licitadas podem não ser aquelas com maior benefício ao poder público (para o caso de serviços).									
Dano 2:		Descritivos podem não apresentar características que permitam a escolha do melhor produto (para o caso de bens).									

Dano 3:	Em caso de pedidos de esclarecimentos ou impugnações questionando os requisitos da licitação, o setor de seleção do fornecedor pode não possuir subsídios para a resposta. Ou, ainda, pode a licitante ter razão em seu pedido (portanto, caracterizando a falha do levantamento do objeto realizado no ETP), o que ocasionará suspensão do processo, gasto de tempo com ajustes e republicação, com novos prazos										
Dano 4:	Gastos com processo licitatório ineficiente (financeiro, pessoal)										
Dano 5:	Dificuldades na gestão e fiscalização dos contratos, inviabilizando a prestação do serviço com qualidade ou dificultando o cumprimento das obrigações										
Dano 6:	Estudo de apenas uma solução de mercado										
Id		Ação Preventiva								Responsável	
1		Assegurar ao técnico responsável pela elaboração do ETP prazo viável para que se dedique ao estudo do objeto e as soluções que o mercado oferece, mesmo que já tenha sido elaborado outro ETP anteriormente sobre o mesmo objeto.								Planejamento das Contratações	
2		Constante conscientização, treinamento e alinhamento com a equipe sobre a importância das justificativas contidas no ETP, as formas de se obter e apresentar as informações no documento, entre outras ações que permitam pacificar o entendimento sobre o conteúdo a ser apresentado em cada ETP.								Planejamento das Contratações	
3		Possuir modelos padrões que auxiliem o técnico na elaboração do documento.								Planejamento das Contratações	
4		Assessoramento jurídico atuante e presente durante a elaboração do ETP.								Setor Jurídico	
5		Realizar estudo comparativo entre várias soluções do objeto em questão.								Planejamento das Contratações	
6		Elaborar descritivo que atenda ao mínimo de três marcas diferentes (sem justificativa), evitando o direcionamento de marcas								Planejamento das Contratações	
Id		Ação de Contingência								Responsável	
1		Entrar em contato com o empregado responsável pela elaboração, informando os problemas identificados, para que este auxilie nos ajustes necessários, ou reforce os argumentos a favor dos requisitos anteriormente estabelecidos, no caso de respostas à esclarecimentos e/ou impugnações.								Seleção do Fornecedor	
2		Suspender o pregão, caso seja acatado eventual pedido de impugnação.								Seleção do Fornecedor	
3		Cancelar o item, caso ocorra erro no descritivo que, sabidamente, acarretará a aquisição de produtos de baixa qualidade ou sem as especificações necessárias para o atendimento da demanda.								Seleção do Fornecedor	
4		Promover reuniões de alinhamento com fornecedores ou prestadores de serviço, visando adequar procedimentos da execução do objeto com o que se pretendia.								Execução e Gestão de Contratos e Fiscal do Contrato	
5		Promover o aprofundamento do ETP e descritivos e lançar novamente o item.								Planejamento das Contratações	
Fase de Análise: Planejamento da Contratação											
Risco 03:		Falha nos elementos descritivos do objeto licitado									
Causa:		Ausência de conhecimento técnico específico sobre o objeto a ser licitado									
Controle:		Treinamento e aperfeiçoamento profissional									
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo	X	Médio		Alto		Muito Alto
Dano 1:		Inclusão de característica não condizente ao atendimento da necessidade									
Dano 2:		Prejuízo na seleção da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso									
Dano 3:		Possibilidade de sobrepreço para a Administração Pública									
Dano 4:		Divergência no descritivo do item e o exigido na folha de dados									

Id		Ação Preventiva										Responsável		
1		Realização de uma pesquisa com clareza e precisão sobre o objeto a ser licitado										Planejamento da Contratação		
2		Técnico responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar com qualificação técnica do objeto de estudo										Planejamento da Contratação		
3		Revisões periódicas de descritivos										Planejamento da Contratação		
4		Realizar descritivo que atenda no mínimo três marcas diferentes										Planejamento da Contratação		
Id		Ação de Contingência										Responsável		
1		Se erro insanável verificado na fase de seleção do fornecedor, cancelar o item										Seleção do Fornecedor		
2		Se erro identificado apenas ao longo da execução do contrato, promover o feedback ao setor de planejamento das contratações, por meio de campo específico na folha de dados										Gestão e Execução de Contratos		
3		Revisar e corrigir os elementos descritivos do objeto licitado										Planejamento da Contratação		
Fase de Análise: Planejamento da Contratação														
Risco 04:		Erro na relação orçamento/descritivo (atribuir a um determinado item, na Lista Inicial, valor referente a outro produto)												
Causa:		Possível desatenção durante a elaboração da pesquisa de preços. Conhecimento técnico insuficiente												
Controle:		Revisão de documentos antes de liberação para licitação												
Probabilidade:				Muito Baixa	X	Baixa			Média			Alta		Muito Alta
Impacto:				Muito Baixo		Baixo			Médio	X		Alto		Muito Alto
Dano 1:		Valores de referência para os produtos inadequados, o que pode resultar em itens fracassados												
Dano 2:		Possibilidade de sobrepreço para a Administração Pública												
Dano 3:		Suspensão do Edital após atuação do Controle Externo												
Dano 4:		Desabastecimento dos itens do objeto, em razão de suspensão de Edital e do final da vigência da ata anterior. Prejuízo à prestação dos serviços públicos												
Id		Ação Preventiva										Responsável		
1		Criar rotina de revisões e processos com redundância, a fim de se evitar que erros em fórmulas sejam inseridos no Edital										Planejamento das Contratações		
2		Fazer orçamento com marcas que atendam integralmente o descritivo solicitado										Planejamento das Contratações		
3		Fazer orçamento compatível com a unidade do item (não se deve solicitar unidade em caixa e orçar unitário)										Planejamento das Contratações		
Id		Ação de Contingência										Responsável		
1		Cancelar o item ou suspender o Edital										Seleção do Fornecedor		
2		Sanar o erro e efetuar a republicação do edital, caso necessário										Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
3		Avaliar necessidade de lançar Edital complementar (e lançá-lo, caso necessário)										Planejamento das Contratações		
Fase de Análise: Planejamento da Contratação														
Risco 05:		Possuir falha na realização da pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral												
Causa:		Metodologia inadequada, prazos exíguos, falta de capacitação dos responsáveis pela pesquisa												

Controle:		Rotina de Revisões, treinamento e aprimoramento									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Fracassar itens em razão do preço estimado ser muito baixo									
Dano 2:		Licitação deserta									
Dano 3:		Contratação com sobrepreço									
Dano 4:		Suspensão do Edital pelo Controle Externo									
Dano 5:		Desabastecimento dos itens do objeto, em razão de suspensão de Edital e do final da vigência da ata anterior. Prejuízo à prestação dos serviços públicos									
Dano 6:		Orçamento com marcas que não atendem integralmente o descritivo solicitado									
Id	Ação Preventiva									Responsável	
1	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, através de atas e bancos de preços, consultar sites da internet e fornecedores, seguindo o Procedimento Operacional Padrão da Pesquisa de Preços, justificando e registrando todas as dificuldades encontradas									Planejamento das Contratações	
2	Adotar rotina de revisão de orçamentos									Planejamento das Contratações	
3	Capacitar de forma recorrente os empregados responsáveis por realizar pesquisas de preço									Planejamento das Contratações	
4	Orçamento com ao menos três marcas diferentes									Planejamento das Contratações	
5	Seguir o POP da Pesquisa de Preços e a Resolução n. 104/2022 do CINCATARINA									Planejamento das Contratações	
Id	Ação de Contingência									Responsável	
1	Suspensão do Pregão e retorno ao setor de Planejamento das Contratações para ajustes e posterior relançamento do Edital.									Planejamento das Contratações	
Fase de Análise: Planejamento da Contratação											
Risco 06:		Não realizar procedimento público de Intenção de Registro de Preço (IRP)									
Causa:		Falha no planejamento das aquisições e na comunicação interna									
Controle:		Adoção de Checklists e procedimentos padronizados									
Probabilidade:		X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Estimativa do quantitativo inconsistente ou incompleto									
Dano 2:		Diminuição da competitividade									
Dano 3:		Lentidão das aquisições									
Dano 4:		Gastos com recursos									
Dano 5:		Processo licitatório não otimizado									
Dano 6:		Não obtenção dos melhores preços por meio de economia de escala									
Id	Ação Preventiva									Responsável	
1	Realizar cadastro no sistema com a Intenção de Registro de Preço									Planejamento das Contratações	
2	Aceitar ou recusar, justificadamente, os quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens									Planejamento das Contratações	
3	Solicitar para a Seleção do Fornecedor a abertura da IRP com prazo hábil									Planejamento das Contratações	

4	Cumprir o checklist e procedimentos padronizados	Planejamento das Contratações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Interromper o andamento do processo e solicitar cadastro no sistema para a realização da Intenção de Registro de Preço	Planejamento das Contratações
Fase de Análise: Planejamento da Contratação		
Risco 07:	Termo de Referência Incompleto ou Inconsistente	
Causa:	Falta de conhecimento técnico	
Controle:	Assessoramento Jurídico	
Probabilidade:	Muito Baixa	Muito Alta
Impacto:	Muito Baixo	Muito Alto
Dano 1:	O Termo de Referência incompleto ou inconsistente, cujo conteúdo não permite embasamento para elaboração do edital	
Dano 2:	Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, ocasionando desperdício de recursos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar um checklist dos conteúdos previstos do inciso XXIII do Art. 6º e do §1º do Art. 40 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021	Planejamento das Contratações
2	Elaborar modelos padrões que auxiliem o técnico na elaboração do documento	Planejamento das Contratações
3	Solicitar assessoramento jurídico na elaboração do documento	Assessoramento Jurídico
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Interromper o andamento do processo e encaminhar para revisão o Termo de Referência para inclusão das instruções ausentes	Assessoramento Jurídico e/ou Planejamento das Contratações
Fase de Análise: Planejamento da Contratação		
Risco 08:	Ausência de validação (ou validação insuficiente) do Termo de Referência pelos supervisores	
Causa:	Falha de comunicação e supervisores com excesso de responsabilidades podem não ter tempo de revisar e validar o TR	
Controle:	Adoção de checklists para otimizar validação	
Probabilidade:	Muito Baixa	Muito Alta
Impacto:	Muito Baixo	Muito Alto
Dano 1:	Atraso na contratação do objeto	
Dano 2:	Impugnação de algum item e por consequência do edital	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Adoção de lista de verificação de processos	Planejamento das Contratações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Encaminhar ao supervisor competente o processo para validação do Termo de Referência	Planejamento das Contratações
2	Reajustar responsabilidades e reforçar a equipe com atribuição de supervisão, para que trabalho seja realizado com mais tempo e maior grau de atenção e o risco não volte a se concretizar	Planejamento das Contratações / Direção Executiva
Fase de Análise: Planejamento da Contratação		

Risco 09:		Contratação com preço acima da média do mercado									
Causa:		Realização inadequada de pesquisa de preços									
Controle:		Rotina de Revisões									
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Comprometimento da economicidade da contratação									
Dano 2:		Possíveis sanções administrativas e criminais									
Tabela de Ação Preventiva para Risco 09											
Id		Ação Preventiva								Responsável	
1		Realizar uma ampla pesquisa de preços praticados pelo mercado da área do objeto a ser licitado								Planejamento das Contratações	
2		Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações								Planejamento das Contratações	
Tabela de Ação de Contingência para Risco 09											
Id		Ação de Contingência								Responsável	
1		Corrigir imediatamente o mecanismo deficiente								Planejamento das Contratações	
2		Bloquear o item no GESCON para compras futuras								Gestão e Execução de Contratos	
3		Promover o reequilíbrio econômico-financeira, com base na pesquisa de preço com valores corretos								Gestão e Execução de Contratos	
Fase de Análise: Planejamento da Contratação											
Risco 10:		Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação									
Causa:		Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação									
Controle:		Valorização profissional e realização de concurso público									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa		Média	X	Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia)									
Dano 2:		Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133									
Tabela de Ação Preventiva para Risco 10											
Id		Ação Preventiva								Responsável	
1		Manter concurso público vigente e com Cadastro de Reserva, para convocação de novo empregado público que substituirá aquele exonerado ou remanejado								Direção Executiva	
2		Dar ciência e discutir com a chefia do setor de planejamento de licitações os planos de remanejamento de pessoal que envolvam funcionários do setor, de forma a minimizar os impactos ocasionados								Direção Executiva	
3		Manter lista atualizada de formação e lotação de todos os empregados públicos, possibilitando conhecer as capacidades de cada um e, caso haja necessidade, que seja solicitado sua atuação em determinados processos cujo responsável técnico do setor tenha sido exonerado ou remanejado								Direção Executiva	
4		Estudar a possibilidade de criação de contratação de empresas de consultoria técnica, que atuarão no apoio às atividades de planejamento, fazendo com intervalos de ausência do								Planejamento das Contratações	

	profissional com formação técnica em determinada área seja menos sentida, evitando assim a total paralização dos processos										
Id		Ação de Contingência								Responsável	
1		Repassar temporariamente para empregados com formação acadêmica competente a elaboração dos documentos enquanto o novo empregado público não for substituído								Planejamento das Contratações	
2		Caso exista, repassar para empresa e consultoria contratada mais demandas da fase de planejamento das contratações								Planejamento das Contratações	
Fase de Análise: Planejamento da Contratação											
Risco 11:		Diminuição de fornecedores após quantificações irreais de produtos ou serviços									
Causa:		IRP deficitária									
Controle:		Treinamento dos usuários do GESCON									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:		Dificuldade de obtenção de orçamentos									
Dano 2:		Redução na competitividade do pregão									
Dano 3		Contratações por preços mais elevados, em razão da baixa competitividade									
Id		Ação Preventiva								Responsável	
1		Ao orçar com fornecedores, solicitar orçamento com quantitativo condizente. Adotar IRP anterior como referencial								Planejamento das Contratações	
2		Estudar a dinâmica de contratações da licitação anterior, de modo a não tornar a IRP do CINCATARINA grande demais, criando expectativas irreais nos fornecedores								Planejamento das Contratações	
3		Manter contato com os fornecedores e avaliar reclamações sobre o processo, de forma que estes se sintam ouvidos e não desistam de participar de novas licitações								Execução e Gestão de Contratos	
Id		Ação de Contingência								Responsável	
1		Entrar em contato com fornecedores no momento de divulgação dos editais, e estar atento ao índice de resposta e interesse, assim como eventuais reclamações que sejam direcionadas ao CINCATARINA								Planejamento das Contratações	
2		Aumentar a abrangência da pesquisa de fornecedores, para que mais empresas participem dos processos, reduzindo o impacto de eventuais empresas que deixem de participar								Planejamento das Contratações e Seleção do Fornecedor	
Fase de Análise: Planejamento da Contratação											
Risco 12:		Falha na comunicação com setores técnicos do CINCATARINA que auxiliarão os empregados lotados no Planejamento das Contratações a elaborar os documentos do processo licitatório									
Causa:		Comunicação interna ineficiente									
Controle:		Adoção de comunicação efetiva									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:		Atraso no cronograma de execução do PCA, podendo resultar em ausência de contratos vigentes para determinado serviço oferecido aos órgãos/entidades consorciadas									
Dano 2:		Quanto ao ETP: pouca segurança nos posicionamentos e conclusões técnicas. Falta de requisitos fundamentais para a contratação. Problemas na execução do contrato. Necessidade de aditivos contratuais									
Id		Ação Preventiva								Responsável	

1	Promover reuniões de alinhamento periódicas, para ajuste da comunicação									Planejamento das Contratações		
2	Permitir que o corpo técnico do setor dedique certa carga horária para auxílio à elaboração dos documentos da fase preparatória da licitação									Planejamento das Contratações		
Id		Ação de Contingência									Responsável	
1	Sanar o erro e efetuar a republicação do edital, caso necessário									Planejamento das Contratações		
2	Realizar reuniões com os responsáveis pelos setores, para realinhar os trabalhos									Planejamento das Contratações		
Fase de Análise: Planejamento da Contratação												
Risco 13:		Aliciamento de empregados por empresas mal-intencionadas										
Causa:		Desejo de obtenção de vantagens por parte de representantes de empresa										
Controle:		Compliance										
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto	
Dano 1:		Prejuízo à competitividade do certame										
Dano 2:		Dano à imagem do CINCATARINA										
Dano 3:		Corrupção e má aplicação do dinheiro público										
Id		Ação Preventiva									Responsável	
1	Orientações frequentes sobre procedimentos a serem adotados no contato com fornecedores									Planejamento das Contratações / Direção Executiva		
2	Sempre contar com dois empregados públicos participando de reuniões com fornecedores									Planejamento das Contratações		
Id		Ação de Contingência									Responsável	
1	Suspensão de Edital afetado por indícios de corrupção									Seleção do Fornecedor		
2	Instauração de PAD									Comissão PAD		
Fase de Análise: Planejamento da Contratação												
Risco 14:		Folha de dados apresentar inconsistências										
Causa:		Metodologia inadequada na elaboração das folhas de dados										
Controle:		Rotina de revisões										
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto	
Dano 1:		Folha de dados ou descritivo exigir algo desatualizado										
Dano 2:		Folha de dados ou descritivo solicitar algo que não pode ser exigido										
Dano 3:		Divergência no descritivo do item e o exigido na folha de dados										
Dano 4:		Exigências divergentes na folha de dados e no termo de referência										
Id		Ação Preventiva									Responsável	
1	Capacitar de forma recorrente os empregados responsáveis por fazer as folhas de dados									Planejamento das Contratações		
2	Verificar se há necessidade de criação ou revisão das folhas de dados e fazer as devidas adequações									Planejamento das Contratações		

3	Para novos itens a folha de dados deverá ser criada com base no descritivo repassado pelos entes consorciados	Planejamento das Contratações
4	O gerente deverá informar à Seleção dos Fornecedores sobre a necessidade de criação de códigos (para itens novos)	Planejamento das Contratações
5	Com os códigos criados, o técnico deverá atualizar as folhas de dados e descritivos na lista inicial	Planejamento das Contratações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Em caso de erro, informar a Seleção dos Fornecedores para atualizar a folha de dados no sistema	Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Planejamento da Contratação		
Risco 15:	Falhas no processo ou na elaboração do edital	
Causa:	Ausência de conhecimento técnico específico sobre os processos de elaboração	
Controle:	Revisão do edital	
Probabilidade:	Muito Baixa	Muito Alta
Impacto:	Muito Baixo	Muito Alto
Dano 1:	Enviar o edital para a Seleção dos Fornecedores fora do cronograma estabelecido	
Dano 2:	Não solicitar no edital todos os documentos de habilitação necessário conforme o objeto do processo	
Dano 3:	Estando em desacordo com a legislação pode haver anulação da licitação	
Dano 4:	O processo licitatório anulado acarreta gastos públicos extras para o CINCATARINA, e por consequência, aos municípios consorciados	
Dano 5:	Especificações técnicas incompletas, pode gerar contratação de produtos que não atendem as necessidades dos entes consorciados	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Revisão do edital por parte da equipe jurídica especializada em licitações	Planejamento das Contratações
2	Seguir os modelos de edital desenvolvido pelo Planejamento das Contratações	Planejamento das Contratações
3	Estar atendo ao edital anterior respeitando suas cláusulas pois há um histórico naquela elaboração	Planejamento das Contratações
4	Observar se há novas resoluções internas que dizem respeito ao processo licitatório e se há atualização da Lei Federal nº 14.133/21	Planejamento das Contratações
5	Compreender e entender o conteúdo do Termo de Referência e sempre que necessário tirar dúvidas com o técnico que o elaborou	Planejamento das Contratações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Fazer as devidas adequações, emitir retificações com novos prazos e republicar o edital	Planejamento das Contratações/ Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor		
Risco 16:	Habilitar uma empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa	
Causa:	Falhas na avaliação dos critérios técnicos do edital	
Controle:	Seguir checklist de conferência dos documentos de habilitação de acordo com o solicitado no edital, ter máxima atenção ao exame de documentos e na análise da amostra com nosso descritivo/folha de dados do Cincatarina	
Probabilidade:	Muito Baixa	Muito Alta
Impacto:	Muito Baixo	Muito Alto

Dano 1:	Desperdício de recursos públicos									
Dano 2:	Possíveis impugnações, recursos e ações judiciais									
Id	Ação Preventiva									Responsável
1	Atenção aos requisitos do edital									Seleção do Fornecedor
2	Capacitação contínua dos empregados públicos									Seleção do Fornecedor
Id	Ação de Contingência									Responsável
1	Após identificação do erro é preciso revisar o processo de habilitação									Seleção do Fornecedor
2	Comunicar todas as partes interessadas sobre o erro									Seleção do Fornecedor
3	Implementar as correções necessárias no processo licitatório									Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										
Risco 17:		Impugnação do edital na Elaboração do Ato Convocatório								
Causa:		Problemas gerados por questões técnicas e de procedimentos								
Controle:		Revisão dos documentos e assessoramento jurídico								
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta	Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto	Muito Alto
Dano 1:	Atraso, anulação ou revogação da licitação									
Dano 2:	Custos adicionais com a readequação do edital									
Id	Ação Preventiva									Responsável
1	Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades									Assessoramento Jurídico
2	Adotar editais padrões validados pelo quadro jurídico do CINCATARINA									Seleção do Fornecedor
Id	Ação de Contingência									Responsável
1	Retirar as cláusulas restritivas ou passíveis de nulidade									Assessoramento Jurídico
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										
Risco 18:		Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações								
Causa:		Problemas no edital ou em procedimentos administrativos								
Controle:		Revisão dos documentos e assessoramento jurídico								
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta	Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	Muito Alto
Dano 1:	Retrabalho									
Dano 2:	Atraso na contratação comprometendo cronogramas de obras, serviços ou fornecimentos									
Dano 3:	Suspensões e revisões do processo podem gerar custos adicionais									
Id	Ação Preventiva									Responsável
1	Definição de critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle									Seleção do Fornecedor
2	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares									Seleção do Fornecedor

3	Observar as recomendações da área jurídica do CINCATARINA	Seleção do Fornecedor
4	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	Seleção do Fornecedor
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Alocação integral da equipe inerente à contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Seleção do Fornecedor
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Seleção do Fornecedor
3	Ajuste e republicação do edital	Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor		
Risco 19:	Adjudicação ou homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa	
Causa:	Falhas processuais internas	
Controle:	Seguir checklist de conferência dos documentos de habilitação de acordo com o solicitado no edital, ter máxima atenção ao exame de documentos e na análise da amostra com nosso descritivo e folha de dados do Cincatarina	
Probabilidade:		Muito Baixa X Baixa Média Alta Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo Baixo Médio X Alto Muito Alto
Dano 1:	Prorrogação da finalização	
Dano 2:	Revogação ou anulação da licitação após a homologação	
Dano 3:	Problemas na gestão do contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Procedimentos rigorosos para a análise e verificação de toda a documentação e das propostas apresentadas	Seleção do Fornecedor
2	Processo de reavaliação das propostas das empresas de acordo com as exigências do edital	Seleção do Fornecedor
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aferir se todos os requisitos do edital foram plenamente atendidos pelos licitantes	Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor		
Risco 20:	Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato	
Causa:	Falhas no processo licitatório e avaliação inadequada das qualificações do fornecedor	
Controle:	Seguir checklist de conferência dos documentos de habilitação de acordo com o solicitado no edital, ter máxima atenção ao exame de documentos e assessoramento jurídico	
Probabilidade:		Muito Baixa X Baixa Média Alta Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo Baixo Médio Alto X Muito Alto
Dano 1:	Atraso na execução do contrato	
Dano 2:	Custos adicionais	
Dano 3:	Hipótese de rescisão contratual	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Capacitação contínua dos empregados públicos	Seleção do Fornecedor
2	Revisão dos critérios de habilitação e detalhada dos documentos	Seleção do Fornecedor

3	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto								Seleção do Fornecedor		
Id	Ação de Contingência								Responsável		
1	Realizar aplicação de sanções								Assessoramento Jurídico		
2	Rescisão contratual								Assessoramento Jurídico		
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 21:		Falta de capacidade técnico operacional da empresa contratada									
Causa:		Falha no processo de seleção e avaliação inadequada das qualificações do fornecedor									
Controle:		Seguir checklist de conferência dos documentos de habilitação de acordo com o solicitado no edital e ter máxima atenção ao exame de documentos									
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atrasos no cronograma do projeto									
Dano 2:		Inexecução contratual									
Id	Ação Preventiva								Responsável		
1	Aplicar critérios de avaliação com ênfase à capacidade técnico-operacional e à experiência dos fornecedores								Seleção do Fornecedor		
2	Realizar uma pesquisa de mercado abrangente para entender as capacidades dos fornecedores								Seleção do Fornecedor		
3	Exigência de requisitos de qualificação técnica e econômica adequados ao objeto licitado								Seleção do Fornecedor		
Id	Ação de Contingência								Responsável		
1	Verificar se a empresa atende aos requisitos exigidos na fase de Habilitação								Seleção do Fornecedor		
2	Mobilização de recursos adicionais, reestruturação do cronograma de trabalho e intensificação da supervisão								Seleção do Fornecedor		
3	Ajustar o escopo do trabalho ou repriorizar demandas para garantir que o projeto ou serviço possa continuar de forma funcional								Seleção do Fornecedor		
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 22:		Contratação de Empresa Inidônea									
Causa:		Falhas no processo de seleção, contratação e na fiscalização das empresas envolvidas									
Controle:		Fazer a conferência no CEIS e CNEP									
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:		Contratação baseada em conduta fraudulenta, ardilosa ou enganosa perpetradas com o objetivo de obter vantagem indevida em desfavor da Administração Pública									
Dano 2:		Possibilidade de responsabilização de agentes públicos pelo cometimento do crime de contratação inidônea, nos termos do art. 337-M do Código Penal									
Id	Ação Preventiva								Responsável		
1	Consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep)								Seleção do Fornecedor		
2	Verificar a regularidade e validade da documentação apresentada pelo licitante								Seleção do Fornecedor		
3	Emitir as certidões negativas de inidoneidade, impedimento e débitos trabalhistas, com as respectivas datas de emissão, para posterior vinculação ao processo.								Seleção do Fornecedor		

Id		Ação de Contingência								Responsável	
1		Bloquear os itens para os municípios não efetuarem a compra								Seleção do Fornecedor	
2		Buscar próximos colocados no cadastro reserva de fornecedores								Seleção do Fornecedor	
3		Abrir Processo Administrativo contra a empresa								Seleção do Fornecedor	
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 23:		Análise imprecisa de amostras									
Causa:		Avaliação inadequada das amostras enviadas pelo fornecedor e falta de treinamento adequado do pessoal									
Controle:		Setor possuir uma equipe multidisciplinar e seguir um padrão de conferência baseada nas folhas de dados e descritivos dos itens									
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Reprovação equivocada de bens que, em última análise, resulta na aquisição de bens por preços maiores									
Dano 2:		Risco de ações judiciais									
Id		Ação Preventiva								Responsável	
1		Averiguar por outras fontes, quando necessário, a veracidade das informações prestadas pelos fornecedores, orientando fornecedores quanto ao tipo de documentação necessária para aprovação								Seleção do Fornecedor	
2		Contratação de laboratórios com reconhecida credibilidade para execução de ensaios que comprovem as características das amostras								Seleção do Fornecedor	
Id		Ação de Contingência								Responsável	
1		Em casos de dúvidas nas análises, compartilhar com demais técnicos da mesma área do consórcio para colher informações e opiniões, buscando sempre o melhor produto								Seleção do Fornecedor	
2		Equipe do planejamento, quando possível, pode indicar as fontes que resultaram nas exigências das folhas de dados e descritivos								Planejamento da Contratação	
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 24:		Análise imprecisa da habilitação									
Causa:		Falhas no processo licitatório, avaliação inadequada das qualificações do fornecedor e falta de treinamento adequado									
Controle:		Seguir checklist de conferência dos documentos de habilitação de acordo com o solicitado no edital, ter máxima atenção ao exame de documentos e assessoramento jurídico									
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Inabilitação equivocada de empresas que, em última análise, resulta na aquisição de serviços mais caros									
Dano 2:		Risco de ações judiciais									
Id		Ação Preventiva								Responsável	
1		Implementar/manter sistema de redundância nos procedimentos de análises, para dividir a responsabilidade da decisão e permitir discussão sobre medidas a serem tomadas								Seleção do Fornecedor	
Id		Ação de Contingência								Responsável	
1		Em casos de dúvidas nas análises, compartilhar com demais técnicos da mesma área do consórcio para colher informações e opiniões, buscando sempre o melhor produto								Seleção do Fornecedor	

2	Equipe do planejamento, quando possível, pode indicar as fontes que resultaram nas exigências das folhas de dados e descritivos									Planejamento da Contratação
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										
Risco 25:		Contratar um objeto acima do valor estimado								
Causa:		Falha na metodologia de pesquisa de reanálise de preços								
Controle:		Seguir os procedimentos para realizar a pesquisa da reanálise de preços em cima da marca vencedora e ter máxima atenção no preenchimento da planilha								
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta	Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto	Muito Alto
Dano 1:		Ilegalidade (possível penalização aos responsáveis pela contratação)								
Dano 2:		Gasto de dinheiro público								
Id	Ação Preventiva									Responsável
1	Elaborar os orçamentos de forma precisa e assertiva com o que existe atualmente no mercado									Planejamento da Contratação
2	Realizar reanálise de todos os itens com valores superestimados, verificar as marcas/modelos e unidades de medida.									Seleção do Fornecedor
Id	Ação de Contingência									Responsável
1	Cancelar os itens acima do valor de mercado e realizar nova licitação caso seja necessário									Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										
Risco 26:		Contratar um objeto abaixo do valor estimado								
Causa:		Erro na pesquisa de preços ou na análise de mercado								
Controle:		Seguir os procedimentos para realizar a pesquisa da reanálise de preços em cima da marca vencedora e ter máxima atenção no preenchimento da planilha								
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa		Média	X	Alta	Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X Muito Alto
Dano 1:		Demanda a mais para o Setor de Execução, que terá que rescindir o contrato								
Dano 2:		O município que terá comprado o item errado possivelmente terá atraso/inexecução da entrega ou ficará sem o bem								
Id	Ação Preventiva									Responsável
1	Estar atento aos itens em que são caixas, kits, pois muitos fornecedores cotam valor unitário									Seleção do Fornecedor
2	Estar atento aos itens que estão muito abaixo do valor de IRP, se possível, ligar para o fornecedor questionando se a cotação está correta									Seleção do Fornecedor
3	Realizar reanálise para verificar o valor de mercado da marca que o fornecedor cotou									Seleção do Fornecedor
Id	Ação de Contingência									Responsável
1	Desclassificar o fornecedor com valor inexecutável e passar para o próximo colocado									Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										
Risco 27:		Contratar fornecedor que possua débitos com a União, Estado, Município								
Causa:		Falhas no processo de seleção e análise de documentação								
Controle:		Seguir checklist de conferência dos documentos de habilitação de acordo com o solicitado no edital e ter máxima atenção ao exame de documentos								
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta	Muito Alta

Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:		Rescisão de contrato, atraso no edital e possível sanção penal por contratação de fornecedor não habilitado									
Id	Ação Preventiva									Responsável	
1	Conferir o CNPJ das CNDS e as respectivas veracidades									Seleção do Fornecedor	
Id	Ação de Contingência									Responsável	
1	Inabilitação do fornecedor em todo processo para que nenhum item possa ser passado para o mesmo. Caso o fornecedor seja beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, dar o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização dos débitos e apresentação de Certidão Negativa									Seleção do Fornecedor	
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 28:		Elaboração de Cadastro Reserva de Fornecedores com informações erradas/inexistentes									
Causa:		Não realizar uma verificação adequada das informações coletadas									
Controle:		Seguir um padrão de planilha de Cadastro Reserva de Fornecedores com preenchimento baseado no edital e no ranking do processo e passar para conferência antes da sua publicação									
Probabilidade:		X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Contratação de fornecedores e/ou valores divergentes do ranking original do processo									
Dano 2:		Responsabilização ao CINCATARINA									
Id	Ação Preventiva									Responsável	
1	Trabalhar somente com a planilha aberta do processo em questão para evitar usar informações de outras licitações									Seleção do Fornecedor	
2	Conferir com o ranking originário do PCP do processo									Seleção do Fornecedor	
3	Conferir fornecedores inabilitados para que não sejam colocados no Cadastro Reserva de Fornecedores									Seleção do Fornecedor	
4	Ter o cadastro de Reserva de Fornecedores sistematizado no Gescon, de modo que evite erros nas buscas dos próximos colocados									Seleção do Fornecedor	
Id	Ação de Contingência									Responsável	
1	Refazer todo o cadastro reserva imediatamente, informar ao Setor de Execução sobre o erro e solicitar conferência do cadastro de reserva por outro empregado público da equipe									Seleção do Fornecedor	
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 29:		Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade									
Causa:		Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos									
Controle:		Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:		Pouca efetividade na pré-qualificação									
Id	Ação Preventiva									Responsável	
1	Buscar sempre efetuar a divulgação para o maior número possível de empresas reconhecidas no mercado como de boa reputação e com bens de qualidade									Seleção do Fornecedor	

2	Dialogar com a equipe de Planejamento pode auxiliar, uma vez que constantemente são feitos contatos com fornecedores para obtenção de manuais, descritivos técnicos dos produtos entre outros documentos								Seleção do Fornecedor		
Id	Ação de Contingência								Responsável		
1	Caso haja baixa adesão, intensificar a busca por novas empresas								Seleção do Fornecedor		
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 30:		Não apresentação de amostra para pré-qualificação									
Causa:		Ineficiência da divulgação do processo licitatório									
Controle:		Realizar o procedimento de divulgação dos editais de chamada pública, principalmente para fornecedores que já enviaram amostras para pré-qualificar em editais anteriores									
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Não ter marcas pré-qualificadas no momento da abertura da licitação									
Id	Ação Preventiva								Responsável		
1	Divulgar o edital de chamada pública								Seleção do Fornecedor		
2	Entrar em contato com os fornecedores e orientá-los								Seleção do Fornecedor		
Id	Ação de Contingência								Responsável		
1	Lançar novamente o edital de licitação com os itens que não tiverem marcas pré-aprovadas e entrar em contato com os fornecedores para que apresentem seus produtos								Seleção do Fornecedor		
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 31:		Ausência da publicação do edital de chamada pública									
Causa:		Não publicação do edital dentro do prazo estabelecido por lei									
Controle:		Seguir os procedimentos de acordo com o padrão, todo início do ano realizar a publicação de todos os editais de chamada pública									
Probabilidade:		X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Impugnações do processo e ações judiciais									
Dano 2:		Anulação de todos os atos praticados									
Dano 3:		Comprometimento da credibilidade do CINCATARINA perante os municípios consorciados e fornecedores									
Id	Ação Preventiva								Responsável		
1	Observar o checklist disponibilizado no setor de Seleção do Fornecedor								Seleção do Fornecedor		
2	Treinamento e capacitação contínua dos empregados públicos								Seleção do Fornecedor		
3	Planejamento do calendário de publicações								Seleção do Fornecedor		
Id	Ação de Contingência								Responsável		
1	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem dos prazos de apresentação da proposta								Seleção do Fornecedor		
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 32:		Não realizar reanálise de preços dos produtos									
Causa:		Falhas no processo licitatório e falta de treinamento adequado									

Controle:		Seguir todas as etapas do processo licitatório, treinamento da equipe e dupla conferência dos procedimentos									
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:		Ilegalidade (possível penalização aos responsáveis pela contratação)									
Dano 2:		Gasto de dinheiro público									
Id		Ação Preventiva								Responsável	
1		Observar o checklist disponibilizado no setor de Seleção do Fornecedor								Seleção do Fornecedor	
2		Capacitação contínua dos empregados públicos								Seleção do Fornecedor	
3		Em casos de dúvidas sempre questionar demais empregados públicos da equipe								Seleção do Fornecedor	
Id		Ação de Contingência								Responsável	
1		Se possível retornar para a etapa da reanálise de preços imediatamente								Seleção do Fornecedor	
2		Solicitar conferência das etapas do processo licitatório por outro empregado público da equipe								Seleção do Fornecedor	
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 33:		Não cadastrar no sistema as sanções existentes emitidas pelos municípios do estado de Santa Catarina dos fornecedores quando observado na consulta do CEIs/CNEP									
Causa:		Falhas na análise da consulta e falta de treinamento adequado									
Controle:		Ter máxima atenção ao exame de documentos e treinamento da equipe									
Probabilidade:		X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Contratação indevida, baseada em conduta fraudulenta, ardilosa ou enganosa									
Dano 2:		Repetição dos mesmos problemas nas contratações futuras, perpetuando o ciclo vicioso de falhas na contratação									
Dano 3:		Impactos financeiros e administrativos									
Id		Ação Preventiva								Responsável	
1		Conferir com a máxima atenção a consulta no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), e caso conter sanções realizar prints da tela do dia da conferência								Seleção do Fornecedor	
2		Capacitação contínua dos empregados públicos								Seleção do Fornecedor	
3		Em casos de dúvidas sempre questionar demais empregados públicos da equipe								Seleção do Fornecedor	
Id		Ação de Contingência								Responsável	
1		Cadastrar no sistema imediatamente a sanção existente								Seleção do Fornecedor	
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 34:		Não cadastrar no sistema as opções do item para o município fazer a escolha no momento da contratação									
Causa:		Falhas no andamento das etapas e falta de treinamento adequado									
Controle:		Seguir todas as etapas do processo licitatório e treinamento da equipe									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta

Impacto:			Muito Baixo		Baixo	X	Médio		Alto		Muito Alto
Dano 1:		Transtornos para o setor de execução de contratos que terão que tratar diretamente com o município das AFs que já foram emitidas sem as opções previstas									
Dano 2:		Transtornos para o fornecedor que poderão deixar de atender efetivamente o município									
Dano 3:		Falhas na contratação									
Id		Ação Preventiva								Responsável	
1		Seguir as etapas e procedimentos de acordo com o que foi repassado pela equipe								Seleção do Fornecedor	
2		Capacitação contínua dos empregados públicos								Seleção do Fornecedor	
Id		Ação de Contingência								Responsável	
1		Cadastrar no sistema imediatamente as opções existentes								Seleção do Fornecedor	
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 35:		A folha de dados do item não se encontra disponível no sistema quando o descritivo a prevê									
Causa:		Empregados públicos insuficientes e alta demanda de processos licitatórios ocorrendo simultaneamente									
Controle:		Melhor distribuição das atividades dentro do setor e concurso ativo para novas convocações									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo	X	Médio		Alto		Muito Alto
Dano 1:		Deixar de atender efetivamente o município									
Dano 2:		Os municípios não conseguem visualizar o descritivo completo do item									
Id		Ação Preventiva								Responsável	
1		Redistribuição de atividades entre empregados públicos e priorização de demanda								Seleção do Fornecedor	
2		Manter concurso público vigente e com Cadastro de Reserva para convocação de novo empregado público quando necessário								Seleção do Fornecedor	
Id		Ação de Contingência								Responsável	
1		Elaborar o mais breve possível a folha de dados e cadastrá-la no sistema								Seleção do Fornecedor	
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 36:		Folha de dados com alguma informação divergente									
Causa:		Falta de cuidado durante a elaboração da folha de dados									
Controle:		Ter máxima atenção no momento de elaborar a folha de dados e dupla conferência									
Probabilidade:		X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo	X	Médio		Alto		Muito Alto
Dano 1:		Deixar de atender efetivamente o município									
Dano 2:		Os municípios visualizarão uma informação inverídica sobre o descritivo do item									
Id		Ação Preventiva								Responsável	
1		Adotar rotina de revisão das folhas de dados antes de serem inseridas no sistema								Seleção do Fornecedor	
Id		Ação de Contingência								Responsável	

1	Ajustar imediatamente a informação na folha de dados									Seleção do Fornecedor
2	Substituir no sistema imediatamente a folha de dados ajustada									Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										
Risco 37:		Não cadastrar no sistema o múltiplo do item quando for pertinente								
Causa:		Falhas no andamento das etapas e falta de treinamento adequado								
Controle:		Seguir todas as etapas do processo licitatório e treinamento da equipe								
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta	Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo	X	Médio		Alto	Muito Alto
Dano 1:		Transtornos para o setor de execução de contratos que terão que tratar diretamente com o município das AFs que já foram emitidas em desacordo com o múltiplo correto								
Dano 2:		Transtornos para o fornecedor que poderão deixar de atender efetivamente o município								
Dano 3:		Falhas na contratação								
Id		Ação Preventiva							Responsável	
1		Seguir as etapas e procedimentos de acordo com o que foi repassado pela equipe							Seleção do Fornecedor	
2		Capacitação contínua dos empregados públicos							Seleção do Fornecedor	
Id		Ação de Contingência							Responsável	
1		Cadastrar no sistema imediatamente o múltiplo							Seleção do Fornecedor	
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										
Risco 38:		Não incluir código no edital de chamada pública para pré-qualificação de bens								
Causa:		Falhas no andamento das etapas e falta de treinamento adequado								
Controle:		Revisão dos documentos								
Probabilidade:		X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta	Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	Muito Alto
Dano 1:		Problemas no futuro processo licitatório desse objeto								
Dano 2:		Não poderá exigir a pré-qualificação no processo licitatório								
Dano 3:		Retrabalho								
Id		Ação Preventiva							Responsável	
1		Procedimentos rigorosos de conferência do edital antes de realizar a sua publicação							Seleção do Fornecedor	
2		Em casos de dúvidas sempre questionar demais empregados públicos da equipe							Seleção do Fornecedor	
3		Capacitação contínua dos empregados públicos							Seleção do Fornecedor	
Id		Ação de Contingência							Responsável	
1		Seguir com o processo licitatório sem a exigência da pré-qualificação para o item em questão							Seleção do Fornecedor	
2		Providenciar a publicação de um novo edital de chamada pública com os códigos faltantes, caso seja muito necessário							Seleção do Fornecedor	
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										

Risco 39:		Aprovar um item erroneamente no edital de chamada pública para pré-qualificação de bens									
Causa:		Avaliação inadequada das amostras, falhas na avaliação dos critérios técnicos do edital de chamada pública para pré-qualificação de bens e falta de treinamento adequado do pessoal									
Controle:		Ter máxima atenção ao exame de documentos, setor possuir uma equipe multidisciplinar e seguir um padrão de conferência baseada nas folhas de dados e descritivos dos itens									
Probabilidade:		X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Reprovação equivocada de bens									
Dano 2:		Problemas no processo licitatório e gestão do contrato									
Dano 3:		Retrabalho									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:		Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 40:		Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:		Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:		Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto

2	Estar em contato com os responsáveis diretos pelas publicações nos principais Diários (DOM, DOE, DOU, DC), para que o CINCATARINA possa ser informado quando ocorrerem instabilidades	Seleção do Fornecedor
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Após identificação do Portal/Veículo de publicação que está apresentando erro para publicação do Extrato do Edital, entrar em contato para que a solução seja resolvida o mais rápido possível, evitando que o Edital fique parado por conta disso	Seleção do Fornecedor
2	Avaliar se o veículo de publicação possui obrigatoriedade de publicação do Extrato e qual a urgência da licitação, para assim, avaliar se o Edital pode ser publicado sem a veiculação deste Jornal	Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor		
Risco 41:	Baixa adesão dos municípios no momento de quantificar suas Intenções de Registro de Preços	
Causa:	Ocasionalmente pela baixa divulgação de abertura de IRP e da sua importância através de ligações e pela facilidade de compra de itens devido à existência de adesão à ata através de MOP	
Controle:	Possuir um funcionário com dedicação exclusiva no contato com o município para realizar a orientação quanto à realização da Intenção de Registro de Preços e sua divulgação, para todos os órgãos participantes, além de orientar sobre o correto uso do saldo destinado ao CINCATARINA através da MOP	
Probabilidade:		Muito Baixa Baixa Média X Alta Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo Baixo Médio Alto X Muito Alto
Dano 1:	Baixa adesão dos órgãos na licitação inicial	
Dano 2:	O saldo direcionado ao CINCATARINA, reservado sobretudo às novas entidades que integram ao Consórcio é todo utilizado para os municípios que já estão consorciados há tempos e não fizeram IRP	
Dano 3:	Pela facilidade de adquirir sem a necessidade da IRP, apenas através de MOP, as pessoas param de realizar seus quantitativos, o que prejudica o real motivo da existência do setor de Compras, realização de licitações compartilhadas, fazendo com que o consórcio licite a maior parte do saldo para si e não para os Órgãos Participantes	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Promover a informação da necessidade de realização da Intenção de Registro de Preços aos municípios	Seleção do Fornecedor
2	Realizar contato com as pessoas que realizam efetivamente as compras, não somente com os responsáveis dos municípios, para avisar da abertura de novas IRPs no sistema	Seleção do Fornecedor
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aumentar o quantitativo dos itens para o CINCATARINA, evitando que os municípios novos que ingressarem ao processo e, também aqueles que não quantificarem suas Intenções de Registro de Preços fiquem sem saldo	Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor		
Risco 42:	Erros no Cadastro da Requisição ao Compras	
Causa:	Ocorre por falta de atenção no momento de gerar a Requisição ao Compras na IPM	
Controle:	Conferência rigorosa através de fórmulas após geração da Requisição e antes de finalizá-la	
Probabilidade:	X	Muito Baixa Baixa Média Alta Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo Baixo Médio Alto X Muito Alto
Dano 1:	No momento da importação do processo com o Portal de Compras Públicas para sua homologação, as informações não irão coincidir e o procedimento não será executado	

Dano 2:	Erro no cálculo final do valor de homologação do processo transmitido ao Tribunal de Contas de SC										
Dano 3:	Dependendo da etapa do processo, podem ocorrer danos financeiros ao CINCATARINA, haja vista que a plataforma da IPM possui custos para reverter alguns procedimentos já finalizados e transmitidos ao tribunal										
Id	Ação Preventiva								Responsável		
1	Treinamento de todos os funcionários para que todos saibam como realizar o cadastro e a elaboração de uma Requisição ao Compras								Seleção do Fornecedor		
2	Conferência rigorosa através de fórmulas na ferramenta Excel para confirmação se os códigos, valores e itens foram lançados corretamente								Seleção do Fornecedor		
Id	Ação de Contingência								Responsável		
1	Analisar em que fase o processo está, se ainda for editável, pode-se retornar e excluir a requisição para que esta seja refeita								Seleção do Fornecedor		
2	Se o Edital já foi publicado, deve ser entrado em contato com a IPM para os desenvolvedores verificarem se o erro pode ser contido ou resolvido pela própria programação do sistema, pois o documento da Requisição ao Compras contendo o item ou o valor errado já foi transmitido ao Tribunal de Contas								Seleção do Fornecedor		
3	A transmissão final ao TCE, caso o valor homologado na IPM encontre-se divergente do valor homologado no Portal de Compras Públicas, deve ser resolvida diretamente com os responsáveis do setor e da IPM, que decidirão o adequado a ser feito. Determinadas alíquotas podem ser deduzidas do CINCATARINA, dependendo do serviço a ser executado pela plataforma da IPM								Seleção do Fornecedor		
Fase de Análise: Execução do Contrato											
Risco 43:		Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato									
Causa:		Empregados públicos insuficientes									
Controle:		Concurso ativo para reposição de empregados públicos									
Probabilidade:		X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:		Não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio									
Id	Ação Preventiva								Responsável		
1	Manter concurso público vigente e com Cadastro de Reserva, para convocação de novo empregado público que substituirá aquele exonerado ou remanejado								Execução do Contrato		
2	Dar ciência e discutir com a chefia do setor de Execução do Contrato os planos de remanejamento de pessoal que envolvam funcionários do setor, de forma a minimizar os impactos ocasionados								Execução do Contrato		
3	Manter lista atualizada de formação e lotação de todos os empregados públicos, possibilitando conhecer as capacidades de cada um e, caso haja necessidade, que seja solicitado sua atuação em determinados processos cujo responsável técnico do setor tenha sido exonerado ou remanejado								Execução do Contrato		
Id	Ação de Contingência								Responsável		
1	Redistribuição de atividades entre empregados públicos e priorização de demanda								Execução do Contrato		
Fase de Análise: Execução do Contrato											
Risco 44:		Não apresentação de garantias de execução contratual									
Causa:		Inadequação técnica e financeira das empresas									
Controle:		Descrever no Edital todas as garantias necessárias para atendimento dos contratos									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto

Dano 1:	Prejuízo aos recursos financeiros públicos											
Dano 2:	Possibilidade de rescisão contratual											
Id		Ação Preventiva									Responsável	
1		Editais elaborados de forma clara e bem detalhados sobre a exigência de garantias de execução contratual										
2		Manter comunicação com os fornecedores para esclarecer dúvidas e garantir que todos os requisitos sejam cumpridos										
3		Exigir garantias de execução contratual									Execução do Contrato	
Id		Ação de Contingência									Responsável	
1		Revisar os critérios de seleção de fornecedores e as exigências de garantias									Execução do Contrato	
2		Aplicação de penalidades como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitações e/ou declaração de inidoneidade, conforme é previsto na Lei Federal nº 14.133/21									Execução do Contrato	
Fase de Análise: Execução do Contrato												
Risco 45:		Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais										
Causa:		Não cumprimento dos requisitos do processo										
Controle:		Descrever no Edital penalidades referente ao não atendimento das garantias necessárias para atendimento dos contratos										
Probabilidade:		X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto	
Dano 1:		Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a Administração										
Dano 2:		Impactos financeiros e administrativos										
Id		Ação Preventiva									Responsável	
1		Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto									Execução do Contrato	
2		Garantir que os editais sejam elaborados de forma clara e bem detalhados sobre às exigências de assinatura do contato e apresentação das garantias contratuais									Execução do Contrato	
Id		Ação de Contingência									Responsável	
1		Perda da garantia de proposta por parte do licitante, previsto na Lei Federal nº 14.133/21									Execução do Contrato	
2		Convocar remanescente									Execução do Contrato	
Fase de Análise: Execução do Contrato												
Risco 46:		Execução em desacordo com o contrato										
Causa:		Não cumprimento dos requisitos do processo										
Controle:		Fiscalização do contrato, notificação por inexecução, aplicação de penalidades										
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa		Média	X	Alta		Muito Alta	
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto	
Dano 1:		Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração										
Id		Ação Preventiva									Responsável	
1		Verificar o histórico da empresa terceirizada em relação a correta execução de outros serviços									Execução do Contrato	
2		Durante a habilitação e ao longo da execução do contrato, é importante o CINCATARINA avalie a capacidade técnica e financeira da empresa contratada									Execução do Contrato	

	para garantir o cumprimento do contrato										
3	Averiguar o Art. 91 da Lei Federal n. 14.133/21, no que diz respeito a verificação da regularidade fiscal do contratado, através do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep)										Execução do Contrato
Id	Ação de Contingência										Responsável
1	Verificar se a empresa terceirizada executou corretamente o serviço, se falhas forem detectadas é necessário tomar medidas corretivas imediatas, como a exigência de retrabalho ou substituição de itens ou serviços										Execução do Contrato
2	Aplicação de penalidades como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitações e/ou declaração de inidoneidade, conforme é previsto na Lei Federal nº 14.133/21										Execução do Contrato
3	Suspensão temporária da execução do contrato para ajustes, e em casos mais graves, rescisão do contrato										Execução do Contrato
4	Não liberação de pagamento										Execução do Contrato
Fase de Análise: Execução do Contrato											
Risco 47:		Contratos com deficiência em cláusulas e regramento									
Causa:		Falta de atenção, conhecimento e recursos durante a elaboração do documento									
Controle:		Revisão de documentos pelos técnicos									
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Não conseguir atuar no fornecimento deixando municípios desassistidos									
Dano 2:		Dificuldade para o consórcio público monitorar o cumprimento das obrigações, pois a falta de critérios objetivos impede a avaliação da execução, gerando problemas de fiscalização									
Dano 3:		Pode gerar disputa entre o consórcio público e o contratado, ocasionando possíveis litígios judiciais ou administrativos									
Id	Ação Preventiva										Responsável
1	Atenção na elaboração do contrato seguindo rito dos elementos essenciais do Art. 92 da Lei Federal n. 14.133/21										Execução do Contrato
2	Revisão jurídica e técnica do contrato										Execução do Contrato
3	Capacitação contínua dos empregados públicos que são responsáveis pela elaboração e gestão dos contratos										Execução do Contrato
Id	Ação de Contingência										Responsável
1	Manter treinamento na equipe técnica de elaboração										Execução do Contrato
2	Realização de ajustes no contrato por meio de termos aditivos, conforme permite a Lei Federal nº 14.133/21										Execução do Contrato
3	Aplicação de penalidades como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitações e/ou declaração de inidoneidade, conforme é previsto na Lei Federal nº 14.133/21										Execução do Contrato
4	Após ocorrência de problemas com cláusulas contratuais deficientes, o CINCATARINA deve revisar seus processos de elaboração e fiscalização de contratos, identificando as falhas e promovendo melhorias										Execução do Contrato
Fase de Análise: Execução dos Contratos											
Risco 48:		Indisponibilidade no sistema de Gestão de Serviços e Contratos Públicos - GESCON									
Causa:		Falhas de natureza física ou lógica, equipamentos ou softwares									
Controle:		Manutenção e atualização periódica dos equipamentos e sistemas assim como acompanhamentos de relatórios de eventos, checklist e demais meios de monitoramento dos sistemas									

Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Deixar de atender efetivamente a qualquer usuário do sistema, sejam dos municípios e até mesmo do CINCATARINA									
Dano 2:		As informações dos processos de compras ou entregas estarão comprometidas									
Dano 3:		Perca de prazos para compras, entregas e recebimentos									
Dano 4:		Não racionalização de processos									
Ação Preventiva											
Id		Ação Preventiva								Responsável	
1		Manutenção periódica do contrato do software com a emissão de relatórios de execução e checklist do sistema afim de identificar eventuais aumentos no número de chamados técnicos. Verificação periódica sobre os requisitos de contratação com relação as hospedagens dos servidores do sistema os quais deverão estar em ambiente de datacenter em nuvem e com a certificação mínima Tier 3 garantindo assim a redundância de equipamentos de infraestrutura, links de internet e até mesmo locais físicos do armazenamento								Execução do Contrato	
Ação de Contingência											
Id		Ação de Contingência								Responsável	
1		Ao menor sinal de possível indisponibilidade ou falhas na utilização do sistema a cláusula 9.25 do contrato (CT22CIN0042) será considerada onde o fornecedor tem a obrigação de “manter o sistema disponível no formato 24x7 (vinte e quatro horas por sete dias por semana) em todos os dias do ano”, fazendo o uso dos recursos do datacenter Tier 3 para que a infraestrutura redundante passe a operar								Execução do Contrato	
Fase de Análise: Execução do Contrato											
Risco 49:		Falta de feedback da efetividade da contratação e dos problemas identificados no processo licitatório ou na execução do contrato									
Causa:		Comunicação interna ineficiente									
Controle:		Registro de ocorrência durante execução de contratos para possíveis correções para próximos processos.									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa		Média	X	Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:		Repetição dos mesmos problemas nas contratações futuras, perpetuando o ciclo vicioso de falhas na contratação									
Dano 2:		Má qualidade dos serviços e bens oferecidos aos órgãos/entidades consorciadas									
Ação Preventiva											
Id		Ação Preventiva								Responsável	
1		Estabelecer metodologia/canal de feedback eficiente, que permita que os fiscais e gestores dos contratos (tanto do CINCATARINA como dos demais municípios e entidades) informem ao setor de planejamento de licitações os pontos a serem ajustados no próximo processo								Fiscais e gestores de contratos e Desenvolvedores do sistema	
2		Promover reuniões regulares de alinhamento dos setores da central de compras (planejamento, seleção e execução), para entendimento das cargas de trabalho existentes, funcionamento da comunicação interna e auxílio mútuo entre as gerências								Gestores das gerências da Central de Compras	
Ação de Contingência											
Id		Ação de Contingência								Responsável	
1		Caso a caso, enquanto ainda não houver uma metodologia definida para o repasse das informações, cabe o técnico responsável pela elaboração dos documentos investigar os problemas ocorridos com o objeto em questão junto aos demais gerências								Execução do Contrato	
Fase de Análise: Execução do Contrato											
Risco 50:		Município fazer a solicitação dentro do sistema e não anexar a nota de empenho									

Causa:		Falta de atenção e de treinamento adequado									
Controle:		Sistema de controle por indicadores.									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa		Média	X	Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:		Não efetivação da solicitação									
Dano 2:		Atraso na formalização da Autorização de Fornecimento									
Id	Ação Preventiva									Responsável	
1	Promover treinamentos contínuos com os usuários do sistema									Equipe de treinamento	
Id	Ação de Contingência									Responsável	
1	Através do sistema avisos e alertas para os usuários									Execução de Contratos	
Fase de Análise: Execução do Contrato											
Risco 51:		Fornecedor não dar o recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) dentro do prazo previsto em edital									
Causa:		Atraso na entrega do produto para o município, conforme prazo estabelecido em Edital									
Controle:		Acompanhamento diário pelo Sistema Gescon e efetuando via telefone a confirmação, não havendo confirmação o fornecedor e notificado administrativamente									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa		Média	X	Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:		Atraso na entrega do produto para o município									
Dano 2:		Pode ocorrer penalização do fornecedor e troca do mesmo									
Id	Ação Preventiva									Responsável	
1	Orientação e treinamento do fornecedor									Equipe de Treinamento	
Id	Ação de Contingência									Responsável	
1	Notificar fornecedor para cumprimento das obrigações do Edital									Execução de Contratos	
Fase de Análise: Execução do Contrato											
Risco 52:		Fornecedor não anexar a Nota Fiscal e o comprovante de entrega no sistema									
Causa:		Não cumprimento das obrigações prevista em Edital.									
Controle:		Notificação pelo Sistema Gescon e Ocorrência registrada pelo município informando o recebimento dos Produtos									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:		Município não consegue confirmar o recebimento provisório e definitivo.									
Dano 2:		Notificação para o fornecedor que entregou a mercadoria, gerando retrabalho.									
Id	Ação Preventiva									Responsável	
1	Treinamento e orientação									Equipe de treinamento	
Id	Ação de Contingência									Responsável	

1	Notificação via sistema Gescon por inexecução de contrato										Execução de Contrato	
Fase de Análise: Execução do Contrato												
Risco 53:		Município não dar o recebimento provisório e definitivo no sistema										
Causa:		Falta de comprometimento, conhecimento e controle										
Controle:		Registro de ocorrência pelo município informando o não recebimento dos produtos										
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa		Média	X	Alta		Muito Alta	
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto	
Dano 1:		Sem confirmação da efetiva entrega do objeto contratado										
Id		Ação Preventiva									Responsável	
1		Treinamento e controle através de Sistema Gescon									Equipe de Treinamento/ Execução de Contratos	
Id		Ação de Contingência									Responsável	
1		Notificação por nota lançada e não entregue após registro de ocorrência pelo município									Execução de Contratos	
Fase de Análise: Execução do Contrato												
Risco 54:		Fornecedor não entregar dentro do prazo estabelecido										
Causa:		Impossibilita as atividades programadas pelos municípios.										
Controle:		Notificação, acompanhamento e penalização do fornecedor.										
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa		Média		Alta	X	Muito Alta	
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto	
Dano 1:		Dificulta o desenvolvimento das atividades programadas pelo município.										
Dano 2:		Ações para tratativa quanto ao descumprimento pode demorar devido aos prazos legais previstos em lei.										
Id		Ação Preventiva									Responsável	
1		Especificação clara de prazos no edital									Execução de Contratos	
2		Na fase de habilitação e julgamento das propostas é importante avaliar a capacidade técnica e logística do fornecedor, incluindo a verificação de seu histórico de entregas									Execução de Contratos	
3		Monitoramento contínuo da execução contratual através dos fiscais de contrato ou do gestor responsável									Execução de Contratos	
Id		Ação de Contingência									Responsável	
1		Notificar fornecedor, agilizar abertura de Processo Administrativo e andamento do processo									Execução de Contratos	
2		Se o atraso causar prejuízos significativos ao consórcio público pode-se acionar a execução das garantias contratuais									Execução de Contratos	
3		Penalização para o fornecedor recorrente de atrasos previstas em contrato									Execução de Contratos	
Fase de Análise: Execução do Contrato												
Risco 55:		Não realizar o acompanhamento dos preços registrados nas ARP e contratos										
Causa:		A ausência de acompanhamento dos preços praticados no mercado										
Controle:		Pesquisa de mercado para revisão dos valores										


Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo	X	Médio		Alto		Muito Alto
Dano 1:		Aquisição de produtos com valor fora do praticado no mercado									
Dano 2:		Custo elevado do produto para o município									
Id	Ação Preventiva									Responsável	
1	Acompanhar o valor de mercado dos objetos licitados									Execução de Contratos	
Id	Ação de Contingência									Responsável	
1	Solicitar ao fornecedor a revisão de preços dos objetos acompanhando o valor de mercado									Execução de Contratos	
Fase de Análise: Execução do Contrato											
Risco 56:		Não bloquear o item quando é solicitado pedido de reequilíbrio ou cancelamento									
Causa:		Geração de novos pedidos com valor não reequilibrado									
Controle:		Bloquear item após análise da documentação recebida									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:		Recusa do pedido por parte do fornecedor									
Id	Ação Preventiva									Responsável	
1	Verificar e monitorar os pedidos de reequilíbrio									Execução de Contratos	
Id	Ação de Contingência									Responsável	
1	Treinamento e controle dos itens com pedido de reequilíbrio									Execução de Contratos	
Fase de Análise: Execução do Contrato											
Risco 57:		Não tratar de forma célere os pedidos de reequilíbrios e cancelamentos enviados para as empresas									
Causa:		Falta de empregados públicos designados para o processo									
Controle:		Agilizar o processo de tratativa do item									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa		Média	X	Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:		Item indisponível para compra gerando insatisfação do município									
Dano 2:		Município não consegue solicitar/comprar produto									
Dano 3:		Demora na aquisição do produto									
Id	Ação Preventiva									Responsável	
1	Tratar os processos com celeridade									Execução de Contratos	
2	Procedimentos internos claros e ágeis estabelecendo processos formais e prazos definidos para a nálise de pedidos de reequilíbrio e cancelamento									Execução de Contratos	
3	Capacitação contínua dos empregados públicos que são responsáveis pela elaboração e gestão dos contratos									Execução de Contratos	
Id	Ação de Contingência									Responsável	

1	Acompanhar as fases do processo para acelerar a liberação do item									Execução de Contratos	
2	Implementar um procedimento de emergência para priorizar e acelerar a análise dos pedidos mais urgentes, com prioridade para aqueles que possam comprometer a continuidade de serviços essenciais									Execução de Contratos	
3	Execução de garantias contratuais									Execução de Contratos	
Fase de Análise: Execução do Contrato											
Risco 58:		Insatisfação do atendimento por parte do município consorciado									
Causa:		Não dar retorno para os municípios quando solicitam um prazo de entrega									
Controle:		Entrar em contato com o fornecedor e solicitar a previsão de entrega									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta	Muito Alta	
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X Muito Alto	
Dano 1:		Descontentamento com o serviço prestado									
Dano 2:		Pode prejudicar a credibilidade do consórcio público entre os municípios consorciados ou não, afetando também a cooperação institucional entre os diversos agentes públicos									
Ação Preventiva											
Id		Ação Preventiva									Responsável
1		Retornar a informação para o município com brevidade									Execução de Contratos
2		Capacitação contínua dos empregados públicos que são responsáveis pelo atendimento aos municípios consorciados									Execução de Contratos
Ação de Contingência											
Id		Ação de Contingência									Responsável
1		Deve-se abrir um diálogo direto com o município consorciado e orientá-lo									Execução de Contratos
2		Utilizar canais de comunicação estruturados para resolver as insatisfações									Execução de Contratos
Fase de Análise: Execução do Contrato											
Risco 59:		Punições dada por municípios que afetam a compra do CINCATARINA									
Causa:		O CINCATARINA ficar impedido de contratar									
Controle:		Consulta ao site de cadastro de suspensão									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta	Muito Alta	
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto	Muito Alto	
Dano 1:		Impedimento de contratar objeto de necessidade									
Ação Preventiva											
Id		Ação Preventiva									Responsável
1		Bloquear fornecedor para não ocorrer a contratação									Execução de Contratos
Ação de Contingência											
Id		Ação de Contingência									Responsável
1		Efetuar contratação por outro meio legal									Execução de Contratos

Florianópolis, 21 de fevereiro de 2025.

Thiago Matheus Vieira Oliveira
Supervisor de Atuação Governamental

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 14.063/2020

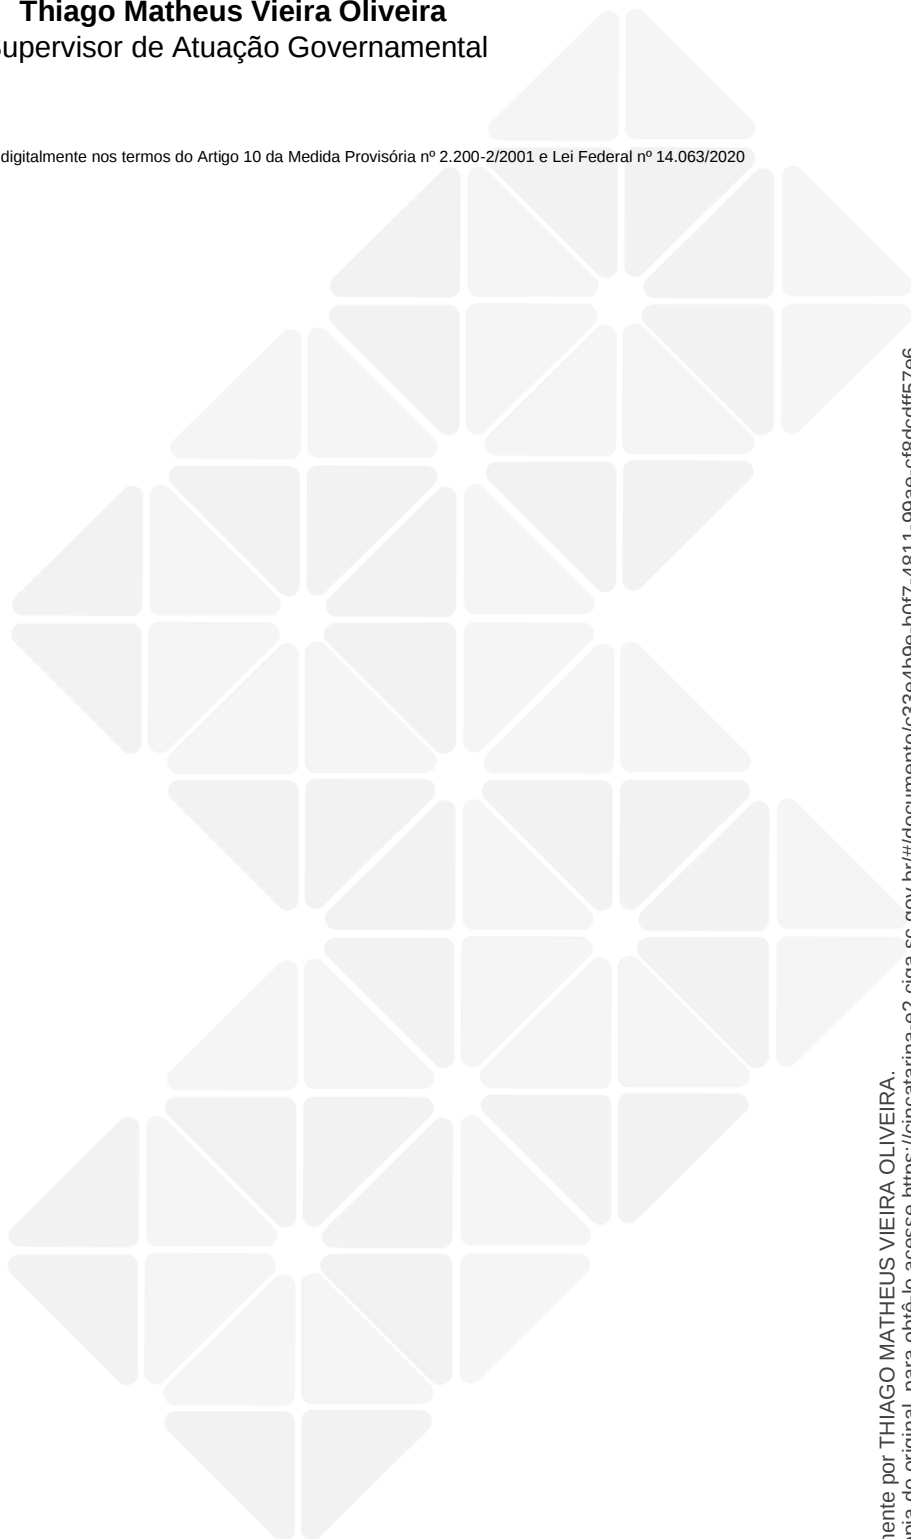

Assinado eletronicamente por THIAGO MATHEUS VIEIRA OLIVEIRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://cincatarina-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/c33e4b9e-b0f7-4811-99ae-cf8dcdf57e6>.

Inovação e Modernização na Gestão Pública

Assinado eletronicamente por:

* THIAGO MATHEUS VIEIRA OLIVEIRA (**.418.729-**)

em 21/02/2025 15:31:36 com assinatura avançada (AC Ciga v2)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://cincatarina-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/c33e4b9e-b0f7-4811-99ae-cf8dcdff57e6>

