CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:
RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS/MA

24/09/2026
22,88%
114,11%
71,30%


ENDEREÇO:
AVENIDA NORTE/SUL, S/N, CIDADE JUDICIÁRIA - CEP: 65.600-100 - CAXIAS/MA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 3ª REGIÃO FISCAL

FONTE	VERSÃO	DATA REF.
SBC	SEM DESONERAÇÃO	set/26
ORSE	SEM DESONERAÇÃO	jul/26
SEINFRA	028.1 SEM DESONERAÇÃO	out/23
SIINAPI	SEM DESONERAÇÃO	ago/26
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

Número da estrutura de tópicos	Nome da Tarefa	Custo	%	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias
1	**RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM**										
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
1.2	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
1.3	PLANEJAMENTO DA OBRA										
1.4	PROJETOS EXECUTIVOS										
1.5	INSTALAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS										
1.6	MANUTENÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS										
1.7	MOBILIZAÇÃO										
1.8	DESMOBILIZAÇÃO										
1.9	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS										
1.10	SUPERESTRUTURA										
1.11	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS										
1.12	ESQUADRIAS, FERRAGENS E ESTRUTURAS METÁLICAS										
1.13	COBERTA E TELHADO										
1.14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS										
1.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS										
1.16	COMBATE A INCÊNDIO										
1.17	FORRO										
1.18	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS										
1.19	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS										
1.20	PISOS / RODAPÉS / PEITORIS										
1.21	VIDROS										
1.22	PINTURA										
1.23	COMUNICAÇÃO VISUAL										
1.24	ELEMENTOS DECORATIVOS E ACESSIBILIDADE										
1.25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
1.26	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO										
1.27	EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO)										
1.28	AS-BUILT										

Id	Número da estrutura de tópicos	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
1	**1**	**RETOMADA OBRA DE CONSTRUÇÃO AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS/MA**	**240 dias**	**04/01/27 08:00**	**31/08/27 17:00**	
2	1.1	INÍCIO	0 dias	04/01/27 08:00	04/01/27 08:00	
3	1.2	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	210 dias	03/02/27 08:00	31/08/27 17:00	5;6
4	1.3	**DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	210 dias	03/02/27 08:00	31/08/27 17:00	5;6
5	1.4	**PLANEJAMENTO DA OBRA**	30 dias	04/01/27 08:00	02/02/27 17:00	2II
6	1.5	**PROJETOS EXECUTIVOS**	30 dias	04/01/27 08:00	02/02/27 17:00	2II
7	1.6	**INSTALAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS**	30 dias	03/02/27 08:00	04/03/27 17:00	5;6
8	1.7	**MANUTENÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS**	210 dias	03/02/27 08:00	31/08/27 17:00	5;6
9	1.8	**MOBILIZAÇÃO**	30 dias	03/02/27 08:00	04/03/27 17:00	5;6
10	1.9	**DESMOBILIZAÇÃO**	10 dias	22/08/27 08:00	31/08/27 17:00	30TT
11	1.10	**SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS**	30 dias	03/02/27 08:00	04/03/27 17:00	5;6
12	1.11	**SUPERESTRUTURA**	30 dias	13/02/27 08:00	14/03/27 17:00	11II+10 dias
13	1.12	**ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS**	30 dias	13/02/27 08:00	14/03/27 17:00	11II+10 dias
14	1.13	**ESQUADRIAS, FERRAGENS E ESTRUTURAS METÁLICAS**	30 dias	15/03/27 08:00	13/04/27 17:00	13
15	1.14	**COBERTA E TELHADO**	20 dias	15/03/27 08:00	03/04/27 17:00	12
16	1.15	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**	60 dias	15/03/27 08:00	13/05/27 17:00	13
17	1.16	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS**	60 dias	15/03/27 08:00	13/05/27 17:00	13
18	1.17	**COMBATE A INCÊNDIO**	30 dias	14/05/27 08:00	12/06/27 17:00	17
19	1.18	**FORRO**	30 dias	14/05/27 08:00	12/06/27 17:00	16;17
20	1.19	**IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS**	30 dias	15/03/27 08:00	13/04/27 17:00	13
21	1.20	**REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS**	60 dias	14/04/27 08:00	12/06/27 17:00	13;20
22	1.21	**PISOS / RODAPÉS / PEITORIS**	30 dias	13/06/27 08:00	12/07/27 17:00	21
23	1.22	**VIDROS**	30 dias	13/07/27 08:00	11/08/27 17:00	22
24	1.23	**PINTURA**	30 dias	13/06/27 08:00	12/07/27 17:00	21
25	1.24	**COMUNICAÇÃO VISUAL**	15 dias	13/07/27 08:00	27/07/27 17:00	24
26	1.25	**ELEMENTOS DECORATIVOS E ACESSIBILIDADE**	20 dias	13/07/27 08:00	01/08/27 17:00	24
27	1.26	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	30 dias	02/08/27 08:00	31/08/27 17:00	26
28	1.27	**SISTEMA DE IRRIGAÇÃO**	25 dias	13/06/27 08:00	07/07/27 17:00	16TI+30 dias
29	1.28	**EQUIPAMENTOS (BDI DIFERENCIADO)**	30 dias	14/05/27 08:00	12/06/27 17:00	17;16
30	1.29	**AS-BUILT**	30 dias	02/08/27 08:00	31/08/27 17:00	26
31	1.30	FIM	0 dias	31/08/27 17:00	31/08/27 17:00	30

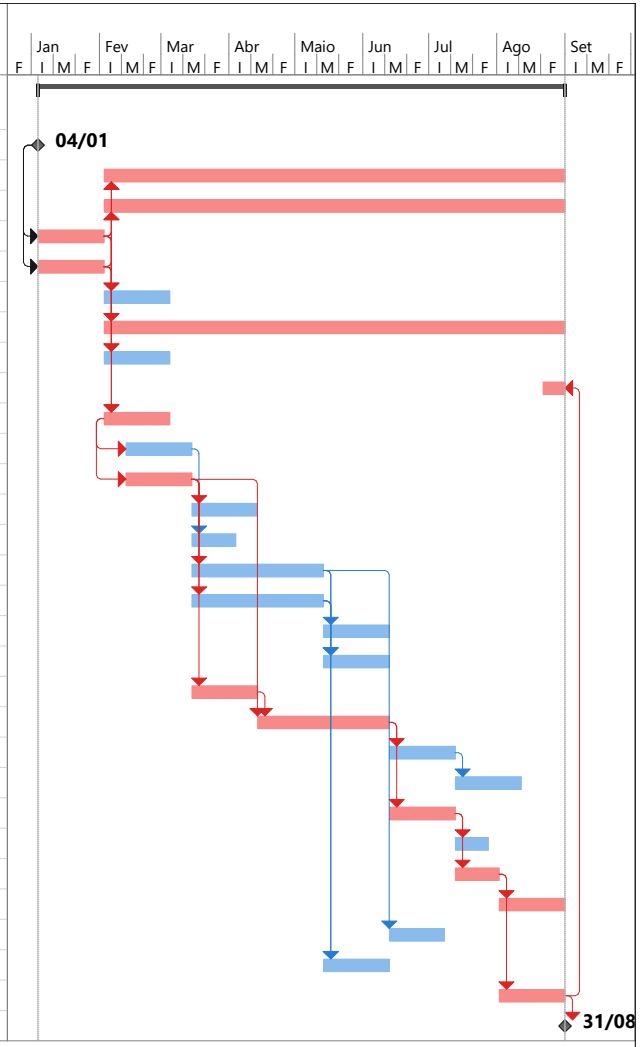

Receita Federal

Tarefa	Marco Inativo	Somente início	Divisão crítica		
Divisão	Resumo Inativo	Somente término	Andamento		
Marco	Tarefa Manual	Tarefas externas	Progresso manual		
Resumo	Somente duração	Marco externo			
Resumo do projeto	Acúmulo de Resumo Manual	Data limite			
Tarefa Inativa	Resumo Manual	Crítica			

O presente cronograma constitui planejamento inicial de referência. As datas indicadas deverão ser reprogramadas pelo contratado em função da data efetiva de emissão da Ordem de Serviço, preservando-se o prazo global de execução estabelecido contratualmente
