PLATOR

CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA - MG
CONTRATADA: PLATOR PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RUA TRIÂNGULO CENTRAL - (2ª ETAPA)

REV_06
18/09/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR			MÊS 1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
1	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**											
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 5.996,50	0,30%	%	50,00%						50,00%	100,00%
				G								
				R$	R$2.998,25						R$2.998,25	R$5.996,50
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**											
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 141.329,63	7,05%	%	6,14%	12,71%	13,39%	21,13%	19,37%	16,49%	10,77%	100,00%
				G								
				R$	R$8.677,64	R$17.963,00	R$18.924,04	R$29.862,95	R$27.375,55	R$23.305,26	R$15.221,20	R$141.329,63
3	**SERVIÇOS INICIAIS**											
3.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	R$ 1.472,19	0,07%	%	100,00%							100,00%
				G								
				R$	R$1.472,19							R$1.472,19
3.2	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 46.394,03	2,31%	%	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	15,00%	100,00%
				G								
				R$	R$6.959,10	R$6.495,16	R$6.495,16	R$6.495,16	R$6.495,16	R$6.495,16	R$6.959,10	R$46.394,03
3.3	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	R$ 8.070,00	0,40%	%	100,00%							100,00%
				G								
				R$	R$8.070,00							R$8.070,00
3.4	SINALIZAÇÃO DE OBRA	R$ 11.654,78	0,58%	%	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	15,00%	100,00%
				G								
				R$	R$1.748,22	R$1.631,67	R$1.631,67	R$1.631,67	R$1.631,67	R$1.631,67	R$1.748,22	R$11.654,78
4	**PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RUA TRIÂNGULO CENTRAL - (2ª ETAPA)**											
4.1	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RECOLOCAÇÕES	R$ 28.570,80	1,43%	%	50,00%	50,00%						100,00%
				G								
				R$	R$14.285,40	R$14.285,40						R$28.570,80
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 169.271,73	8,44%	%	50,00%	50,00%						100,00%
				G								
				R$	R$84.635,87	R$84.635,87						R$169.271,73
4.3	ESTRUTURAL - SOLO GRAMPEADO	R$ 194.645,38	9,71%	%		40,00%	60,00%					100,00%
				G								
				R$		R$77.858,15	R$116.787,23					R$194.645,38
4.4	CONTENÇÃO - MURO GABIÃO 1	R$ 195.722,74	9,76%	%		30,00%	45,00%	25,00%				100,00%
				G								
				R$		R$58.716,82	R$88.075,23	R$48.930,69				R$195.722,74
4.5	CONTENÇÃO - MURO GABIÃO 2	R$ 78.267,13	3,90%	%			40,00%	20,00%	40,00%			100,00%
				G								
				R$			R$31.306,85	R$15.653,43	R$31.306,85			R$78.267,13
4.6	MURO DE DIVISA	R$ 47.599,38	2,37%	%				50,00%	50,00%			100,00%
				G								
				R$				R$23.799,69	R$23.799,69			R$47.599,38
4.7	DRENAGEM - REDE TUBULAR DE CONCRETO	R$ 160.866,33	8,02%	%				50,00%	50,00%			100,00%
				G								
				R$				R$80.433,17	R$80.433,17			R$160.866,33
4.8	PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO	R$ 675.750,18	33,71%	%				30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
				G								
				R$				R$202.725,05	R$202.725,05	R$202.725,05	R$67.575,02	R$675.750,18
4.9	ELÉTRICA	R$ 48.986,78	2,44%	%						50,00%	50,00%	100,00%
				G								
				R$						R$24.493,39	R$24.493,39	R$48.986,78
4.10	HIDROSSANITÁRIO	R$ 5.123,41	0,26%	%						50,00%	50,00%	100,00%
				G								
				R$						R$2.561,71	R$2.561,71	R$5.123,41

PLATOR

CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA - MG
CONTRATADA: PLATOR PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RUA TRIÂNGULO CENTRAL - (2ª ETAPA)

REV_06
18/09/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR			MÊS							
					1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
4.11	ACESSIBILIDADE	R$ 11.490,74	0,57%	%							100,00%	100,00%
				G								
				R$							R$11.490,74	R$11.490,74
4.12	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	R$ 21.413,29	1,07%	%							100,00%	100,00%
				G								
				R$							R$21.413,29	R$21.413,29

CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA - MG
CONTRATADA: PLATOR PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RUA TRIÂNGULO CENTRAL - (2ª ETAPA)

REV_06
18/09/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR			MÊS							
					1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
4.13	RESTAURAÇÃO DO TRILHO DO TREM	R$ 5.307,04	0,26%	%							100,00%	100,00%
				G								
				R$							R$5.307,04	R$5.307,04
4.14	PAISAGISMO	R$ 97.895,83	4,88%	%						60,00%	40,00%	100,00%
				G								
				R$						R$58.737,50	R$39.158,33	R$97.895,83
4.15	LIMPEZA DE OBRA	R$ 49.003,50	2,44%	%	15,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	15,00%	100,00%
				G								
				R$	R$7.350,53	R$6.860,49	R$6.860,49	R$6.860,49	R$6.860,49	R$6.860,49	R$7.350,53	R$49.003,50
TOTAL		**R$2.004.831,40**	**100,00%**	R$	R$136.197,19	R$268.446,56	R$270.080,67	R$416.392,30	R$380.627,63	R$326.810,23	R$206.276,82	R$2.004.831,40
TOTAL ACUMULADO				R$	R$136.197,19	R$404.643,75	R$674.724,42	R$1.091.116,72	R$1.471.744,35	R$1.798.554,58	R$2.004.831,40	

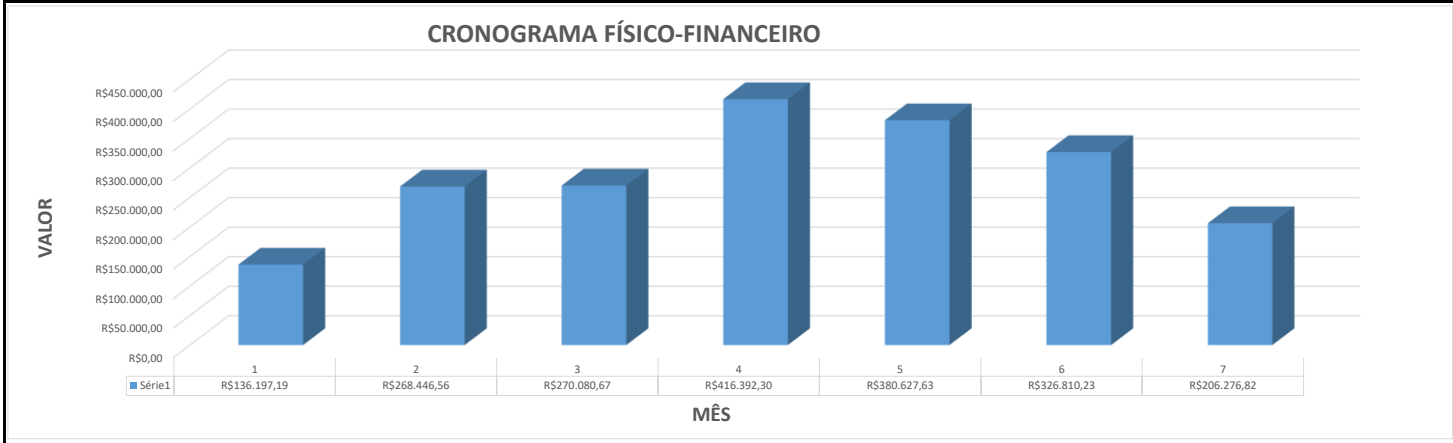

JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MG: 239.787/D
