CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNUCIPAL DE CAPITÃO ANDRADE
CONTRATADA: CARVALHAIS ENGENHARIA
PROJETO: CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL

REV_00
27/08/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR			MÊS										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
1	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**														
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 5.832,28	0,30%	%	50,00%									50,00%	100,00%
				G											
				R$	R$2.916,14									R$2.916,14	R$5.832,28
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**														
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 75.727,34	3,88%	%	3,96%	8,08%	9,24%	10,03%	11,27%	13,91%	10,66%	15,54%	11,61%	5,70%	100,00%
				G											
				R$	R$2.995,34	R$6.119,57	R$7.000,07	R$7.593,46	R$8.537,60	R$10.534,60	R$8.074,26	R$11.766,81	R$8.792,36	R$4.313,26	R$75.727,34
3	**SERVIÇOS INICIAIS**														
3.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	R$ 3.105,92	0,16%	%	100,00%										100,00%
				G											
				R$	R$3.105,92										R$3.105,92
3.2	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 12.120,87	0,62%	%	100,00%										100,00%
				G											
				R$	R$12.120,87										R$12.120,87
3.3	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 11.569,03	0,59%	%	70,00%	30,00%									100,00%
				G											
				R$	R$8.098,32	R$3.470,71									R$11.569,03
4	**ESTRUTURAS DE CONCRETO**														
4.1	INFRAESTRUTURA	R$ 51.750,36	2,65%	%	40,00%	60,00%									100,00%
				G											
				R$	R$20.700,14	R$31.050,22									R$51.750,36
4.2	SUPERESTRUTURA	R$ 62.984,89	3,23%	%		40,00%	60,00%								100,00%
				G											
				R$		R$25.193,96	R$37.790,93								R$62.984,89

CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNUCIPAL DE CAPITÃO ANDRADE
CONTRATADA: CARVALHAIS ENGENHARIA
PROJETO: CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL

REV_00
27/08/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR			MÊS										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
5	**ARQUITETURA**														
5.1	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	R$ 39.419,48	2,02%	%			20,00%	40,00%	40,00%						100,00%
				G											
				R$			R$7.883,90	R$15.767,79	R$15.767,79						R$39.419,48
5.2	ACABAMENTO GROSSO	R$ 39.817,94	2,04%	%					60,00%	40,00%					100,00%
				G											
				R$					R$23.890,76	R$15.927,18					R$39.817,94
5.3	PINTURAS	R$ 21.055,18	1,08%	%						40,00%	30,00%			30,00%	100,00%
				G											
				R$						R$8.422,07	R$6.316,55			R$6.316,55	R$21.055,18
5.4	REVESTIMENTOS	R$ 34.483,38	1,77%	%						40,00%	60,00%				100,00%
				G											
				R$						R$13.793,35	R$20.690,03				R$34.483,38
5.5	PISO PRÉ-MOLDADO	R$ 410.610,29	21,06%	%		5,00%	10,00%					35,00%	35,00%	15,00%	100,00%
				G											
				R$		R$20.530,51	R$41.061,03					R$143.713,60	R$143.713,60	R$61.591,54	R$410.610,29
5.6	ESQUADRIAS	R$ 51.322,79	2,63%	%					60,00%	40,00%					100,00%
				G											
				R$					R$30.793,67	R$20.529,12					R$51.322,79
5.7	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 21.692,63	1,11%	%						20,00%	40,00%	40,00%			100,00%
				G											
				R$						R$4.338,53	R$8.677,05	R$8.677,05			R$21.692,63
5.8	PEDRAS	R$ 32.048,75	1,64%	%					40,00%	40,00%	20,00%				100,00%
				G											
				R$					R$12.819,50	R$12.819,50	R$6.409,75				R$32.048,75
5.9	PAISAGISMO E URBANISMO	R$ 30.552,31	1,57%	%								20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
				G											
				R$								R$6.110,46	R$12.220,92	R$12.220,92	R$30.552,31
5.10	DIVERSOS	R$ 8.580,01	0,44%	%							20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
				G											
				R$							R$1.716,00	R$2.574,00	R$2.574,00	R$1.716,00	R$8.580,01

CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNUCIPAL DE CAPITÃO ANDRADE
CONTRATADA: CARVALHAIS ENGENHARIA
PROJETO: CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL

REV_00
27/08/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR			MÊS										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
5.11	DUCHAS	R$ 3.433,45	0,18%	%									50,00%	50,00%	100,00%
				G											
				R$									R$1.716,73	R$1.716,73	R$3.433,45
6	**QUADRAS POLIESPORTIVA**														
6.1	PISO	R$ 49.408,39	2,53%	%				10,00%	70,00%					20,00%	100,00%
				G											
				R$				R$4.940,84	R$34.585,87					R$9.881,68	R$49.408,39
6.2	ACESSÓRIOS	R$ 13.288,41	0,68%	%									100,00%		100,00%
				G											
				R$									R$13.288,41		R$13.288,41
6.3	FECHAMENTO	R$ 36.093,10	1,85%	%							40,00%	40,00%	20,00%		100,00%
				G											
				R$							R$14.437,24	R$14.437,24	R$7.218,62		R$36.093,10
7	**QUADRAS DE AREIA**														
7.1	PISO	R$ 182.085,31	9,34%	%					5,00%	15,00%			40,00%	40,00%	100,00%
				G											
				R$					R$9.104,27	R$27.312,80			R$72.834,12	R$72.834,12	R$182.085,31
7.2	ACESSÓRIOS	R$ 4.257,68	0,22%	%									100,00%		100,00%
				G											
				R$									R$4.257,68		R$4.257,68
7.3	FECHAMENTO	R$ 48.098,10	2,47%	%							30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%
				G											
				R$							R$14.429,43	R$14.429,43	R$9.619,62	R$9.619,62	R$48.098,10
8	**PLAYGROUD**														
8.1	PISO	R$ 21.468,05	1,10%	%					15,00%	80,00%			5,00%		100,00%
				G											
				R$					R$3.220,21	R$17.174,44			R$1.073,40		R$21.468,05

CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNUCIPAL DE CAPITÃO ANDRADE
CONTRATADA: CARVALHAIS ENGENHARIA
PROJETO: CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL

REV_00
27/08/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR			MÊS										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
8.2	FECHAMENTO	R$ 11.851,68	0,61%	%							40,00%	40,00%	20,00%		100,00%
				G											
				R$							R$4.740,67	R$4.740,67	R$2.370,34		R$11.851,68
9	**PORTAL DE ENTRADA E ESTRUTURA PARA FECHAMENTOS**														
9.1	INFRAESTRUTURA - PORTAL	R$ 17.231,19	0,88%	%						40,00%	60,00%				100,00%
				G											
				R$						R$6.892,48	R$10.338,71				R$17.231,19
9.2	SUPERESTRUTURA - PORTAL	R$ 32.830,91	1,68%	%							30,00%	50,00%	20,00%		100,00%
				G											
				R$							R$9.849,27	R$16.415,46	R$6.566,18		R$32.830,91
9.3	INFRAESTRUTURA - MURETAS/FECHAMENTO	R$ 144.840,40	7,43%	%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%							100,00%
				G											
				R$	R$28.968,08	R$43.452,12	R$43.452,12	R$28.968,08							R$144.840,40
9.4	DIVERSOS	R$ 6.934,70	0,36%	%										100,00%	100,00%
				G											
				R$										R$6.934,70	R$6.934,70
10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**														
10.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 14.713,55	0,75%	%		60,00%	40,00%								100,00%
				G											
				R$		R$8.828,13	R$5.885,42								R$14.713,55
10.2	ALIMENTAÇÃO	R$ 5.166,62	0,26%	%			50,00%	50,00%							100,00%
				G											
				R$			R$2.583,31	R$2.583,31							R$5.166,62
10.3	AGUA FRIA	R$ 9.963,65	0,51%	%					30,00%	30,00%	40,00%				100,00%
				G											
				R$					R$2.989,10	R$2.989,10	R$3.985,46				R$9.963,65
10.4	ESGOTO	R$ 11.684,31	0,60%	%			40,00%	40,00%	20,00%						100,00%
				G											
				R$			R$4.673,72	R$4.673,72	R$2.336,86						R$11.684,31

CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNUCIPAL DE CAPITÃO ANDRADE
CONTRATADA: CARVALHAIS ENGENHARIA
PROJETO: CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL

REV_00
27/08/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR			MÊS										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
10.5	ESGOTO (GORDURA)	R$ 696,20	0,04%	%			40,00%	40,00%	20,00%						100,00%
				G											
				R$			R$278,48	R$278,48	R$139,24						R$696,20
10.6	VENTILAÇÃO	R$ 1.466,66	0,08%	%				50,00%	50,00%						100,00%
				G											
				R$				R$733,33	R$733,33						R$1.466,66
11	**DRENAGEM PLUVIAL**														
11.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 9.415,10	0,48%	%		30,00%	70,00%								100,00%
				G											
				R$		R$2.824,53	R$6.590,57								R$9.415,10
11.2	DRENAGEM PLUVIAL	R$ 74.853,32	3,84%	%				40,00%	40,00%		20,00%				100,00%
				G											
				R$				R$29.941,33	R$29.941,33		R$14.970,66				R$74.853,32
12	**IMPERMEABILIZAÇÃO**														
12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 12.520,79	0,64%	%				100,00%							100,00%
				G											
				R$				R$12.520,79							R$12.520,79
13	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**														
13.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 31.935,53	1,64%	%		60,00%	40,00%								100,00%
				G											
				R$		R$19.161,32	R$12.774,21								R$31.935,53
13.2	INFRAESTRUTURA	R$ 37.567,77	1,93%	%			30,00%	40,00%	30,00%						100,00%
				G											
				R$			R$11.270,33	R$15.027,11	R$11.270,33						R$37.567,77
13.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS	R$ 120.338,19	6,17%	%						20,00%	40,00%	40,00%			100,00%
				G											
				R$						R$24.067,64	R$48.135,28	R$48.135,28			R$120.338,19

CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNUCIPAL DE CAPITÃO ANDRADE
CONTRATADA: CARVALHAIS ENGENHARIA
PROJETO: CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL

REV_00
27/08/2026


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR			MÊS										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
13.4	CABEAMENTO	R$ 87.197,57	4,47%	%				40,00%	30,00%	30,00%					100,00%
				G											
				R$				R$34.879,03	R$26.159,27	R$26.159,27					R$87.197,57
13.5	QUADROS	R$ 7.218,78	0,37%	%							60,00%	40,00%			100,00%
				G											
				R$							R$4.331,27	R$2.887,51			R$7.218,78
14	**COBERTURA**														
14.1	BANHEIROS	R$ 2.418,74	0,12%	%				50,00%	50,00%						100,00%
				G											
				R$				R$1.209,37	R$1.209,37						R$2.418,74
14.2	QUIOSQUE	R$ 35.721,31	1,83%	%				40,00%	40,00%	20,00%					100,00%
				G											
				R$				R$14.288,52	R$14.288,52	R$7.144,26					R$35.721,31
15	**LIMPEZA FINAL DE OBRA**														
15.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R$ 2.554,18	0,13%	%										100,00%	100,00%
				G											
				R$										R$2.554,18	R$2.554,18
TOTAL		**R$1.949.927,09**	**100,00%**	R$	R$78.904,81	R$160.631,06	R$181.244,10	R$173.405,16	R$227.787,03	R$198.104,32	R$177.101,65	R$273.887,52	R$286.245,99	R$192.615,45	R$1.949.927,09
TOTAL ACUMULADO				R$	R$78.904,81	R$239.535,88	R$420.779,98	R$594.185,14	R$821.972,17	R$1.020.076,49	R$1.197.178,13	R$1.471.065,65	R$1.757.311,64	R$1.949.927,09	

CRONOGRAMA - FÍSICO-FINANCEIRO - SERVIÇOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNUCIPAL DE CAPITÃO ANDRADE
CONTRATADA: CARVALHAIS ENGENHARIA
PROJETO: CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL

REV_00
27/08/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL

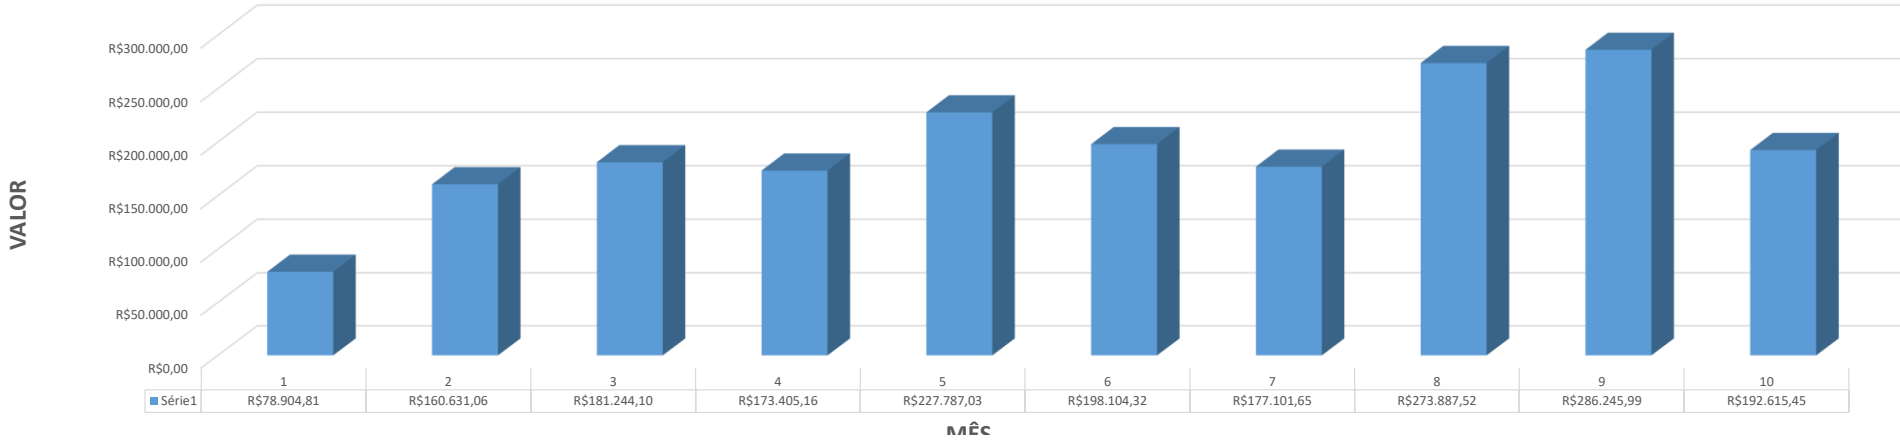

Documento assinado digitalmente
gov.br
LARA CARVALHAIS OLIVEIRA COLEN
Data: 28/08/2026 08:18:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LARA CARVALHAIS OLIVEIRA COLEN
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MG: 199647/D
