



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE



Página 1/1

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261859334

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ITAMAR GONCALVES DA COSTA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2114217191

Registro: 355385CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

AVENIDA ILIDIO SAMPAIO

Complemento:

Cidade: ICÓ

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.669.682/0001-79

Nº: 2131

CEP: 63430000

Contrato: Não especificado

Celebrado em

Valor: R\$ 5.275.867,38

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

CONJUNTO GAMA

Complemento: HORTO DO SENHOR DO BOMFIM

Cidade: ICÓ

Data de início: 14/04/2026

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

Bairro: ZONA RURAL

UF: CE

Previsão de término: 16/04/2026

Coordenadas Geográficas: -6.404802, -38.859147

Código: Não Especificado

Nº: S/N

CEP: 63430000

CPF/CNPJ: 07.669.682/0001-79

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >

81.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

Quantidade

1,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE A ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BOMFIM-ICÓ/CE.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

ITAMAR GONCALVES

DA

COSTA:08006974489

Apostado de forma digital por

ITAMAR GONCALVES DA COSTA

COSTA:08006974489

Data: 25/04/2026 17:24:13

07109

8. Assinaturas

O declarante declara veracidade das informações acima

ITAMAR GONCALVES DA COSTA - CPF: 080.006.744-89

Local _____ de _____ de _____
data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CNPJ: 07.669.682/0001-79

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 285,59 Registrada em: 15/04/2026 Valor pago: R\$ 285,59 Nosso Número: 8218781856

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://cra.crea.org.br> ou no aplicativo CREA-CE
Impresso em: 15/04/2026 às 13:55:58 (GMT -3) 177.37.167.163

www.crea.org.br
Tel: (85) 3402-9800

fiscalizacao@crea.org.br
Fax: (85) 3403-9804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil**RRT 16917162**

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSÁVEL TÉCNICONome Civil/Social: BEATRIZ MAGALHÃES CARNEIRO
Título Profissional: Arquiteto(a) e UrbanistaCPF: 956.XXX.XXX-30
Nº do Registro: 000A538000**2. DETALHES DO RRT**Nº do RRT: SI16917162I00CT001
Data de Cadastro: 25/05/2026
Data de Registro: 28/05/2026Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL**2.1 Valor do RRT**

Valor do RRT: R\$130,64

Boleto nº 24635868

Pago em: 28/05/2026

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE**3.1 Serviço 001**Contratante: prefeitura municipal de ico
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito PúblicoCPF/CNPJ: 07.XXX.XXX/0001-79
Data de Início: 01/02/2026
Data de Previsão de Término: 30/12/2026**3.1.1 Endereço da Obra/Serviço**País: Brasil
Tipo Logradouro: AVENIDA
Logradouro: avenida ilídio sampaio
Bairro: CENTROCEP: 63430970
Nº: 2131
Complemento:
Cidade/UF: ICO/CE**3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)**

Grupo: PROJETO	Quantidade: 1,00
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 1,00
Atividade: 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 1,00
Atividade: 1.5.2 - Projeto de instalações prediais de águas pluviais	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 1,00
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 1,00
Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Unidade: unidade
Grupo: PROJETO	Quantidade: 1,00
Atividade: 1.9.5 - Projeto de sistema de coleta de resíduos sólidos	Unidade: unidade

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Institucional

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil**RRT 16917162**

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Projeto Arquitetônico do Horto do Ico, com área total de 208.102,17m², contemplando a base da Praça do Esplendor (na subida do Horto) com aproximadamente 16.102,17m², a via interna de veículos com aproximadamente 8.405,37m², a via sacra (via para pedestres) com aproximadamente 6.546,75m² e bateria de banheiros na praça superior (já construída) com aproximadamente 176m².

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI16917162I00CT001	prefeitura municipal de Ico	INICIAL	25/05/2026


5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista BEATRIZ MAGALHÃES CARNEIRO, registro CAU nº 000A538000, na data e hora: 2026-05-25 14:58:19, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (LGPD).



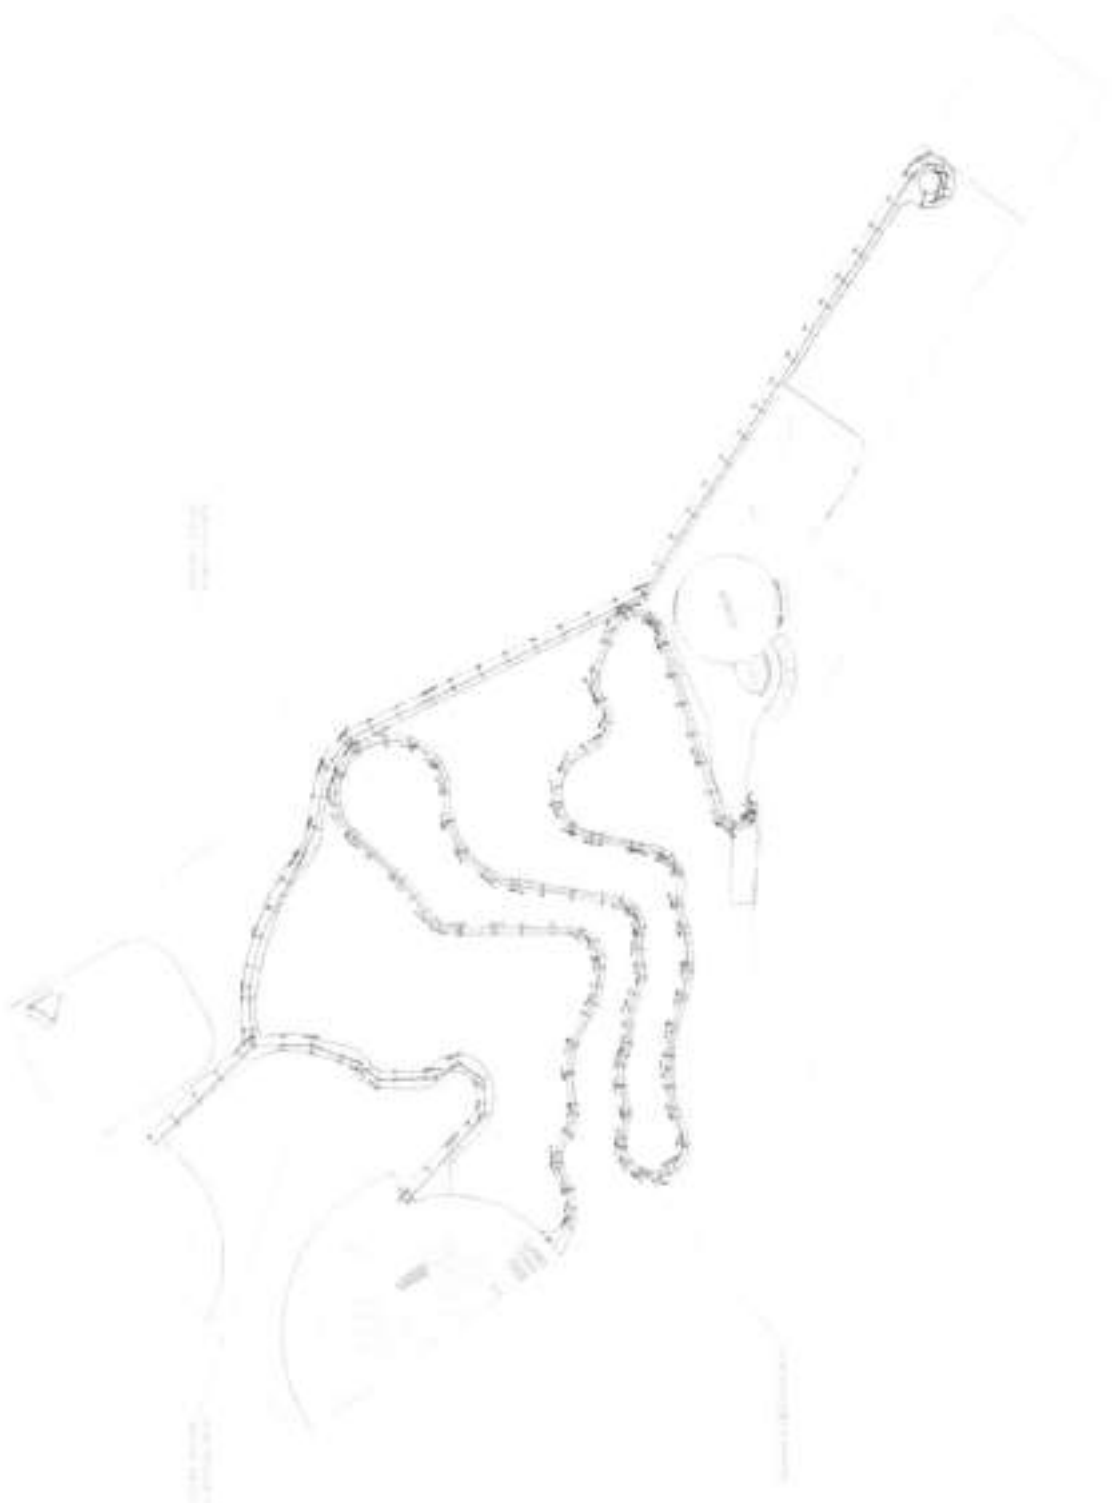

PLANTA DO ESTABELECIMENTO - 10.00m





ARQUITETURA
PROJETO BAC



45




4,10


CORTE AA
1:10

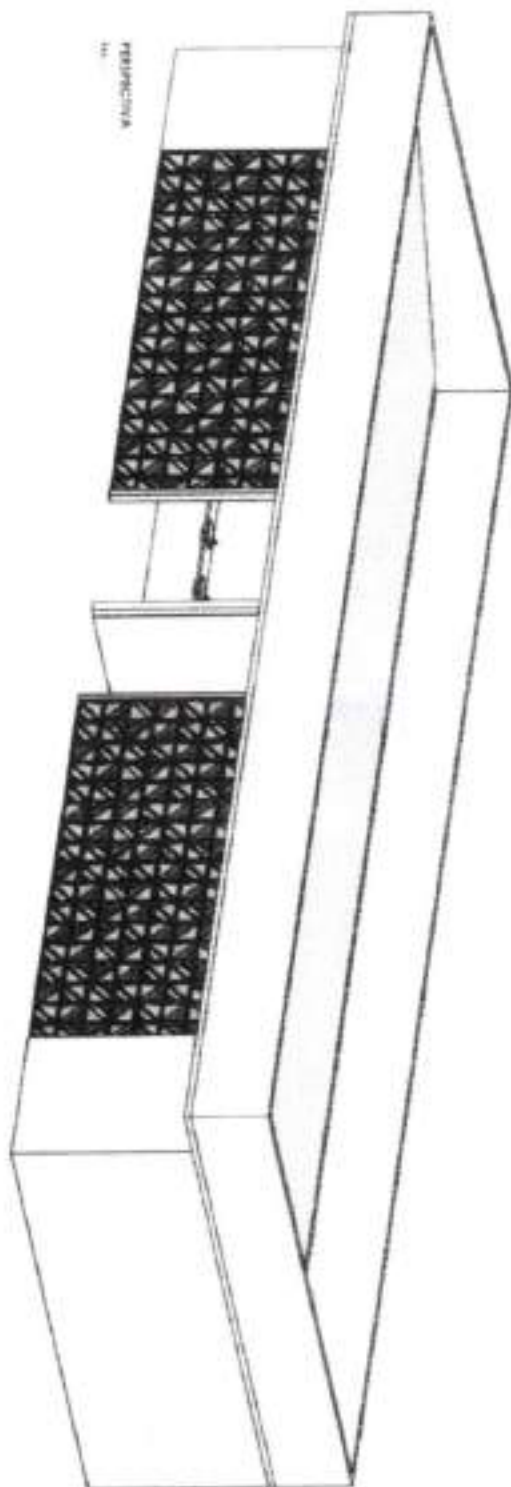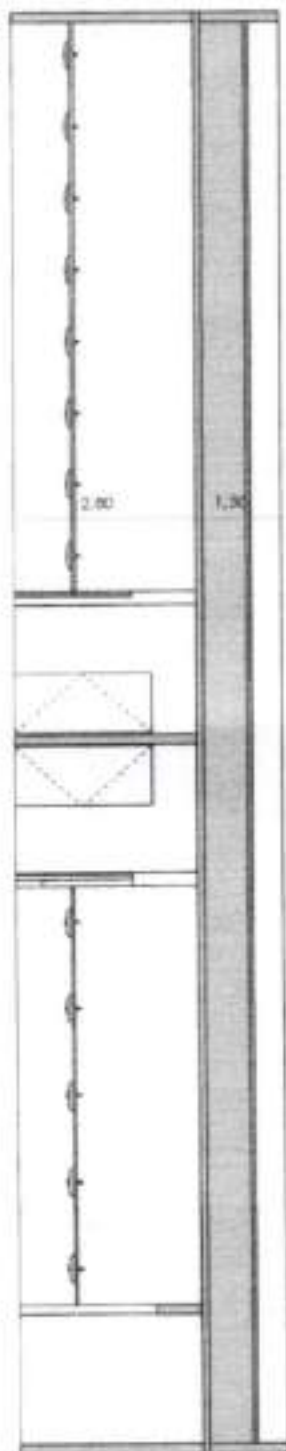

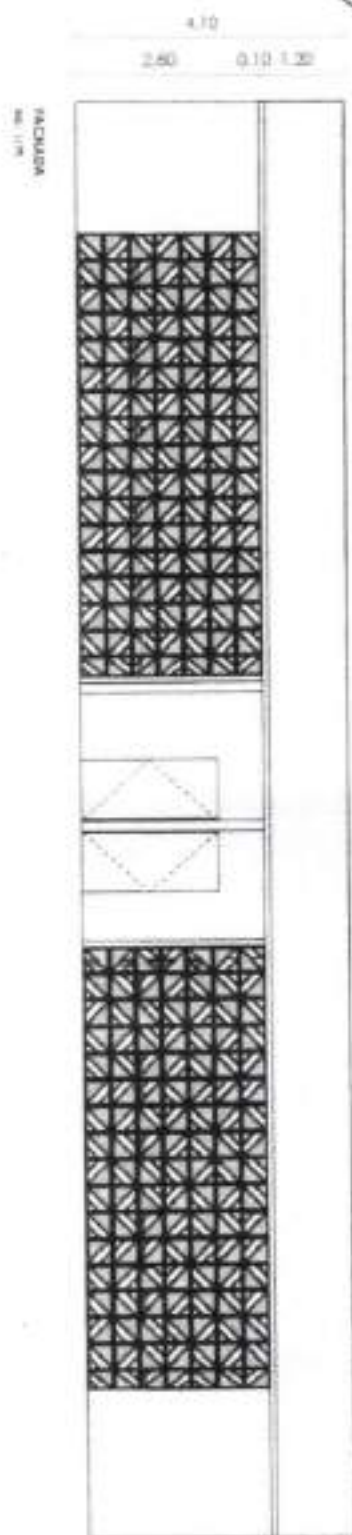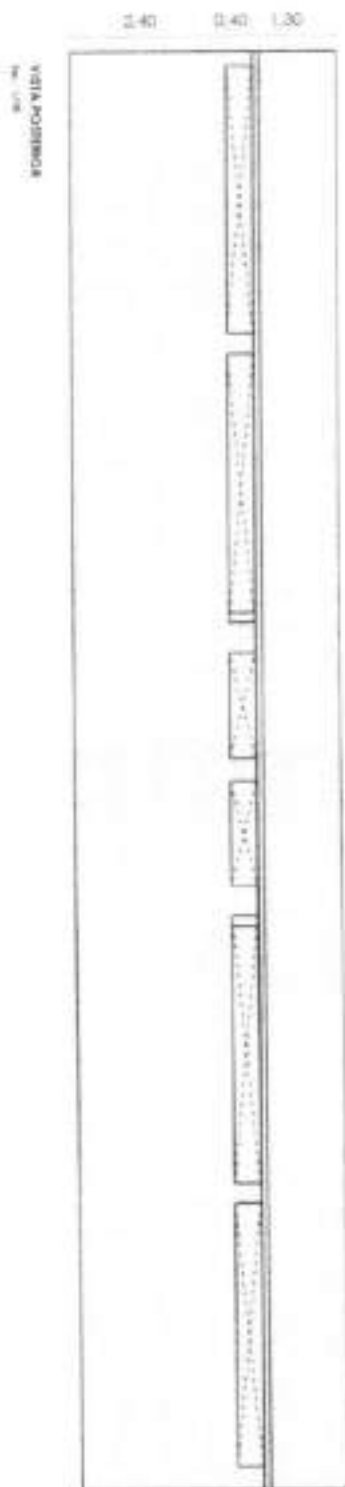

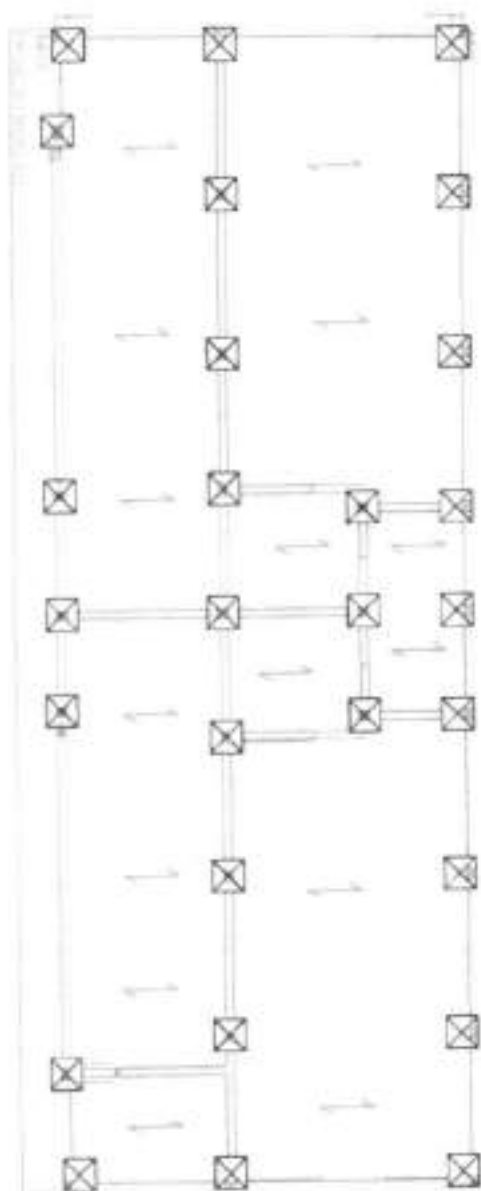


[illegible]

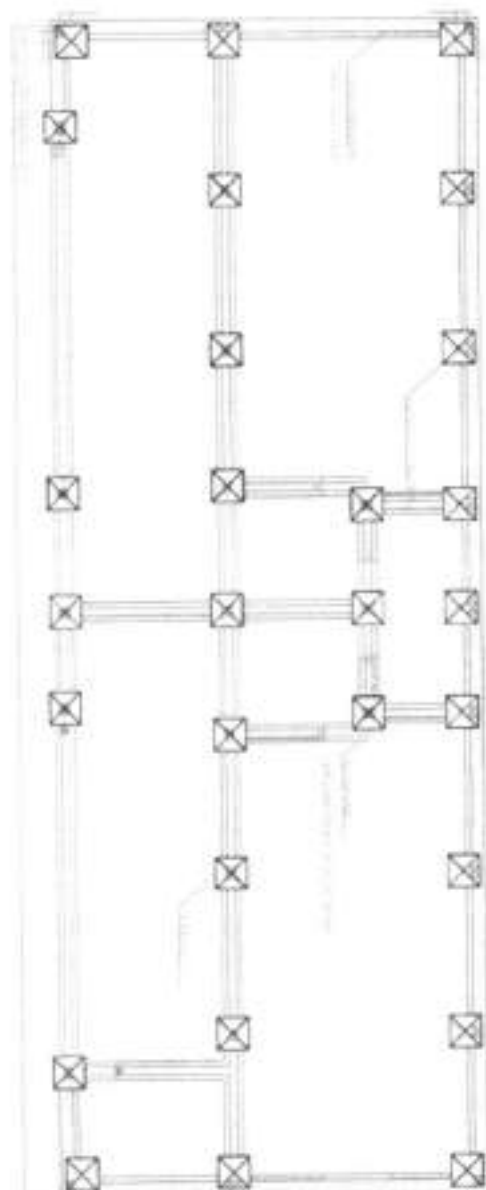

		ANEXO II - RESOLUÇÃO Nº 001/2011 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	
		Nº 001/2011 001/2011	
Único		Data: 00/00/00	Valor: 000,00

INTERPOL (1989) p. 11.

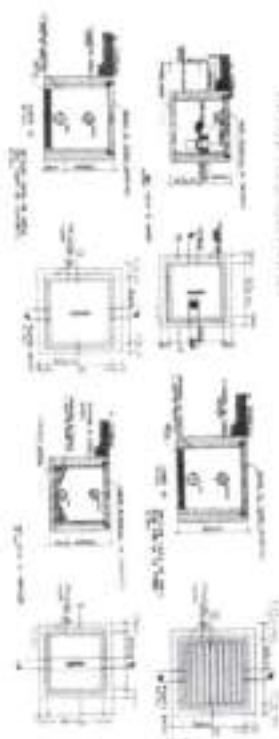[illegible]

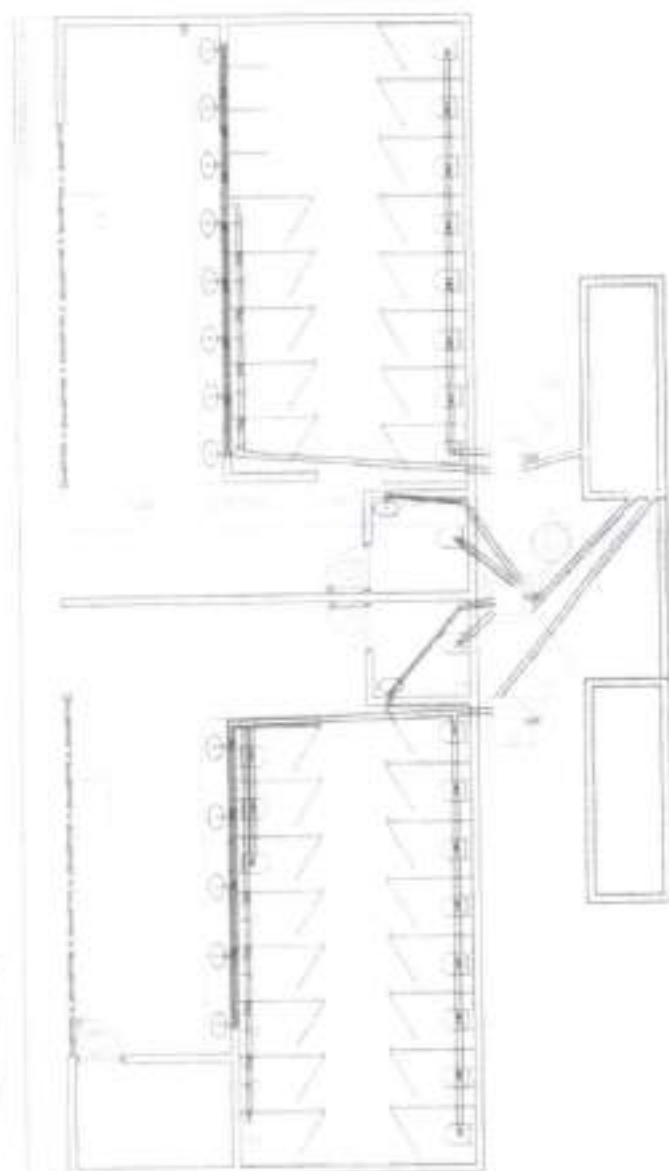
[illegible]

Table 1. Demographic characteristics of the study population	
Age (years)	Mean (SD)
Male	55.2 (10.5)
Female	56.8 (11.2)
Marital status	
Married	78.5%
Single	21.5%
Education level	
High school or above	65.2%
Below high school	34.8%
Occupation	
White collar	45.1%
Blue collar	54.9%
Income (USD/month)	
< 1000	12.3%
1000-2000	35.7%
> 2000	52.0%

Abstract The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week training program on the physical fitness of 10 sedentary, middle-aged men. The program consisted of 3 sessions per week, each lasting 45 min. The sessions included aerobic, strength, and flexibility exercises. The results of the study showed that the participants experienced significant improvements in their physical fitness. The mean heart rate decreased from 145 to 135 beats per minute, and the mean blood pressure decreased from 140/90 to 130/80 mmHg. The mean body mass index (BMI) decreased from 28.5 to 27.5. The mean waist circumference decreased from 100 to 95 cm. The mean maximum oxygen consumption (VO₂max) increased from 25 to 30 ml/kg/min. The mean maximum strength (1RM) increased from 100 to 120 kg for the bench press and from 150 to 180 kg for the squat. The mean flexibility (sit and reach) increased from 15 to 20 cm. The results of this study suggest that a 12-week training program can significantly improve the physical fitness of sedentary, middle-aged men.

[illegible]

EXAMINATION ANSWERS

1. **Answer: C**
The patient is exhibiting signs of a severe allergic reaction (anaphylaxis). The most appropriate action is to administer epinephrine (A) immediately, followed by antihistamines (B) and corticosteroids (D). Oxygen (E) should also be administered.

2. **Answer: B**
The patient is exhibiting signs of a severe allergic reaction (anaphylaxis). The most appropriate action is to administer epinephrine (A) immediately, followed by antihistamines (B) and corticosteroids (D). Oxygen (E) should also be administered.

3. **Answer: A**
The patient is exhibiting signs of a severe allergic reaction (anaphylaxis). The most appropriate action is to administer epinephrine (A) immediately, followed by antihistamines (B) and corticosteroids (D). Oxygen (E) should also be administered.

4. **Answer: C**
The patient is exhibiting signs of a severe allergic reaction (anaphylaxis). The most appropriate action is to administer epinephrine (A) immediately, followed by antihistamines (B) and corticosteroids (D). Oxygen (E) should also be administered.

5. **Answer: B**
The patient is exhibiting signs of a severe allergic reaction (anaphylaxis). The most appropriate action is to administer epinephrine (A) immediately, followed by antihistamines (B) and corticosteroids (D). Oxygen (E) should also be administered.

6. **Answer: A**
The patient is exhibiting signs of a severe allergic reaction (anaphylaxis). The most appropriate action is to administer epinephrine (A) immediately, followed by antihistamines (B) and corticosteroids (D). Oxygen (E) should also be administered.


7. **Answer: C**
The patient is exhibiting signs of a severe allergic reaction (anaphylaxis). The most appropriate action is to administer epinephrine (A) immediately, followed by antihistamines (B) and corticosteroids (D). Oxygen (E) should also be administered.

8. **Answer: B**
The patient is exhibiting signs of a severe allergic reaction (anaphylaxis). The most appropriate action is to administer epinephrine (A) immediately, followed by antihistamines (B) and corticosteroids (D). Oxygen (E) should also be administered.

9. **Answer: A**
The patient is exhibiting signs of a severe allergic reaction (anaphylaxis). The most appropriate action is to administer epinephrine (A) immediately, followed by antihistamines (B) and corticosteroids (D). Oxygen (E) should also be administered.

10. **Answer: C**
The patient is exhibiting signs of a severe allergic reaction (anaphylaxis). The most appropriate action is to administer epinephrine (A) immediately, followed by antihistamines (B) and corticosteroids (D). Oxygen (E) should also be administered.

		INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DE GASTOS	
REPÚBLICA DE GUATEMALA GUATEMALA, 20 DE JULIO DE 2012		REPÚBLICA DE GUATEMALA GUATEMALA, 20 DE JULIO DE 2012	
Cédula de notificación		Cédula de notificación	
Se notifica a:		Se notifica a:	
Nombre y apellidos:		Nombre y apellidos:	
Domicilio:		Domicilio:	
Fecha de expedición:		Fecha de expedición:	
Lugar de expedición:		Lugar de expedición:	

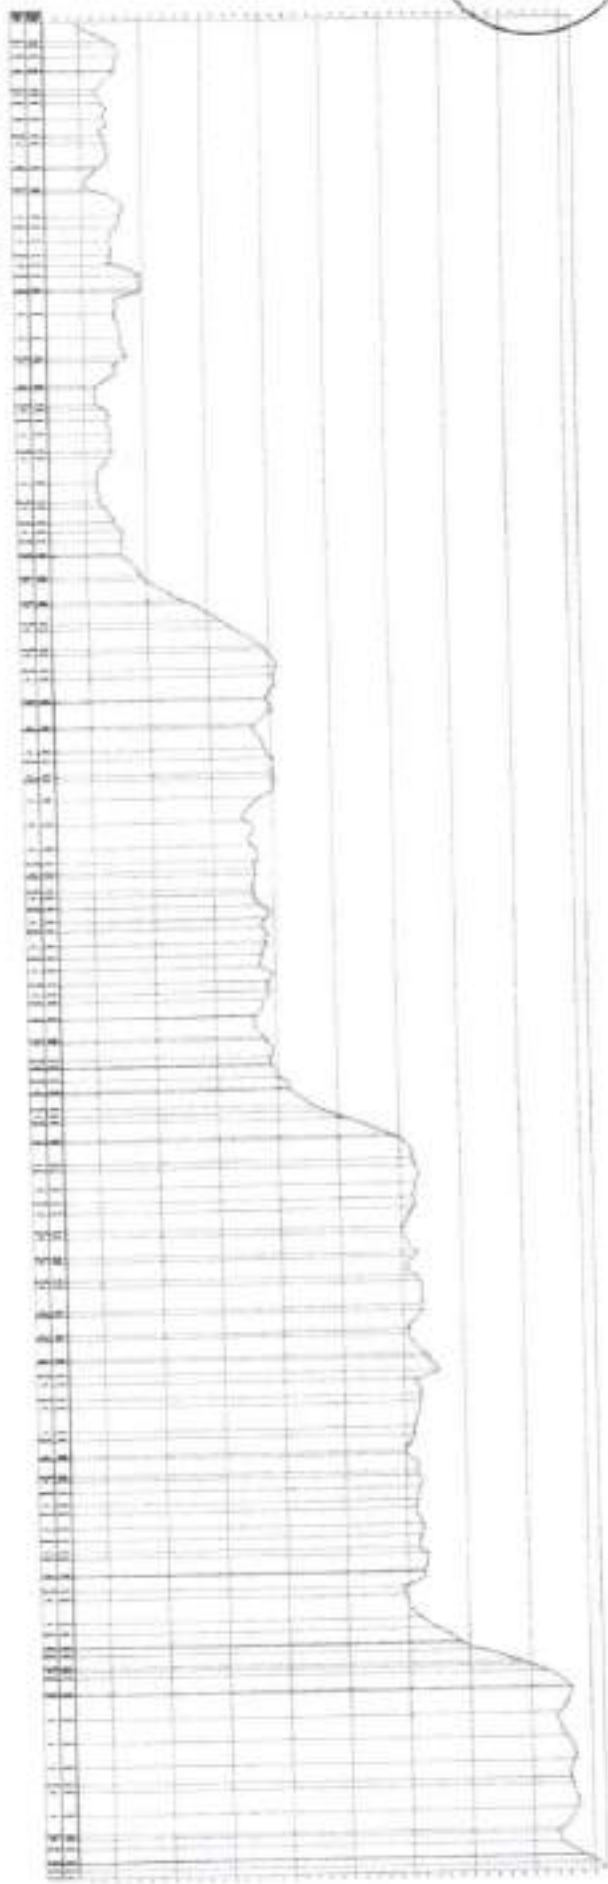

ARQUITETURA
(INTEGRATED DESIGN)

ARQUITETURA
(INCLUDE ARRE)



PREFEITURA DE
ICÓ
PREFEITURA DE ICÓ

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



MEMORIAL DESCRITIVO
CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR
DO BONFIM – ICÓ/CE

ITAMAR
GONCALVES DA
COSTA:0800697
4489

Assinado de forma
digital por ITAMAR
GONCALVES DA
COSTA:08006974489
Data: 2026.06.01
17:50:23 -03'00'

ICÓ – CE, ABRIL DE 2026

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
PRAZ. CONTÁBIL. MUNICIPAL

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



O presente memorial descritivo refere-se à execução dos serviços constantes na planilha orçamentária da obra em epígrafe, devendo todos os serviços serem executados conforme projetos, normas técnicas vigentes da ABNT, composições do SINAPI e SEINFRA, além das boas práticas da engenharia civil.

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Refere-se à gestão técnica e administrativa da obra, incluindo acompanhamento por equipe técnica habilitada, planejamento, supervisão dos serviços e apoio logístico necessário ao pleno desenvolvimento das atividades.

Com a utilização de boas práticas: manutenção de diário de obra, controle de produtividade, cumprimento das exigências do CREA e atendimento às normas de segurança do trabalho.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO

2.1. Fossa e demais instalações de esgoto para barracão (1,00 un)

Execução de sistema provisório de esgotamento sanitário destinado ao atendimento do canteiro de obras, conforme necessidade operacional.

2.2. Instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica (3,00 un)

Implantação de infraestrutura provisória para fornecimento de energia elétrica e comunicação, garantindo o funcionamento adequado das atividades da obra.

2.3. Limpeza mecanizada de camada vegetal (9.500,00 m²)

Execução de limpeza do terreno com remoção de vegetação, camada orgânica e pequenos arbustos, conforme área definida em memória de cálculo.

2.4. Locação da obra com auxílio topográfico (2,10 ha)

Serviços de locação e marcação da obra, utilizando equipamentos topográficos adequados para garantir precisão na implantação.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
PILAR DO DESENVOLVIMENTO

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



2.5. Placas padrão de obra (12,00 m²)

Fornecimento e instalação de placas informativas conforme padrão fornecido pela equipe técnica de infraestrutura do município.

2.6. Carga manual de entulho em caminhão basculante (36,00 m³)

Remoção e transporte de materiais provenientes da limpeza inicial do terreno.

2.7. Caixa d'água em fiberglass – 1000L (1,00 un)

Instalação de reservatório para suprimento hídrico do canteiro.

2.8. Barracão para escritório tipo A1 (1,00 un)

Execução de unidade administrativa para funcionamento da equipe técnica.

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.1. ACESSO VIA SACRA

3.1.1. Regularização e compactação de subleito (7.660,00 m³)

Execução de regularização do terreno e compactação do solo predominantemente argiloso, conforme memória de cálculo.

3.2. ACESSO AUTOMÓVEIS

3.2.1. Regularização e compactação do subleito (10.429,02 m³)

Preparação da superfície para recebimento da pavimentação e compactação do solo conforme especificações técnicas.

Para uma melhor execução tendo como base boas práticas orienta-se a execução em camadas, controle de umidade, ensaios de compactação e atendimento aos parâmetros geotécnicos.

4. PAVIMENTAÇÃO

4.1. PAVIMENTAÇÃO

4.1.1. Piso Intertravado tipo tijolinho (6.281,77 m²)

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
PRA CONSTRUIR E AJUSTAR

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



Execução de pavimentação com blocos intertravados sobre base preparada, seguir a espessura indicada em planilha orçamentário, inclusive cores.

4.1.2. Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados (3.064,28 m)

Execução deve ser feita com concreto moldado in loco.

4.1.3. Piso podotátil (1.100,00 m²)

Execução de piso acessível em concreto e instalado conforme normas de acessibilidade.

4.2. ACESSO AUTOMÓVEIS

**4.2.1. Pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento
(9.386,12,00 m²)**

Execução de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento, foi pensado com o intuito de suportar o tráfego de veículos.

4.2.2. Guia (meio-fio) e sarjeta (2.317,56 m)

Execução deve ser feita com concreto moldado in loco.

5. PAREDES E CERCAS

5.1. Cerca com mourões de concreto e arame liso (1.685,35 m²)

Execução de cercamento com mourões de concreto e seis fios de arame liso, conforme dimensões da memória de cálculo e projeto.

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1 Dutos em Pead

Execução de infraestrutura subterrânea com eletrodutos para passagem de cabos.

6.2 a 6.6 Cabos elétricos

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
PRAÇA CORONEL JOSÉ GOMES, 400

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



Instalação de cabos de cobre com seções variadas, conforme especificações do projeto elétrico.

6.7 a 6.8 Sistema de aterramento

Instalação de hastes e conectores garantindo segurança do sistema elétrico.

6.9 Célula fotoelétrica (244 un)

Automação do sistema de iluminação externa

6.10 e 6.14 Quadros elétricos

Instalação de quadros de medição e distribuição.

6.11 a 6.13 Postes e luminárias

Implantação de sistema de iluminação com postes de concreto e metálicos e luminárias.

Para boas práticas a execução deve atender à NBR 5410, com execução adequada de aterramento, proteção de cabos e testes de funcionamento.

6.12 Caixa de alvenaria

Execução de 244 unidades de caixas de alvenaria.

6.15 a 6.20 Disjuntores e DPS

Instalação de disjuntores e DPS.

7. SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES

7.1. Carga manual de entulho (360,00 m³)

Remoção de resíduos gerados durante a obra.

8. BANHEIROS SUPERIORES

8.1. MOVIMENTO DE TERRA

8.1.1. Escavação manual de solo (13,92 m³)

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
PILARES DO DESENVOLVIMENTO

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



Execução de escavação manual em solo de 1ª categoria, com profundidade de até 1,50 m, destinada à implantação das fundações dos banheiros, conforme memória de cálculo.

8.2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

8.2.1. Alvenaria de pedra (3,84 m³)

Execução de alvenaria de embasamento para fundações do banheiro conforme memória de cálculo e projetos.

8.2.2. Forma de tábuas para fundações (34,08 m²)

Montagem de formas em madeira para moldagem dos elementos estruturais da fundação.

8.2.3. Concreto estrutural fck = 30 MPa (14,67 m³)

Execução de elementos estruturais em concreto com resistência característica de 30 MPa, com preparo mecânico em betoneira.

8.2.4. Armadura de aço CA 50/60 (1.080,13 kg)

Execução de armação em aço para elementos estruturais da fundação, sapatas, pilares e armadura negativa da laje conforme memória de cálculo.

8.2.5. Laje pré-fabricada treliçada (176,00 m²)

Execução de laje de cobertura com vigotas treliçadas e elementos de enchimento, não esquecendo do escoramento e tempo de cura antes da desforma.

8.3. ALVENARIA

8.3.1. Alvenaria de tijolo cerâmico (347,05 m³)

Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos, assentados com argamassa mista, conforme descritos em memória de cálculo.

8.3.2. Chapisco (694,10 m²)

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
CERÁZ

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



Aplicação de chapisco em superfícies internas para garantir aderência do revestimento.

8.3.3. Emboço (265,33 m²)

Execução de camada de regularização para posterior aplicação de revestimentos cerâmicos.

8.3.4. Cobogó de cimento (37,52 m²)

Execução de elementos vazados para ventilação e iluminação natural, o tipo solicitado é o tipo Slit, conforme descrito em memória de cálculo.

8.4. COBERTURA

8.4.1. Estrutura de madeira (191,06 m²)

Execução da estrutura de cobertura em madeira.

8.4.2. Telha de fibrocimento (191,06 m²)

Cobertura com telhas onduladas, conforme inclinação especificada.

8.4.3. Calha de chapa galvanizada (21,81 m)

Instalação de calhas para coleta de águas pluviais.

8.4.4. Tubo PVC para águas pluviais (14,00 m)

Execução de condutores verticais.

8.4.5. Joelho 45° PVC (5,00 un)

Conexões para direcionamento do escoamento.

8.5. PISOS

8.5.1. Piso morto em concreto (15,12 m²)

Execução de base em concreto simples.

8.5.2. Piso industrial polido (167,99 m²)

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
PILARES DO DESENVOLVIMENTO

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



Execução de piso com acabamento polido para alta durabilidade.

8.5.3. Rodapé industrial (74,26 m)

Execução de rodapé monolítico.

8.6. REVESTIMENTOS

8.6.1. Revestimento cerâmico (265,33 m²)

Aplicação de revestimento cerâmico em paredes internas.

8.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.7.1. Pontos elétricos (34 un)

Execução completa dos pontos elétricos.

8.7.2. Tomadas (5 un)

Instalação de tomadas padrão.

8.7.3. Interruptores duplos (2 un)

9.7.4 Interruptores simples (6 un)

9.7.5 Luminárias LED (22 un)

9.7.6 Quadro de distribuição (1 un)

9.7.7 Disjuntores monopolares (4 un)

9.7.8 Disjuntores DR (2 un)

9.7.9 DPS (1 un)

9.7.10 Disjuntores monopolares 16A (1 un)

9.7.11 Disjuntores monopolares 20A (1 un)

Para execução desse sistema descrito anteriormente é necessário a execução de boas práticas fazendo o atendimento à NBR 5410, identificações dos circuitos e testes de funcionamento

9.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
PILAR CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



Tendo em vista uma excelente funcionalidade do sistema é importante o atendimento à NBR 5626 que é referente a água fria e NBR 8160 referente a rede de esgoto, não dispensa teste de estanqueidade e garantia de declividade adequada para o fluxo correto do sistema, esse item contempla os seguintes serviços e objetos:

- 9.8.1 Bacia sanitária (21 un)
- 9.8.2 Cuba de embutir (12 un)
- 9.8.3 Caixa d'água (4 un)
- 9.8.4 Pontos hidráulicos (50 un)
- 9.8.5 Mictório (4 un)
- 9.8.6 Pontos sanitários (49 un)
- 9.8.7 Bancada de granito (7,56 m²)
- 9.8.8 Torneiras (14 un)
- 9.8.9 Lavatórios (2 un)
- 9.8.10 Chuveiros (9 un)
- 9.8.11 Divisórias de granito (99,36 m²)
- 9.8.12 Ralos sifonados (4 un)
- 9.8.13 Assentos sanitários (21 un)
- 9.8.14 Fossa séptica e sumidouro (3 un)
- 9.8.15 Caixa de inspeção (3 un)

9.9 ESQUADRIAS E FERRAGENS

É necessário que seja verificado o prumo das esquadrias nas suas instalações bem como um teste de funcionalidade para garantir que a fixação das mesmas foram feitas de maneira adequada, foi possível prever a necessidade de instalação de:

- 9.9.1 Porta de madeira (3 un)
- 9.9.2 Porta em alumínio (29,12 m²)
- 9.9.3 Fechaduras com tarjeta (28 un)
- 9.9.4 Janela de Maximar (7,68m²)



PREFEITURA DE
ICÓ
CASA CONTADORIA E ARQUIVO

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



9.9.5 Vidro temperado incolor para as janelas (7,68m²)

9.10 PINTURAS E ACABAMENTOS

Para garantir proteção e durabilidade de um ambiente se faz necessária a execução de serviços que possam oferecer barreira contra intempéries, que conservem a estrutura e prolonguem a vida útil, essa etapa tem também a função de aumentar a valorização do bem, com isso o item em questão contempla:

9.10.1 Emassamento (320,00 m²)

9.10.2 Pintura látex (320,00 m²)

9.10.3 Pintura esmalte em madeira (11,34 m²)

9.10.4 Textura acrílica (188,29 m²)

9.10.5 Emassamento em teto (173,61 m²)

9.10.6 Pintura em teto (173,61 m²)

9.10.7 Pintura externa (75,04 m²)

9.11 ACESSIBILIDADE

9.11.4 Barras de apoio (6 un)

Instalação conforme normas de acessibilidade.

9. DRENAGEM

9.1. Alvenaria de pedra argamassada (3.097,99m³)

É indispensável a execução da construção de um muro de arrimo na extensão da via sacra devido as diferenças de níveis que o terreno apresenta, com isso foi previsto o muro ao lado da via com a largura de 0,60m e altura foi considerada uma média conforme as medidas verificadas em projeto.

9.2. Enrocamento de pedra (3.064,28)

Com o intuito de dar suporte ao solo que a de ficar exposto, foi previsto um revestimento com enrocamento de pedra na extensão da via sacra com uma altura de 10m.

9.3. Drenagem com calha pré-moldada de concreto d=0,30m

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará

CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
Iniciativa, Comprometimento e Ação

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



Para que as água sigam um fluxo, foi pensado nas calhas de drenagem, tanto calhas verticais como uma calha contínua horizontal em todo o percurso da via sacra.

O sistema de drenagem constitui elemento essencial para a durabilidade, estabilidade e desempenho da infraestrutura executada, tendo como finalidade captar, conduzir e dar destinação adequada às águas pluviais e superficiais, evitando acúmulo de água, erosões, processos de infiltração indesejada, recalques diferenciais, assoreamentos e comprometimento da estrutura do pavimento ou demais elementos construtivos.

A ausência ou execução inadequada dos dispositivos de drenagem pode ocasionar redução da vida útil da obra, deterioração prematura dos materiais empregados, surgimento de patologias construtivas e aumento dos custos futuros com manutenção corretiva.

Com isso se faz indispensável a execução adequada dos elementos de drenagem, obedecendo os projetos, orientações da fiscalização e não deixando de seguir sempre as normas vigentes.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO, MEDIÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS

Todos os serviços executados deverão atender integralmente às especificações constantes nos projetos, planilha orçamentária e normas técnicas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

A contratada será responsável pela qualidade dos materiais empregados, correta execução dos serviços e atendimento às exigências técnicas da fiscalização, devendo reparar, corrigir ou substituir, quaisquer serviços executados em desacordo com os projetos ou normas vigentes.

Os materiais utilizados deverão ser novos, de primeira qualidade e possuir especificações compatíveis com os serviços executados, sendo vedada a utilização de materiais danificados ou recondicionados.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Itó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
MAYOR CONTINUA E QUINCE

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



Os serviços somente serão aceitos pela fiscalização quando atenderem às condições abaixo:

- Atendimento integral aos projetos executivos;
- Conformidade dimensional, nivelamento, alinhamento e acabamento;
- Atendimento às especificações técnicas da planilha orçamentária;
- Execução conforme normas técnicas da ABNT aplicáveis;
- Ausência de defeitos construtivos, fissuras, recalques, infiltrações ou falhas de execução;
- Aprovação prévia da fiscalização municipal.

Vale ressaltar que os serviços rejeitados pela fiscalização deverão ser refeitos pela contratada sem qualquer ônus adicional para a administração pública.

As medições dos serviços executados serão realizadas conforme unidades previstas na planilha orçamentária, obedecendo rigorosamente aos quantitativos efetivamente executados em campo.

As medições deverão seguir os seguintes critérios:

- Serviços medidos por metro quadrado (m^2): serão calculados conforme área efetivamente executada;
- Serviços medidos por metro linear (m): serão aferidos conforme comprimento executado;
- Serviços medidos por metro cúbico (m^3): serão calculados pelo volume efetivamente executado;
- Serviços medidos por unidade (un): serão contabilizados por item integralmente concluído e instalado;

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
Pelo Desenvolvimento e Qualidade

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



- Serviços medidos por ponto (pt): serão considerados após completa execução e funcionamento.

Somente serão medidos serviços efetivamente concluídos, aceitos pela fiscalização e executados em conformidade com os projetos.

Não serão considerados para medição:

- Serviços executados em desacordo com o projeto;
- Serviços com defeitos executivos;
- Retrabalhos decorrentes de falhas da contratada;
- Perdas excessivas de materiais;
- Serviços sem aprovação da fiscalização.

A contratada deverá garantir a qualidade da obra.

A execução dos serviços deverá obedecer às normas técnicas vigentes, incluindo, mas não se limitando a:

- ABNT NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto;
- ABNT NBR 14931 – Execução de Estruturas de Concreto;
- ABNT NBR 6122 – Fundações;
- ABNT NBR 9050 – Acessibilidade;
- ABNT NBR 9781 – Peças de concreto para pavimentação;
- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;
- ABNT NBR 5419 – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas;
- ABNT NBR 5626 – Instalações prediais de água fria;
- ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário;
- NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil;

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
MARCONATO DO VALENTE

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



- Demais normas aplicáveis aos serviços executados.

Na ausência de norma específica da ABNT, deverão ser observadas as recomendações dos fabricantes e boas práticas de engenharia.

O recebimento dos serviços ocorrerá após verificação da perfeita execução pela fiscalização, podendo ser recusados serviços que apresentem vícios, defeitos ou inconformidades técnicas.

A obra deverá ser entregue completamente limpa, em perfeito funcionamento e com todas as instalações testadas e aprovadas.

SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDIDAS PREVENTIVAS

A empresa contratada deverá cumprir integralmente as disposições relativas à segurança e medicina do trabalho, adotando todas as medidas preventivas necessárias à proteção dos trabalhadores, terceiros e patrimônio público durante a execução da obra.

Todos os serviços deverão atender às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente

- **NR-01** – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais;
- **NR-06** – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
- **NR-09** – Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais;
- **NR-10** – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
- **NR-11** – Transporte, Movimentação e Manuseio de Materiais;
- **NR-12** – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;
- **NR-18** – Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção;
- **NR-23** – Proteção Contra Incêndios;

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
MUNICÍPIO DE IÓ - CEARÁ

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



- **NR-24** – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
- **NR-35** – Trabalho em Altura.

A contratada deverá obrigatoriamente:

- Disponibilizar e exigir o uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI adequados a cada atividade;
- Fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC necessários à execução dos serviços;
- Manter o canteiro de obras limpo, organizado e sinalizado;
- Isolar áreas de risco e circulação de máquinas;
- Garantir condições adequadas de acesso e circulação no canteiro;
- Disponibilizar instalações sanitárias, local para refeição e água potável aos trabalhadores;
- Manter extintores de incêndio em locais estratégicos;
- Realizar treinamento admissional e periódico dos trabalhadores;
- Manter profissionais habilitados para operação de máquinas e equipamentos;
- Garantir proteção contra quedas em trabalhos executados em altura;
- Executar aterramento e proteção das instalações elétricas provisórias;
- Adotar medidas de prevenção contra choques elétricos, soterramentos, quedas, incêndios e acidentes com ferramentas e equipamentos.

A contratada deverá manter no canteiro de obras, sempre atualizados e disponíveis à fiscalização.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



O descumprimento das normas de segurança poderá implicar paralisação dos serviços, aplicação de penalidades contratuais e responsabilização da contratada pelos danos ou acidentes decorrentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços deverão seguir rigorosamente os projetos e normas vigentes, garantindo qualidade, segurança e durabilidade da obra.



CARTÓRIO PEIXOTO DOS SANTOS

2º OFÍCIO - COMARCA DE ICÓ - ESTADO DO CEARÁ

ESTABELECE O REGISTRO DE IMÓVEIS, NOTAS, PROTESTOS,
TESTES E INSTRUMENTOS - ATOS - TESTES E INSTRUMENTOS E ANOTAÇÕES
TÍTULOS DE PROTESTO DE

CERTIDÃO DA MATRÍCULA

PROTOCOLO - 539/2021



CARTÓRIO PEIXOTO DOS SANTOS

2º Ofício - Icó - Ceará

Registro de Imóveis

Edmir Peixoto dos Santos - Oficial

Dr. Daniel Ferreira Dantas - 1ª Tabelião Substituto

Mel de Santana Sarmiento Dantas Peixoto - Substituto

Dr. José Borges Rodrigues Neto - Esc. Autorizado

LIVRO - REGISTRO DE IMÓVEIS - REGISTRO GERAL

LIVRO Nº "2-K" às fls. 261

MATRÍCULA Nº 3.498

DATA: 18/08/2016

KELLY

FLS. 001

(R.I.R.G.) REGISTRO DE IMÓVEIS - REGISTRO GERAL - Nº "2-K" - MATRÍCULA Nº 3.498

IMÓVEL - Um terreno rural, denominado Sítio "Logoa", neste município de Icó - CE, com uma área de 30.000,00m² ou 3,00ha. Perímetro: 910,00m, com a seguinte descrição do perímetro: Inicia-se a descrição deste perímetro em plano georreferenciado no vértice VT-M-0001, de coordenadas N 9.294.702,05m e E 514.623,49m; deste segue, com azimute de 124°59'33" por uma distância de 375,00m até o vértice VT-M-0002, de coordenadas N 9.294.487,00m e E 514.930,70m; deste segue, com azimute de 219°34'05" por uma distância de 80,00m até o vértice VT-M-0003, de coordenadas N 9.294.425,33m e E 514.879,74m; deste segue com azimute de 304°59'32" por uma distância de 375,00m até o vértice VT-M-0004, de coordenadas N 9.294.640,38m e E 514.572,53m; deste segue com azimute 39°34'24" por uma distância de 80,00m até o vértice VT-M-0001, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontra-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº. 39 WGr, tendo como datum o Sirgas 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. **LIMITES E CONFRONTANTES** - ao Norte, com o imóvel de propriedade de Luiz Bento Landim, ao Sul, com o imóvel de propriedade de Luis Gonzaga Teixeira; ao Leste, com terras do DNOCS e ao Oeste, com o imóvel de propriedade de Luis Gonzaga Teixeira. **PROPRIETÁRIO: O MUNICÍPIO DE ICÓ, ESTADO DO CEARÁ**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede no Palácio da Alforria - Prefeitura Municipal de Icó-CE, à Av. Ilídio Sampaio, 2131, inscrita no C.N.P.J nº 07.669.682/0001-79, CGF. nº. 06.920.187-7, neste ato representado pelo Exm^o. Senhor Prefeito Municipal - Dr. JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JUNIOR, brasileiro, casado, estudante universitário, portador da C.I/RG nº 99002076496-SSP - CE e CPF/MF nº 213.683.763-04, residente e domiciliado à Rua São José, nº 1200-A, Centro, neste Município e Comarca de Icó-CE. **REGISTRO ANTERIOR: R - 4 / 899**, datado de 25/09/1990, proveniente da Matrícula nº 899, datada de 12/03/1980, no Livro "2-B-1" (R.I.R.G.), às fls. 094, com as devidas e competentes anotações. **CONDIÇÕES** - Nenhuma. O referido é verdade e dou Fé. Eu, Mohanna Sarmiento Peixoto dos Santos, Oficial Substituta do Registro Geral de Imóveis que fiz este ato. Subscribo e assino (as) Edmir Peixoto dos Santos Oficial.

R - 1 / 3.498, Em 18/08/2016.

Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em Notas do Cartório do 2º Ofício desta cidade de Icó-Ce, no Livro "A-118" às fls. 036/037, em data de 24/06/2016, o imóvel desta cidade de Icó-Ce, no Livro "A-118" às fls. 036/037, em data de 24/06/2016, o imóvel constante, descrito e caracterizado da matrícula supra, foi em sua totalidade adquirido em doação pelo **MUNICÍPIO DE ICÓ, ESTADO DO CEARÁ**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,



com sede no Palácio da Alforria - Prefeitura Municipal de Icó-CE, à Av. Ilídio Sampaio, 2131, inscrita no C.N.P.J nº 07.669.682/0001-79, CGF. nº. 06.920.187-7, neste ato representado pelo Exmº. Senhor Prefeito Municipal - Dr. JOSÉ JAIME BEZERRA RODRIGUES JUNIOR, brasileiro, casado, estudante universitário, portador da C.I/RG nº 99002076496-SSP - CE e CPF/MF nº 213.683.763-04, residente e domiciliado à Rua São José, nº 1200-A, Centro, neste Município e Comarca de Icó-CE, doado pelo Sr. **LUIS GONZAGA TEIXEIRA**, engenheiro agrônomo, portador da C.I/RG nº. 2008313059-9 SSPDS-CE e CPF/MF nº. 080.345.084-20, e sua esposa Srª. **ALBANIZA FERREIRA TEIXEIRA**, funcionária pública estadual, portadora da C.I/RG nº. 2008312944-2 SSPDS-CE e CPF/MF nº. 101.281.313-49, brasileiros, casados sob o regime da comunhão de bens posterior a Lei nº federal 6.515/77, residentes e domiciliados à Rua 07 de Setembro, nº. 155, Centro, nesta cidade de Icó-CE. Foi avaliado para efeitos fiscais no valor de R\$ 2.000,00, estando isento de pagamento conforme Art. 4º, I da Lei 13.417/2003. Com a condição expressa de reversão em favor dos Outorgantes Doadores da área que não for utilizada no projeto para o que se propõe a presente doação pelo período acordado de 05 (cinco) anos a contar na assinatura deste ato. Eu, Mohanna Sarmento Peixoto dos Santos, Oficial Substituta do Registro Geral de Imóveis que fiz este ato. Subscribo e assino, (as) Edmir Peixoto dos Santos, Oficial. SELO AA - 886.250.

AV - 2 / 3.498, Em 25/11/2021.

Nos termos da Escritura de Re-Ratificação à "Escritura Pública de Doação de Imóvel do Lv. A-118, às fls. 036/037, datada de 24/06/2016", lavrada em Notas do Cartório do 2º Ofício desta cidade de Icó-CE, no Livro "A-124" às fls. 103/104, em data de 25/11/2021, foi pelos OUTORGANTES e reciprocamente OUTORGADOS, Sr. **LUIS GONZAGA TEIXEIRA**, engenheiro agrônomo, portador da C.I/RG nº. 2008313059-9 SSPDS-CE e CPF/MF nº. 080.345.084-20, e sua esposa Srª. **ALBANIZA FERREIRA TEIXEIRA**, funcionária pública estadual, portadora da C.I/RG nº. 2008312944-2 SSPDS-CE e CPF/MF nº. 101.281.313-49, brasileiros, casados sob o regime da comunhão de bens posterior a Lei nº federal 6.515/77, residentes e domiciliados à Rua 07 de Setembro, nº. 155, Centro, nesta cidade de Icó-CE, e **O MUNICÍPIO DE ICÓ**, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ nº 07.669.682/0001-79, com endereço à Av. Ilídio Sampaio, nº 2131, Centro, Icó-CE, neste ato legalmente representado por sua prefeita a Srª. **ANA LAÍS PEIXOTO CORREIA NUNES**, brasileira, casada, portadora do RG nº 2003034068797, inscrita no CPF/MF nº 026.942.683-31, com domicílio funcional no Palácio da Alforria, sede do Governo Municipal de Icó; constar que, tendo em vista o constante na referida escritura no local destinado A DESCRIÇÃO DA ÁREA está incorreto, e que atendendo as exigências da Legislação em vigor, vimos retificar, para fazer constar que por este instrumento, passa a constar como área total a de 3,6332ha com a seguinte descrição: um terreno rural, denominado Sítio "Logão", neste município de Icó - CE, com uma área de 3,6332ha, Perímetro: 1.056,17m, com a seguinte descrição do perímetro: DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: inicia-se a descrição deste perímetro em plano georreferenciado no vértice M01, de coordenadas N 9.294.731,49m e E 514.557,66m, com azimute de 123°46'58" por uma distância de 449,25m, até o ponto M02, de coordenadas N 9.294.481,69m e E 514.931,05m, com azimute de 220°49'39" por uma distância de 81,77m, até o ponto M03, de coordenadas N 9.294.419,81m e E 514.877,59m, com azimute de 303°43'01" por uma distância de 443,38m, até o ponto M04, de coordenadas N 9.294.665,93m e E 514.508,79m, com azimute de 36°41'58" por uma distância de 81,77m, até o ponto M01, onde teve início essa descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº -39 WGr, tendo como datum o Sírquo 2000. Todas as azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Edmir Peixoto dos Santos
Oficial Substituta do Registro Geral de Imóveis



LIMITES CONFRONTANTES: AO NORTE: Com Luiz Bento Landim, AO SUL: Com Luiz Gonzaga Teixeira, AO LESTE: Com Maria de Fátima Penaforte dos Santos, Moisés Penaforte dos Santos e Manuela Penaforte dos Santos, AO OESTE: Com Luiz Gonzaga Teixeira. E ainda que em virtude de ter havido declaração, na citada escritura em relação a condição expressa de reversão em favor dos Outorgantes Doadores da área que não for utilizada no projeto para o que se propõe a presente doação pelo período acordado de 05 (anos) anos a contar na assinatura daquele ato; e que atendendo as exigências da Legislação em vigor, vimos retificar, para fazer constar que por este instrumento, **passa a constar que a condição expressa de reversão em favor dos Outorgantes Doadores da área que não for utilizada no projeto para o que se propõe a presente doação passará a constar pelo novo período de 05 (cinco) anos a contar da assinatura deste ato;** Que, retificada, prefalada escritura naquelas partes, ratificam-na nas demais partes, a qual fica fazendo parte integrante e complementar da escritura ora re-ratificada, para que com a retificação ora feita, continue produzindo os seus devidos e legais efeitos. Pelos OUTORGANTES e reciprocamente OUTORGADOS referidos, me foi dito que estão de pleno acordo com a re-ratificação ora feita. Certifico mais que, em cumprimento ao que preconiza o Art. 215, Parágrafo 1º, Inciso V, do Código Civil Brasileiro vigente, que foram cumpridas as exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade deste ato. O referido é verdade e dou Fé. Eu, (as) Edmir Peixoto dos Santos, Tabelião Oficial do Registro Geral de Imóveis que fiz este ato. SELO DIGITAL – AAK052274-G9Y9.

AV – 3 / 3.498, Em 25/11/2021.

AVERBAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA – Procedo a presente averbação para constar que o imóvel descrito e caracterizado nesta matrícula supra, foi retificado nos termos dos documentos comprobatórios apresentados e arquivados nesta Serventia, constante do Ofício nº 206/2021-PGM, expedido pelo **MUNICÍPIO DE ICÓ-CE**, com sede a Av. Ilidim Sampaio, 2131, Centro, nesta cidade de Icó-Ce, inscrita no CNPJ/MF nº 07.669.682/0001-79, e CGF. nº 06.920.187-7, neste ato representado pelo Procurador Assistente do Município – Ligia Iasino Maciel de Melo Peixoto, datado de 24 de Novembro de 2021, Memorial Descritivo, Planta de Locação, Planta de Localização/Situação, Planilha de Cálculo Analítico, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº CE20210892445, devidamente assinado pelo Sr. Pedro Benício de Oliveira – Engenheiro Civil – CREA-CE nº 9442-D e RNP 969135287-4, ficando alterada a área total do imóvel para 21.3259 ha com a seguinte descrição: **um terreno rural, denominado Sítio "Lagoo", neste município de Icó - CE, com uma área de 21.3259ha.**
Perímetro: 2.553,36m, com a seguinte descrição do perímetro: DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO:
DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: inicia-se a descrição deste perímetro no ponto M01, de coordenadas N 9.294.731,49m e E 514.557,66m, com azimute de 123°46'58" por uma distância de 449,25m, até o ponto M02, de coordenadas N 9.294.481,69m e E 514.931,05m, com azimute de 59°58'32" por uma distância de 247,69m, até o ponto M03, de coordenadas N 9.294.605,63m e E 515.145,50m, com azimute de 145°39'24" por uma distância de 495,89m, até o ponto M04, de coordenadas N 9.294.196,18m e E 515.425,26m, com azimute de 231°52'07" por uma distância de 248,84m, até o ponto M05, de coordenadas N 9.294.042,53m e E 515.229,52m, com azimute de 246°36'27" por uma distância de 90,28m, até o ponto M06, de coordenadas N 9.294.006,69m e E 515.146,66m, com azimute de 321°26'20" por uma distância de 291,53m, até o ponto M07, de coordenadas N 9.294.234,65m e E 514.964,94m, com azimute de 134°44'38" por uma distância de 204,73m, até o ponto M08, de coordenadas N 9.294.419,81m e E 514.877,59m, com azimute de 303°43'01" por uma distância de 443,38m, até o ponto M09, de coordenadas N 9.294.665,93m e E 514.508,79m, com azimute de 36°41'58" por uma distância de 81,77m, até o ponto M01, onde teve início essa descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão

Edmir Peixoto dos Santos
2º Tabelião Oficial do Registro Público



georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº -39 WGr, tendo como datum o SIRGAS 2000. Todas as azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculadas no plano de projeção UTM.
LIMITES CONFRONTANTES: Ao Norte: Com Luiz Gonzaga Teixeira e Luiz Bento Landim, Ao Sul: Com Estrada Carraçavel, Ao Leste: Com Luiz Bento Landim, Maria de Fátima Penaforte dos Santos, Moisés Penaforte dos Santos e Manuela Penaforte dos Santos, Ao Oeste: Com Luiz Gonzaga Teixeira e João Reinaldo Ribeiro Filho. O referido é verdade e dou Fé. Eu, (as) Edmir Peixoto dos Santos, Tabelião Oficial que fiz este ato. SELO DIGITAL – AAK052275-F9Y9.

Certidão válida, somente com a selo de autenticidade por 30 dias, exceto para fins de incorporação imobiliária e Parcelamento do Solo Urbano, cuja validade é de 90 dias.

Certifico que até este momento, da data de hoje, as atas constantes da presente certidão são as únicas desta Matrícula.
Itó-Ce, 25 de Novembro de 2021.

Em Testemunha da Verdade
Edmir Peixoto dos Santos
Tabelião Oficial do Registro Público
Reg. Abstrato nº 0213/211



Cartório Peixoto dos Santos 2º Oficial - Itó-Ce
Edmir Peixoto dos Santos - 2º Tabelião Público
Maria do Socorro S. Santos Peixoto - Tabelião Substituto
Dêni Fátima Santos - Tabelião Substituto
João Borges Rodrigues Neto - Escrivão Autorizado
João Roberto Teixeira Júnior - Escrivão Autorizado
Rafael Rodrigues S. Peixoto - Escrivão Autorizado
CNPJ nº 05.537.212/0001-26



PREFEITURA DE
ICÓ
PM - CONTINUA A AVANÇAR

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA
DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM**

Icó, Ceará

2026




PREFEITURA DE
ICÓ
PRAZOS E AUTORAÇÃO

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



Série: Foto 17 de abril de 2024 15:08:15
0.2828718N 48.8647539W
ICÓ 63430-000
Brasil
Número de Índice: 1999

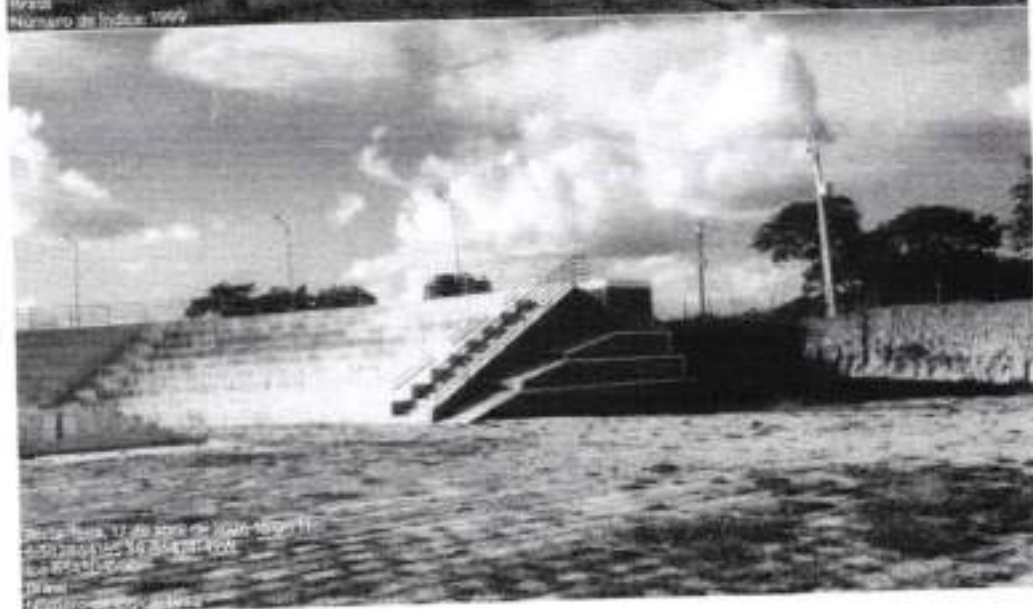


Série: Foto 17 de abril de 2024 15:08:11
0.2828718N 48.8647539W
ICÓ 63430-000
Brasil
Número de Índice: 1999

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
UMA CONTINUAÇÃO E INOVAÇÃO

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**

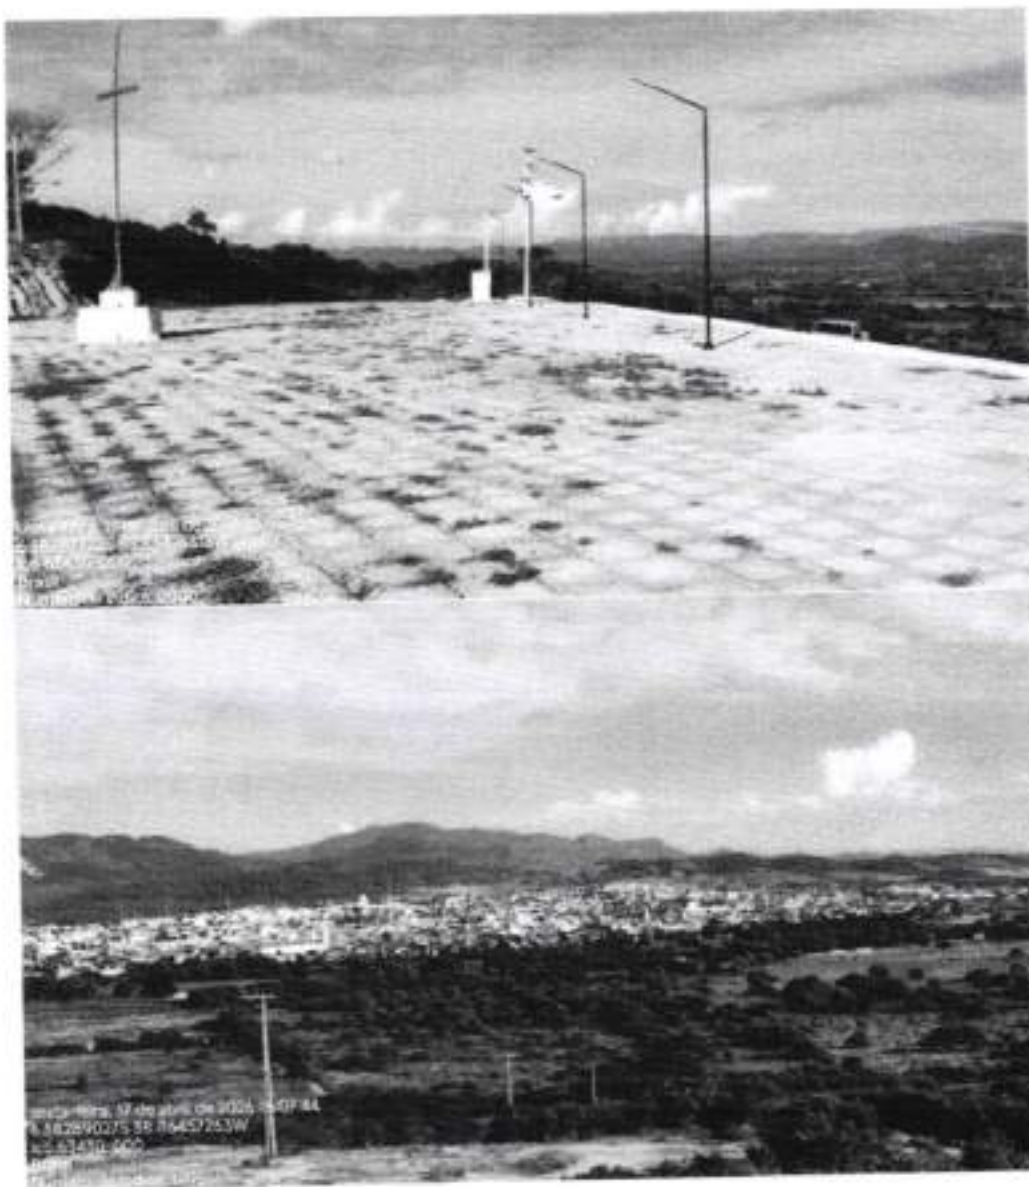


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
Pela Continuidade e Avanço

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**

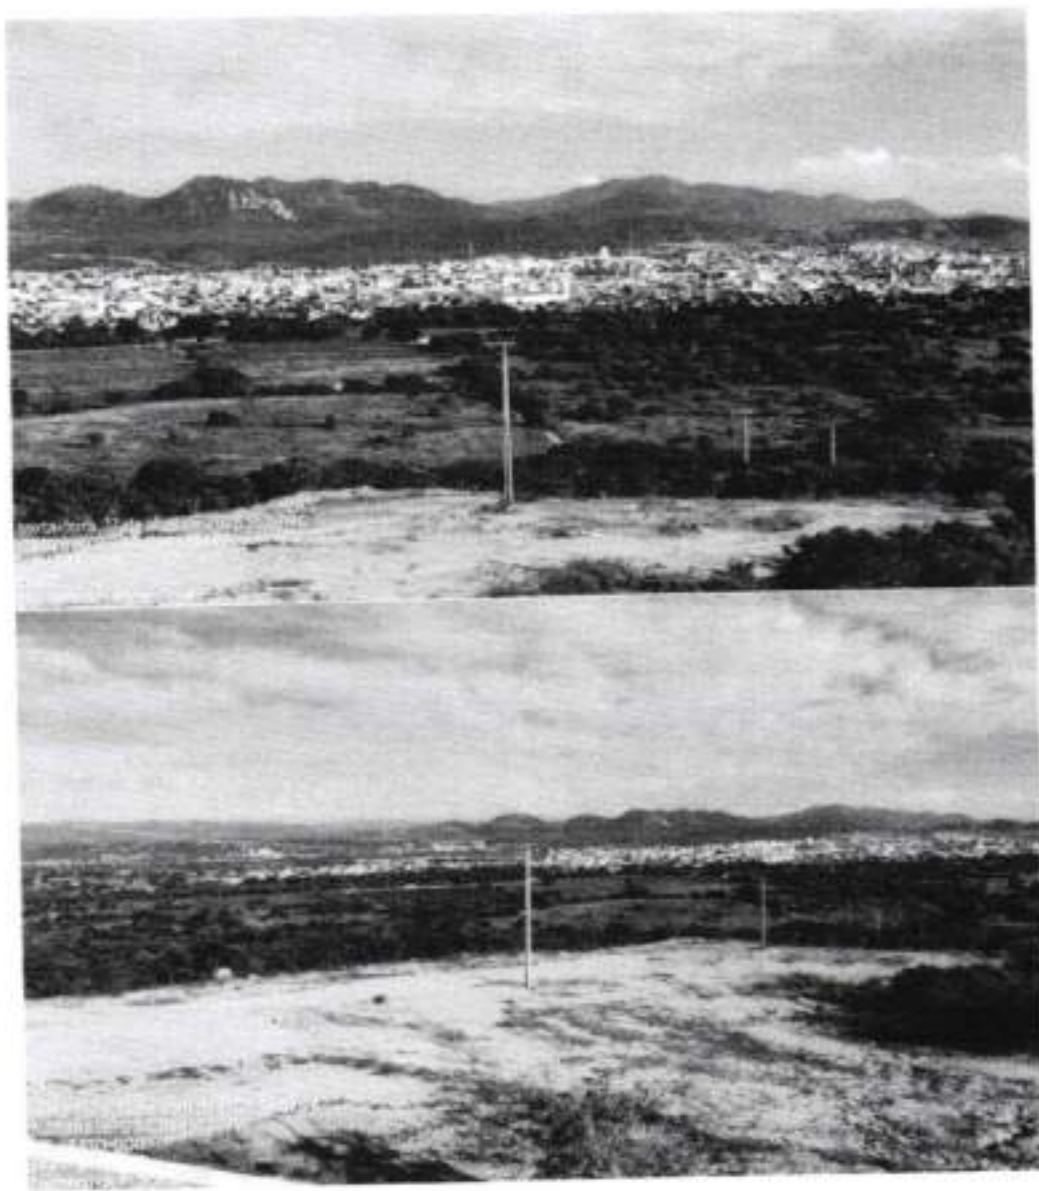

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
PIL CONTINUAR E AVANÇAR

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



Imagem
Número da Imagem: 1092




Imagem
Data: 17 de abril de 2016 16:06:45
A: 1029775135 38.844543044W
ICÓ 63.430-000
Brasil
Número da Imagem: 1093

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
RUA CRUZELANDIA E ALVARO

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**

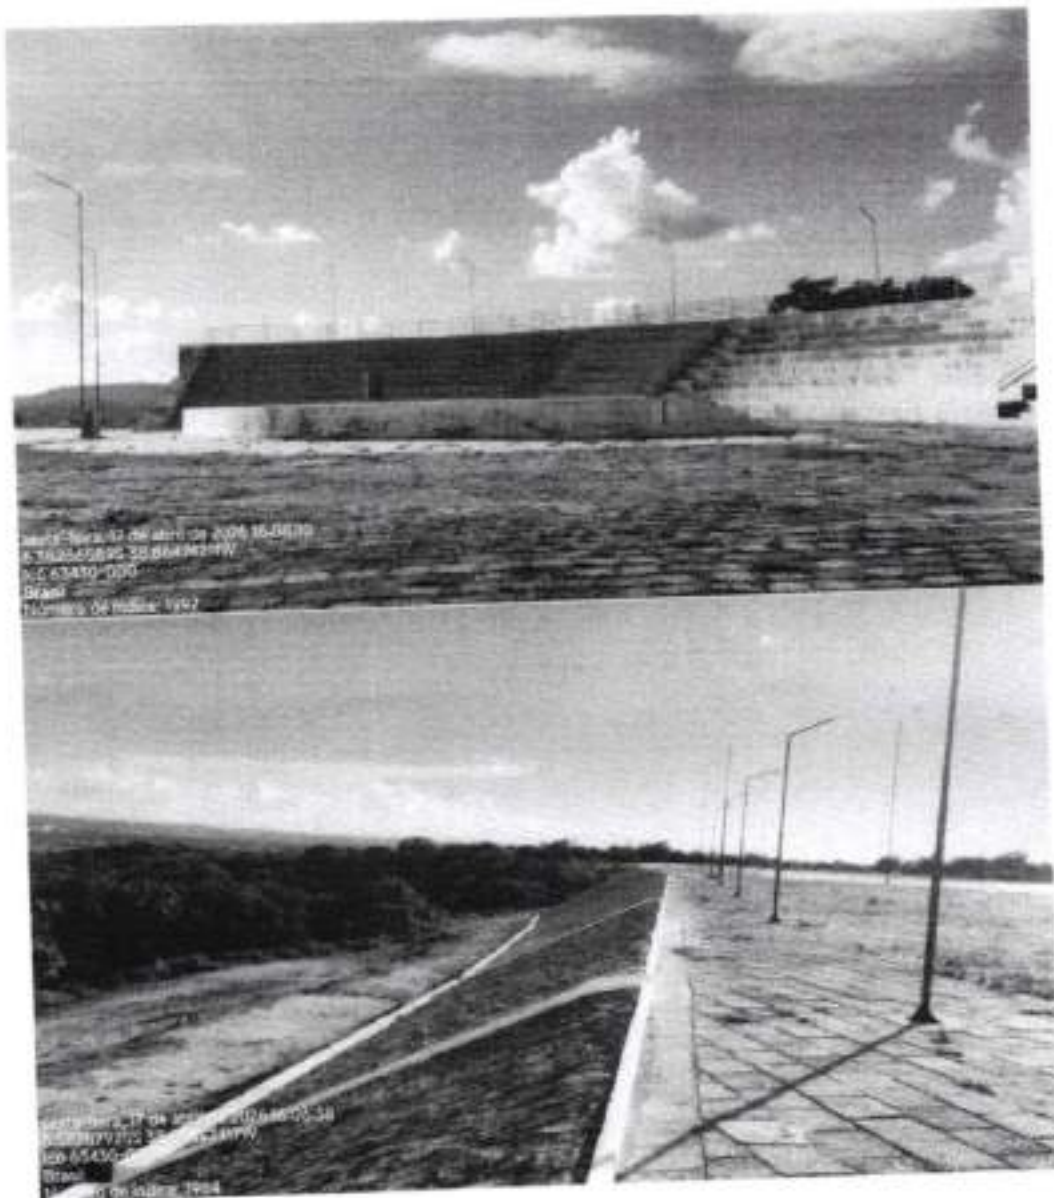

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
PRA CONTINUAR A JUNTAR

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



Imagem: 17 de maio de 2024 16:06:38
652870285 53 6417156W
ICÓ 63430-000
Brasil
Número de rubrica: 1942



Imagem: 17 de maio de 2024 16:06:38
652870285 53 6417156W
ICÓ 63430-000
Brasil
Número de rubrica: 1942

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
PIL-CONTINUA E AVANÇA

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
RUA DO CRUZEIRO, 619 - JARDIM

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**

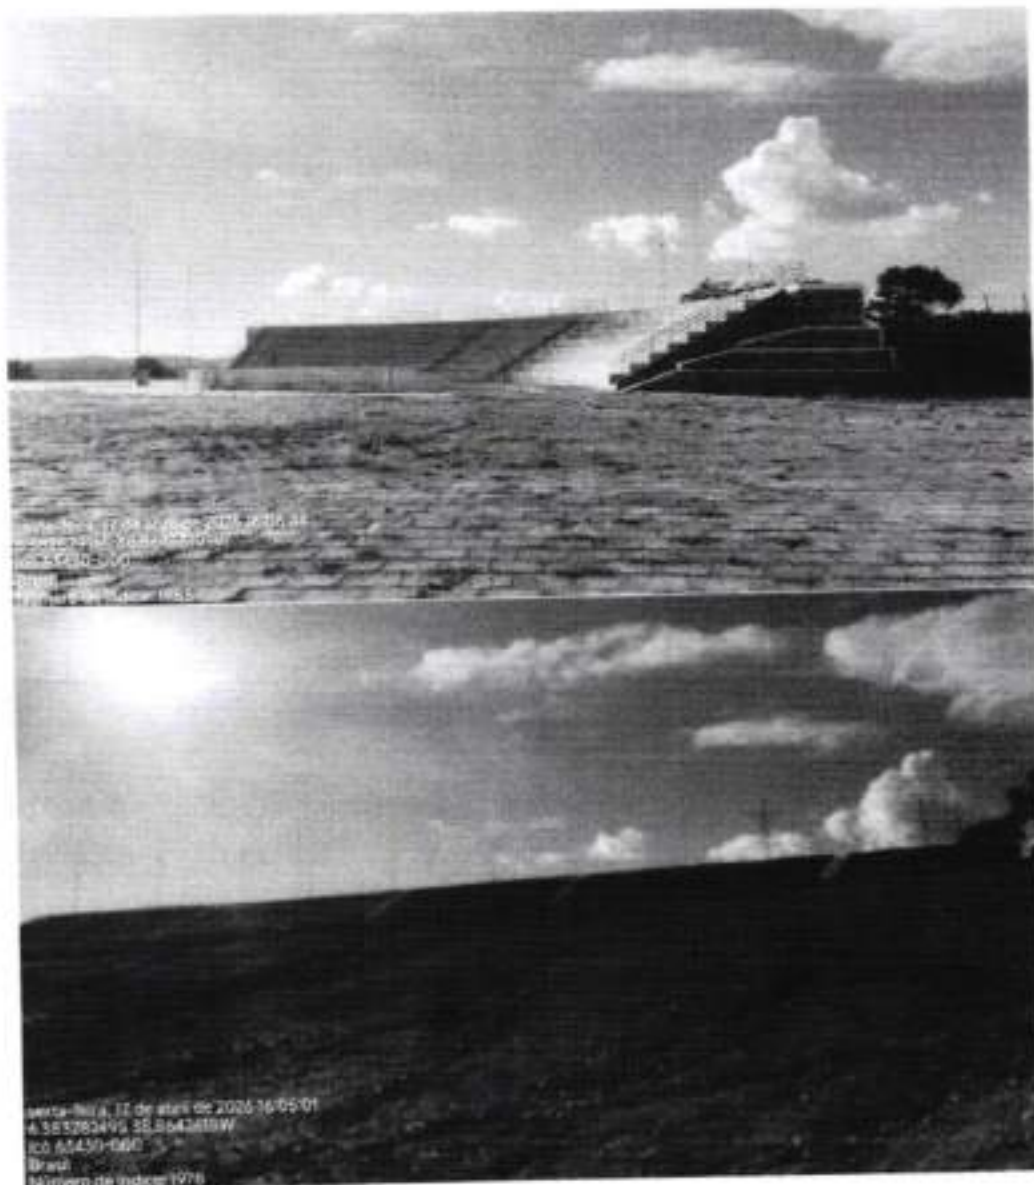

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
PRA CONTINUIDADE E FORTALECIMENTO

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
ASA CONTINUA E AVANÇA

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**

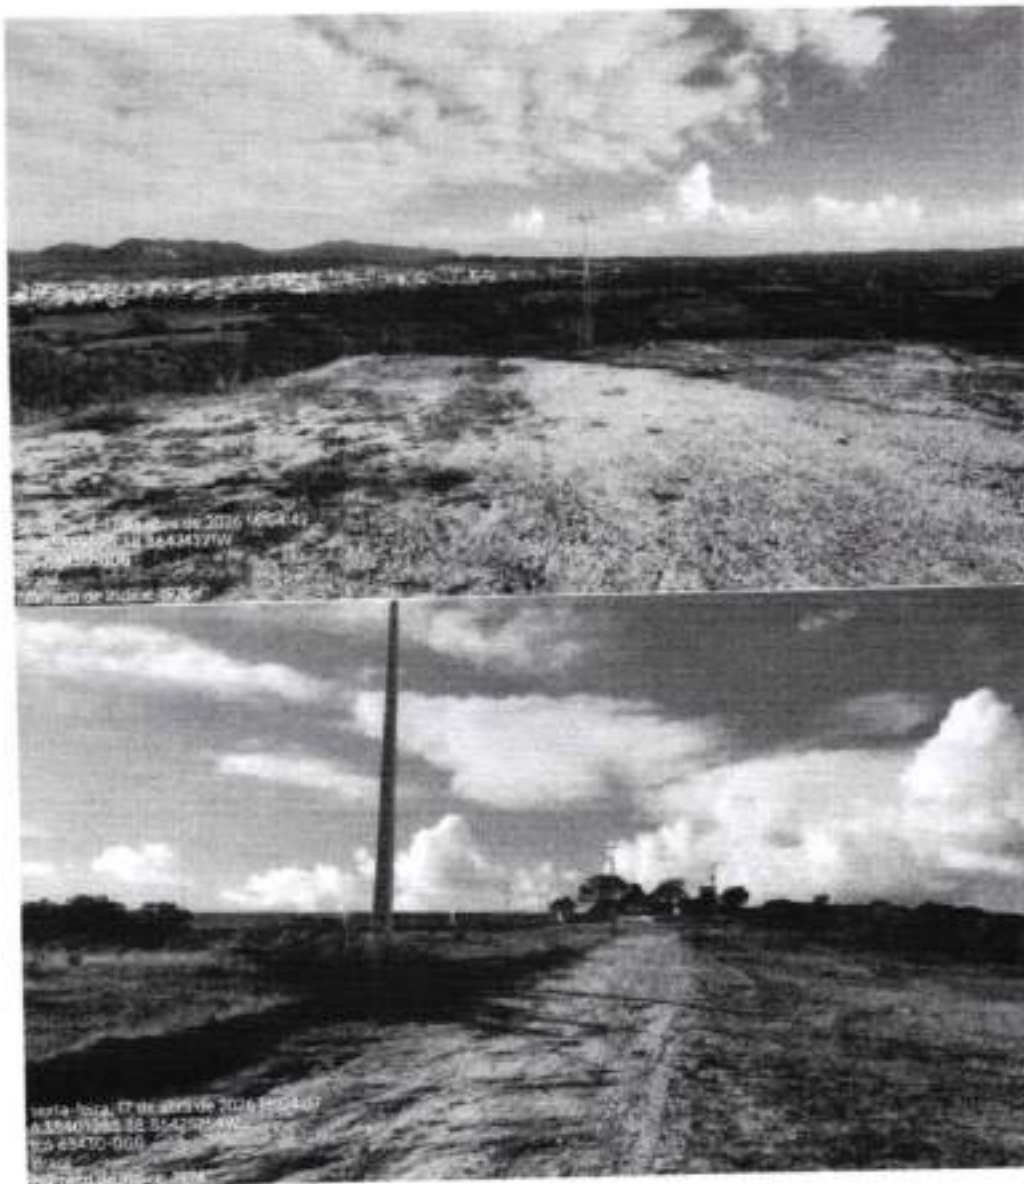

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
RUA CRUZEIRO, 619 - JARDIM

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**




SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
PRA CONTINUAR E AVANÇAR

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**

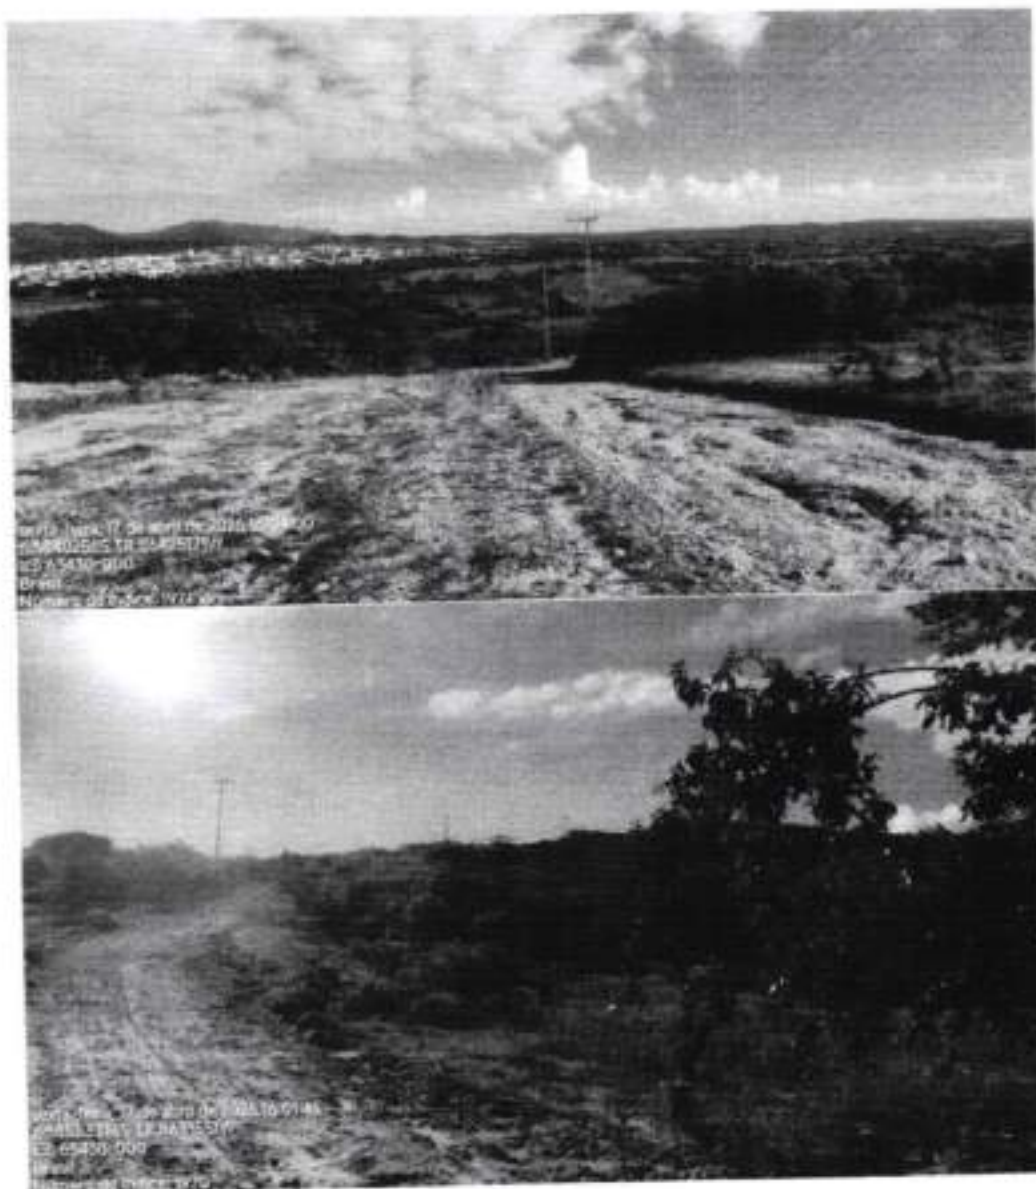

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
ORA CONTINUAR E AVANÇAR

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



sexta-feira, 17 de abril de 2026 16:01:41
S 381631065 38 49 516350W
ICÓ 63430-000
Brasil
Número de índice: 1969



sexta-feira, 17 de abril de 2026 16:01:41
S 381631065 38 49 516350W
ICÓ 63430-000
Brasil
Número de índice: 1968


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
PRA CONTINUAR E AVANÇAR

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**

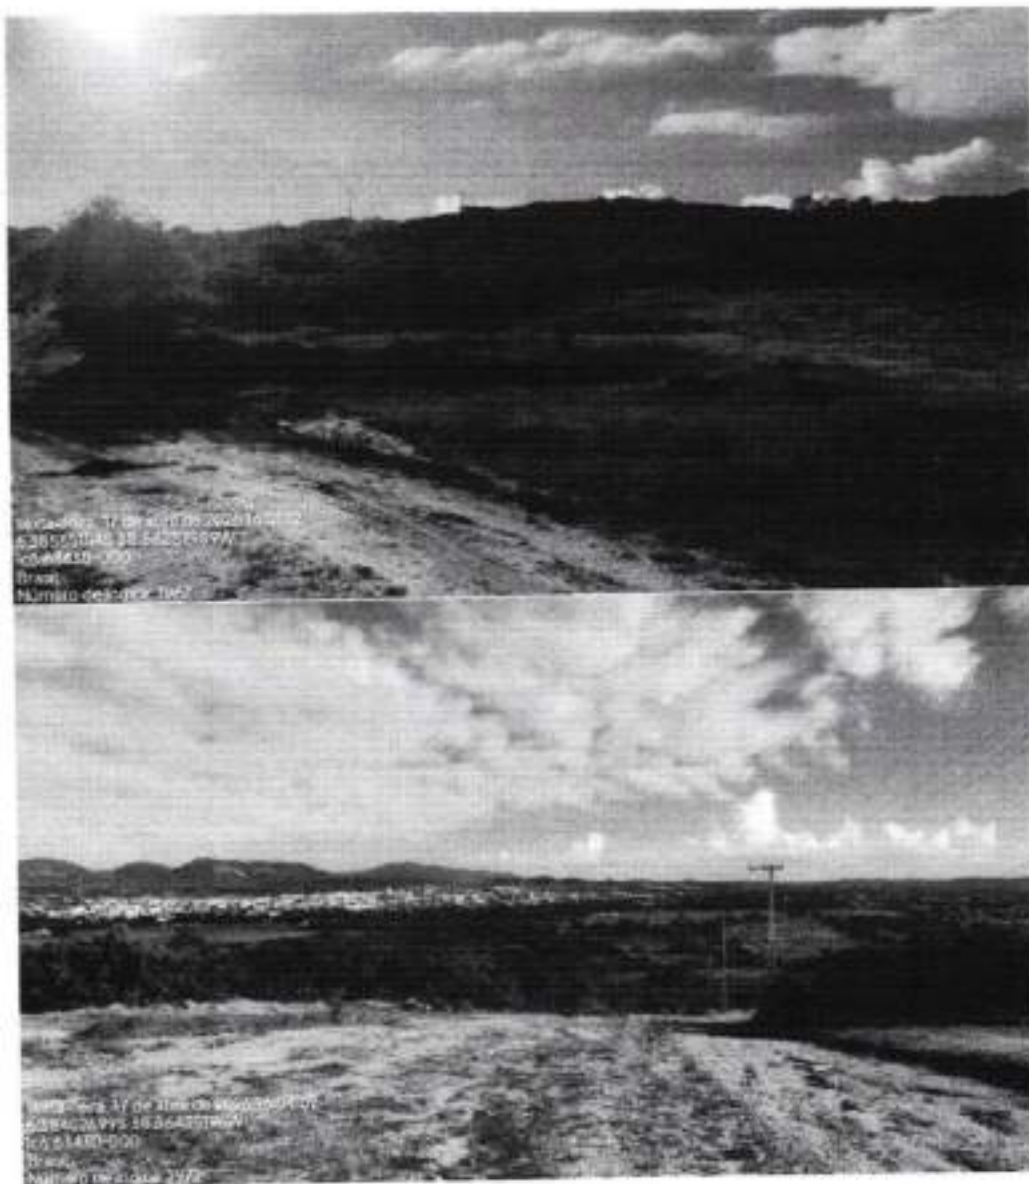


SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
PIL CONTÁVEL E BUNÇAR

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**

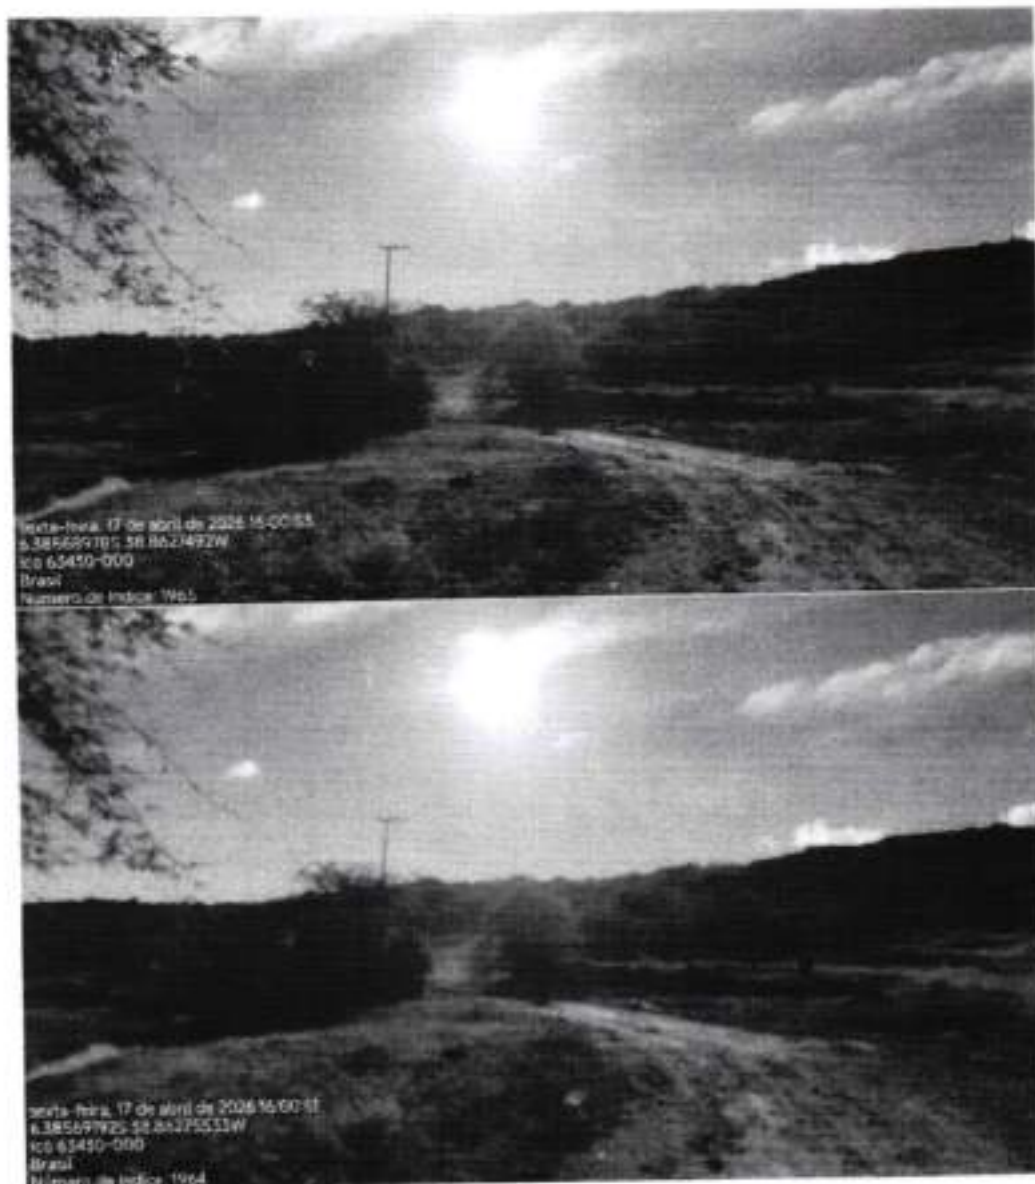

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
Pela Continuidade e Rotação

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



Santa-Feliza, 17 de abril de 2020 16:00:20
A: 36677278538 86060733w
Se: 63430-000
Brasil
Município de Icó-CE



Santa-Feliza, 17 de abril de 2020 15:57:42
A: 36665612638 86206102w
Se: 63430-000
Brasil
Município de Icó-CE

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua do Cruzeiro, Nº 619, DNER, Icó-Ceará
CNPJ: 07.669.682/0001-79 – CEP: 63.430-000



PREFEITURA DE
ICÓ
PMA CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO

Secretaria de
**Desenvolvimento Urbano
e Infraestrutura**



data-hora: 17 de abril de 2026 16:03:11
A:185456925 38.86387509W
icó 63430-000
Brasil
Número de índice: 1966

ITAMAR
GONCALVES
DA

COSTA:080069⁹
74489

Assinado de forma
digital por ITAMAR
GONCALVES DA
COSTA:0800697448

Dados: 2026.04.17
16:38:21 -03'00'



PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 62
Rubrica

1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICO-COM DESONERAÇÃO FINAL		DATA:	05/04/2026	BDI:	23,32%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICO-COM DESONERAÇÃO		FONTE:	SEINFRA	VERBA:	SEINFRA
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ		DESCRIÇÃO:	SEINFRA	DESCRIÇÃO:	SEINFRA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ		DESCRIÇÃO:	SEINFRA	DESCRIÇÃO:	SEINFRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 1.014.240,43	R\$ 1.266.838,80
8.1	C3619	TUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2" INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	5.720,00	R\$ 37,70	R\$ 40,72	R\$ 215.844,00	R\$ 287.236,40
8.2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	3.882,00	R\$ 8,91	R\$ 8,96	R\$ 34.524,62	R\$ 33.229,92
8.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	12.900,00	R\$ 6,76	R\$ 10,06	R\$ 113.064,00	R\$ 140.094,00
8.4	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	4.400,00	R\$ 9,87	R\$ 12,23	R\$ 43.428,00	R\$ 53.812,00
8.5	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	8.930,00	R\$ 18,52	R\$ 22,35	R\$ 128.343,60	R\$ 159.043,60
8.6	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	4.190,00	R\$ 25,14	R\$ 31,15	R\$ 105.336,60	R\$ 130.516,60
8.7	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	SEINFRA	UN	222,00	R\$ 320,79	R\$ 408,08	R\$ 73.213,36	R\$ 90.726,96
8.8	C2911	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA SPDA PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"	SEINFRA	UN	222,00	R\$ 13,17	R\$ 16,32	R\$ 2.923,74	R\$ 3.623,04
8.9	C1030	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	SEINFRA	UN	244,00	R\$ 75,13	R\$ 98,06	R\$ 18.207,72	R\$ 23.626,64
8.10	C1067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISORES 207X332X85mm	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 314,31	R\$ 389,49	R\$ 1.257,24	R\$ 1.557,96
8.11	C4380	COMPARIMENTO LUMINÁRIA P/ BETA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M	SEINFRA	UN	44,00	R\$ 3.340,64	R\$ 4.150,75	R\$ 147.379,76	R\$ 182.633,00
8.12	C3504	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	244,00	R\$ 189,79	R\$ 210,40	R\$ 41.428,76	R\$ 51.337,60
8.13	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO 50 FUNDO DI=300x300x40 cm	SEINFRA	UN	200,00	R\$ 474,05	R\$ 587,44	R\$ 94.810,00	R\$ 117.488,00
8.14	C3506	POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2,80M, CIGLOBO E LÂMPADA VAPOR DE 500W TSW	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 376,41	R\$ 466,45	R\$ 376,41	R\$ 466,45
8.15	C1126	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 98,08	R\$ 122,76	R\$ 196,12	R\$ 245,52
8.16	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 96,06	R\$ 122,76	R\$ 96,06	R\$ 122,76
8.17	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 143,81	R\$ 178,21	R\$ 143,81	R\$ 178,21
8.18	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 99,06	R\$ 122,76	R\$ 99,06	R\$ 122,76
8.19	C1093	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 24,08	R\$ 29,82	R\$ 289,72	R\$ 357,84
8.20	C4562	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 133,83	R\$ 165,54	R\$ 133,83	R\$ 165,54
7		SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES						R\$ 10.213,20	R\$ 12.687,60
7.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	360,00	R\$ 28,37	R\$ 35,18	R\$ 10.213,20	R\$ 12.687,60
8		BANHEIROS SUPELORES						R\$ 393.066,80	R\$ 487.084,93
8.1		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 690,97	R\$ 843,83
8.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	13,92	R\$ 49,92	R\$ 60,82	R\$ 690,97	R\$ 843,83

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL			DATA :	06/04/2026	BDI :	23,92%
	DESCRIÇÃO	FONTE		SEINFRA	VERBA	SEINFRA	MS
	LOCAL	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO		SEINFRA	VERBA	SEINFRA	MS
	CLIENTE	HORTO DO SENHOR DO BONFIM - CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARA		SEINFRA	VERBA	SEINFRA	MS
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ		SEINFRA	VERBA	SEINFRA	MS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS									
8.2									
8.2.1	C0554	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	3,84	R\$ 543,91	R\$ 674,01	R\$ 2.088,81	R\$ 2.588,20
8.2.2	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PROFUNDIDADES ÚTL. 5 X	SEINFRA	M2	34,08	R\$ 77,54	R\$ 96,09	R\$ 2.642,86	R\$ 3.274,75
8.2.3	C0944	CONCRETO PAVIBR - FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	14,87	R\$ 571,56	R\$ 708,26	R\$ 8.384,79	R\$ 10.396,47
8.2.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/95	SEINFRA	KG	1.080,13	R\$ 12,97	R\$ 15,95	R\$ 13.901,27	R\$ 17.228,57
8.2.5	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRILHADA PI FÓRNO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	M2	179,00	R\$ 178,96	R\$ 219,29	R\$ 31.144,96	R\$ 38.595,04
8.3									
8.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO FURADO (8x15x19cm) ARGAMASSA MISTA DE CAL	SEINFRA	M2	347,05	R\$ 62,98	R\$ 78,04	R\$ 21.857,31	R\$ 27.083,78
8.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERFICIAL TRAÇO 1:3 ESP = 5mm PI PAREDE	SEINFRA	M2	894,10	R\$ 7,42	R\$ 9,18	R\$ 5.100,22	R\$ 6.378,79
8.3.3	C3028	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	265,33	R\$ 44,77	R\$ 55,48	R\$ 11.878,82	R\$ 14.720,51
8.3.4	C0855	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	37,52	R\$ 142,95	R\$ 177,34	R\$ 5.363,48	R\$ 6.640,29
8.4									
8.4.1	C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA PI TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 1,0m	SEINFRA	M2	191,08	R\$ 151,93	R\$ 126,31	R\$ 19.474,75	R\$ 24.132,79
8.4.2	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	191,08	R\$ 82,45	R\$ 85,07	R\$ 13.115,27	R\$ 16.253,47
8.4.3	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 35cm	SEINFRA	M	23,81	R\$ 65,22	R\$ 80,82	R\$ 1.422,45	R\$ 1.762,68
8.4.4	C2593	TUBO PVC BRANCO PRESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	14,00	R\$ 42,14	R\$ 52,22	R\$ 589,96	R\$ 731,08
8.4.5	C4399	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 33,22	R\$ 41,17	R\$ 166,10	R\$ 208,95
8.5									
8.5.1	C2405	PISO MORTO CONCRETO FCK=13 MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	15,12	R\$ 647,03	R\$ 801,89	R\$ 9.763,09	R\$ 12.123,22
8.5.2	C1929	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	167,99	R\$ 136,06	R\$ 168,61	R\$ 22.856,72	R\$ 28.324,79
8.5.3	C2344	RODAPE INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 10cm	SEINFRA	M	74,26	R\$ 24,20	R\$ 29,98	R\$ 1.797,09	R\$ 2.227,06
8.6									
8.6.1	C4458	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA PI PAREDE	SEINFRA	M2	295,33	R\$ 168,43	R\$ 208,72	R\$ 44.889,53	R\$ 55.379,66
8.7									
8.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	34,00	R\$ 264,15	R\$ 327,33	R\$ 8.981,10	R\$ 11.129,22
8.7.2	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 3P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 28,50	R\$ 35,32	R\$ 142,60	R\$ 178,60

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL			DATA:	06/04/2026	BDI:	23,92%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO			POSTO:	SEINFRA	SEINFRA	MS
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-GEARÁ			SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA	MS
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ			SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA	MS
					SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA	MS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.9.1	C1988	PORTA INTERNA DE CIMENTO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10m)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 1.052,89	R\$ 1.304,74	R\$ 3.158,67	R\$ 3.914,22
8.9.2	C4617	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FORÇO, DE ABRIIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	29,12	R\$ 407,91	R\$ 505,48	R\$ 11.879,24	R\$ 14.710,56
8.9.3	C1342	FECHADURA DE TAPETA (LIVRE OCUPADA)	SEINFRA	UN	26,00	R\$ 108,78	R\$ 134,79	R\$ 3.043,60	R\$ 3.771,60
8.9.4	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	SEINFRA	M2	7,68	R\$ 418,28	R\$ 518,33	R\$ 3.212,38	R\$ 3.980,77
8.9.5	C4850	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E-8MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	7,68	R\$ 369,02	R\$ 457,29	R\$ 2.834,07	R\$ 3.511,99
8.10		PINTURAS E ACABAMENTOS						R\$ 24.091,96	R\$ 29.886,19
8.10.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	320,00	R\$ 12,83	R\$ 18,90	R\$ 4.105,60	R\$ 5.088,00
8.10.2	C4167	LATEX ACRILICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	320,00	R\$ 26,97	R\$ 33,05	R\$ 8.534,40	R\$ 10.576,00
8.10.3	C1280	BIMANTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	11,34	R\$ 24,64	R\$ 30,53	R\$ 279,42	R\$ 346,21
8.10.4	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	188,29	R\$ 13,81	R\$ 17,11	R\$ 2.600,29	R\$ 3.221,64
8.10.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - TETO	SEINFRA	M2	173,81	R\$ 12,83	R\$ 15,93	R\$ 2.227,42	R\$ 2.760,40
8.10.6	C4167	LATEX ACRILICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA - TETO	SEINFRA	M2	173,81	R\$ 26,97	R\$ 33,05	R\$ 4.630,18	R\$ 5.737,81
8.10.7	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	75,04	R\$ 22,85	R\$ 28,32	R\$ 1.714,88	R\$ 2.125,13
8.11		ACESSIBILIDADE						R\$ 1.176,40	R\$ 1.456,56
8.11.1	C1938	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/UBO INOX PWC 3	SEINFRA	M	6,00	R\$ 195,60	R\$ 242,76	R\$ 1.176,40	R\$ 1.456,56
9		DRENAGEM						R\$ 1.401.785,10	R\$ 1.736.223,43
9.1	C3526	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:6) C/ARGAMASSA	SEINFRA	M3	3.097,99	R\$ 533,29	R\$ 658,01	R\$ 1.632.529,00	R\$ 2.000.500,85
9.2	C3078	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA (PRODUZIDA) (TRANSPORTE)	SEINFRA	M3	3.064,28	R\$ 98,06	R\$ 121,62	R\$ 300.483,30	R\$ 372.371,31
9.3	C2727	DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m	SEINFRA	M	2.262,14	R\$ 65,19	R\$ 80,78	R\$ 148.772,71	R\$ 184.351,27

VALOR BDI TOTAL: R\$ 1.207.134,18
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 8.046.083,81
 VALOR TOTAL: R\$ 9.253.217,99



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - IÇO-COM DESONERAÇÃO FINAL		DATA :	06/04/2028	BOI :	23,32%
	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO	06/04/2028	BOI :	23,32%
LOCAL	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - IÇO-COM DESONERAÇÃO		DESCRIÇÃO	06/04/2028	BOI :	23,32%
	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO	06/04/2028	BOI :	23,32%
CLIENTE	HORTO DO SENHOR DO BONFIM - CONJUNTO GAMA, IÇO CEARA		DESCRIÇÃO	06/04/2028	BOI :	23,32%
	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO	06/04/2028	BOI :	23,32%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ		DESCRIÇÃO	06/04/2028	BOI :	23,32%
	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO	06/04/2028	BOI :	23,32%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 193.981,00	R\$ 19.398,10	R\$ 19.398,10	R\$ 19.398,10	R\$ 19.398,10	R\$ 19.398,10	R\$ 19.398,10	R\$ 19.398,10	R\$ 19.398,10	R\$ 193.981,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO	R\$ 26.349,44	R\$ 26.349,44								R\$ 26.349,44
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 284.732,19	R\$ 56.946,43	R\$ 73.361,71	R\$ 69.004,38	R\$ 42.709,83	R\$ 42.709,84				R\$ 284.732,19
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.839.138,55	R\$ 183.913,86	R\$ 367.827,71	R\$ 276.870,78	R\$ 367.827,71	R\$ 276.870,78	R\$ 183.913,86	R\$ 183.913,85		R\$ 1.839.138,55
5	PAREDES E CERCAS	R\$ 316.137,95	R\$ 31.613,80	R\$ 31.613,80	R\$ 63.227,59	R\$ 79.034,49	R\$ 31.613,80	R\$ 63.227,59	R\$ 47.420,08		R\$ 316.137,95
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.256.888,90	R\$ 125.688,89	R\$ 251.377,78	R\$ 186.533,34	R\$ 186.533,34	R\$ 186.533,34	R\$ 186.533,34	R\$ 62.844,42	R\$ 62.844,42	R\$ 1.256.888,90
7	SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES	R\$ 12.657,60	R\$ 1.265,76	R\$ 2.531,52	R\$ 5.063,04	R\$ 1.265,76	R\$ 532,88	R\$ 632,88	R\$ 632,88		R\$ 12.657,60
8	BANHIEIROS SUPERIORES	R\$ 487.084,93	R\$ 73.062,74	R\$ 73.062,74	R\$ 73.062,74	R\$ 73.062,74	R\$ 73.062,74	R\$ 73.062,74	R\$ 24.354,26	R\$ 24.354,24	R\$ 487.084,93
9	DRENAÇÃO	R\$ 1.836.223,43	R\$ 183.622,34	R\$ 367.244,69	R\$ 183.622,34	R\$ 275.433,51	R\$ 367.244,69	R\$ 183.622,34	R\$ 183.622,34	R\$ 91.811,19	R\$ 1.836.223,43
			R\$ 870.247,56	R\$ 1.180.418,06	R\$ 887.481,36	R\$ 1.046.964,63	R\$ 1.009.766,22	R\$ 722.089,90	R\$ 522.186,55	R\$ 199.040,82	R\$ 8.263.193,99
			R\$ 870.247,56	R\$ 1.368.665,61	R\$ 2.744.146,87	R\$ 3.801.111,80	R\$ 4.809.876,72	R\$ 6.431.366,62	R\$ 6.064.163,17	R\$ 8.263.193,99	

ITAMAR
GONCALVES DA
COSTA-0800697
4489





OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM ICD-COM DESENHAGEM FINAL
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM ICD-COM DESENHAGEM
LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

DATA : 06/04/2025	BDI : 29,92%	
versão	NORA	REN
sem o cdm de denominação	94,44%	47,88%
com cdm		
com cdm de denominação	95,71%	94,14%
sem cdm	0,00%	0,00%

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COM-PAV01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições	%	R\$ 1.565,37	R\$ 1.565,37
				TOTAL Serviço:	R\$ 1.565,37
				VALOR:	1.565,37

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1291	PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 24,1500	R\$ 14,4960
12543	SERVENTE	H	0,60000000	R\$ 18,4800	R\$ 11,0780
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 25,5720

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073 ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	7,20000000	R\$ 62,9800	R\$ 453,4560
C0074 ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	9,18000000	R\$ 108,9100	R\$ 999,7938
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/EN TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,16960000	R\$ 545,3800	R\$ 92,4964
C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	16,00000000	R\$ 11,9630	R\$ 191,3600
C0636 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,14400000	R\$ 502,6900	R\$ 72,4162
C0640 CONCRETO PAVBR. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,42260000	R\$ 495,6500	R\$ 209,1643
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	9,55000000	R\$ 48,9200	R\$ 467,1980
				TOTAL Serviço	R\$ 2.485,9727
				VALOR:	2.611,33

Material		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 81,8800	R\$ 81,8800
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	80,00000000	R\$ 9,3300	R\$ 559,8000
10940	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 6,0200	R\$ 24,0800
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 4,1400	R\$ 8,2800
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 7,1400	R\$ 42,8400
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 53,2800	R\$ 53,2800
11406	LUXA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,6500	R\$ 3,3000
02383	NOFUSE DE 70 A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,1500	R\$ 29,1500
02405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/8), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 479KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 601,7000	R\$ 601,7000
02413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 272,4000	R\$ 272,4000
					TOTAL Material	R\$ 1.878,6900
					VALOR:	1.878,69

	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Cutilo Horário					

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA : 05/04/2025		BDI : 20,92%	
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA

10779	TRATOR DE ESTEIRAS CALÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0.00060000	R\$ 277.5820	R\$ 0.1685
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 0.1685	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.00300000	R\$ 18.4600	R\$ 0.0054
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0.0054	
VALOR:					0,32	

2.4. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2.00000000	R\$ 79.4828	R\$ 158.9652
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4.00000000	R\$ 1.1732	R\$ 4.7008
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4.00000000	R\$ 2.3202	R\$ 9.2808
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 172.9468	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4.00000000	R\$ 19.1000	R\$ 76.4000
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4.00000000	R\$ 26.4400	R\$ 105.7600
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5.00000000	R\$ 31.5200	R\$ 157.6000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 339.7600	
VALOR:					612,71	

2.5. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1.02000000	R\$ 39.0300	R\$ 39.8106
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1.00000000	R\$ 31.8800	R\$ 31.8800
11691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4.50000000	R\$ 16.0900	R\$ 72.4050
11725	PREGO 15X15 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/RG)	SEINFRA	KG	0.15000000	R\$ 15.9900	R\$ 2.3985
TOTAL Material					R\$ 146.4941	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	2.00000000	R\$ 18.4600	R\$ 36.9200
TOTAL Mão de Obra					R\$ 36.9200	
VALOR:					182,41	

2.6. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0.24000000	R\$ 62.8491	R\$ 15.0838
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 15.0838	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.72000000	R\$ 18.4600	R\$ 13.2912
TOTAL Mão de Obra					R\$ 13.2912	

ITAMAR
GONCALVES DA
COSTA:0800697
4489

Assinado de forma
digital por ITAMAR
GONCALVES DA
COSTA:08006974489
Dados: 2026.06.01
17:52:26 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA: 06/04/2025		SDR - 23,52%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM ICÓ-COM DESONERAÇÃO	PONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA

VALOR:	28,37
--------	-------

2.7. C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Material	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10665 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 532,8100	R\$ 532,8100
TOTAL Material					R\$ 532,8100

Mão de Obra	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,9220

VALOR:	548,73
--------	--------

2.8. C0370 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 (UN)

Material	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10174 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 223,0000	R\$ 223,0000
10197 BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	15,00000000	R\$ 8,8900	R\$ 133,3500
10400 CADEADO MEDIUM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 28,4900	R\$ 28,4900
10414 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 81,5300	R\$ 81,5300
10435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 38,2700	R\$ 38,2700
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	43,00000000	R\$ 35,9500	R\$ 1.545,8500
10796 CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,2200	R\$ 7,2200
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900	R\$ 11,0900
12311 DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 12,1400	R\$ 72,8400
11075 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,5700	R\$ 13,7100
11092 ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,1500	R\$ 6,1500
12331 FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 53,1200	R\$ 106,2400
12340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2,5MM2	SEINFRA	M	64,00000000	R\$ 1,7400	R\$ 111,3600
12357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 11,2800	R\$ 33,8400
12373 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 3,8900	R\$ 11,6700
11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 100,9600	R\$ 100,9600
12379 MINI POSTE F.G. 1 1/4" C/2 00M E REX MONOFÁSICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 67,4600	R\$ 67,4600
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	26,05000000	R\$ 22,1100	R\$ 574,8600
12408 PREGO 14X18 (1 1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 17,2300	R\$ 34,4600
12412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 47,0400	R\$ 47,0400
11798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 34,4300	R\$ 34,4300
12416 REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,1300	R\$ 23,1300
11824 RIPA DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	16,38000000	R\$ 1,7200	R\$ 28,0016
12429 TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	2,70000000	R\$ 38,8400	R\$ 98,9280
12433 TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 5,8700	R\$ 17,6100
12440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0,50 x 2,44M)	SEINFRA	UN	10,50000000	R\$ 25,0600	R\$ 263,1300
12444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 16,7600	R\$ 33,5200
12447 TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,9900	R\$ 17,9900
12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 15,8200	R\$ 47,4600

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA: 05/04/2025		ENR - 23,92%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FONTE	VERBA	NORMA
	LOCAL	HORTO DO SENHOR DO BONFIM - CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARA	SEINFRA	20811 COM DESONERAÇÃO	84,34%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	20804	15,66%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%
			SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	84,34%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA: 05/04/2020		BDI: 23,90%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FONTE:	VERBA:	HORA:	ME:
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARA	SEINFRA:	328.1 COM DESONERAÇÃO	24,44%	47,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA:	328.12 COM DESONERAÇÃO	24,44%	47,44%

10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 32,3811	R\$ 2,4512
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 49,0941	R\$ 0,2013
TOTAL Equipamento Curo: HORMO:						R\$ 2,6525

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 83,5800	R\$ 4,7473
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 77,1300	R\$ 0,5013
19513	TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	LIN	51,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 36,2100
TOTAL Material						R\$ 41,4586

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 24,1600	R\$ 3,8535
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,4800	R\$ 2,9444
TOTAL Mão de Obra						R\$ 6,7979
VALOR:						50,91

4.1.2. C4583 MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18567	EXTRUSORA DE PERFS DE CONCRETO ACOPLADA C/ FORMA E MOTOR DIESEL 10 HP	SEINFRA	H	0,06670000	R\$ 60,0300	R\$ 4,0040
TOTAL Material						R\$ 4,0040

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06670000	R\$ 24,1600	R\$ 1,6115
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13340000	R\$ 18,4800	R\$ 2,4626
TOTAL Mão de Obra						R\$ 4,0741

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0568	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,72000000	R\$ 5,2700	R\$ 3,7944
C0842	CONCRETO PMBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,08700000	R\$ 522,5800	R\$ 45,4845
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 48,9200	R\$ 2,9352
C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,08700000	R\$ 159,9800	R\$ 13,8400
TOTAL Serviço						R\$ 66,0541
VALOR:						74,11

4.1.3. C4524 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 83,5800	R\$ 1,5212
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,6208
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,9880
18823	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 67,3600	R\$ 74,1180
TOTAL Material						R\$ 80,2480

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRELHISTA	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 43,4880
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 18,4800	R\$ 23,0750



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 PREFEITURA DE ICÓ	OBRA	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA	05/04/2021	
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	VERBA	VERBA	VERBA
	LOCAL	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ	SEINFRA	228.1 COM DESONERAÇÃO	64.44% 47.46%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	228.09	
			SEINFRA	228.09 COM DESONERAÇÃO	68.71% 59.74%
			SEINFRA	PROPRIA	0.00% 0.00%

TOTAL Mão de Obra	R\$ 61.7310
VALOR	141,88

4.2.1. C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10728	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP)	SEINFRA	H	0.01000000	R\$ 113,0195	R\$ 1.1302
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 1.1302
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0.15000000	R\$ 70,0000	R\$ 10,5000
12527	PARALELEPÍPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32.00000000	R\$ 0.9800	R\$ 31,3600
TOTAL Material						R\$ 41,8600
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0.15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
TOTAL Mão de Obra						R\$ 11,0080
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0.02000000	R\$ 545,3800	R\$ 10,9076
TOTAL Serviço						R\$ 10,9076
VALOR						64,81

4.2.2. C4583 MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18567	EXTRUSORA DE PERFIS DE CONCRETO ACOPLADA C/ FORMA E MOTOR DIESEL 18 HP	SEINFRA	H	0.08670000	R\$ 60,0300	R\$ 4,0040
TOTAL Material						R\$ 4,0040
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEIDREIRO	SEINFRA	H	0.08670000	R\$ 24,1600	R\$ 1,6115
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0.13340000	R\$ 18,4600	R\$ 2,4626
TOTAL Mão de Obra						R\$ 4,0741
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0.72000000	R\$ 5,2700	R\$ 3,7944
C0842	CONCRETO P/VBR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0.08700000	R\$ 522,5800	R\$ 45,4645
C2794	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0.08000000	R\$ 48,9200	R\$ 2,9352
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0.08700000	R\$ 159,0800	R\$ 13,8400
TOTAL Serviço						R\$ 66,0341
VALOR						74,11

5.1. C6734 CERCA C/ MOURÕES PM - CONCRETO E ARAME LISO - 6 FIOS (M²)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	SEINFRA	KG	3.15000000	R\$ 23,5700	R\$ 74,2455
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0.75000000	R\$ 16,5300	R\$ 12,3975

 ICÓ INSTITUTO DE CONTROLE E ORÇAMENTO		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA: 05/04/2025		BDI: 23,92%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FONTE	VERSÃO	NOVA	REC		
LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ CEARÁ	SEINFRA	001 - COM DESONERAÇÃO	54,48%	47,48%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA/ANEXO	202504				
		SEINFRA	202504 COM DESONERAÇÃO	56,71%	58,74%		
		Compartilhamento Projeto	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

6.4. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 4,1500	R\$ 4,2432
TOTAL Material					R\$ 4,2432
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,4920
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,1395
TOTAL Mão de Obra					R\$ 5,6315
VALOR:					9,87

6.5. C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10342 CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 11,3700	R\$ 11,5974
TOTAL Material					R\$ 11,5974
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,0560
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,8640
TOTAL Mão de Obra					R\$ 6,9200
VALOR:					18,52

6.6. C0553 CABO EM PVC 1000V 25MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10372 CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 17,4400	R\$ 17,7888
TOTAL Material					R\$ 17,7888
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,2470
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,17000000	R\$ 24,1500	R\$ 4,1055
TOTAL Mão de Obra					R\$ 7,3525
VALOR:					25,14

6.7. C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10339 CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 34,9100	R\$ 104,7300
10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 65,8700	R\$ 65,8700
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,8300	R\$ 2,8300
12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 53,2800	R\$ 53,2800
TOTAL Material					R\$ 226,7100
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 66,8500
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 36,2250

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL			DATA: 05/04/2008	BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO			SEINFRA	VERBA
	LOCAL	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARA			SEINFRA	SEINFRA
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ			SEINFRA	SEINFRA
					SEINFRA	SEINFRA

TOTAL Mão de Obra	R\$ 100,0750
VALOR:	329,79

6.8. C3911 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17382 CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,9500	R\$ 10,9500
TOTAL Material					R\$ 10,9500

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05200000	R\$ 24,1500	R\$ 1,2558
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35200000	R\$ 15,4000	R\$ 0,9590
TOTAL Mão de Obra					R\$ 2,2157

VALOR:	13,17
--------	-------

6.9. C1030 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10502 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 1000W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,5300	R\$ 44,5300
TOTAL Material					R\$ 44,5300

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1500	R\$ 19,3200
TOTAL Mão de Obra					R\$ 34,6000

VALOR:	79,13
--------	-------

6.10. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,3200	R\$ 41,3200
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,5500	R\$ 40,5500
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,6000	R\$ 33,6000
11754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 112,2400	R\$ 112,2400
TOTAL Material					R\$ 227,7100

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 48,3000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 86,5000

VALOR:	314,31
--------	--------

6.11. C4980 LUMINÁRIA 1 PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,1700	R\$ 40,1700
18438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 5,0400	R\$ 60,4800

 ICÓ PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO FINAL				DATA: 05/04/2025 BDI: 23,52%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO				
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ				
		FORNTE	VENDEDOR	HORA	MEB	
		SEINFRA	SIN 1 COM DESONERAÇÃO	86,44%	47,48%	
		SEINFRA	SEINFRA			
		SEINFRA	SÓDIO COM DESONERAÇÃO	98,71%	98,74%	
		SEINFRA	SEINFRA	0,00%	0,00%	

10501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,5300	R\$ 44,5300
11675	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 4,5700	R\$ 54,8400
11487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 96,1300	R\$ 96,1300
8793	LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FAB REEME REF. ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 235,9000	R\$ 235,9000
8794	NÚCLEO P/01 LUMINÁRIA FAB. REEME REF. ZE-157 OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 57,7000	R\$ 57,7000
11778	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 114,8800	R\$ 114,8800
					TOTAL Material	R\$ 724,0300

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 43,9300
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 55,5450
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 99,4750

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2.525,4400	R\$ 2.525,4400
					TOTAL Serviço	R\$ 2.525,4400
					VALOR:	3.348,54

6.12. C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TUJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 122,4300	R\$ 97,944
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	R\$ 12,5200	R\$ 9,765
C0940	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	R\$ 495,6500	R\$ 12,490
C2784	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,21600000	R\$ 48,9200	R\$ 10,566
C2927	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	0,12000000	R\$ 140,9400	R\$ 16,604
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 37,0400	R\$ 22,224
					TOTAL Serviço:	R\$ 186,790
					VALOR:	186,79

6.13. C2009 POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2,80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0.03500000	R\$ 119,5800	R\$ 4,18
10396	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	8.30000000	R\$ 2,1100	R\$ 19,62
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3.50000000	R\$ 0,7100	R\$ 2,48
11481	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 39,4200	R\$ 39,42
11721	POSTE DE FERRO, H= 2,80M C/GLOBO DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 236,5000	R\$ 236,50
11778	REATOR APF P/ LÂMP. V. SÓDIO 70W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 66,3000	R\$ 66,30
					TOTAL Material	R\$ 366,51

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 34,38
12512	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 24,1500	R\$ 43,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL		DATA	06/04/2025	
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM ICÓ-COM DESONERAÇÃO		FORTE	VERBA	RECURSOS
	LOCAL	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARA		SEINFRA	SR 1 COM DESONERAÇÃO	SR 44% 47,41%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ		SEINFRA	2020M	
				SEINFRA	SEINFRA COM DESONERAÇÃO	SR 71% 54,74%
				SEINFRA	SEINFRA	0,00% 0,00%

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.50000000	R\$ 18,4800	R\$ 27,6900
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 105,5400
					VALOR:	474,85

6.14. COMPHORTO1 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16424	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 333,16	R\$ 333,16
					TOTAL Material	R\$ 333,16
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,10	R\$ 19,10
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,15	R\$ 24,15
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 43,25
					VALOR:	376,41

6.15. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,1300	R\$ 60,1300
					TOTAL Material	R\$ 60,1300
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 38,9250
					VALOR:	99,06

6.16. C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11008	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,1300	R\$ 60,1300
					TOTAL Material	R\$ 60,1300
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 38,9250
					VALOR:	99,06

6.17. C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11016	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 104,8800	R\$ 104,8800
					TOTAL Material	R\$ 104,8800
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL		DATA: 06/04/2025		BDI: 23,80%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO		FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARA		SEINFRA	2025	2025
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ		SEINFRA	2025	2025

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 36,3250
					VALOR:	143,81

6.18. C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11055	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 60,1300	R\$ 60,1300
					TOTAL Material	R\$ 60,1300
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 38,9250
					VALOR:	99,06

6.19. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900	R\$ 11,0900
					TOTAL Material	R\$ 11,0900
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 12,9750
					VALOR:	24,06

6.20. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 133,8300	R\$ 133,8300
					TOTAL Material	R\$ 133,8300
					VALOR:	133,83

7.1. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 62,8491	R\$ 15,0838
					TOTAL Equipamento Custo Horário	R\$ 15,0838
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,4800	R\$ 13,2912
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 13,2912
					VALOR:	28,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO FINAL		DATA:	06/04/2025
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO		BDI:	23,92%
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ - CEARÁ		FONTES:	SEINFRA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ		VERSÃO:	00000000
				MODALIDADE:	00000000
				ORÇAMENTO:	1000000000
				COMPOSIÇÃO:	1000000000
				PREÇO UNITÁRIO:	1000000000
				TOTAL:	1000000000

8.1.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTES	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,65000000	R\$ 18,4800	R\$ 48,9150
TOTAL Mão de Obra					R\$ 48,9150
VALOR:					48,92

8.2.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FONTES	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100	AREIA MEDIA	M3	0,36480000	R\$ 83,5800	R\$ 30,4900
10600	CIMENTO PORTLAND	KG	109,50000000	R\$ 0,7100	R\$ 77,7450
11800	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,10000000	R\$ 113,2500	R\$ 124,5750
TOTAL Material					R\$ 232,8100
Mão de Obra	FONTES	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	H	6,00000000	R\$ 24,1800	R\$ 144,9800
12543	SERVENTE	H	9,00000000	R\$ 18,4800	R\$ 166,1400
TOTAL Mão de Obra					R\$ 311,1200
VALOR:					643,91

8.2.2. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FONTES	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10905	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,40000000	R\$ 8,4500	R\$ 3,3800
11728	PREGO 18X27 (2. 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,15000000	R\$ 14,2000	R\$ 2,1300
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,50000000	R\$ 6,0500	R\$ 3,0250
11918	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 36cm	M	1,00000000	R\$ 12,7700	R\$ 12,7700
TOTAL Material					R\$ 21,3050
Mão de Obra	FONTES	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	1,30000000	R\$ 18,1000	R\$ 23,5300
10498	CARPinteIRO	H	1,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 31,3950
TOTAL Mão de Obra					R\$ 54,9250
VALOR:					77,54

8.2.3. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 17,9764
Material	FONTES	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100	AREIA MEDIA	M3	0,92900000	R\$ 83,5800	R\$ 77,6458
10280	BRITA	M3	0,92700000	R\$ 100,5000	R\$ 93,1650
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	396,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 281,1600
11805	PEDRISCO	M3	0,20900000	R\$ 100,5000	R\$ 21,0045

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO FINAL		DATA: 05/04/2025	BOM: 23,92%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO		FONTE	VERBA
	LOCAL	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ CEARÁ		SEINFRA	20294
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ		SEINFRA	20294

TOTAL Material	R\$ 442.8238
TOTAL Mão de Obra	R\$ 110.7600
VALOR:	R\$ 553.5838

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVENTE	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 110,7600
VALOR:					R\$ 553,5838

8.2.4. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. CIGUNDASTE (CHP)	H	0,00800000	R\$ 169,7613	R\$ 1,3581
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 1,3581
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07962	AÇO CA-50/60	KG	1,05000000	R\$ 7,3500	R\$ 7,7175
01003	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
TOTAL Material					R\$ 8,0481
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
01121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
TOTAL Mão de Obra					R\$ 3,4608
VALOR:					12,87

8.2.5. C4458 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PI FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01169	AÇO CA-60	KG	0,74000000	R\$ 7,5900	R\$ 5,6166
08265	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PI FÔRRO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA DE 5,01 m	M2	1,00000000	R\$ 77,3600	R\$ 77,3600
11891	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,30000000	R\$ 16,0900	R\$ 20,9170
11728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,03000000	R\$ 14,2000	R\$ 0,4260
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,97000000	R\$ 6,0500	R\$ 5,8585
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,85000000	R\$ 12,7700	R\$ 8,3005
TOTAL Material					R\$ 118,4886
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391	PEDREIRO	H	0,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4560
02543	SERVENTE	H	0,35000000	R\$ 18,4600	R\$ 6,4610
TOTAL Mão de Obra					R\$ 14,9170
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0940	CONCRETO PM18R, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,05700000	R\$ 495,6500	R\$ 28,2521
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M2	0,05700000	R\$ 268,4800	R\$ 15,3034
TOTAL Serviço					R\$ 43,5555
VALOR:					176,96

 ICÓ		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL		DATA: 06/04/2025		BDI: 23,92%	
		DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO		FONTE:	VERBA:	HORA:	MES:
		LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARA		SEINFRA:	SEINFRA	2025M	44,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ		SEINFRA:	SEINFRA	2025M	44,44%	47,44%	
				COMPANHIA:	COMPANHIA	0,00%	0,00%	

8.3.1. C0073 ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 83,5800	R\$ 1,2537
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,0928
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,5478
12081 TJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	LN	25,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 13,2500
TOTAL Material					R\$ 18,1443

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 20,6752
TOTAL Mão de Obra					R\$ 44,8352

VALOR: 62,98

8.3.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7253
TOTAL Material					R\$ 2,2351

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1600	R\$ 2,4160
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690
TOTAL Mão de Obra					R\$ 5,1850

VALOR: 7,42

8.3.3. C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra					R\$ 23,1560

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 959,8100	R\$ 19,1962
TOTAL Serviço					R\$ 19,1962

VALOR: 44,77

8.3.4. C0805 COBOGÔ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10811 COBOGÔ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 70,0000	R\$ 70,0000
TOTAL Material					R\$ 70,0000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA : 06/04/2025	BDR : 73,92%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FONTE SINAPI	VERSÃO VER 1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL	HORTO DO SENHOR DO BONFIM - CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ	SINAPI	NORMA M 44% 47,48%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SINAPI	MES 2025/4
		SINAPI	2025/4 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	98,71% 98,74%
		SINAPI	0,00% 0,00%

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,4800	R\$ 18,4800
				TOTAL Mês de Obrs		R\$ 88,7800

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0154 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEB. TRAÇO 1:1	SEINFRA	M3	0,00560000	R\$ 1.045,7200	R\$ 6,1697
TOTAL Serviço:					R\$ 6,1697
VALOR:					142,86

8.4.1. C1338 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1151 FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,23000000	R\$ 13,9100	R\$ 3,1950
I1495 MADEIRA (PERoba)	SEINFRA	M3	0,01700000	R\$ 3.162,7100	R\$ 53,7661
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 17,0000	R\$ 1,7000
				TOTAL Material	R\$ 58,6611

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 43,2600
					VALOR:	101,92

8.4.2. C3745 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA	SEINFRA	UN	1.42000000	R\$ 0,5500	R\$ 0,7810
11571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	1.42000000	R\$ 1,3800	R\$ 1,8596
18814	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 8MM	SEINFRA	M2	1.15000000	R\$ 49,0400	R\$ 56,3960
				TOTAL Material		R\$ 68,1366

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0.22000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2020
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0.22000000	R\$ 24,1600	R\$ 5,3152
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 9,5172
					VALOR:	88,68

8.4.3. C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 2% DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

Material		FORTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26 DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 15,3300	R\$ 15,7890
11725	PREGO 15X15 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 872UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 15,9900	R\$ 1,1193
11764	REBITES	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 63,0700	R\$ 1,8921
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 128,1200	R\$ 3,8436
					TOTAL Material	R\$ 22,6443

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,1000	R\$ 18,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 23,4800

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA : 05/04/2025		BDI : 23,92%	
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FONTE	VERSÃO	MORA	RES
	LOCAL	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ	SEINFRA	202504	16,71%	16,71%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	202504	16,71%	16,71%

TOTAL Mão de Obra	R\$ 42.5830
VALOR	66,22

B.4.4. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 63,3600	R\$ 1,5840
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 61,0200	R\$ 2,4408
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NSR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 15,8200	R\$ 15,9782
TOTAL Material					R\$ 20,0030

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,9320
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 23,4800	R\$ 12,2096
TOTAL Mão de Obra					R\$ 22,1416
VALOR					42,14

B.4.5. C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,04200000	R\$ 63,3600	R\$ 2,6611
18242 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,8300	R\$ 8,8300
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,06300000	R\$ 61,0200	R\$ 3,8443
TOTAL Material					R\$ 15,3354

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	R\$ 19,1000	R\$ 8,0220
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42000000	R\$ 23,4800	R\$ 9,8816
TOTAL Mão de Obra					R\$ 17,9036
VALOR					33,32

B.5.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 48,3000
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 18,4800	R\$ 147,8400
TOTAL Mão de Obra					R\$ 196,1400

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK. 13,5 MPa COM AGREGADO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 487,9500	R\$ 487,9500
TOTAL Serviço					R\$ 487,9500
VALOR					647,83

B.5.2. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 1,9604	R\$ 0,3921

 ICÓ INSTITUTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA:	05/04/2025	BDI: 23,92%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO: 02:1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ GEARA	SEINFRA	202504	HORA: 64,44% 47,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	202504 COM DESONERAÇÃO	MES: 66,71% 56,71%
			COMPANHIA	PRECISA	0,00% 0,00%

10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 1,3993	R\$ 1,1194
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,5101

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21.00000000	R\$ 0.4800	R\$ 10.0800
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0.03000000	R\$ 119.5800	R\$ 3.5874
10508	CERA	SEINFRA	KG	0.15000000	R\$ 20.0000	R\$ 3.0000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26.58000000	R\$ 0.7100	R\$ 18.8718
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0.03000000	R\$ 23.7800	R\$ 0.7134
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0.10000000	R\$ 45.1100	R\$ 4.5110
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0.05000000	R\$ 45.9000	R\$ 2.2950
11318	JUNTA PLASTICA T 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2.50000000	R\$ 1.6400	R\$ 4.1000
					TOTAL Material	R\$ 47.1566

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9920
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,4600	R\$ 22,1520
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 87,3840
					VALOR:	136,96

8.5.3. C2244 RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 10cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	3,50000000	R\$ 0,4800	R\$ 1,6800
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,70000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,2070
					TOTAL Material	R\$ 2,8870

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 9,2300
TOTAL Mão de Obra						R\$ 21,3100
VALOR						24,29

8.6.1. C4436 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 82,3700	R\$ 90,6070
					TOTAL Material	R\$ 90,6070

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 25,8440
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 59,6680

Serviço		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 907,9600	R\$ 18,1592
					TOTAL Serviço	R\$ 18,1592

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA:	06/04/2018	REVISÃO: 23.32%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO	FORTE:	SEINFRA	VERSAO: 02.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ CEARÁ	VERSAO:	2018/4	VERSAO: 02.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	VERSAO:	2018/4	VERSAO: 02.1 COM DESONERAÇÃO

VALOR:	188,43
--------	--------

8.7.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10350 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 2,1100	R\$ 25,3200
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,9300	R\$ 1,9300
10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,2000	R\$ 11,2000
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7300	R\$ 2,7300
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 11,0900	R\$ 1,1090
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,5700	R\$ 13,7100
11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,9000	R\$ 2,9000
11181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,7500	R\$ 2,2500
11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,7400	R\$ 24,7400
11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,1600	R\$ 2,3600
TOTAL Material:					R\$ 88,2400

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 72,4500
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 175,9000

VALOR:	264,15
--------	--------

8.7.2. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,4800	R\$ 3,4800
19107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,3000	R\$ 1,3000
19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,5900	R\$ 11,1800
TOTAL Material:					R\$ 15,9600

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5390
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0035
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,5425

VALOR:	28,50
--------	-------

8.7.3. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,9000	R\$ 14,9000
TOTAL Material:					R\$ 14,9000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,0670
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 24,1500	R\$ 8,9355

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					Rubrica
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA: 06/04/2026		BDI: 23,92%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO	FUNTE	VERSÃO	HORA	RES
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ	SEINFRA	100% COM DESONERAÇÃO	94,44%	97,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	200000	200000 COM DESONERAÇÃO	96,71%
			PROPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra	R\$ 10,0025
-------------------	-------------

VALOR:	30,90
--------	-------

8.7.4. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,4400
					TOTAL Material
					R\$ 8,4400

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500
					TOTAL Mão de Obra
					R\$ 9,0625

VALOR:	17,52
--------	-------

8.7.5. C5192 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA COR BRANCO, SEM ALETAS, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 32W, REATOR ELETRÔNICO P/2X32W, FP DO C.J. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,4100
110273	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA COR BRANCO, SEM ALETAS, REFLETOR DE ALTO BRILHO P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 43,0500
11779	REATOR APF DUPLO P/LÂMP. FLUORESCENTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 38,2200
					TOTAL Material
					R\$ 100,1200

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1500
					TOTAL Mão de Obra
					R\$ 64,7500

VALOR:	165,00
--------	--------

8.7.6. C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,3200
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,8500
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,6000
11747	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 47,0400
					TOTAL Material
					R\$ 162,8100

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1500
					TOTAL Mão de Obra
					R\$ 51,9000

VALOR:	214,51
--------	--------

8.7.7. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA:	05/04/2025	BDI: 23,99%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FONTE:	SEINFRA	VERBA:
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARA	SEINFRA:	DR 1 - COM DESONERAÇÃO	VERBA: 34,44% 47,46%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA:	2020M	VERBA: 34,44% 47,46%

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900
TOTAL Material					R\$ 11,0900

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,9750
VALOR:					24,06

8.7.8. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 134,1900
TOTAL Material					R\$ 134,1900

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 25,9500
VALOR:					160,14

8.7.9. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 133,8300
TOTAL Material					R\$ 133,8300

VALOR: 133,83

8.7.10. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900
TOTAL Material					R\$ 11,0900

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,9750
VALOR:					24,06

8.7.11. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,0900
TOTAL Material					R\$ 11,0900

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	-----	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 PREFEITURA DE ICÓ	OBRA	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL		DATA : 05/04/2023	BDI : 21,30%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO		FONTE	VERSÃO
	LOCAL	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ		SEINFRA	SR 1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ		SEINFRA	SR 2 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 3 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 4 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 5 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 6 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 7 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 8 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 9 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 10 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 11 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 12 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 13 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 14 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 15 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 16 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 17 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 18 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 19 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 20 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 21 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 22 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 23 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 24 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 25 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 26 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 27 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 28 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 29 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 30 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 31 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 32 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 33 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 34 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 35 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 36 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 37 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 38 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 39 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 40 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 41 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 42 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 43 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 44 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 45 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 46 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 47 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 48 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 49 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 50 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 51 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 52 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 53 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 54 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 55 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 56 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 57 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 58 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 59 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 60 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 61 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 62 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 63 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 64 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 65 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 66 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 67 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 68 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 69 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 70 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 71 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 72 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 73 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 74 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 75 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 76 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 77 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 78 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 79 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 80 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 81 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 82 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 83 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 84 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 85 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 86 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 87 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 88 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 89 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 90 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 91 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 92 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 93 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 94 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 95 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 96 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 97 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 98 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 99 COM DESONERAÇÃO
				SEINFRA	SR 100 COM DESONERAÇÃO

VALOR:	545,73
--------	--------

8.8.4. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,003500000	R\$ 119,5800	R\$ 0,4185
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,500000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,4000
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,500000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,7750
10884 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 0,7900	R\$ 1,5800
10885 COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,000000000	R\$ 2,6500	R\$ 10,6000
11283 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 5,9400	R\$ 5,9400
11412 LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 2,1800	R\$ 4,3600
11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 3,3900	R\$ 3,3900
11673 TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 4,1200	R\$ 4,1200
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,200000000	R\$ 4,3300	R\$ 5,1960
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,000000000	R\$ 8,5600	R\$ 42,8000
TOTAL Material:					R\$ 62,5795

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,000000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,000000000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,500000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 173,8900
VALOR:					286,47

8.8.5. C1792 MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,550000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,2016
11315 JOGO METAIS PARA MICTÓRIO	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 44,6300	R\$ 44,6300
11524 MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 449,1300	R\$ 449,1300
11579 PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,000000000	R\$ 9,4000	R\$ 18,8000
TOTAL Material:					R\$ 512,7616

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,900000000	R\$ 19,1000	R\$ 55,3900
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,900000000	R\$ 23,4800	R\$ 68,0920
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 123,4820
VALOR:					636,24

8.8.6. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,004000000	R\$ 119,5800	R\$ 0,4783
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,000000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,8800
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,000000000	R\$ 0,7100	R\$ 2,1300
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 9,8200	R\$ 9,8200

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA: 05/04/2025		BDI: 23,32%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FORTE	VERBA	MOB	MES
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM - CONJUNTO SAMA - ICÓ-GEARÁ	SEINFRA	008.1 COM DESONERAÇÃO	86,41%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	00904		
			SEINFRA	00902 COM DESONERAÇÃO	86,71%	58,74%
			SEINFRA	PROPRIA	3,38%	3,38%

11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,3600	R\$ 4,7200
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,2500	R\$ 3,2500
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,9800	R\$ 16,9800
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,9300	R\$ 3,9300
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 15,8200	R\$ 5,2206
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 6,9100	R\$ 10,3650
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 10,7500	R\$ 5,3750
TOTAL Material						R\$ 64,1489

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 46,1500
TOTAL Mão de Obra						R\$ 173,8900
VALOR:						238,04

8.8.7. C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 119,5800	R\$ 9,5664
11230	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 539,2000	R\$ 539,2000
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,7100	R\$ 2,2720
					TOTAL Material	R\$ 542,4284

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 28,9920
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra						R\$ 65,9120
VALOR:						608,34

8.8.8. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,1008
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 110,3800	R\$ 110,3800
					TOTAL Material	R\$ 110,4808

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 19,1000	R\$ 12,4150
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 23,4800	R\$ 15,2620
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 27,6770
					VALOR:	138,16

8.8.9. C4636 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 22,5900	R\$ 45,1800

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA : 05/04/2028	BDI : 23,32%	
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	UN	1 COM DESONERAÇÃO	54,44% 47,44%
LOCAL	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ	SEINFRA	UN	2028/04	
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	UN	2028/02 COM DESONERAÇÃO	54,71% 48,71%
		SEINFRA	UN	PROPRIA	0,00% 0,00%

11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,4032
18637	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 178,6100	R\$ 178,6100
11579	PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA, CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,4000	R\$ 18,8000
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 164,5800	R\$ 164,5800
12285	VÁLVULA AMERICANA PI PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 38,0000	R\$ 38,0000
					TOTAL Material:	R\$ 445,5732

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 63,3300
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	R\$ 23,4800	R\$ 77,4940
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 140,8240
					VALOR:	586,00

8.8.10. C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 84,1000	R\$ 84,1000
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,1008
					TOTAL Material:	R\$ 84,2008

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0.50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0.50000000	R\$ 23,4800	R\$ 11,7400
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 21,2900
					VALOR:	105,49

8.8.11. C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0.00400000	R\$ 119,5800	R\$ 0,4783
10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0.70000000	R\$ 4,1800	R\$ 2,9260
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1.60000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,1360
17895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1.00000000	R\$ 316,0500	R\$ 316,0500
11821	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1.30000000	R\$ 4,9300	R\$ 6,4090
					TOTAL Material:	R\$ 325,9293

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 57,9840
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 18,4500	R\$ 88,5600
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 146,5440
					VALOR:	472,42

8.8.12. C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,2700	R\$ 14,2700

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					Rubrica	
	OBRA	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA : 05/04/2025		BDI : 20,32%		
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FONTE	VERSÃO	REBA	MES	
	LOCAL	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,41%	47,48%	
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	202504	-	-	
			SEINFRA	202502 COM DESONERAÇÃO	88,71%	58,74%	
			Composição Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%	

10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 24,1600	R\$ 11,1136
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	R\$ 24,1600	R\$ 58,4672
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,86000000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680
					TOTAL Mão de Obra	
					R\$ 146,8048	
					VALOR:	
					222,28	

8.9.1. C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01660000	R\$ 83,5800	R\$ 0,8858
10208	BATENTE DE PEROLA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 227,9000	R\$ 227,9000
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,9600	R\$ 1,6512
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,2212
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 30,8600	R\$ 92,5800
11156	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 58,6900	R\$ 58,6900
11240	GUARNIÇÃO PEROLA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 71,2000	R\$ 142,4000
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,3400	R\$ 2,7200
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 318,9900	R\$ 318,9900
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 17,0000	R\$ 3,4000
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,7600	R\$ 10,5600
					TOTAL Material	R\$ 830,9963

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 71,6250
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 90,6000
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 25,8440
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 221,8930
					VALOR:	1.062,89

8.9.2. C4517 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

FORNECIMENTO E MONTAGEM (m²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18341	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 407,9100	R\$ 407,9100
					TOTAL Material	R\$ 407,9100
					VALOR:	407,91

8.9.3. C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11942	TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X85MM-FAMA 1260/LF 715-AE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 43,6100	R\$ 43,6100
					TOTAL Material	R\$ 43,6100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA:	06/04/2008	NDI: 23,82%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FONTE:	VERSÃO:	NDI:
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ CEARÁ	SEINFRA	100.1 COM DESONERAÇÃO	94.46% 47.46%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	20004	98.71% 98.71%
			SEINFRA	20000 COM DESONERAÇÃO	98.71% 98.71%
			SEINFRA	PROPRIA	0.80% 0.00%

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
					TOTAL Mão de Obra	
					R\$ 64,8900	
					VALOR:	
					108,70	

8.9.4. C1518 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	R\$ 83,5800
10439	CAIXILHO DE FERRO CORRER	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 281,3100
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	R\$ 0,9600
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	R\$ 0,7100
					TOTAL Material
					R\$ 284,7172
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600
					TOTAL Mão de Obra
					R\$ 133,5600
					VALOR:
					418,28

8.9.5. C4950 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 10,8200
19448	VIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 331,1600
					TOTAL Material
					R\$ 347,9800
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600
					TOTAL Mão de Obra
					R\$ 21,6000
					VALOR:
					369,02

8.10.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,7000
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,1200
					TOTAL Material
					R\$ 1,7640
Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600
					TOTAL Mão de Obra
					R\$ 11,0600
					VALOR:
					12,83

8.10.2. C4167 LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA (M2)

--	--	--	--	--	--

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA:	05/04/2025	BSI: 33,99%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FONTE:	SEINFRA	VERBAS: 54,41% 47,48%
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM - CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ	SEINFRA:	20004	20004
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA:	20004 COM DESONERAÇÃO	58,71% 58,71%
			SEINFRA:	PROPRIA	0,00% 0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,0800	R\$ 1,4496
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,1750
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	R\$ 22,2000	R\$ 5,3280
TOTAL Material					R\$ 6,9526

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,6400
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 19,7200
VALOR:					26,87

8.10.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 20,2900	R\$ 0,8116
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 31,6900	R\$ 5,1008
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 16,1800	R\$ 2,1034
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,2800
TOTAL Material					R\$ 8,2958

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra					R\$ 16,3490
VALOR:					24,84

8.10.4. C2481 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856 SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 7,1400	R\$ 1,3566
12079 TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 4,4700	R\$ 1,3857
TOTAL Material					R\$ 2,7423

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra					R\$ 11,0680
VALOR:					13,81

8.10.5. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA DE PVA - TETO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,7000	R\$ 0,2800
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,1200	R\$ 1,4840
TOTAL Material					R\$ 1,7640

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA:	26/04/2026	BDI: 23,92%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FONTES:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARA	SEINFRA	2026	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	2026	47,48%
			SEINFRA	2026	47,48%
			SEINFRA	2026	47,48%
			SEINFRA	2026	47,48%

VALOR:	196,90
--------	--------

9.1. C3529 MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11800 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 113,2500	R\$ 130,2375
TOTAL Material					R\$ 130,2375

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 120,8000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 120,8000

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3529 MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 274,1600	R\$ 82,2480
TOTAL Serviço					R\$ 82,2480

VALOR:	533,29
--------	--------

9.2. C3078 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA (PRODUZIDA) (S/TRANSPORTE) (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra					R\$ 49,0000

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3227 PEDRA DE MÃO POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 42,5800	R\$ 48,9590
TOTAL Serviço					R\$ 48,9590

VALOR:	98,96
--------	-------

9.3. C2727 DRENAGEM COM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12455 CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,30M	SEINFRA	M	1,05000000	R\$ 42,8700	R\$ 45,0135
TOTAL Material					R\$ 45,0135

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12500000	R\$ 24,1600	R\$ 3,0200
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,84000000	R\$ 18,4600	R\$ 15,5144
TOTAL Mão de Obra					R\$ 18,5344

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	R\$ 631,2900	R\$ 0,6313
TOTAL Serviço					R\$ 0,6313

VALOR:	66,19
--------	-------



 ICÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA:	06/04/2008	BOM: 30,92%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FONTE:	SEINFRA	SEINFRA
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ	SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA

COM-PAY01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COM-PAY01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições	%	1,00000000	R\$ 1.565,37	R\$ 1.565,37
TOTAL Serviço					R\$ 1.565,37
VALOR:					1.565,37

COMPHORT01 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO (UN)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16424 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 333,16	R\$ 333,16
TOTAL Material					R\$ 333,16
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,10	R\$ 19,10
02312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,15	R\$ 24,15
TOTAL Mão de Obra					R\$ 43,25
VALOR:					376,41

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA:	19/04/2025	ROI: 23,92%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO	VERSAO:	001	001
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM - CONJUNTO GAMA, ICÓ - CEARÁ	SEINFRA:	001	001
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA:	001	001
			SEINFRA:	001	001
			SEINFRA:	001	001

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	0,01500000	M3	0,01500000	R\$ 83,5800	R\$ 1,2537
10441 CAL HIDRATADA	2,18000000	KG	2,18000000	R\$ 0,9600	R\$ 2,0928
10805 CIMENTO PORTLAND	2,18000000	KG	2,18000000	R\$ 0,7100	R\$ 1,5478
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	25,00000000	UN	25,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 13,2500
TOTAL Material					R\$ 18,1443

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	1,00000000	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543 SERVENTE	1,12000000	H	1,12000000	R\$ 18,4800	R\$ 20,6976
TOTAL Mão de Obra					R\$ 44,8576

VALOR: 82,98

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	0,04130000	M3	0,04130000	R\$ 83,5800	R\$ 3,4518
10441 CAL HIDRATADA	6,19000000	KG	6,19000000	R\$ 0,9600	R\$ 5,9424
10805 CIMENTO PORTLAND	6,19000000	KG	6,19000000	R\$ 0,7100	R\$ 4,3949
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	47,00000000	UN	47,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 24,9100
TOTAL Material					R\$ 38,6991

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	1,50000000	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
12543 SERVENTE	1,84000000	H	1,84000000	R\$ 18,4800	R\$ 33,9024
TOTAL Mão de Obra					R\$ 70,1424

VALOR: 108,81

C0075 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	0,03040000	M3	0,03040000	R\$ 83,5800	R\$ 2,5408
10441 CAL HIDRATADA	4,55000000	KG	4,55000000	R\$ 0,9600	R\$ 4,3680
10805 CIMENTO PORTLAND	4,55000000	KG	4,55000000	R\$ 0,7100	R\$ 3,2305
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	84,00000000	UN	84,00000000	R\$ 0,4700	R\$ 39,4800
TOTAL Material					R\$ 49,6193

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	1,80000000	H	1,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 43,4880
12543 SERVENTE	1,85000000	H	1,85000000	R\$ 18,4800	R\$ 34,1880
TOTAL Mão de Obra					R\$ 77,6760

VALOR: 127,29

C0154 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA : 05/04/2025	BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO	VERSÃO	MOB	MEB
	LOCAL	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARA	SEINFRA	338,1 COM DESONERAÇÃO	34,44% 47,44%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	20802 COM DESONERAÇÃO	38,71% 38,74%
			Composição Propria	PRÓPRIA	0,90% 0,90%

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	1,216000000	M3	1,216000000	R\$ 83,5800	R\$ 101,6333
10805 CIMENTO PORTLAND	486,000000000	KG	486,000000000	R\$ 0,7100	R\$ 345,0600
TOTAL Material					R\$ 446,6933

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	32,450000000	H	32,450000000	R\$ 18,4600	R\$ 599,0270
TOTAL Mão de Obra					R\$ 599,0270
VALOR:					1.045,72

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	1,216000000	M3	1,216000000	R\$ 83,5800	R\$ 101,6333
10805 CIMENTO PORTLAND	365,000000000	KG	365,000000000	R\$ 0,7100	R\$ 259,1500
TOTAL Material					R\$ 360,7833

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	32,450000000	H	32,450000000	R\$ 18,4600	R\$ 599,0270
TOTAL Mão de Obra					R\$ 599,0270
VALOR:					859,81

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	1,216000000	M3	1,216000000	R\$ 83,5800	R\$ 101,6333
10805 CIMENTO PORTLAND	292,000000000	KG	292,000000000	R\$ 0,7100	R\$ 207,3200
TOTAL Material					R\$ 308,9533

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	32,450000000	H	32,450000000	R\$ 18,4600	R\$ 599,0270
TOTAL Mão de Obra					R\$ 599,0270
VALOR:					907,98

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	1,216000000	M3	1,216000000	R\$ 83,5800	R\$ 101,6333
10805 CIMENTO PORTLAND	486,000000000	KG	486,000000000	R\$ 0,7100	R\$ 345,0600
TOTAL Material					R\$ 446,6933

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	10,000000000	H	10,000000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 184,6000
VALOR:					631,29

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA:	05/04/2015	BSI:	23,92%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO	PONTE	VERSO	NORA	NOT
LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ - CEARÁ	SEMPRA	125 - COM DESONERAÇÃO	54,46%	47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEMPRA	SECON		
		SEMPRA	282962 COM DESONERAÇÃO	98,71%	98,74%
		SEMPRA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,215000000	R\$ 83,5800	R\$ 101,6333
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,000000000	R\$ 0,7100	R\$ 258,1500
				TOTAL Material		R\$ 360,7833

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 16,4500	R\$ 164,5000
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 164,5000
					VALOR:	645,38

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	1,21500000	R\$ 83,5800	R\$ 101,5333
0905	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 172,5300
					TOTAL Material	R\$ 274,0633

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q7543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 184,6000
					VALOR:	468,76

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1.15000000	R\$ 7,1000	R\$ 8.1650
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0.02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0.3306
				TOTAL Material		R\$ 8.4956

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,080000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,5280
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,080000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 3,4608
				VALOR	11,86

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)

Material		FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID169	AÇO-CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,5900	R\$ 8,7285
ID103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,5300	R\$ 0,3306
					TOTAL Material	R\$ 9,0591

Mão de Obra		POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10540	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0.08000000	R\$ 18,1000	R\$ 1,5280
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0.08000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,9328
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 3,4608
					VALOR:	12,52

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA	CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA : 06/04/2008	BOM : 20,30%	
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	129 : COM DESONERAÇÃO	14,40%	47,80%
LOCAL	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ CEARÁ	SEINFRA	2026H	10,71%	35,74%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	2026H COM DESONERAÇÃO	10,71%	35,74%
		SEINFRA	PROPRIA	0,00%	0,00%

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Genl	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET ELET 580L	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIACAO	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
12702	JUROS	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
12703	MANUTENCAO	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
TOTAL Genl					R\$ 25,1769
VALOR:					35,18

10688 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12496	SUPERCAL	KG	0,30000000	R\$ 1,4700	R\$ 0,4410
TOTAL Material					R\$ 0,4410
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12365	PINTOR	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
TOTAL Mão de Obra					R\$ 4,8320
VALOR:					5,27

10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)

Genl	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12748	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H	1,00000000	R\$ 18,8300	R\$ 18,8300
12747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H	1,00000000	R\$ 49,3776	R\$ 49,3776
12701	DEPRECIACAO	H	4,98340000	R\$ 1,0000	R\$ 4,9834
12702	JUROS	H	1,30820000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3082
12703	MANUTENCAO	H	4,98340000	R\$ 1,0000	R\$ 4,9834
TOTAL Genl					R\$ 79,4826
VALOR:					79,48

10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

Genl	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12722	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
12701	DEPRECIACAO	H	25,66480000	R\$ 1,0000	R\$ 25,6648
12702	JUROS	H	9,67440000	R\$ 1,0000	R\$ 9,6744
TOTAL Genl					R\$ 59,8492
VALOR:					62,88

10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

Genl	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12722	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100

 ICÓ INSTITUTO DE CONTABILIDADE ORÇAMENTAL	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA:	06/04/2020	REN: 23.92%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FORTE:	SEINFRA	VERBAO: 228.1 COM DESONERAÇÃO 54.46% 47.46%
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ DEARA	DESCRIÇÃO:	2020M	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA:	2020M2 COM DESONERAÇÃO 56.71% 56.74%	
			COMPANHIA:	PROPRIA	2.50% 2.50%

12764	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12763	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 95,0595	R\$ 95,0595
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	37,73740000	R\$ 1,0000	R\$ 37,7374
12702	JUROS	SEINFRA	H	13,83710000	R\$ 1,0000	R\$ 13,8371
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	50,31660000	R\$ 1,0000	R\$ 50,3166
					TOTAL Geral:	R\$ 228,7606
					VALOR:	228,76

10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) (H)

Quant		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12766	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12765	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 95,0595	R\$ 95,0595
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	38,73230000	R\$ 1,0000	R\$ 38,7323
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,20180000	R\$ 1,0000	R\$ 14,2018
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	51,64300000	R\$ 1,0000	R\$ 51,6430
					TOTAL Geral:	R\$ 228,4466
					VALOR:	228,46

10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Quant		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0832
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 1,0000	R\$ 2,0079
					TOTAL Geral:	R\$ 32,3811
					VALOR:	32,38

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Quant		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 5,2365	R\$ 5,2365
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,08320000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0832
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,00790000	R\$ 1,0000	R\$ 2,0079
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	11,47350000	R\$ 1,0000	R\$ 11,4735
					TOTAL Geral:	R\$ 49,0941
					VALOR:	49,09

10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

Quant		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

 ICÓ INSTITUTO DE CONTROLE E ORÇAMENTO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA : 05/04/2024	BDI : 25,92%	
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARA	SEINFRA	208.1 COM DESONERAÇÃO	81,48%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	208.04	47,48%

12762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12781	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,9340	R\$ 32,9340
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R\$ 1,0000	R\$ 21,9752
12702	JUROS	SEINFRA	H	7,32510000	R\$ 1,0000	R\$ 7,3251
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R\$ 1,0000	R\$ 21,9752
					TOTAL Geral	R\$ 113,0195
					VALOR:	113,02

10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Quant	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
					TOTAL Geral	R\$ 45,0499
					VALOR:	45,05

10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Quant	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 70,3590	R\$ 70,3590
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	R\$ 1,0000	R\$ 19,7999
					TOTAL Geral	R\$ 135,2088
					VALOR:	135,21

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 83,5800	R\$ 65,0252
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 100,5000	R\$ 97,0629
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 156,2000
					TOTAL Material	R\$ 318,2881
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4500	R\$ 184,5000
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 184,5000
					VALOR:	502,89

C0839 CONCRETO PVIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10692	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA		06/04/2020		BOR: 23,30%	
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
	LOCAL	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ	SEINFRA	025	1	COM DESONERAÇÃO	64,48%	47,48%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	202004				
			SEINFRA	202002	COM DESONERAÇÃO	66,71%	58,74%	
		Composição Propria	PROPRIA			5,80%	0,90%	

Genl		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,14720000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1472
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,21740000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2174
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,60380000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6038
TOTAL Genl						R\$ 1,9684
VALOR:						1,97

C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 18,4600	R\$ 64,6100
TOTAL Mão de Obra						R\$ 64,6100
VALOR:						64,61

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 48,9190
TOTAL Mão de Obra						R\$ 48,9190
VALOR:						48,92

C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,43090000	R\$ 35,9500	R\$ 15,4585
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 16,0900	R\$ 32,1800
12408	PREGO 14X18 (1,1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25090000	R\$ 17,2300	R\$ 4,3075
11845	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 6,0500	R\$ 9,2565
11918	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 12,7700	R\$ 20,4320
TOTAL Material						R\$ 81,6345
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 25,7850
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 32,6160
TOTAL Mão de Obra						R\$ 58,4010
VALOR:						140,04

C1803 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 120,8000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra						R\$ 231,5600
VALOR:						231,56

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA:		05/04/2025	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	BER:		23,92%	
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MED:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA:	328.1 COM DESONERAÇÃO	84,84%	47,48%
			SEINFRA:	328.04		
			SEINFRA:	328.02 COM DESONERAÇÃO	84,11%	46,31%
			Compartilhada	PRÓPRIA	0,00%	0,30%

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 9/ ELEVÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra					R\$ 159,0800
VALOR:					159,08

C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 119,5800	R\$ 137,5170
TOTAL Material					R\$ 137,5170
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 23,9980
TOTAL Mão de Obra					R\$ 23,9980
VALOR:					161,51

C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280 BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 100,5000	R\$ 115,5750
TOTAL Material					R\$ 115,5750
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra					R\$ 36,9200
VALOR:					152,49

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra					R\$ 21,2900
VALOR:					21,29

I2747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12727 GASOLINA	SEINFRA	L	9,72000000	R\$ 5,0800	R\$ 49,3776
TOTAL Material					R\$ 49,3776
VALOR:					49,38

I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

 ICÓ INSTITUTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-OM DESONERAÇÃO FINAL	DATA:	05/04/2026	SEN:	27-92%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-OM DESONERAÇÃO	PONTE:	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ CEARÁ	SEINFRA	108.1 COM DESONERAÇÃO	94.44%	47.44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	108.1 COM DESONERAÇÃO	94.44%	47.44%

12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,60000000	R\$ 4,9900	R\$ 83,0835
					TOTAL Material	R\$ 83,0835
					VALOR:	83,08

12820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Material		PONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,00000000	R\$ 4,9900	R\$ 104,7900
					TOTAL Material	R\$ 104,7900
					VALOR:	104,79

12721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 4,9900	R\$ 67,8640
					TOTAL Material	R\$ 67,8640
					VALOR:	R\$ 67,86

12733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material		PONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 4,9900	R\$ 67,8640
					TOTAL Material:	R\$ 67,8640
					VALOR:	R\$ 67,86

12743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 4,9900	R\$ 67,8640
					TOTAL Material	R\$ 67,8640
					VALOR:	67,86

12761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

Material		PONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	8.90000000	R\$ 4,9900	R\$ 32,9340
					TOTAL Material	R\$ 32,9340
					VALOR:	32,93

12763 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,05000000	R\$ 4,9900	R\$ 95,0595
					TOTAL Material	R\$ 95,0595
					VALOR:	95,06

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA:	08/04/2008	BOM: 23,02%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	VERBA	HORA
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ CEARÁ	SEINFRA	228.1 COM DESONERAÇÃO	84,84% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	228.12 COM DESONERAÇÃO	84,71% 50,74%
			COMPANHIA	PROPRIA	0,00% 0,00%

12765 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR. (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	15,05000000	R\$ 4,9900
					R\$ 95,0995
					R\$ 95,0995
					VALOR: 95,06

12771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R\$ 4,9900
					R\$ 5,2395
					R\$ 5,2395
					VALOR: 6,24

12775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 4,9900
					R\$ 70,3590
					R\$ 70,3590
					VALOR: 70,36

12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 4,9900
					R\$ 116,0175
					R\$ 116,0175
					VALOR: 116,02

10756 MOTO NIVELADORA (CHP) (H)

Genl	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,8000
12820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 104,7900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	54,84230000	R\$ 1,0000
12702	JUROS	SEINFRA	H	24,31590000	R\$ 1,0000
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	51,05290000	R\$ 1,0000
					R\$ 307,8011
					VALOR: 307,80

C3553 MUTIRÃO MISTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21000000	R\$ 83,5800
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	R\$ 0,7100
					R\$ 172,5300
					R\$ 274,1833

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																							
	OBRA	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA: 05/04/2025 ROR: 23,52%																				
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO																					
	LOCAL	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARA																					
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ																					
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>GR 1 COM DESONERAÇÃO</td><td>94,41%</td><td>47,41%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>202504</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>202502 COM DESONERAÇÃO</td><td>95,71%</td><td>58,74%</td></tr> <tr> <td>Composição Propria</td><td>PROPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	GR 1 COM DESONERAÇÃO	94,41%	47,41%	SEINFRA	202504	-	-	SEINFRA	202502 COM DESONERAÇÃO	95,71%	58,74%	Composição Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																				
SEINFRA	GR 1 COM DESONERAÇÃO	94,41%	47,41%																				
SEINFRA	202504	-	-																				
SEINFRA	202502 COM DESONERAÇÃO	95,71%	58,74%																				
Composição Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%																				

12734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
TOTAL Mão de Obra					R\$ 24,5100
VALOR:					24,51

12744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
TOTAL Mão de Obra					R\$ 24,5100
VALOR:					24,51

12762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra					R\$ 28,8100
VALOR:					28,81

12764 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra					R\$ 28,8100
VALOR:					28,81

12766 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR. (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra					R\$ 28,8100
VALOR:					28,81

12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
TOTAL Mão de Obra					R\$ 21,2900
VALOR:					21,29

12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA	06/04/2020	BR: 29,42%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FONTE	VERSÃO	NORA
	LOCAL	HORTO DO SENHOR DO BONFIM - CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	64,44% 47,46%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	2020/04	66,71% 50,74%
			SEINFRA	2020/02 COM DESONERAÇÃO	66,71% 50,74%
			SEINFRA	PROPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra	R\$ 21.2900
VALOR:	21,29

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra					R\$ 28,8100
VALOR:					28,81

10758 NÍVEL (CHP) (H)

CHP	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10758 DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	0,57580000	R\$ 1,0000	R\$ 0,5758
10758 JUROS	SEINFRA	H	0,23790000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2379
10758 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,36050000	R\$ 1,0000	R\$ 0,3605
TOTAL CHP					R\$ 1,1742
VALOR:					1,18

C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 45,0499	R\$ 0,0000
10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 135,2089	R\$ 7,9535
10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 24,2147	R\$ 0,0000
10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 25,6074	R\$ 4,5190
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 12,4725

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10860 CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 6,0100	R\$ 7,4524
12507 DINAMITE 80%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 18,6700	R\$ 0,9335
12568 DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 16,0600	R\$ 8,6724
13328 ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 7,4000	R\$ 0,0666
13329 ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 7,2500	R\$ 0,4350
12535 SÉRIE DE BROCAS 5.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 729,0700	R\$ 0,3645
TOTAL Material					R\$ 17,3044

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10221 BLASTER	SEINFRA	H	0,5882353	R\$ 23,9300	R\$ 1,4076
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	R\$ 18,4600	R\$ 10,8588
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,2664
VALOR:					42,66

10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

CHI	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-----	-------	-----	-------------	----------------	-------



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA: 09/04/2025		BEM: 23.52%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM - CONJUNTO GAMA - ICÓ (GARÁ)	SEINFRA:	028 1 COM DESONERAÇÃO	64,4%	47,4%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA:	202604		
			SEINFRA:	202602 COM DESONERAÇÃO	99,71%	99,71%
			SEINFRA:	PROPRIA	0,30%	0,30%

TOTAL Serviço:	R\$ 345,8591
VALOR:	2.525,44

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,4900	R\$ 31,3620
TOTAL Mão de Obra						R\$ 31,3620
VALOR:						31,38

C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02381	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4900	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra						R\$ 25,5720
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 458,7600	R\$ 11,4690
TOTAL Serviço						R\$ 11,4690
VALOR:						37,04

I0775 TEODOLITO (CHP) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,13880000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1388
02702	JUROS	SEINFRA	H	0,46970000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4697
02703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,71170000	R\$ 1,0000	R\$ 0,7117
TOTAL Geral						R\$ 2,3202
VALOR:						2,32

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
02841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 116,0175	R\$ 116,0175
02791	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
02792	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
02793	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,0000	R\$ 68,3714
TOTAL Geral						R\$ 277,5819
VALOR:						277,68

C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 63,3600	R\$ 1,5840

 ICÓ PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA : 08/04/2018		SEI : 23,92%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MS
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ	SEINFRA	026 - COM DESONERAÇÃO	66,64%	67,49%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEINFRA	20066	-	-
			SEINFRA	20066 COM DESONERAÇÃO	66,71%	66,74%
			Composição Propria	PROPRIA	3,30%	3,66%

11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 61,0200	R\$ 2,4408
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 1688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 15,8200	R\$ 15,9782
					TOTAL Material	R\$ 20,0030

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,9520
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 23,4800	R\$ 12,2096
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 22,1416

VALOR:	42,14
--------	-------

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																							
 ICÓ INSTITUTO DE CONTROLE E ORÇAMENTO	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO FINAL																					
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO																					
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ CEARÁ																					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ																					
		DATA: 06/04/2025	BDI: 32,02%																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th><th>VERBÃO</th><th>HORA</th><th>PREÇO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECURSA</td><td>100 - COM DESONERAÇÃO</td><td>56,44%</td><td>47,44%</td></tr> <tr> <td>RECURSA</td><td>100000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>RECURSA</td><td>200000 COM DESONERAÇÃO</td><td>56,71%</td><td>56,71%</td></tr> <tr> <td>RECURSA</td><td>PROPOSTA</td><td>5,00%</td><td>5,00%</td></tr> </tbody> </table>	FORTE	VERBÃO	HORA	PREÇO	RECURSA	100 - COM DESONERAÇÃO	56,44%	47,44%	RECURSA	100000			RECURSA	200000 COM DESONERAÇÃO	56,71%	56,71%	RECURSA	PROPOSTA	5,00%	5,00%	
FORTE	VERBÃO	HORA	PREÇO																				
RECURSA	100 - COM DESONERAÇÃO	56,44%	47,44%																				
RECURSA	100000																						
RECURSA	200000 COM DESONERAÇÃO	56,71%	56,71%																				
RECURSA	PROPOSTA	5,00%	5,00%																				

2.1. C2831 FOSSA E DEMAIS INSTALAÇÕES DE ESGOTO PARA BARRACÃO (UN)

			QTD
FOSSA E DEMAIS INSTALAÇÕES DE ESGOTO PARA BARRACÃO	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.2. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

			QTD
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

2.3. C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

			QTD
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL	9500	9.500,00000000	9.500,00
			9.500,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9.500,00

2.4. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

			QTD
LOCAÇÃO DA OBRA	(1311160)10000	2,10000000	2,10
			2,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,10

2.5. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

			QTD
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	3"4	12,00000000	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

2.6. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

			QTD
CARGA MANUAL DE ENTULHO	36,00	36,00000000	36,00
			36,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 36,00

2.7. C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

			QTD
CAIXA D'ÁGUA	1,0	1,00000000	1,00
			1,00

ITAMAR
GONCALVES
DA
COSTA:08006
974489

Assinado de forma
digital por ITAMAR
GONCALVES DA
COSTA:08006974489
Data: 2025.06.01
17:50:51 -03'00'

 ICÓ PREFEITURA MUNICIPAL	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA: 08/04/2023	BOM: 23,92%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	POSTO:	VERBA:
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO DAMA, ICÓ-CEARA	SEARJTA:	SEARJTA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEARJTA:	SEARJTA

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

2.6. C0370 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 (UN)

			QTD
BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO	1,0	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

3.1.1. C2032 REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO (M2)

			QTD
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	1532,14*5	7.660,70000000	7.660,70
			7.660,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7.660,70

3.2.1. C2032 REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO (M2)

			QTD
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	1156,78*5	10.429,02000000	10.429,02
			10.429,02

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10.429,02

4.1.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

			QTD
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO	1532,14*4,10	6.281,77000000	6.281,77
			6.281,77

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6.281,77

4.1.2. C4583 MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa (M)

			QTD
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO	1532,14*2	3.064,28000000	3.064,28
			3.064,28

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.064,28

4.1.3. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

			QTD
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO	1100,00	1.100,00000000	1.100,00
			1.100,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA:	08/04/2025
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	VERSÃO:	001
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARA	HORA:	16,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	REB:	47,48%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.160,00

4.2.1. C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

			QTD
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO	1158,78*2,10	9.386,12000000	9.386,12
		0	
			9.386,12

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9.386,12

4.2.2. C4583 MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa (M)

			QTD
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO	1158,78*2	2.317,56000000	2.317,56
		0	
			2.317,56

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.317,56

5.1. C0734 CERCA C/ MOURÕES PM - CONCRETO E ARAME LISO - 6 FIOS (M²)

			QTD
CERCADO VIA SACRA	1532,14*1,10	1.685,35000000	1.685,35
		0	
			1.685,35

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.685,35

6.1. C3619 DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES (M)

			QTD
VIA DE CARRO (CONSIDERANDO 10% DE PERDA)	44*50*1,10	2.420,00000000	2.420,00
		0	
VIA SACRA (CONSIDERANDO 10% DE PERDA)	200*15*1,10	3.300,00000000	3.300,00
		0	
			5.720,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5.720,00

6.2. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

			QTD
VIA DE CARRO (3 É FASE, TERRA E NEUTRO)	44*13,5*3	1.782,00000000	1.782,00
		0	
VIA SACRA (3 É FASE, TERRA E NEUTRO)	200*3,5*3	2.100,00000000	2.100,00
		0	
			3.882,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3.882,00

6.3. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA: 06/04/2026	BDI: 23,92%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FORTE	VERBA
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ	ICÓ-COM DESONERAÇÃO	64,44% 47,40%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ		200000	
			200000 COM DESONERAÇÃO	96,11% 96,14%
			PROPOSTA	0,00% 0,00%

			QTD
VIA DE CARRO (EXPLICAÇÃO DE QUANTITATIVO EM PLANTA)	1200	1.200.00000000	1.200,00
VIA SACRA (EXPLICAÇÃO DE QUANTITATIVO EM PLANTA)	11700	11.700.00000000	11.700,00
			12.900,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12.900,00

6.4. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

			QTD
VIA DE CARRO	800	800.00000000	800,00
VIA SACRA	3600	3.600.00000000	3.600,00
			4.400,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.400,00

6.5. C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

			QTD
VIA DE CARRO	6280	6.280.00000000	6.280,00
VIA SACRA	650	650.00000000	650,00
			6.930,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6.930,00

6.6. C0553 CABO EM PVC 1000V 25MM2 (M)

			QTD
VIA DE CARRO	3840	3.840.00000000	3.840,00
VIA SACRA	350	350.00000000	350,00
			4.190,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.190,00

6.7. C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)

			QTD
HASTE DE ATERRAMENTO	222	222.00000000	222,00
			222,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 222,00

6.8. C3911 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" (UN)

			QTD
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL	222	222.00000000	222,00
			222,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 222,00

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					Rubrica
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA:	06/04/2020	SOI:	27.90%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FORTE:	VRBÃO	HORA	MRE
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ	SEMPRE:	00% COM DESONERAÇÃO	94.44%	47.44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	SEMPRE:	0000%	-	-
			SNAP:	20% COM DESONERAÇÃO	96.71%	96.74%
			Composição Percentual	PROFMA	0.00%	0.00%

6.9. C1030 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W (UN)

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO	244	244.00000000	244.00
			244.00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 24400

6.10. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	4	4.00000000	4.00
			4.00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4.00

6.11. C4980 LUMINÁRIA 1 PÉTALA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W. INCLUSIVE O POSTE (UN)

		QTD	
POSTE VIA DE VEICULOS	44	44.00000000	44,00
			44,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 44,60

6.12. C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)

CAIXA DE ATERRAMENTO	244	244,00000000	244,00
			244,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 244,00

6.13. C2009 POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2.80M, C/GLOBO E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W (UN)

			QTD
VIA SACRA	200	200.00000000	200.00
			200.00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 200,00

6.14. COMPHORTO1 QUADRO DE MEDICAÇÃO TRIFÁSICO (UN)

			QTD
QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO	1,00	1.00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.00

6.15. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

 ICÓ	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA: 06/04/2020	BDI: 24,02%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO	FORTE:	VERSÃO:
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO SAMA, ICÓ - CEARÁ	RECURSOS:	HORA:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	DISPENS:	REB:

			QTD
DISJUNTOR	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

6.16. C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

			QTD
DISJUNTOR	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

6.17. C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN)

			QTD
DISJUNTOR	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

6.18. C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

			QTD
DISJUNTOR	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

6.19. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

			QTD
DISJUNTOR	12	12,00000000	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

6.20. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

			QTD
DPS	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

7.1. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

			QTD
CARGA MANUAL DE ENTULHO	360,00	360,00000000	360,00
			360,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 360,00

8.1.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	MEMÓRIAS DE CÁLCULO		
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA: 09/04/2025
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	BDI: 23,82%
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	

			QTD
FUNDAÇÕES - SAPATAS	28*(0,60*0,80*1)	10,08000000	10,08
EMBASAMENTO	(21,62+21,62+7,80+7,80+21,62+6+4,80+4,80)*0,20*0,20	3,84000000	3,84
			13,92

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,92

8.2.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

			QTD
EMBASAMENTO	(21,62+21,62+7,80+7,80+21,62+6+4,80+4,80)*0,20*0,20	3,84000000	3,84
			3,84

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,84

8.2.2. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

			QTD
FUNDAÇÕES	0,60*1,07*4%	14,40000000	14,40
PILARES	4,10*0,20*14%	10,68000000	10,68
			34,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 34,08

8.2.3. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

			QTD
SAPATAS	0,60*0,80*1*28	10,08000000	10,08
PILARES	0,20*0,20*4,10*28	4,59000000	4,59
			14,67

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,67

8.2.4. C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

			QTD
ARMADURA - SAPATAS FERRO 10	0,14*0,80*28*0,740	232,08000000	232,08
ARMADURA - PILARES FERRO 10	0,4*4,50*28*0,740	372,96000000	372,96
ESTRIBOS - PILARES (28 ESTRIBOS EM CADA PILAR) FERRO 6,3	28*28*0,248	194,43000000	194,43
NEGATIVO DA LAJE FERRO 10	08,40*11)+(8,40*11)+(10,75*7)+(10,75*7)+(4*11)*0,740	280,58000000	280,58
			1.080,13

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.080,13

8.2.5. C4458 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m (M2)

 ICÓ MUNICÍPIO DE ICÓ CEARÁ	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA: 05/04/2025	BDI: 23,92%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM ICÓ-COM DESONERAÇÃO	PORTO:	VERBAO
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO DAMA, ICÓ-CEARÁ	RECEITA:	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	DESCRIÇÃO:	MES

			QTD
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	8*22	176,00000000	176,00
			176,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 176,00

8.3.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

			QTD
ALVENARIAS	97,70*2,80	273,56000000	273,56
platicanda	61,24*1,20	73,49000000	73,49
			347,05

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 347,05

8.3.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

			QTD
chapisco	347,05*2	694,10000000	694,10
			694,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 694,10

8.3.3. C3029 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

			QTD
emboço	265,33	265,33000000	265,33
			265,33

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 265,33

8.3.4. C0805 COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE (M2)

			QTD
COBOGÓ NO MODELO SLIT	37,52*2,80	105,05600000	105,06
			105,06

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 105,06

8.4.1. C1338 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m (M2)

			QTD
COBERTURA	8,70*21,81	189,54700000	189,55
			189,55

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 189,55

8.4.2. C3745 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% (M2)

 ICÓ	MEMÓRIAS DE CÁLCULO																						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA: 06/04/2025																				
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ COM DESONERAÇÃO	BDI: 23,52%																				
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ CEARÁ																					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ																					
			<table> <tr> <th>FORTE</th><th>VERBA</th><th>HORA</th><th>DIÁ</th></tr> <tr> <td>SEMPRE</td><td>GR. 1 COM DESONERAÇÃO</td><td>54,84%</td><td>41,49%</td></tr> <tr> <td>SEMPRE</td><td>2352%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>SEMPRE</td><td>2352% COM DESONERAÇÃO</td><td>55,71%</td><td>55,71%</td></tr> <tr> <td>Desoneração</td><td>Finalidade</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FORTE	VERBA	HORA	DIÁ	SEMPRE	GR. 1 COM DESONERAÇÃO	54,84%	41,49%	SEMPRE	2352%			SEMPRE	2352% COM DESONERAÇÃO	55,71%	55,71%	Desoneração	Finalidade	0,00%	0,00%
FORTE	VERBA	HORA	DIÁ																				
SEMPRE	GR. 1 COM DESONERAÇÃO	54,84%	41,49%																				
SEMPRE	2352%																						
SEMPRE	2352% COM DESONERAÇÃO	55,71%	55,71%																				
Desoneração	Finalidade	0,00%	0,00%																				

			QTD
cobertura	21,81*8,75	191,06000000	191,06
			191,06

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 191,06

8.4.3. C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

			QTD
calha	21,81	21,81000000	21,81
			21,81

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,81

8.4.4. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

			QTD
tubo de queda	2,875	14,00000000	14,00
			14,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,00

8.4.5. C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

			QTD
joelho agua pluvial	5,00	5,00000000	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

8.5.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

			QTD
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	7,81*21,51*0,09	15,12000000	15,12
			15,12

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,12

8.5.2. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

			QTD
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	7,81*21,51	167,99000000	167,99
			167,99

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 167,99

8.5.3. C2244 RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 10cm (M)

			QTD
RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 10cm	7,81*2,0+21,51*2,0+7,81*2,0	74,26000000	74,26
			74,26

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 74,26

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA: 05/04/2025																				
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	BDI: 25,00%																				
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ																					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ																					
			<table> <tr> <th>PONTO</th><th>VERSÃO</th><th>NCM</th><th>IMP</th></tr> <tr> <td>ELP-114</td><td>100 - COM DESONERAÇÃO</td><td>34.44%</td><td>37.40%</td></tr> <tr> <td>ELP-114</td><td>202504</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>ELP-114</td><td>202504</td><td>35.71%</td><td>38.14%</td></tr> <tr> <td>ELP-114</td><td>202504</td><td>3.00%</td><td>3.00%</td></tr> </table>	PONTO	VERSÃO	NCM	IMP	ELP-114	100 - COM DESONERAÇÃO	34.44%	37.40%	ELP-114	202504	-	-	ELP-114	202504	35.71%	38.14%	ELP-114	202504	3.00%	3.00%
PONTO	VERSÃO	NCM	IMP																				
ELP-114	100 - COM DESONERAÇÃO	34.44%	37.40%																				
ELP-114	202504	-	-																				
ELP-114	202504	35.71%	38.14%																				
ELP-114	202504	3.00%	3.00%																				

8.6.1. C4436 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE (M2)

			QTD
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS BANHEIROS:	$(7,98 \times 7,98 + 21,81 \times 1,98 + 1,98 \times 1,98 + 1,98 \times 1,98 + 1,98 \times 7,85 + 7,85 \times 1,83 + 1,83 \times 8,55 + 8,55 \times 1,98 + 1,98 \times 8,50 + 8,50 \times 2,60)$	265.33000000	265,33
			265,33

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 265,33

8.7.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	34	34.00000000	34,00
			34,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 34,00

8.7.2. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

			QTD
tomadas	5	5.00000000	5,00
			5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

8.7.3. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

			QTD
interruptor	1	1.00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.7.4. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

			QTD
interruptor	6	6.00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

8.7.5. C5192 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA COR BRANCO, SEM ALETAS, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 32W, REATOR ELETRÔNICO P/2X32W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98 (UN)

			QTD
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	22	22.00000000	22,00
			22,00

 ICÓ	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA: 06/04/2016	BDI: 22,76%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FORTE	VERSÃO
	LOCAL	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARA	ELABORADO	2016/04
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	ELABORADO	2016/04

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22,00

8.7.6. C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

			QTD
quadro de distribuição	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.7.7. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

			QTD
disjuntor	4,00	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

8.7.8. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

			QTD
disjuntor dr	2,00	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.7.9. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's (UN)

			QTD
disjuntor dps	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.7.10. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

			QTD
DISJUNTOR	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.7.11. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

			QTD
DISJUNTOR	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.8.1. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

			QTD
BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	21	21,00000000	21,00
			21,00

 ICÓ	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA: 05/04/2025	BOM: 23,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	PONTO:	VERSÃO:
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ	2025M	2025M
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	2025M2 COM DESONERAÇÃO	2025M
			PROPOSTA	PROPOSTA

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 21,00

8.8.2. C4821 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS (UN)

			QTD
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12	12,00000000	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

8.8.3. C3442 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

			QTD
CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

8.8.4. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
PONTOS HIDRAULICOS	50	50,00000000	50,00
			50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

8.8.5. C1792 MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA (UN)

			QTD
MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

8.8.6. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

			QTD
PONTO SANITARIO	49	49,00000000	49,00
			49,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 49,00

8.8.7. C0357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

			QTD
BANCADA EM GRANITO	8,55*0,5	4,28000000	4,28
BANCADA EM GRANITO	6,55*0,5	3,28000000	3,28
			7,56

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,56

8.8.8. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	MEMÓRIAS DE CÁLCULO																						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA: 05/04/2023 BDI: 23,30%																				
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO																					
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ																					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ																					
			<table> <tr> <th>ITEM</th><th>VERSÃO</th><th>NORMA</th><th>NBR</th></tr> <tr> <td>SLABAS</td><td>02.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>14.44%</td><td>17.44%</td></tr> <tr> <td>REVESTIMENTOS</td><td>2020/4</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>REVEST.</td><td>2020/4 COM DESONERAÇÃO</td><td>16.71%</td><td>16.71%</td></tr> <tr> <td>Condições Especiais</td><td>14/04/2023</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> </table>	ITEM	VERSÃO	NORMA	NBR	SLABAS	02.1 COM DESONERAÇÃO	14.44%	17.44%	REVESTIMENTOS	2020/4			REVEST.	2020/4 COM DESONERAÇÃO	16.71%	16.71%	Condições Especiais	14/04/2023	0.00%	0.00%
ITEM	VERSÃO	NORMA	NBR																				
SLABAS	02.1 COM DESONERAÇÃO	14.44%	17.44%																				
REVESTIMENTOS	2020/4																						
REVEST.	2020/4 COM DESONERAÇÃO	16.71%	16.71%																				
Condições Especiais	14/04/2023	0.00%	0.00%																				

			QTD
TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO	14	14.00000000	14,00
			14,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,00

8.8.9. C4636 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS (UN)

			QTD
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS (para banheiro PCD)	2	2.00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

8.8.10. C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

			QTD
CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	9	9.00000000	9,00
			9,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,00

8.8.11. C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

			QTD
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	26,0*2,0*1,8+3,0*0,8*1,8	97,97000000	97,92
			97,92

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 97,92

8.8.12. C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

			QTD
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_08/2022 (UN)	4,0	4.00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

8.8.13. C4162 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

			QTD
fossa e sumidouro	3,00	3.00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

8.8.14. C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

 ICÓ	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM-ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA: 06/04/2025	BDI: 20,52%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM-ICÓ-COM DESONERAÇÃO	PONTE	VERSÃO
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ		QUANTIDADE	VALOR

			QTD
custo de inspeção	3,00	3.00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

8.9.1. C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

			QTD
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA	3	3.00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

8.9.2. C4517 PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

			QTD
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO	(0,7*1,6)*26	29.12000000	29,12
			29,12

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,12

8.9.3. C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) (UN)

			QTD
FECHADURA DE TARJETA	28	28.00000000	28,00
			28,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,00

8.9.4. C1518 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR (M2)

			QTD
JANELAS BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS	(4*0,40)*4	6.40000000	6,40
JANELAS BANHEIROS ACESSIBILIDADE MASCULINOS E FEMININOS	(1,60*0,40)*2	1.28000000	1,28
			7,68

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,68

8.9.5. C4950 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO (M2)

			QTD
VIDRO DE JANELAS	7,68	7.68000000	7,68
			7,68

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,68

8.10.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

			QTD
PINTURA DE PORTAS	(0,90*2,10)*3*2	11.34000000	11,34
			11,34

 ICÓ	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA: 05/04/2020	BDI: 23,30%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ-CEARÁ	OBRA	VER. 1
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ		OBRA 1	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 2	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 3	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 4	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 5	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 6	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 7	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 8	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 9	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 10	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 11	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 12	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 13	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 14	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 15	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 16	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 17	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 18	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 19	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 20	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 21	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 22	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 23	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 24	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 25	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 26	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 27	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 28	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 29	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 30	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 31	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 32	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 33	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 34	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 35	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 36	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 37	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 38	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 39	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 40	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 41	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 42	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 43	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 44	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 45	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 46	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 47	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 48	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 49	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 50	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 51	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 52	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 53	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 54	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 55	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 56	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 57	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 58	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 59	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 60	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 61	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 62	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 63	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 64	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 65	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 66	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 67	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 68	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 69	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 70	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 71	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 72	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 73	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 74	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 75	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 76	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 77	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 78	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 79	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 80	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 81	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 82	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 83	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 84	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 85	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 86	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 87	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 88	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 89	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 90	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 91	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 92	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 93	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 94	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 95	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 96	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 97	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 98	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 99	COM DESONERAÇÃO
			OBRA 100	COM DESONERAÇÃO

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,34

8.10.4. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

			QTD
PINTURA EXTERNA PAREDE	(21,81+7,98+7,98+4)/2	116,84000000	116,84
PINTURA EXTERNA DE PLATIBANDA	(21,81+7,98+7,98+21,81)/2	71,45000000	71,45
			188,29

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 188,29

8.10.5. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - TETO (M2)

			QTD
EMASSAMENTO TETO	7,98*21,81	173,81000000	173,81
			173,81

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 173,81

8.10.6. C4167 LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA - TETO (M2)

			QTD
PINTURA DE TETO	21,81*7,98	173,81000000	173,81
			173,81

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 173,81

8.10.7. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

			QTD
COBOCÔ	6,70*2*2*2,80	75,04000000	75,04
			75,04

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 75,04

8.11.1. C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S (M)

			QTD
BARRA DE APOIO RETA	4	4,00000000	4,00
BARRA DE APOIO RETA CHUVEIRO	2	2,00000000	2,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

9.1. C3529 MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:5) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

			QTD
MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO	1532,14*(4,25+2,86+3)/3	3,097,99000000	3,097,99
			3,097,99

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,097,99

9.2. C3078 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA (PRODUZIDA) (S/TRANSPORTE) (M3)



COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
TABELA SEINFRA 28.1 - SINAPI 02/2026

Descrição	Unidade	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18599	SEINFRA	APONTADOR	HxMES	0,25	4556,25	1139,06
18595	SEINFRA	AUX TOPOGRAFIA	HxMES	0,25	3349,49	837,37
18590	SEINFRA	ENCARREGADO OBRA	HxMES	0,80	6171,03	4936,82
18583	SEINFRA	ENG PLENO	HxMES	0,50	21959,24	10979,62
18592	SEINFRA	TOPOGRAFO	HxMES	0,25	6696,79	1674,20

0

TOTAL	19567,08	
TOTAL PARA 8 MESES	156536,61	
FRAÇÃO DE 100 %	1565,37	346,83
TOTAL	1565,37	

COMPOSIÇÃO DO BDI			
 ICÓ INSTITUTO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES	OBRA	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO FINAL	
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - ICÓ-COM DESONERAÇÃO	
	LOCAL	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, ICÓ CEARÁ	
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ	
	DATA : 05/04/2025	BDI	23,92%
	FONTE	VERSÃO	NDRA
	SENPA	GR.1 COM DESONERAÇÃO	54,44%
	SENPA	2020/04	47,88%
	SENPA	2020/02 COM DESONERAÇÃO	56,71%
	Comissão Própria	2020/04	55,14%
			5,08%
			5,08%

COD	DESCRIÇÃO	%
AC		
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
	Administração Central	3,00%
	TOTAL	3,00%
R+S+G		
	RISCO, SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	
	R	Risco do empreendimento
		0,97%
	S+G	Seguro + Garantia do Empreendimento
		0,80%
	TOTAL	1,77%
DF		
	DESPESAS FINANCEIRAS	
	Despesas Financeiras	0,59%
	TOTAL	0,59%
L		
	LUCRO	
	Lucro	6,59%
	TOTAL	6,59%
I		
	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	3,00%
	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta)	2,70%
	TOTAL	9,35%

BDI = 23,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - 100-COM DESONERAÇÃO FINAL	DATA:	05/04/2025	MDI:	53,32%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO BONFIM - 100-COM DESONERAÇÃO	VERSÃO:		HORA:	MES
LOCAL:	HORTO DO SENHOR DO BONFIM, CONJUNTO GAMA, 100 CEARA	DESCRIÇÃO:	125 1 COM DESONERAÇÃO	04,44%	67,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE 100	DESCRIÇÃO:	202020		
		DESCRIÇÃO:	202020 COM DESONERAÇÃO	66,71%	56,74%
		DESCRIÇÃO:	PROPRIA	0,00%	0,00%

A + B + C + D = 84.44% 47.48%
