

ANEXO III

PROJETO BÁSICO

(TERMO DE REFERÊNCIA) – REV02

**PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E
SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA
PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA
SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA
BAHIA - TRECHO 02.**

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de drenagem, pavimentação, acessibilidade e sinalização viária da Avenida Presidente Getúlio Vargas, Rua Santa Catarina - Trecho 02 e Rua Bahia - Trecho 02.

Proprietário: Prefeitura de Araçoiaba da Serra.

Município: Araçoiaba da Serra/SP - CEP: 18190-000.

Divisão de Convênios

15 3281-7018 | www.aracoiaba.sp.gov.br | convencios@aracoiaba.sp.gov.br
Av. Luane Milanda de Oliveira, 600, Jardim Salete, Araçoiaba da Serra/SP | CEP 18.190-000

SUMÁRIO

1.	DISPOSIÇÕES GERAIS:	3
1.1.	OBJETO:	3
1.3.	JUSTIFICATIVA TÉCNICA:	3
2.	ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO	4
3.	SELEÇÃO DO FORNECEDOR:	5
3.2.	GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO:	5
3.3.	PARCITIPAÇÃO EM CONSÓRCIO:	5
3.4.	GARANTIA CONTRATUAL:	5
3.5.	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA	5
3.6.	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL:	6
3.7.	ATESTADO DE VISITA TÉCNICA:	7
3.8.	PROPOSTA:	8
3.10.	CONTRATO:	8
3.11.	GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:	9
4.	INVESTIMENTO:	9
5.	DISPOSIÇÕES DE EXECUÇÃO:	10
5.8.	MEDIÇÕES E PAGAMENTOS:	11
5.9.	GARANTIA DA EXECUÇÃO:	12
6.	ANEXOS	13
6.1.	ANEXO A – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;	14
6.2.	ANEXO B – MEMORIAL DE CÁLCULO;	21
6.3.	ANEXO C - CRONOGRAMA FÍSICO E DE INVESTIMENTO;	47
6.4.	ANEXO D - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - QCI;	48
6.5.	ANEXO E - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI.....	49
6.6.	ANEXO F – MEMORIAL DESCRITIVO;	50
6.7.	ANEXO G – DESENHOS:	57

Divisão de Convênios

15 3281-7018 | www.aracoiaba.sp.gov.br | convencios@aracoiaba.sp.gov.br
Av. Luane Milanda de Oliveira, 600, Jardim Salete, Araçoiaba da Serra/SP | CEP 18.190-000

1. DISPOSIÇÕES GERAIS:

1.1. OBJETO:

1.1.1. O presente termo visa a **“Contratação de empresa especializada para execução de obras de drenagem, pavimentação, acessibilidade e sinalização viária da Avenida Presidente Getúlio Vargas, Rua Santa Catarina - Trecho 02 e Rua Bahia - Trecho 02”**.

1.2. De acordo com o inciso XII do artigo 6 da Lei 14.133/2021 o presente objeto é caracterizado como Obra.

1.3. JUSTIFICATIVA TÉCNICA:

1.3.1. A execução das obras de pavimentação, drenagem e sinalização viária na Avenida Presidente Getúlio Vargas, Rua Santa Catarina - Trecho 02 e Rua Bahia - Trecho 02 é uma etapa crucial da segunda fase do plano de infraestrutura urbana nas vias dos bairros Alvorada, Alcides Vieira e Maria da Glória. Essas intervenções desempenham um papel fundamental na melhoria da infraestrutura urbana, especialmente nas ruas que compõem uma rota viária vital, conectando a Rodovia Raposo Tavares à região central da cidade. A implementação dessas obras não apenas aumentará a acessibilidade e a segurança viária, mas também promoverá o desenvolvimento socioeconômico dessas áreas, facilitando o acesso aos serviços e estimulando o crescimento comercial e residencial.

1.3.2. Um dos principais desafios enfrentados na Avenida Getúlio Vargas é a inadequada drenagem devido ao seu alto declive e à condição atual da via ser em leito natural. Essa situação resulta em problemas recorrentes de inundação e erosão, afetando não apenas a qualidade das vias, mas também a segurança e o conforto dos moradores e usuários locais. Portanto, a implementação de sistemas de drenagem eficazes é essencial para mitigar esses problemas e garantir a durabilidade das melhorias propostas.

1.3.3. A obra no Trecho 02 da Rua Bahia desempenhará um papel fundamental na conectividade urbana, ao ligar o Conjunto Habitacional Maria Paula Esposito aos bairros Alcides Vieira, Maria da Glória e Alvorada. Essa ligação não apenas melhorará o acesso entre essas áreas residenciais, mas também facilitará o trânsito de veículos de emergência, transporte público e demais fluxos de tráfego, promovendo a integração social e o desenvolvimento harmonioso dessas comunidades.

1.3.4. Além da pavimentação e drenagem, as obras incluirão a implementação de passeios acessíveis, destacando a importância da acessibilidade na infraestrutura urbana. Essa medida não apenas atende às exigências legais de acessibilidade, mas também promove a inclusão social, permitindo que todos os cidadãos, incluindo idosos,

Divisão de Convênios

15 3281-7018 | www.aracoiaba.sp.gov.br | convencios@aracoiaba.sp.gov.br
Av. Luane Milanda de Oliveira, 600, Jardim Salete, Araçoiaba da Serra/SP | CEP 18.190-000

peças com deficiência e famílias com carrinhos de bebê, possam desfrutar plenamente das melhorias urbanas e acessar os serviços e espaços públicos de forma digna e segura.

1.3.5. Para a elaboração do presente projeto foram considerados os objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, em especial:



1.3.5.1. **9. Inovação infraestrutura** - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação.

1.3.5.2. **11. Cidades e comunidades sustentáveis** - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

1.3.5.3. **13. Ação contra a mudança global do clima** - Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

2.1. O presente objeto é dividido em 4 etapas, sendo que sua execução será realizada em conjunto, conforme descrito abaixo:

2.2. ETAPA 01 - RECURSOS CONVÊNIO EMENTA PARLAMENTAR - CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL - Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 - PROGRAMA: Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Convênio 932215/22;

2.3. ETAPA 02 - RECURSOS CONVÊNIO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEMANDA 046527 - Pavimentação e Drenagem Rua Santa Catarina - Trecho 02, Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01 e Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02;

2.4. ETAPA 03 - RECURSOS CONVÊNIO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEMANDA 046527 - Pavimentação e Drenagem Rua Bahia - Trecho 02;

2.5. ETAPA 04 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RECURSOS PRÓPRIOS PMAS;

Divisão de Convênios

15 3281-7018 | www.aracoiaba.sp.gov.br | convencios@aracoiaba.sp.gov.br
Av. Luane Milanda de Oliveira, 600, Jardim Salete, Araçoiaba da Serra/SP | CEP 18.190-000

3. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

3.1. SUBCONTRATAÇÃO:

3.1.1. Será permitido a subcontratação de serviços de sinalização viária e execução de passeio em concreto.

3.1.1.1. A subcontratação deve ser previamente autorizada pela Administração;

3.1.1.2. A responsabilidade pela qualidade, durabilidade e garantia dos serviços realizados através de subcontratação são da CONTRATADA, inclusive os encargos sociais e trabalhistas da mão de obra utilizada.

3.2. GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO:

3.2.1. Não será exigida garantia para participar do certame.

3.3. PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO:

3.3.1. Não serão admitidas empresas em consórcio, uma vez que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste Termo de Referência. Diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto, opta-se, com base no poder discricionário da Administração, por vedar a participação de empresas em consórcio neste certame.

3.4. GARANTIA CONTRATUAL:

3.4.1. Apresentação de uma das modalidades de garantia contratual, nos termos do parágrafo 1º do artigo 96 da Lei 14.133/2021.

3.4.1.1. A garantia será de 5% do valor do contrato;

3.4.1.2. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

3.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

3.5.1. A habilitação econômico-financeira deverá ser demonstrada nos termos do inciso I e § 4º do artigo 69 da Lei 14.133/2021, sendo que, para a habilitação, deverá ser apresentado o seguinte documento:

3.5.1.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

3.5.2. A licitante deve possuir capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, ou seja, R\$326.176,10 (Trezentos e vinte e seis mil, cento e setenta e seis reais e dez centavos.).

Divisão de Convênios

15 3281-7018 | www.aracoiaba.sp.gov.br | convencios@aracoiaba.sp.gov.br
Av. Luane Milanda de Oliveira, 600, Jardim Salete, Araçoiaba da Serra/SP | CEP 18.190-000

3.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL:

3.6.1. Registro ou inscrição da empresa e do responsável técnico no Conselho Regional competente (CREA ou CAU).

3.6.2. Comprovação que a licitante possui no seu quadro permanente, nos termos do inciso I do artigo 67 da Lei 14.133/2021 e das Súmulas 23 e 25 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na data de apresentação da proposta, profissional (ais) de nível superior detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes.

3.6.2.1. A comprovação de vínculo profissional poderá se dar da seguinte forma:

3.6.2.1.1. no caso de profissional empregado, por meio de ficha de registro de empregado ou cópia autenticada da carteira de trabalho e assistência social – CTPS;

3.6.2.1.2. no caso de profissional proprietário ou sócio da empresa licitante, mediante apresentação do contrato social em vigor;

3.6.2.1.3. no caso de sociedade por ações, ato constitutivo em vigor, acompanhado da prova de eleição de seus administradores em exercício;

3.6.2.1.4. no caso de profissional autônomo, mediante contrato de prestação de serviços, que preencha os requisitos e que se responsabiliza tecnicamente pela execução dos serviços.

3.6.2.2. A comprovação da capacidade técnico-profissional deverá ser demonstrada, conforme Súmula 23 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mediante a apresentação da CAT (Certidão de Acervo Técnico), sendo as parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo é a seguinte:

3.6.2.2.1. Escavação mecanizada de solo;

3.6.2.2.2. Camada de Rolamento (CBUQ);

3.6.2.2.3. Base em material granular;

3.6.2.2.4. Tubulação enterrada de concreto armado para rede de drenagem;

3.6.2.3. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, deverá participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra por profissional de experiência equivalente ou superior.

3.6.3. Comprovação que a licitante possui capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao presente objeto, nos termos do inciso II do artigo 67 da Lei 14.133/2021 e da Súmula 24 do Estado de São Paulo, na data de apresentação da proposta.

Divisão de Convênios

15 3281-7018 | www.aracoiaba.sp.gov.br | convencios@aracoiaba.sp.gov.br
Av. Luane Milanda de Oliveira, 600, Jardim Salete, Araçoiaba da Serra/SP | CEP 18.190-000

3.6.3.1. As parcelas de maior relevância operacional e de valor significativo superior a 4% do valor global do presente objeto é a seguinte:

3.6.3.1.1. Escavação mecanizada de solo 50% - **13.684,19 m³**;

3.6.3.1.2. Camada de Rolamento (CBUQ) 50% - **167,60 m³**;

3.6.3.1.3. Base em material granular 50% – **1.380,59 m³**;

3.6.3.1.4. Tubulação enterrada de concreto armado para rede de drenagem - 50% – **1.441,77 m**;

3.6.3.2. A comprovação operacional poderá ser realizada mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:

3.6.3.2.1. Atestado de execução fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, sendo que nele deve conter o seguinte:

3.6.3.2.1.1. Endereço da Obra/Serviço;

3.6.3.2.1.2. Dados do contrato;

3.6.3.2.1.3. Descrição dos serviços/obras realizados, inclusive a indicação das unidades de medida e quantitativos;

3.6.3.2.1.4. Dados do profissional que acompanhou a execução, inclusive número de ART/RRT.

3.6.3.2.2. Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA/CAU em nome de profissional técnico.

3.6.3.2.2.1. A apresentação de Certidão de Acervo Técnico (CAT) para comprovação da capacidade operacional será aceita desde que o nome da Licitante esteja presente no atestado como “CONTRATADA”;

3.7. ATESTADO DE VISITA TÉCNICA:

3.7.1. Apresentar Atestado de Visita Técnica emitido e certificado pela Secretaria de Obras e Serviços ou Declaração de não realização conforme modelo do edital.

3.8. PROPOSTA:

3.9. O julgamento das propostas será o de menor preço, nos termos do inciso I do artigo 33 da Lei 14.133/2021.

3.9.1. A proposta apresentada pela LICITANTE deve conter TODOS os custos necessários para completa execução do objeto, sendo que não serão aceitas, após a assinatura do contrato, reclamações referentes a composições analíticas das tabelas de referência utilizadas ou quanto quantitativos e serviços constantes nos projetos e no memorial descritivo publicados juntos ao edital.

3.9.2. Deverá ser indicado na proposta se é optante pela desoneração da folha de pagamento.

3.9.3. Apresentar composição de BDI nos termos do Acórdão TCU 2622/2013 e conforme indicação da desoneração da folha de pagamento referente ao item 2.1.3.2.

3.9.4. Utilizar arredondamento com duas casas decimais em todas as operações matemáticas presentes na proposta;

3.9.5. O levantamento das quantidades de materiais e dos serviços para elaboração do orçamento da proposta é de inteira responsabilidade da Licitante, que deverá conferir qualquer quantitativo indicado na Planilha disponibilizada pela Contratante. Havendo divergências entre as constantes na planilha disponibilizada e aquelas verificadas pela Licitante, a CPLIC - Comissão Permanente de Licitação deverá ser comunicada imediatamente;

3.9.6. Conforme parágrafo 5º do artigo 59 da Lei 14.133/2021, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei;

3.9.7. O autor do orçamento estimado da Licitante que vier a ser declarada vencedora deste certame, se obriga a apresentar na assinatura do contrato a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) específica do orçamento, e declaração expressa quanto à compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes da planilha orçamentária com os quantitativos dos projetos e das respectivas obras.

3.10. CONTRATO:

3.10.1. O regime de CONTRATAÇÃO e EXECUÇÃO será o de empreitada por preço unitário.

3.10.2. O prazo de execução e a vigência contratual será de 12 meses.

3.10.3. A CONTRATADA deverá emitir ART/RRT do (s) responsável (is) pela execução.

3.10.4. Designação de preposto, por escrito, que tenha poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a vigência contratual.

3.10.5. Todo o material e mão-de-obra, assim como todos os impostos, fretes dos materiais e obrigações sociais relativos aos serviços, ficarão a cargo exclusivo da contratada, não respondendo à Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra/SP perante aos fornecedores nem perante terceiros por quaisquer prejuízos causados pela empresa executora dos serviços e também não assumirá a Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra/SP, quaisquer responsabilidade por multas, salários ou acidentes decorrentes da execução dos serviços inerentes ao objeto desta licitação.

3.10.6. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar os serviços de sinalização viária.

3.11. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:

3.11.1. A Secretaria gestora do contrato será a Secretaria de Obras.

3.11.2. A fiscalização técnica será realizada por preposto indicado pelo gestor do contrato.

4. INVESTIMENTO:

4.1. O valor total do orçamento (**ANEXO A**) da referida obra é de **R\$ 3.261.760,98** (Três milhões, duzentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta reais e noventa e oito centavos.), incluindo a taxa de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas – vide ANEXO E). Foram utilizadas as seguintes tabelas referenciais de custos: SINAPI de dezembro de 2023, CDHU 192 de novembro de 2023 e SICRO de outubro de 2023 (última versão publicada), todas sem desoneração.

4.2. A fonte dos recursos é dividida:

4.2.1. **R\$ 1.000.000,00** (Um milhão de reais) oriundos do convênio firmado com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo;

4.2.2. **R\$ 960.019,00** (Novecentos e sessenta mil e dezenove reais) oriundos do convênio firmado com o Ministério de Desenvolvimento Regional;

4.2.3. **R\$ 1.301.741,98** (Um milhão, trezentos e um mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos) oriundos de recursos próprios do Município de Araçoiaba da Serra;

4.3. Considerando o período de execução (**ANEXO C - CRONOGRAMA FÍSICO E DE INVESTIMENTO**) e o prazo do procedimento licitatório, parte do objeto será executada no exercício financeiro seguinte.

Divisão de Convênios

15 3281-7018 | www.aracoiaba.sp.gov.br | convencios@aracoiaba.sp.gov.br
Av. Luane Milanda de Oliveira, 600, Jardim Salete, Araçoiaba da Serra/SP | CEP 18.190-000

4.3.1. No Quadro de Composição de Investimento – QCI a seguir estão indicadas as fichas financeiras referentes ao Orçamento Municipal de 2024.

QCI - QUADRO RESUMO		Exercício 2024	Exercício 2025
RECURSOS CONVÊNIO EMENTA PARLAMENTAR - CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL - PROGRAMA: Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Convênio 932215/22	VALOR:	R\$ 628.835,34	R\$ 331.183,66
	FICHA:	743	LOA 2025
RECURSOS CONVÊNIO EMENTA PARLAMENTAR - CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL - PROGRAMA: Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Convênio 932215/22	VALOR:	R\$ 903.965,48	R\$ 96.034,52
	FICHA:	737	LOA 2025
RECURSOS PRÓPRIOS PMAS	VALOR:	R\$ 234.474,32	R\$ 1.067.267,66
	FICHA:	362	LOA 2025

5. DISPOSIÇÕES DE EXECUÇÃO:

5.1. Todos os serviços de limpeza, demolição, escavação, compactação, reaterro, retirada de entulho, carga e transporte dos materiais, e demais serviços pertinentes a completa execução do objeto ficarão a cargo da contratada, sendo que todos os custos devem estar inclusos na proposta.

5.2. A CONTRATADA, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra, deve ter obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todos os projetos com os respectivos memoriais e das condições locais onde será executado a pavimentação, bem como o pleno acompanhamento dos autores do projeto e do setor de convênios e da Secretaria de Obras do Município de Araçoiaba da Serra. Os materiais empregados na obra e aos serviços a serem executados, obedecerão rigorosamente ao seguinte:

5.2.1. Normas e especificações constantes neste documento;

5.2.2. Normas da ABNT;

5.2.3. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Regulamentação Volume I e Advertência Volume II do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN;

5.2.4. Especificações técnicas do Departamento de Estradas e Rodagem DER/SP

5.2.5. Prescrições e recomendações dos fabricantes;

5.3. Os projetos complementares poderão sofrer revisões, e fica a cargo da CONTRATADA manter a lista mestra e os projetos atualizados na obra.

5.4. Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas e quaisquer despesas relativas às instalações provisórias de obra, inclusive tapumes, barracão, andaimes, ligações provisórias, equipamentos e maquinários, todos os custos relativos

Divisão de Convênios

15 3281-7018 | www.aracoiaba.sp.gov.br | convencios@aracoiaba.sp.gov.br
Av. Luane Milanda de Oliveira, 600, Jardim Salete, Araçoiaba da Serra/SP | CEP 18.190-000

à mão-de-obra empregada, cópia em geral, alvarás, emolumentos, impostos, transportes e despesas de escritório.

5.5. A CONTRATADA providenciará um Diário de Obras, conforme modelo disponibilizado pela FISCALIZAÇÃO, registrando as principais ocorrências que caracterizam o andamento das obras, solicitações, respostas às solicitações feitas a fiscalização etc.

5.6. Todas as medidas deverão ser conferidas in loco.

5.7. A CONTRATADA deverá entregar junto com a solicitação de recebimento definitivo da obra um conjunto dos projetos “As Built” com quaisquer alterações autorizadas pela FISCALIZAÇÃO e efetivamente executadas.

5.8. MEDIÇÕES E PAGAMENTOS:

5.8.1. A CONTRATADA deverá apresentar na conclusão da etapa a planilha de medições conforme modelo disponibilizado pela fiscalização.

5.8.1.1. As medições e o acompanhamento da execução da ETAPA 01 seguirão o estabelecido nos Art. 184 e 184-A da Lei Federal 14.133/2021 e demais instruções normativas do Governo Federal pertinentes a contrato de repasse e convênio.

5.8.1.1.1. As medições e as demais documentações deverão ser protocoladas pela contratada através do <https://portal.transferegov.sistema.gov.br>.

5.8.2. As medições das ETAPAS 02, 03 e 04 serão deverão ser realizadas conforme procedimentos a seguir:

5.8.2.1. A solicitação de medição deverá ser protocolada através do Araçoiaba sem Papel - <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br>.

5.8.2.2. Junto a solicitação, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos:

5.8.2.2.1. Relatório de execução/ocorrências contendo o seguinte:

5.8.2.2.1.1. Registros fotográficos dos serviços realizados;

5.8.2.2.1.2. Descrição das atividades realizadas;

5.8.2.2.1.3. Principais ocorrências, tais como: Período chuvoso, acidentes de trabalho, quantidade de mão de obra e descrição dos maquinários pesados utilizados.

5.8.2.2.2. Documentação de Pessoal que trabalhou na execução da obra.

5.8.2.2.2.1. A documentação de pessoal inclui a ficha de registro do empregado, comprovante de pagamento de salário e FGTS do mês anterior a solicitação da medição.

5.8.2.2.3. Cronograma Físico-Financeiro atualizado.

5.8.2.2.3.1. No caso de atrasos na execução, a CONTRATADA deverá apresentar junto ao cronograma físico-financeiro a justificativa.

5.8.2.3. Após a aprovação da medição pelo fiscal designado pela CONTRATANTE, será autorizado a emissão da NOTA FISCAL.

5.8.2.3.1. O pagamento será realizado apenas com a apresentação da documentação solicitada no item 6.8.1.2;

5.8.2.3.2. A Nota Fiscal deverá indicar o número do contrato, número do convênio quando pertinente, empenho e medição. Tais informações não poderão ser inseridas manualmente na Nota Fiscal, mas sim quando da emissão desta no site gerador. Caso a Nota Fiscal tenha sido gerada sem estas informações, deverá ser apresentada, pela empresa, Carta de Correção Eletrônica, que também deverá ser elaborada no site gerador da Nota Fiscal, para a inclusão dos dados faltantes;

5.8.2.3.3. Para o pagamento da medição a CONTRATADA deverá entregar os ensaios realizados durante a execução da base, sendo que estes devem estar assinados pelo responsável técnico que realizou o ensaio e pelo responsável técnico pela execução;

5.8.2.3.4. Após o recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria de Obras, o pagamento será efetivado em até 15 (quinze) dias úteis pela Secretaria de Administração e Finanças.

5.8.3. A CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, Projetos e Normas Técnicas vigentes.

5.8.4. Com exceção dos serviços complementares (ETAPA 04 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RECURSOS PRÓPRIOS PMAS), as medições serão realizadas por grupos de serviço, não sendo possível a realização de medições parciais.

5.8.5. O pagamento das medições das ETAPAS 01, 02 e 03 será efetuado após o desbloqueio dos recursos pelo órgão concedente do convênio.

5.9. GARANTIA DA EXECUÇÃO:

5.9.1. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela Administração, as partes do referido objeto, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados.

5.9.2. Todos os serviços executados, deverão ser garantidos por 12 (doze) meses contatos a partir da liberação dos serviços.

5.9.3. Em caso de vícios estruturais, de solidez ou segurança, a garantia da obra será de cinco anos conforme artigo 618 do código civil.

6. ANEXOS

- 6.1. ANEXO A – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
- 6.2. ANEXO B – MEMORIAL DE CÁLCULO;
- 6.3. ANEXO C - CRONOGRAMA FÍSICO E DE INVESTIMENTO;
- 6.4. ANEXO D - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - QCI;
- 6.5. ANEXO E - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI
- 6.6. ANEXO F – MEMORIAL DESCRITIVO;
- 6.7. ANEXO G – DESENHOS:

Araçoiaba da Serra, 19 de março de 2024.

ANEXO A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÃO DESONERADO

BDI = 19,60%

REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL C/ BDI
						S/ BDI	C/ BDI	
01.	ETAPA 01 - RECURSOS CONVÊNIO EMENTA PARLAMENTAR - CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL - Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 - PROGRAMA: Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Convênio 932215/22							R\$ 1.239.269,52
01.01			EVENTO 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.016,45
01.01.01	02.08.040	CDHU	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M2	4,50	R\$ 336,43	R\$ 402,37	R\$ 1.810,67
01.01.02	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	2.275,06	R\$ 0,44	R\$ 0,53	R\$ 1.205,78
01.02			EVENTO 02 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DA VIA					R\$ 27.798,67
01.02.01	101116	SINAPI	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	1.510,63	R\$ 2,31	R\$ 2,76	R\$ 4.169,34
01.02.02	100996	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1.888,29	R\$ 4,30	R\$ 5,14	R\$ 9.705,81
01.02.03	95426	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.888,29	R\$ 2,06	R\$ 2,46	R\$ 4.645,19
01.02.04	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.888,29	R\$ 1,51	R\$ 1,81	R\$ 3.417,80
01.02.05	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.820,04	R\$ 2,69	R\$ 3,22	R\$ 5.860,53
01.03			EVENTO 03 - DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA					R\$ 564.944,50
01.03.01			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.913,47
01.03.01.01	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	530,28	R\$ 6,17	R\$ 7,38	R\$ 3.913,47
01.03.02			DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 83.347,39
01.03.02.01	54.06.151	CDHU	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO	M3	52,22	R\$ 404,89	R\$ 484,25	R\$ 25.287,54
01.03.02.02	11.01.630	CDHU	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO	M3	52,22	R\$ 569,92	R\$ 681,62	R\$ 35.594,20
01.03.02.03	54.06.160	CDHU	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPA	M3	16,16	R\$ 804,05	R\$ 961,64	R\$ 15.540,10
01.03.02.04	10.02.020	CDHU	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	502,58	R\$ 11,52	R\$ 13,78	R\$ 6.925,55
01.03.03			ESCOVAÇÕES REDE DE DRENAGEM					R\$ 93.175,22
01.03.03.01	90106	SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	280,78	R\$ 8,09	R\$ 9,68	R\$ 2.717,95
01.03.03.02	90108	SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.886,99	R\$ 7,28	R\$ 8,71	R\$ 16.435,68
01.03.03.03	08.01.060	CDHU	ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO	M2	1.992,89	R\$ 21,73	R\$ 25,99	R\$ 51.795,21
01.03.03.04	101622	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	20,67	R\$ 194,06	R\$ 232,10	R\$ 4.797,51
01.03.03.05	07.11.020	CDHU	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	2.167,77	R\$ 6,72	R\$ 8,04	R\$ 17.428,87
01.03.04			ESCOVAÇÕES EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM					R\$ 14.720,66
01.03.04.01	90091	SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	129,02	R\$ 6,60	R\$ 7,89	R\$ 1.017,97
01.03.04.02	102278	SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	80,50	R\$ 10,52	R\$ 12,58	R\$ 1.012,69
01.03.04.03	90095	SINAPI	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	35,86	R\$ 5,56	R\$ 6,65	R\$ 238,47
01.03.04.04	08.01.060	CDHU	ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO	M2	424,78	R\$ 21,73	R\$ 25,99	R\$ 11.040,03
01.03.04.05	07.11.020	CDHU	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	175,56	R\$ 6,72	R\$ 8,04	R\$ 1.411,50
01.03.05			BOCAS DE LOBO E LEÃO					R\$ 51.063,31
01.03.05.01	97961	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	15,00	R\$ 2.459,50	R\$ 2.941,56	R\$ 44.123,40
01.03.05.02	14.20.010	CDHU	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	3,19	R\$ 1.819,00	R\$ 2.175,52	R\$ 6.939,91
01.03.06			POÇOS DE VISITA					R\$ 52.757,95
01.03.06.01	102457	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA	UN	8,00	R\$ 1.651,48	R\$ 1.975,17	R\$ 15.801,36
01.03.06.02	102142	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	7,00	R\$ 2.596,42	R\$ 3.105,32	R\$ 21.737,24

 SETOR DE CONVÊNIOS								
ANEXO A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
						NÃO DESONERADO	BDI =	19,60%
REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPDS 192 - SICRO 1023								
Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL C/ BDI
						S/ BDI	C/ BDI	
01.03.06.03	99246	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_ 12/2020	M	5,50	R\$ 939,55	R\$ 1.123,70	R\$ 6.180,35
01.03.06.04	99318	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_ 12/2020	M	15,00	R\$ 286,41	R\$ 342,55	R\$ 5.138,25
01.03.06.05	49.06.420	CDHU	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE D 400 (RUPTURA > 400 KN)	UN	4,00	R\$ 523,70	R\$ 626,35	R\$ 2.505,40
01.03.06.06	98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_ 12/2020	UN	11,00	R\$ 106,06	R\$ 126,85	R\$ 1.395,35
01.03.07			REDE DE DRENAGEM					R\$ 265.966,50
01.03.07.01	46.12.270	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM	M	46,40	R\$ 136,21	R\$ 162,91	R\$ 7.559,02
01.03.07.02	46.12.300	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 500MM	M	22,95	R\$ 173,84	R\$ 207,91	R\$ 4.771,53
01.03.07.03	46.12.150	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM	M	30,00	R\$ 225,30	R\$ 269,46	R\$ 8.083,80
01.03.07.04	46.12.290	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 700MM	M	120,00	R\$ 307,11	R\$ 367,30	R\$ 44.076,00
01.03.07.05	46.12.100	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 800MM	M	120,00	R\$ 454,90	R\$ 544,06	R\$ 65.287,20
01.03.07.06	46.12.310	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 900MM	M	90,00	R\$ 523,08	R\$ 625,60	R\$ 56.304,00
01.03.07.07	46.12.120	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1000MM	M	90,00	R\$ 636,89	R\$ 761,72	R\$ 68.554,80
01.03.07.08	92816	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 12/2015	M	10,93	R\$ 866,73	R\$ 1.036,61	R\$ 11.330,15
01.04			EVENTO 04 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 539.978,66
01.04.01			SERVIÇOS PRELIMINARES E BASE					R\$ 227.002,04
01.04.01.01	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_ 10/2018	M	910,02	R\$ 1,06	R\$ 1,27	R\$ 1.155,73
01.04.01.02	54.01.400	CDHU	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	3.156,35	R\$ 22,99	R\$ 27,50	R\$ 86.799,63
01.04.01.03	96400	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	609,95	R\$ 115,44	R\$ 138,07	R\$ 84.215,80
01.04.01.04	100996	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_ 07/2020	T	1.280,90	R\$ 4,30	R\$ 5,14	R\$ 6.583,83
01.04.01.05	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	21.348,25	R\$ 1,89	R\$ 2,26	R\$ 48.247,05
01.04.02			CAMADA DE REVESTIMENTO - CBUQ					R\$ 270.313,02
01.04.02.01	54.03.240	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	2.730,06	R\$ 14,55	R\$ 17,40	R\$ 47.503,04
01.04.02.02	54.03.230	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2.730,06	R\$ 7,31	R\$ 8,74	R\$ 23.860,72
01.04.02.03	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	112,61	R\$ 1,46	R\$ 1,75	R\$ 197,07
01.04.02.04	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	109,20	R\$ 1.440,25	R\$ 1.722,54	R\$ 188.101,37
01.04.02.05	101004	SINAPI	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_ 07/2020	T	327,60	R\$ 7,50	R\$ 8,97	R\$ 2.938,57
01.04.02.06	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	3.412,50	R\$ 1,89	R\$ 2,26	R\$ 7.712,25
01.04.03			CAMADA DE REVESTIMENTO - INTERTRAVADO					R\$ 42.663,60
01.04.03.01	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF_ 10/2022	M2	426,29	R\$ 79,54	R\$ 95,13	R\$ 40.552,97
01.04.03.02	100996	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_ 07/2020	T	40,41	R\$ 4,30	R\$ 5,14	R\$ 207,71
01.04.03.03	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	842,00	R\$ 1,89	R\$ 2,26	R\$ 1.902,92
01.05			EVENTO 05 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 31.593,97
01.05.01	70.03.001	CDHU	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IAI/A - ÁREA ATÉ 2,0 M²	M2	4,73	R\$ 1.552,21	R\$ 1.856,44	R\$ 8.780,96
01.05.02	5213863	SICRO	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	18,00	R\$ 474,09	R\$ 567,01	R\$ 10.206,18
01.05.03	70.02.001	CDHU	LIMPEZA, PRÉ MARCAÇÃO E PRÉ PINTURA DE SOLO	M2	88,18	R\$ 77,11	R\$ 92,22	R\$ 8.131,96
01.05.04	70.02.010	CDHU	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	88,18	R\$ 38,35	R\$ 45,87	R\$ 4.044,82
01.05.05	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_ 05/2021	M2	6,12	R\$ 58,75	R\$ 70,27	R\$ 430,05
01.06			EVENTO 06 - PASSEIO					R\$ 71.937,27
01.06.01	06.14.020	CDHU	CARGA MANUAL DE SOLO	M3	148,32	R\$ 12,22	R\$ 14,62	R\$ 2.168,44
01.06.02	05.10.020	CDHU	TRANSPORTE DE SOLO DE 1º E 2º CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM	M3	185,40	R\$ 7,97	R\$ 9,53	R\$ 1.766,86
01.06.03	06.11.020	CDHU	REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO	M3	185,40	R\$ 8,75	R\$ 10,47	R\$ 1.941,14
01.06.04	11.18.040	CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	55,18	R\$ 193,79	R\$ 231,77	R\$ 12.789,07
01.06.05	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 08/2022	M3	66,10	R\$ 660,80	R\$ 790,32	R\$ 52.240,15

 SETOR DE CONVÊNIOS ANEXO A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA									
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						NÃO DESONERADO		BDI = 19,60%	
REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPDS 192 - SICRO 1023									
Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL C/ BDI	
						S/ BDI	C/ BDI		
01.06.06	30.04.030	CDHU	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M2	3,50	R\$ 130,88	R\$ 156,53	R\$ 547,86	
01.06.07	34.02.100	CDHU	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M2	23,46	R\$ 17,24	R\$ 20,62	R\$ 483,75	
02.	ETAPA 02 - RECURSOS CONVÊNIO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEMANDA 046527 - Pavimentação e Drenagem Ruas Santa Catarina - Trecho 02, Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01 e Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02							R\$ 866.173,28	
02.01			EVENTO 07 - SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.525,87	
02.01.01	02.08.040	CDHU	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M2	6,00	R\$ 336,43	R\$ 402,37	R\$ 2.414,22	
02.01.02	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	2.097,46	R\$ 0,44	R\$ 0,53	R\$ 1.111,65	
02.02			EVENTO 08 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DA VIA					R\$ 19.435,38	
02.02.01	101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	1.102,46	R\$ 2,31	R\$ 2,76	R\$ 3.042,79	
02.02.02	100996	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	1.378,08	R\$ 4,30	R\$ 5,14	R\$ 7.083,33	
02.02.03	95426	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.378,08	R\$ 2,06	R\$ 2,46	R\$ 3.390,08	
02.02.04	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.378,08	R\$ 1,51	R\$ 1,81	R\$ 2.494,32	
02.02.05	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.063,62	R\$ 2,69	R\$ 3,22	R\$ 3.424,86	
02.03			EVENTO 09 - DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA					R\$ 215.200,54	
02.03.01			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.325,88	
02.03.01.01	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	315,16	R\$ 6,17	R\$ 7,38	R\$ 2.325,88	
02.03.02			DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 52.545,63	
02.03.02.01	54.06.151	CDHU	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO	M3	35,20	R\$ 404,89	R\$ 484,25	R\$ 17.045,60	
02.03.02.02	11.01.630	CDHU	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO	M3	35,20	R\$ 569,92	R\$ 681,62	R\$ 23.993,02	
02.03.02.03	54.06.160	CDHU	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPA	M3	8,28	R\$ 804,05	R\$ 961,64	R\$ 7.962,38	
02.03.02.04	10.02.020	CDHU	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	257,23	R\$ 11,52	R\$ 13,78	R\$ 3.544,63	
02.03.03			ESCAVAÇÕES REDE DE DRENAGEM					R\$ 18.678,26	
02.03.03.01	90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	478,97	R\$ 8,09	R\$ 9,68	R\$ 4.636,43	
02.03.03.02	90107	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	226,80	R\$ 7,98	R\$ 9,54	R\$ 2.163,67	
02.03.03.03	08.01.060	CDHU	ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO	M2	304,84	R\$ 21,73	R\$ 25,99	R\$ 7.922,79	
02.03.03.04	101622	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,45	R\$ 194,06	R\$ 232,10	R\$ 104,45	
02.03.03.05	07.11.020	CDHU	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	478,97	R\$ 6,72	R\$ 8,04	R\$ 3.850,92	
02.03.04			ESCAVAÇÕES EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM					R\$ 9.860,92	
02.03.04.01	07.02.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M3	227,30	R\$ 10,65	R\$ 12,74	R\$ 2.895,80	
02.03.04.02	07.02.040	CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M	M3	19,90	R\$ 12,01	R\$ 14,36	R\$ 285,76	
02.03.04.03	08.01.060	CDHU	ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO	M2	219,04	R\$ 21,73	R\$ 25,99	R\$ 5.692,85	
02.03.04.04	07.11.020	CDHU	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	122,70	R\$ 6,72	R\$ 8,04	R\$ 986,51	
02.03.05			BOCAS DE LOBO E LEÃO					R\$ 50.711,00	
02.03.05.01	97961	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	11,00	R\$ 2.459,50	R\$ 2.941,56	R\$ 32.357,16	
02.03.05.02	14.20.010	CDHU	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	2,34	R\$ 1.819,00	R\$ 2.175,52	R\$ 5.090,72	
02.03.05.03	49.12.058	CDHU	BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA	UN	4,00	R\$ 2.772,39	R\$ 3.315,78	R\$ 13.263,12	
02.03.06			POÇOS DE VISITA					R\$ 17.225,70	
02.03.06.01	102457	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA	UN	6,00	R\$ 1.651,48	R\$ 1.975,17	R\$ 11.851,02	
02.03.06.02	99240	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020	M	1,50	R\$ 686,20	R\$ 820,70	R\$ 1.231,05	
02.03.06.03	99318	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	5,50	R\$ 286,41	R\$ 342,55	R\$ 1.884,03	
02.03.06.04	49.06.420	CDHU	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE D 400 (RUPTURA > 400 KN)	UN	3,00	R\$ 523,70	R\$ 626,35	R\$ 1.879,05	

 SETOR DE CONVÊNIOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO									
ANEXO A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA									
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						NÃO DESONERADO		BDI = 19,60%	
REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPDS 192 - SICRO 1023									
Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL C/ BDI	
						S/ BDI	C/ BDI		
02.03.06.05	98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF 12/2020	UN	3,00	R\$ 106,06	R\$ 126,85	R\$ 380,55	
02.03.07			REDE DE DRENAGEM					R\$ 63.853,15	
02.03.07.01	46.12.270	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM	M	76,73	R\$ 136,21	R\$ 162,91	R\$ 12.500,08	
02.03.07.02	46.12.300	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 500MM	M	39,63	R\$ 173,84	R\$ 207,91	R\$ 8.239,47	
02.03.07.03	46.12.150	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM	M	160,00	R\$ 225,30	R\$ 269,46	R\$ 43.113,60	
02.04			EVENTO 10 - PAVIMENTAÇÃO - AV. PRES.D. GETÚLIO VARGAS					R\$ 424.438,49	
02.04.01			SERVIÇOS PRELIMINARES E BASE					R\$ 187.562,69	
02.04.01.01	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	711,06	R\$ 1,06	R\$ 1,27	R\$ 903,05	
02.04.01.02	54.01.400	CDHU	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	2.376,33	R\$ 22,99	R\$ 27,50	R\$ 65.349,08	
02.04.01.03	54.01.220	CDHU	BASE DE BICA CORRIDA	M3	467,37	R\$ 217,02	R\$ 259,56	R\$ 121.310,56	
02.04.02			CAMADA DE REVESTIMENTO - CBUQ					R\$ 221.856,68	
02.04.02.01	54.03.240	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	2.218,45	R\$ 14,55	R\$ 17,40	R\$ 38.601,03	
02.04.02.02	54.03.230	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2.218,45	R\$ 7,31	R\$ 8,74	R\$ 19.389,25	
02.04.02.03	54.03.210	CDHU	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	88,74	R\$ 1.543,97	R\$ 1.846,59	R\$ 163.866,40	
02.04.03			CAMADA DE REVESTIMENTO - INTERTRAVADO					R\$ 15.019,12	
02.04.03.01	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	157,88	R\$ 79,54	R\$ 95,13	R\$ 15.019,12	
02.05			EVENTO 11 - PAVIMENTAÇÃO - RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02					R\$ 96.554,02	
02.05.01			SERVIÇOS PRELIMINARES E BASE					R\$ 42.826,83	
02.05.01.01	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	127,92	R\$ 1,06	R\$ 1,27	R\$ 162,46	
02.05.01.02	54.01.400	CDHU	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	537,26	R\$ 22,99	R\$ 27,50	R\$ 14.774,65	
02.05.01.03	54.01.220	CDHU	BASE DE BICA CORRIDA	M3	107,45	R\$ 217,02	R\$ 259,56	R\$ 27.889,72	
02.05.02			CAMADA DE REVESTIMENTO - CBUQ					R\$ 53.727,19	
02.05.02.01	54.03.240	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	537,26	R\$ 14,55	R\$ 17,40	R\$ 9.348,32	
02.05.02.02	54.03.230	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	537,26	R\$ 7,31	R\$ 8,74	R\$ 4.695,65	
02.05.02.03	54.03.210	CDHU	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	21,49	R\$ 1.543,97	R\$ 1.846,59	R\$ 39.683,22	
02.06			EVENTO 12 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 67.406,72	
02.06.01	70.03.001	CDHU	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IAI/A - ÁREA ATÉ 2,0 M²	M2	4,41	R\$ 1.552,21	R\$ 1.856,44	R\$ 8.186,90	
02.06.02	5213863	SICRO	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	72,00	R\$ 474,09	R\$ 567,01	R\$ 40.824,72	
02.06.03	70.02.001	CDHU	LIMPEZA, PRÉ MARCAÇÃO E PRÉ PINTURA DE SOLO	M2	114,95	R\$ 77,11	R\$ 92,22	R\$ 10.600,69	
02.06.04	70.02.010	CDHU	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	105,95	R\$ 38,35	R\$ 45,87	R\$ 4.859,93	
02.06.05	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	M2	41,76	R\$ 58,75	R\$ 70,27	R\$ 2.934,48	
02.07			EVENTO 13 - PASSEIO (RAMPAS E ACESSIBILIDADE)					R\$ 38.913,00	
02.07.01	06.14.020	CDHU	CARGA MANUAL DE SOLO	M3	78,68	R\$ 12,22	R\$ 14,62	R\$ 1.150,30	
02.07.02	05.10.020	CDHU	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM	M3	98,35	R\$ 7,97	R\$ 9,53	R\$ 937,28	
02.07.03	06.11.020	CDHU	REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO	M3	98,35	R\$ 8,75	R\$ 10,47	R\$ 1.029,72	
02.07.04	11.18.040	CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	28,62	R\$ 193,79	R\$ 231,77	R\$ 6.633,26	
02.07.05	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	34,32	R\$ 660,80	R\$ 790,32	R\$ 27.123,78	
02.07.06	30.04.030	CDHU	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M2	4,75	R\$ 130,88	R\$ 156,53	R\$ 743,52	
02.07.07	34.02.100	CDHU	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M2	62,81	R\$ 17,24	R\$ 20,62	R\$ 1.295,14	
02.08			EVENTO 14 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 699,26	
02.08.01	01.20.280	CDHU	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE ÁREA PAVIMENTADA PARA VEÍCULO E PEDESTRE	M2	2.913,59	R\$ 0,20	R\$ 0,24	R\$ 699,26	
03.	ETAPA 03 - RECURSOS CONVÊNIO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEMANDA 046527 - Pavimentação e Drenagem Rua Bahia - Trecho 02							R\$ 357.115,34	
03.01			EVENTO 15 - SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 291,08	
03.01.02	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018	M2	549,20	R\$ 0,44	R\$ 0,53	R\$ 291,08	
03.02			EVENTO 16 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DA VIA					R\$ 43.845,76	
03.02.01	101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	2.921,74	R\$ 2,31	R\$ 2,76	R\$ 8.064,00	
03.02.02	100996	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF 07/2020	T	3.652,18	R\$ 4,30	R\$ 5,14	R\$ 18.772,21	
03.02.03	95426	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	3.652,18	R\$ 2,06	R\$ 2,46	R\$ 8.984,36	
03.02.04	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	M3	3.652,18	R\$ 1,51	R\$ 1,81	R\$ 6.610,45	
03.02.05	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	439,36	R\$ 2,69	R\$ 3,22	R\$ 1.414,74	

ANEXO A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÃO DESONERADO

BDI = 19,60%

REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL C/ BDI
						S/ BDI	C/ BDI	
03.03			EVENTO 17 - DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA					R\$ 100.674,34
03.03.01			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.122,72
03.03.01.01	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	152,13	R\$ 6,17	R\$ 7,38	R\$ 1.122,72
03.03.02			DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 24.055,44
03.03.02.01	54.06.151	CDHU	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO	M3	14,80	R\$ 404,89	R\$ 484,25	R\$ 7.166,90
03.03.02.02	11.01.630	CDHU	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO	M3	14,80	R\$ 569,92	R\$ 681,62	R\$ 10.087,98
03.03.02.03	54.06.160	CDHU	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPA	M3	4,89	R\$ 804,05	R\$ 961,64	R\$ 4.702,42
03.03.02.04	10.02.020	CDHU	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	152,26	R\$ 11,52	R\$ 13,78	R\$ 2.098,14
03.03.03			ESCAVAÇÕES REDE DE DRENAGEM					R\$ 18.046,47
03.03.03.01	90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	148,46	R\$ 8,09	R\$ 9,68	R\$ 1.437,09
03.03.03.02	90107	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	350,19	R\$ 7,98	R\$ 9,54	R\$ 3.340,81
03.03.03.03	08.01.060	CDHU	ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO	M2	294,56	R\$ 21,73	R\$ 25,99	R\$ 7.655,61
03.03.03.04	101622	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	6,91	R\$ 194,06	R\$ 232,10	R\$ 1.603,81
03.03.03.05	07.11.020	CDHU	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	498,65	R\$ 6,72	R\$ 8,04	R\$ 4.009,15
03.03.04			ESCAVAÇÕES EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM					R\$ 3.870,20
03.03.04.01	07.02.020	CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M3	48,03	R\$ 10,65	R\$ 12,74	R\$ 611,90
03.03.04.02	07.02.040	CDHU	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M	M3	28,94	R\$ 12,01	R\$ 14,36	R\$ 415,58
03.03.04.03	08.01.060	CDHU	ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO	M2	91,24	R\$ 21,73	R\$ 25,99	R\$ 2.371,33
03.03.04.04	07.11.020	CDHU	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	58,63	R\$ 6,72	R\$ 8,04	R\$ 471,39
03.03.05			BOCAS DE LOBO E LEÃO					R\$ 14.895,28
03.03.05.01	97961	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 2.459,50	R\$ 2.941,56	R\$ 11.766,24
03.03.05.02	14.20.010	CDHU	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	0,85	R\$ 1.819,00	R\$ 2.175,52	R\$ 1.849,19
03.03.05.03	97933	SINAPI	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 1.070,11	R\$ 1.279,85	R\$ 1.279,85
03.03.06			POÇOS DE VISITA					R\$ 5.709,84
03.03.06.01	102457	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA	UN	2,00	R\$ 1.651,48	R\$ 1.975,17	R\$ 3.950,34
03.03.06.02	99240	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020	M	1,00	R\$ 686,20	R\$ 820,70	R\$ 820,70
03.03.06.03	99318	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	2,00	R\$ 286,41	R\$ 342,55	R\$ 685,10
03.03.06.04	98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 106,06	R\$ 126,85	R\$ 253,70
03.03.07			REDE DE DRENAGEM					R\$ 32.974,39
03.03.07.01	46.12.270	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM	M	25,82	R\$ 136,21	R\$ 162,91	R\$ 4.206,34
03.03.07.02	46.12.300	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 500MM	M	85,58	R\$ 173,84	R\$ 207,91	R\$ 17.792,94
03.03.07.03	46.12.150	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM	M	40,73	R\$ 225,30	R\$ 269,46	R\$ 10.975,11
03.04			EVENTO 18 - PAVIMENTAÇÃO					R\$ 177.987,97
03.04.01			SERVIÇOS PRELIMINARES E BASE					R\$ 78.549,66
03.04.01.01	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	219,68	R\$ 1,06	R\$ 1,27	R\$ 278,99
03.04.01.02	54.01.400	CDHU	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	997,95	R\$ 22,99	R\$ 27,50	R\$ 27.443,63
03.04.01.03	54.01.220	CDHU	BASE DE BICA CORRIDA	M3	195,82	R\$ 217,02	R\$ 259,56	R\$ 50.827,04
03.04.02			CAMADA DE REVESTIMENTO - CBUQ					R\$ 92.275,97
03.04.02.01	54.03.240	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	922,66	R\$ 14,55	R\$ 17,40	R\$ 16.054,28
03.04.02.02	54.03.230	CDHU	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	922,66	R\$ 7,31	R\$ 8,74	R\$ 8.064,05
03.04.02.03	54.03.210	CDHU	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	36,91	R\$ 1.543,97	R\$ 1.846,59	R\$ 68.157,64
03.04.03			CAMADA DE REVESTIMENTO - INTERTRAVADO					R\$ 7.162,34
03.04.03.01	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	75,29	R\$ 79,54	R\$ 95,13	R\$ 7.162,34
03.05			EVENTO 19 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 9.235,10
03.05.01	70.03.001	CDHU	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IAlA - ÁREA ATÉ 2,0 M²	M2	0,83	R\$ 1.552,21	R\$ 1.856,44	R\$ 1.540,85
03.05.02	5213863	SICRO	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	9,00	R\$ 474,09	R\$ 567,01	R\$ 5.103,09
03.05.03	70.02.001	CDHU	LIMPEZA, PRÉ MARCAÇÃO E PRÉ PINTURA DE SOLO	M2	15,65	R\$ 77,11	R\$ 92,22	R\$ 1.443,24

ANEXO A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

NÃO DESONERADO

BDI = 19,60%

REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPDS 192 - SICRO 1023

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		TOTAL C/ BDI
						S/ BDI	C/ BDI	
03.05.04	70.02.010	CDHU	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	15,65	R\$ 38,35	R\$ 45,87	R\$ 717,87
03.05.05	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	6,12	R\$ 58,75	R\$ 70,27	R\$ 430,05
03.06			EVENTO 20 - PASSEIO (RAMPAS E ACESSIBILIDADE)					R\$ 24.841,58
03.06.01	06.14.020	CDHU	CARGA MANUAL DE SOLO	M3	18,56	R\$ 12,22	R\$ 14,62	R\$ 271,35
03.06.02	05.10.020	CDHU	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM	M3	23,20	R\$ 7,97	R\$ 9,53	R\$ 221,10
03.06.03	06.11.020	CDHU	REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO	M3	23,20	R\$ 8,75	R\$ 10,47	R\$ 242,90
03.06.04	11.18.040	CDHU	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	6,75	R\$ 193,79	R\$ 231,77	R\$ 1.564,45
03.06.05	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	8,10	R\$ 660,80	R\$ 790,32	R\$ 6.401,59
03.06.06	30.04.030	CDHU	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M2	1,31	R\$ 130,88	R\$ 156,53	R\$ 205,05
03.06.07	34.02.100	CDHU	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M2	772,80	R\$ 17,24	R\$ 20,62	R\$ 15.935,14
03.07			EVENTO 21 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 239,51
03.07.01	01.20.280	CDHU	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE ÁREA PAVIMENTADA PARA VEÍCULO E PEDESTRE	M2	997,95	R\$ 0,20	R\$ 0,24	R\$ 239,51
04.	ETAPA 04 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RECURSOS PRÓPRIOS PMAS							R\$ 799.202,84
04.01			EVENTO 22 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 5.007,34
04.01.01	03.01.020	CDHU	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	12,69	R\$ 223,96	R\$ 267,86	R\$ 3.399,14
04.01.02	05.07.040	CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	12,69	R\$ 105,96	R\$ 126,73	R\$ 1.608,20
04.02			EVENTO 23 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DRENAGEM (Travessas Avenida Getúlio Vargas)					R\$ 100.278,82
04.02.01	90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	27,00	R\$ 8,09	R\$ 9,68	R\$ 261,36
04.02.02	101622	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	27,00	R\$ 194,06	R\$ 232,10	R\$ 6.266,70
04.02.03	07.11.020	CDHU	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	31,00	R\$ 6,72	R\$ 8,04	R\$ 249,24
04.02.04	97961	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	14,00	R\$ 2.459,50	R\$ 2.941,56	R\$ 41.181,84
04.02.05	46.12.150	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM	M	163,00	R\$ 225,30	R\$ 269,46	R\$ 43.921,98
04.02.06	34.02.100	CDHU	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M2	407,26	R\$ 17,24	R\$ 20,62	R\$ 8.397,70
04.03			EVENTO 24 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DRENAGEM (Ligação com galerias de drenagem da Rua Rio Grande do Sul e da Avenida Getúlio Vargas)					R\$ 79.397,98
04.02.01	90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	281,25	R\$ 8,09	R\$ 9,68	R\$ 2.722,50
04.02.02	101622	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	10,00	R\$ 194,06	R\$ 232,10	R\$ 2.321,00
04.02.03	07.11.020	CDHU	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	281,25	R\$ 6,72	R\$ 8,04	R\$ 2.261,25
04.02.04	46.12.160	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM	M	125,00	R\$ 444,38	R\$ 531,48	R\$ 66.435,00
04.02.05	49.12.140	CDHU	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIPO PMSP - BALÃO	UN	1,00	R\$ 4.730,96	R\$ 5.658,23	R\$ 5.658,23
04.04			EVENTO 25 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DRENAGEM (Ligação Drenagem Av. Presidente Tancredo Neves)					R\$ 261.710,02
04.03.01	90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.410,00	R\$ 8,09	R\$ 9,68	R\$ 13.648,80
04.03.02	101622	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	11,60	R\$ 194,06	R\$ 232,10	R\$ 2.692,36
04.03.03	07.11.020	CDHU	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	1.410,00	R\$ 6,72	R\$ 8,04	R\$ 11.336,40
04.03.04	46.12.140	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1200MM	M	145,00	R\$ 941,97	R\$ 1.126,60	R\$ 163.357,00
04.03.05	46.12.150	CDHU	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM	M	50,00	R\$ 225,30	R\$ 269,46	R\$ 13.473,00
04.03.06	102738	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISADE DE 0º, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	4,00	R\$ 2.131,72	R\$ 2.549,54	R\$ 10.198,16
04.03.07	102741	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISADE DE 0º, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	3,00	R\$ 7.497,16	R\$ 8.966,60	R\$ 26.899,80
04.03.08	34.02.100	CDHU	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M2	975,00	R\$ 17,24	R\$ 20,62	R\$ 20.104,50

ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.
 REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

01.	ETAPA 01 - RECURSOS CONVÊNIO EMENTA PARLAMENTAR - CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL - Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 - PROGRAMA: Apoio a projetos de desenvolvimento					
01.01	EVENTO 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.01.01	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON					4,50 M2
	PLACA PADRÃO GOVERNO ESTADO SP	Comprimento (m)	Largura (m)	Quant.	Área (m²)	
		3,00	1,50	1,00	4,50	
				Total:	4,50	
01.01.02	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE					2.275,06 M2
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	Obs.	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	Lado Direito	455,01	2,50	1.137,53	
		Lado Esquerdo	455,01	2,50	1.137,53	
				Total:	2.275,06	
01.02	EVENTO 02 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DA VIA					
01.02.01	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020					1.510,63 M3
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	Obs.	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Altura média (m) Volume (m³)
		regularização e conformação do terreno - área pavimento natural consolidado. Ver Nota 01.	455,01	6,60	3.003,07	0,20 600,61
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	regularização e conformação do terreno - lateral direita	455,01	2,00	910,02	0,50 455,01
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	regularização e conformação do terreno - lateral esquerda	455,01	2,00	910,02	0,50 455,01
					Total:	1.510,63
	Notas: 01: a regularização deverá ser executada considerando o greide final da rua na altura das sarjetas. Foi considerando na largura a faixa de rolamento, a sarjeta, a guia e mais 50 cm para a extrusora.					
01.02.02	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA					1.888,29 T
	Movimentação de solo dentro da obra - o solo excedente deverá ser colocado em terreno disponibilizado pela PMAS.	Volume (m³)	Empolamento	Volume Total (m³)		
		1.510,63	1,25	1.888,29		
			Total:	1.888,29		
01.02.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020					1.888,29 M3XKM
	Movimentação de solo dentro da obra - o solo excedente deverá ser colocado em terreno disponibilizado pela PMAS.	Volume (m³)	Distância Média (km)	KMXM		
		1.888,29	1,00	1.888,29		
			Total:	1.888,29		
01.02.04	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019					1.888,29 M3
	Movimentação de solo dentro da obra - o solo excedente deverá ser colocado em terreno disponibilizado pela PMAS.	Volume (m³)				
		1.888,29				
		Total:	1.888,29			
01.02.05	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019					1.820,04 M2
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	Obs.	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	
		regularização e conformação do terreno - lateral direita	455,01	2,00	910,02	
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	regularização e conformação do terreno - lateral esquerda	455,01	2,00	910,02	
				Total:	1.820,04	
	Obs: Laterais da faixa de rolamento. A regularização e compactação da via estão inclusas no item abertura de caixa.					
01.03	EVENTO 03 - DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA					
01.03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.03.01.01	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018					530,28 M
	Trecho	Comprimento (m)				
L15.17	PV15.06 - PV15.07	30,00				
L15.18	PV15.07 - PV15.08	30,00				
L15.19	PV15.08 - BLC15.13	2,02				
L15.20	BLC15.12 - BLC15.13	5,80				
L15.21	PV15.08 - PV15.09	30,00				
L15.22	PV15.09 - PV15.10	30,00				
L15.23	PV15.10 - BLC15.15	3,00				
L15.24	BLC15.14 - BLC15.15	5,80				
L15.25	PV15.10 - PV15.11	30,00				
L15.26	PV15.11 - PV15.12	30,00				
L15.27	PV15.12 - BLC15.17	3,00				
L15.28	BLC15.16 - BLC15.17	5,80				
L15.29	PV15.12 - PV15.13	30,00				
L15.30	PV15.13 - PV15.14	30,00				
L15.31	PV15.14 - BLC15.19	3,00				
L15.32	BLC15.18 - BLC15.19	5,80				
L15.33	PV15.14 - PV15.15	30,00				
L15.34	PV15.15 - PV15.16	30,00				
L15.35	PV15.16 - BLC15.21	3,00				
L15.36	BLC15.20 - BLC15.21	5,80				
L15.37	PV15.16 - PV15.17	30,00				
L15.38	PV15.17 - BLC15.23	2,93				
L15.39	BLC15.22 - BLC15.23	5,80				
L15.40	PV15.17 - PV15.18	30,00				
L15.41	PV15.18 - PV15.19	30,00				

 SETOR DE CONVÊNIOS ANEXO B - MEMORIAL DE CALCULO								
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.								
REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023								
L15.42	PV15.19 - BLC15.25	3,00						
L15.43	BLC15.24 - BLC15.25	5,80						
L15.44	PV15.19 - PV15.20	30,00						
L15.45	PV15.20 - PV15.21	30,00						
L15.46	PV15.21 - BLC15.27	3,00						
L15.47	BLC15.26 - BLC15.27	5,80						
L15.48	PV15.21 - PV15.22	10,93						
Total:		530,28						
01.03.02	DRENAGEM SUPERFICIAL							
01.03.02.01	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO						52,22	M3
	Trecho	Obs.	Guia Reta (m)	Guia Curva (m)	Comprimento Total (m)	Área Perfil (m²)	Volume (m³)	
	Av. Getúlio Vargas - TRECHO3	Rua Mato Grosso - Rua Goiás Guia e sarjeta - Lado Direito	86,20	19,75	105,95	0,055	5,83	
	Av. Getúlio Vargas - TRECHO3	Rua Goiás - Rua Amazonas Guia e sarjeta - Lado Direito	92,88	20,14	113,02	0,055	6,22	
	Av. Getúlio Vargas - TRECHO3	Rua Amazonas - Rua Lotério Pinto Guia e sarjeta - Lado Direito	90,91	19,54	110,45	0,055	6,07	
	Av. Getúlio Vargas - TRECHO3	Rua Lotério Pinto - Rua Copacabana Guia e sarjeta - Lado Direito	120,92	22,82	143,74	0,055	7,91	
	Av. Getúlio Vargas - TRECHO3	Rua Mato Grosso - Rua Goiás Guia e sarjeta - Lado Esquerdo	85,01	19,94	104,95	0,055	5,77	
	Av. Getúlio Vargas - TRECHO3	Rua Goiás - Rua Amazonas Guia e sarjeta - Lado Esquerdo	93,00	19,93	112,93	0,055	6,21	
	Av. Getúlio Vargas - TRECHO3	Rua Amazonas - Rua Lotério Pinto Guia e sarjeta - Lado Esquerdo	91,06	19,94	111,00	0,055	6,11	
	Av. Getúlio Vargas - TRECHO3	Rua Lotério Pinto - Rua Copacabana Guia e sarjeta - Lado Esquerdo	122,18	25,15	147,33	0,055	8,10	
				Total:	949,37	Total:	52,22	
01.03.02.02	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO						52,22	M3
	Trecho	Obs.	Guia Reta (m)	Guia Curva (m)	Comprimento Total (m)	Área Perfil (m²)	Volume (m³)	
	Av. Getúlio Vargas - TRECHO3	Rua Mato Grosso - Rua Goiás Guia e sarjeta - Lado Direito	86,20	19,75	105,95	0,055	5,83	
	Av. Getúlio Vargas - TRECHO3	Rua Goiás - Rua Amazonas Guia e sarjeta - Lado Direito	92,88	20,14	113,02	0,055	6,22	
	Av. Getúlio Vargas - TRECHO3	Rua Amazonas - Rua Lotério Pinto Guia e sarjeta - Lado Direito	90,91	19,54	110,45	0,055	6,07	
	Av. Getúlio Vargas - TRECHO3	Rua Lotério Pinto - Rua Copacabana Guia e sarjeta - Lado Direito	120,92	22,82	143,74	0,055	7,91	
	Av. Getúlio Vargas - TRECHO3	Rua Mato Grosso - Rua Goiás Guia e sarjeta - Lado Esquerdo	85,01	19,94	104,95	0,055	5,77	
	Av. Getúlio Vargas - TRECHO3	Rua Goiás - Rua Amazonas Guia e sarjeta - Lado Esquerdo	93,00	19,93	112,93	0,055	6,21	
	Av. Getúlio Vargas - TRECHO3	Rua Amazonas - Rua Lotério Pinto Guia e sarjeta - Lado Esquerdo	91,06	19,94	111,00	0,055	6,11	
	Av. Getúlio Vargas - TRECHO3	Rua Lotério Pinto - Rua Copacabana Guia e sarjeta - Lado Esquerdo	122,18	25,15	147,33	0,055	8,10	
				Total:	949,37	Total:	52,22	
01.03.02.03	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPA						16,16	M3
	Obs.	Comprimento (m)	Largura (m)	Espessura (m)	Volume (m³)			
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	Cruzamento Rua Mato Grosso - Lado Direito	19,81	1,00	0,10	1,98		
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	Cruzamento Rua Mato Grosso - Lado Esquerdo	22,12	1,00	0,10	2,21		
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	Cruzamento Rua Amazonas - Lado Direito	19,30	1,00	0,10	1,93		
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	Cruzamento Rua Amazonas - Lado Esquerdo	20,46	1,00	0,10	2,05		
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	Cruzamento Rua Lotério Pinto - Lado Direito	19,54	1,00	0,10	1,95		
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	Cruzamento Rua Lotério Pinto - Lado Esquerdo	20,05	1,00	0,10	2,01		
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	Cruzamento Rua Goiás - Lado Esquerdo	20,89	1,00	0,10	2,09		
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	Cruzamento Rua Goiás - Lado Direito	19,43	1,00	0,10	1,94		
				Total:		16,16		
01.03.02.04	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO						502,58	KG
	Tela Q 196	Obs.	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Peso / m²	Peso Total (kg)	
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	Cruzamento Rua Mato Grosso - Lado Direito	19,81	1,00	19,81	3,11	61,61	
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	Cruzamento Rua Mato Grosso - Lado Esquerdo	22,12	1,00	22,12	3,11	68,79	
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	Cruzamento Rua Amazonas - Lado Direito	19,30	1,00	19,30	3,11	60,02	
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	Cruzamento Rua Amazonas - Lado Esquerdo	20,46	1,00	20,46	3,11	63,63	
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	Cruzamento Rua Lotério Pinto - Lado Direito	19,54	1,00	19,54	3,11	60,77	
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	Cruzamento Rua Lotério Pinto - Lado Esquerdo	20,05	1,00	20,05	3,11	62,36	
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	Cruzamento Rua Goiás - Lado Esquerdo	20,89	1,00	20,89	3,11	64,97	
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 03	Cruzamento Rua Goiás - Lado Direito	19,43	1,00	19,43	3,11	60,43	
						Total:	502,58	

Página 2

SETOR DE

CONVÊNIOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

ANEXOS

AN

ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.

REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

L15.42	PV15.19 - BLC15.25	0,50	1,25	3,00	1,70	2,00	-
L15.43	BLC15.24 - BLC15.25	0,40	1,20	5,80	1,60	2,00	-
L15.44	PV15.19 - PV15.20	1,00	2,38	30,00	2,20	2,00	142,80
L15.45	PV15.20 - PV15.21	1,00	1,85	30,00	2,20	2,00	111,00
L15.46	PV15.21 - BLC15.27	0,50	1,25	3,00	1,70	2,00	-
L15.47	BLC15.26 - BLC15.27	0,40	1,20	5,80	1,60	2,00	-
L15.48	PV15.21 - PV15.22	1,20	2,15	10,93	2,40	2,00	47,00
Total:							1.992,89

Obs: escoramento apenas nos trechos com altura superior a 1,25m.

01.03.03.04	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020							20,67	M3
	Trecho	Tubo		Comprimento (m)	Largura (m)	Espessura (m)	Volume (m³)		
L15.17	PV15.06 - PV15.07	0,60	30,00	0,60	0,05	0,90			
L15.18	PV15.07 - PV15.08	0,70	30,00	0,70	0,05	1,05			
L15.19	PV15.08 - BLC15.13	0,50	2,02	0,50	0,05	0,05			
L15.20	BLC15.12 - BLC15.13	0,40	5,80	0,40	0,05	0,12			
L15.21	PV15.08 - PV15.09	0,70	30,00	0,70	0,05	1,05			
L15.22	PV15.09 - PV15.10	0,70	30,00	0,70	0,05	1,05			
L15.23	PV15.10 - BLC15.15	0,50	3,00	0,50	0,05	0,08			
L15.24	BLC15.14 - BLC15.15	0,40	5,80	0,40	0,05	0,12			
L15.25	PV15.10 - PV15.11	0,70	30,00	0,70	0,05	1,05			
L15.26	PV15.11 - PV15.12	0,80	30,00	0,80	0,05	1,20			
L15.27	PV15.12 - BLC15.17	0,50	3,00	0,50	0,05	0,08			
L15.28	BLC15.16 - BLC15.17	0,40	5,80	0,40	0,05	0,12			
L15.29	PV15.12 - PV15.13	0,80	30,00	0,80	0,05	1,20			
L15.30	PV15.13 - PV15.14	0,80	30,00	0,80	0,05	1,20			
L15.31	PV15.14 - BLC15.19	0,50	3,00	0,50	0,05	0,08			
L15.32	BLC15.18 - BLC15.19	0,40	5,80	0,40	0,05	0,12			
L15.33	PV15.14 - PV15.15	0,80	30,00	0,80	0,05	1,20			
L15.34	PV15.15 - PV15.16	0,90	30,00	0,90	0,05	1,35			
L15.35	PV15.16 - BLC15.21	0,50	3,00	0,50	0,05	0,08			
L15.36	BLC15.20 - BLC15.21	0,40	5,80	0,40	0,05	0,12			
L15.37	PV15.16 - PV15.17	0,90	30,00	0,90	0,05	1,35			
L15.38	PV15.17 - BLC15.23	0,50	2,93	0,50	0,05	0,07			
L15.39	BLC15.22 - BLC15.23	0,40	5,80	0,40	0,05	0,12			
L15.40	PV15.17 - PV15.18	0,90	30,00	0,90	0,05	1,35			
L15.41	PV15.18 - PV15.19	1,00	30,00	1,00	0,05	1,50			
L15.42	PV15.19 - BLC15.25	0,50	3,00	0,50	0,05	0,08			
L15.43	BLC15.24 - BLC15.25	0,40	5,80	0,40	0,05	0,12			
L15.44	PV15.19 - PV15.20	1,00	30,00	1,00	0,05	1,50			
L15.45	PV15.20 - PV15.21	1,00	30,00	1,00	0,05	1,50			
L15.46	PV15.21 - BLC15.27	0,50	3,00	0,50	0,05	0,08			
L15.47	BLC15.26 - BLC15.27	0,40	5,80	0,40	0,05	0,12			
L15.48	PV15.21 - PV15.22	1,20	10,93	1,20	0,05	0,66			
				Total:		20,67			

01.03.03.05	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR							2.167,77	M3
Trecho	Tubo	Cota Montante	Cota Juzante	Altura Média (m)	Comprimento (m)	Largura	Volume (m³)		
L15.17	PV15.06 - PV15.07	0,60	1,30	1,30	30,00	1,80	70,20		
L15.18	PV15.07 - PV15.08	0,70	2,50	1,40	1,95	30,00	111,15		
L15.19	PV15.08 - BLC15.13	0,50	3,00	1,50	2,25	2,02	7,73		
L15.20	BLC15.12 - BLC15.13	0,40	1,20	1,20	5,80	1,60	11,14		
L15.21	PV15.08 - PV15.09	0,70	1,35	1,35	30,00	1,90	76,95		
L15.22	PV15.09 - PV15.10	0,70	2,55	1,40	1,98	30,00	112,86		
L15.23	PV15.10 - BLC15.15	0,50	1,25	1,25	3,00	1,70	6,38		
L15.24	BLC15.14 - BLC15.15	0,40	1,20	1,20	5,80	1,60	11,14		
L15.25	PV15.10 - PV15.11	0,70	2,50	1,40	1,95	30,00	111,15		
L15.26	PV15.11 - PV15.12	0,80	3,00	1,50	2,25	30,00	135,00		
L15.27	PV15.12 - BLC15.17	0,50	1,25	1,25	3,00	1,70	6,38		
L15.28	BLC15.16 - BLC15.17	0,40	1,20	1,20	5,80	1,60	11,14		
L15.29	PV15.12 - PV15.13	0,80	3,30	1,80	2,55	30,00	153,00		
L15.30	PV15.13 - PV15.14	0,80	3,15	1,50	2,33	30,00	139,80		
L15.31	PV15.14 - BLC15.19	0,50	1,25	1,25	3,00	1,70	6,38		
L15.32	BLC15.18 - BLC15.19	0,40	1,20	1,20	5,80	1,60	11,14		
L15.33	PV15.14 - PV15.15	0,80	3,30	1,50	2,40	30,00	144,00		
L15.34	PV15.15 - PV15.16	0,90	3,55	1,60	2,58	30,00	162,54		
L15.35	PV15.16 - BLC15.21	0,50	1,25	1,25	3,00	1,70	6,38		
L15.36	BLC15.20 - BLC15.21	0,40	1,20	1,20	5,80	1,60	11,14		
L15.37	PV15.16 - PV15.17	0,90	3,40	1,90	2,65	30,00	166,95		
L15.38	PV15.17 - BLC15.23	0,50	1,25	1,25	2,93	1,70	6,23		
L15.39	BLC15.22 - BLC15.23	0,40	1,20	1,20	5,80	1,60	11,14		
L15.40	PV15.17 - PV15.18	0,90	3,00	1,61	2,31	30,00	145,53		
L15.41	PV15.18 - PV15.19	1,00	3,20	1,70	2,45	30,00	161,70		
L15.42	PV15.19 - BLC15.25	0,50	1,25	1,25	3,00	1,70	6,38		
L15.43	BLC15.24 - BLC15.25	0,40	1,20	1,20	5,80	1,60	11,14		
L15.44	PV15.19 - PV15.20	1,00	3,05	1,70	2,38	30,00	157,08		
L15.45	PV15.20 - PV15.21	1,00	2,00	1,70	1,85	30,00	122,10		
L15.46	PV15.21 - BLC15.27	0,50	1,25	1,25	3,00	1,70	6,38		
L15.47	BLC15.26 - BLC15.27	0,40	1,20	1,20	5,80	1,60	11,14		
L15.48	PV15.21 - PV15.22	1,20	2,20	2,10	2,15	10,93	56,40		
Total:							2.167,77		

01.03.04	ESCAVAÇÕES EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM								
01.03.04.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M							129,02	M3
Equipamento	Comprimento Equipamento (m)	Largura Equipamento (m)	Altura Equipamento (m)	Comprimento Vala (m)	Largura Vala (m)	Altura Cava (m)	Volume (m³)		
BLC 15.12	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	8,06		
BLC 15.13	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	8,06		
BLC 15.14	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	8,06		
BLC 15.15	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	8,06		
BLC 15.16	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	8,06		
BLC 15.17	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	8,06		
BLC 15.18	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	8,06		
BLC 15.19	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	8,06		
BLC 15.20	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	8,06		
BLC 15.21	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	8,06		
BLC 15.22	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	8,06		
BLC 15.23	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	8,06		
BLC 15.24	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	8,06		
BLC 15.25	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	8,06		
BLC 15.26	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	8,06		

ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.

REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

BLC 15.27	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	8,06
PV15.07		1,20	2,55		2,20	2,55	-
PV15.08		1,20	2,85		2,20	2,85	-
PV15.09		1,20	2,55		2,20	2,55	-
PV15.10		1,20	2,65		2,20	2,65	-
PV15.11		1,50	3,00		2,50	3,00	-
PV15.12		1,50	3,30		2,50	3,30	-
PV15.13		1,50	3,15		2,50	3,15	-
PV15.14		1,50	3,30		2,50	3,30	-
PV15.15		1,50	3,55		2,50	3,55	-
PV15.16		1,50	3,40		2,50	3,40	-
PV15.17		1,50	3,00		2,50	3,00	-
PV15.18		1,50	3,20		2,50	3,20	-
PV15.19		1,50	3,05		2,50	3,05	-
PV15.20		1,50	2,00		2,50	2,00	-
PV15.21		1,50	2,20		2,50	2,20	-
Total:							129,02

01.03.04.02 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 80,50 M3

Equipamento	Comprimento Equipamento (m)	Largura Equipamento (m)	Altura Equipamento (m)	Comprimento Vala (m)	Largura Vala (m)	Altura Cava (m)	Volume (m³)
BLC 15.12	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.13	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.14	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.15	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.16	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.17	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.18	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.19	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.20	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.21	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.22	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.23	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.24	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.25	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.26	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.27	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
PV15.07	-	1,20	2,55	-	2,20	2,55	9,69
PV15.08	-	1,20	2,85	-	2,20	2,85	10,83
PV15.09	-	1,20	2,55	-	2,20	2,55	9,69
PV15.10	-	1,20	2,65	-	2,20	2,65	10,07
PV15.11	-	1,50	3,00	-	2,50	3,00	14,72
PV15.12	-	1,50	3,30	-	2,50	3,30	-
PV15.13	-	1,50	3,15	-	2,50	3,15	-
PV15.14	-	1,50	3,30	-	2,50	3,30	-
PV15.15	-	1,50	3,55	-	2,50	3,55	-
PV15.16	-	1,50	3,40	-	2,50	3,40	-
PV15.17	-	1,50	3,00	-	2,50	3,00	14,72
PV15.18	-	1,50	3,20	-	2,50	3,20	-
PV15.19	-	1,50	3,05	-	2,50	3,05	-
PV15.20	-	1,50	2,00	-	2,50	2,00	-
PV15.21	-	1,50	2,20	-	2,50	2,20	10,79
Total:							80,50

01.03.04.03 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 35,86 M3

Equipamento	Comprimento Equipamento (m)	Largura Equipamento (m)	Altura Equipamento (m)	Comprimento Cava (m)	Largura Cava (m)	Altura Cava (m)	Volume (m³)
BLC 15.12	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.13	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.14	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.15	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.16	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.17	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.18	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.19	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.20	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.21	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.22	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.23	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.24	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.25	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.26	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
BLC 15.27	1,40	1,40	1,40	2,40	2,40	1,40	-
PV15.07	-	1,20	2,55	-	2,20	2,55	-
PV15.08	-	1,20	2,85	-	2,20	2,85	-
PV15.09	-	1,20	2,55	-	2,20	2,55	-
PV15.10	-	1,20	2,65	-	2,20	2,65	-
PV15.11	-	1,50	3,00	-	2,50	3,00	-
PV15.12	-	1,50	3,30	-	2,50	3,30	5,16
PV15.13	-	1,50	3,15	-	2,50	3,15	4,92
PV15.14	-	1,50	3,30	-	2,50	3,30	5,16
PV15.15	-	1,50	3,55	-	2,50	3,55	5,55
PV15.16	-	1,50	3,40	-	2,50	3,40	5,31
PV15.17	-	1,50	3,00	-	2,50	3,00	-
PV15.18	-	1,50	3,20	-	2,50	3,20	5,00
PV15.19	-	1,50	3,05	-	2,50	3,05	4,77
PV15.20	-	1,50	2,00	-	2,50	2,00	-
PV15.21	-	1,50	2,20	-	2,50	2,20	-
Total:							35,86

01.03.04.04 ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO 424,78 M2

Trecho	Comprimento (m)	Altura Cava (m)	Área Parede Cava (m²)
PV15.07	8,80	2,55	22,44
PV15.08	8,80	2,85	25,08
PV15.09	8,80	2,55	22,44
PV15.10	8,80	2,65	23,32
PV15.11	10,00	3,00	30,00
PV15.12	10,00	3,30	33,00
PV15.13	10,00	3,15	31,50
PV15.14	10,00	3,30	33,00

ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.

REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

PV15.15	10,00	3,55	35,50
PV15.16	10,00	3,40	34,00
PV15.17	10,00	3,00	30,00
PV15.18	10,00	3,20	32,00
PV15.19	10,00	3,05	30,50
PV15.20	10,00	2,00	20,00
PV15.21	10,00	2,20	22,00
Total:			424,78

01.03.04.05	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR					175,56	M3
	Equipamento	Volume Equipamento (m³)	Volume Escavado (m³)	Volume Reaterro (m³)			
	BLC 15.12	2,74	8,06	5,32			
	BLC 15.13	2,74	8,06	5,32			
	BLC 15.14	2,74	8,06	5,32			
	BLC 15.15	2,74	8,06	5,32			
	BLC 15.16	2,74	8,06	5,32			
	BLC 15.17	2,74	8,06	5,32			
	BLC 15.18	2,74	8,06	5,32			
	BLC 15.19	2,74	8,06	5,32			
	BLC 15.20	2,74	8,06	5,32			
	BLC 15.21	2,74	8,06	5,32			
	BLC 15.22	2,74	8,06	5,32			
	BLC 15.23	2,74	8,06	5,32			
	BLC 15.24	2,74	8,06	5,32			
	BLC 15.25	2,74	8,06	5,32			
	BLC 15.26	2,74	8,06	5,32			
	BLC 15.27	2,74	8,06	5,32			
	PV15.07	2,26	7,60	5,34			
	PV15.08	2,26	7,60	5,34			
	PV15.09	2,26	7,60	5,34			
	PV15.10	2,26	7,60	5,34			
	PV15.11	3,53	9,81	6,28			
	PV15.12	3,53	9,81	6,28			
	PV15.13	3,53	9,81	6,28			
	PV15.14	3,53	9,81	6,28			
	PV15.15	3,53	9,81	6,28			
	PV15.16	3,53	9,81	6,28			
	PV15.17	3,53	9,81	6,28			
	PV15.18	3,53	9,81	6,28			
	PV15.19	3,53	9,81	6,28			
	PV15.20	3,53	9,81	6,28			
	PV15.21	3,53	9,81	6,28			
	Total:			175,56			
01.03.05	BOCAS DE LOBO E LEÃO						
01.03.05.01	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M.					15,00	UN
	Obs. Quantidade						
	Avenida Getúlio Vargas - Trecho 03	BLC 15.12 à BLC 15.27	15,00				
		Total:	15,00				
01.03.05.02	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO					3,19	M3
		Comprimento (m)	Altura (m)	Largura (m)	Quantidade	Volume (m³)	
	BLC 15.12 à BLC 15.27	5,60	0,20	0,19	15,00	3,19	
				Total:		3,19	
	Obs: Verga interna para prolongamento da altura da boca de lobo conjugada.						
01.03.06	POÇOS DE VISITA						
01.03.06.01	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO					8,00	UN
	Equipamento	Altura (m)	Tubo Montante (m)	Tubo Jusante (m)	Quantidade		
	PV15.07	2,55		0,70	1,00		
	PV15.08	2,85	0,70	0,80	1,00		
	PV15.09	2,55	0,70	0,70	1,00		
	PV15.10	2,65	0,70	0,70	1,00		
	PV15.11	3,00	0,70	0,80	1,00		
	PV15.12	3,30	0,80	0,80	1,00		
	PV15.13	3,15	0,80	0,80	1,00		
	PV15.14	3,30	0,80	0,80	1,00		
	PV15.15	3,55	0,80	0,90	-		
	PV15.16	3,40	0,90	0,90	-		
	PV15.17	3,00	0,90	0,90	-		
	PV15.18	3,20	0,90	1,00	-		
	PV15.19	3,05	1,00	1,00	-		
	PV15.20	2,00	1,00	1,00	-		
	PV15.21	2,20	1,00	1,20	-		
				Total:	8,00		
01.03.06.02	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO					7,00	UN
	Equipamento	Tubo Montante (m)	Tubo Jusante (m)	Quantidade			
	PV15.07	2,55	0,70	-			
	PV15.08	2,85	0,80	-			
	PV15.09	2,55	0,70	-			
	PV15.10	2,65	0,70	-			
	PV15.11	3,00	0,80	-			
	PV15.12	3,30	0,80	-			
	PV15.13	3,15	0,80	-			
	PV15.14	3,30	0,80	-			
	PV15.15	3,55	0,90	1,00			
	PV15.16	3,40	0,90	1,00			
	PV15.17	3,00	0,90	1,00			
	PV15.18	3,20	1,00	1,00			
	PV15.19	3,05	1,00	1,00			
	PV15.20	2,00	1,00	1,00			
	PV15.21	2,20	1,20	1,00			
			Total:	7,00			
01.03.06.03	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020					5,50	M

ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.

REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

Equipamento	Diâmetro Base	Altura Total Equipamento (m)	Altura Item Equipamento	Diferença	Acrescimento Base	Acrescimento (m)	Acrescimento diâmetro 1,5 (m)
PV15.07	1,20	2,55	1,45	1,10	0,10	0,50	-
PV15.08	1,20	2,85	1,45	1,40	0,40	1,00	-
PV15.09	1,20	2,55	1,45	1,10	0,10	0,50	-
PV15.10	1,20	2,65	1,45	1,20	0,20	0,50	-
PV15.11	1,20	3,00	1,45	1,55	0,55	1,00	-
PV15.12	1,20	3,30	1,45	1,85	0,85	1,00	-
PV15.13	1,20	3,15	1,45	1,70	0,70	1,00	-
PV15.14	1,20	3,30	1,45	1,85	0,85	1,00	-
PV15.15	1,50	3,55	1,45	2,10	1,10	1,50	1,50
PV15.16	1,50	3,40	1,45	1,95	0,95	1,00	1,00
PV15.17	1,50	3,00	1,45	1,55	0,55	1,00	1,00
PV15.18	1,50	3,20	1,45	1,75	0,75	1,00	1,00
PV15.19	1,50	3,05	1,45	1,60	0,60	1,00	1,00
PV15.20	1,50	2,00	1,45	0,55	-	-	-
PV15.21	1,50	2,20	1,45	0,75	-	-	-
Total:							5,50

01.03.06.04 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 15,00 M

Equipamento	Diâmetro Base	Altura Total Equipamento (m)	Altura Item Equipamento	Diferença	Acrescimento Base	Chaminé (m)	Acrescimento diâmetro 1,5 (m)
PV15.07	1,20	2,55	1,45	1,10	0,50	0,60	1,00
PV15.08	1,20	2,85	1,45	1,40	1,00	0,40	1,00
PV15.09	1,20	2,55	1,45	1,10	0,50	0,60	1,00
PV15.10	1,20	2,65	1,45	1,20	0,50	0,70	1,00
PV15.11	1,20	3,00	1,45	1,55	1,00	0,55	1,00
PV15.12	1,20	3,30	1,45	1,85	1,00	0,85	1,00
PV15.13	1,20	3,15	1,45	1,70	1,00	0,70	1,00
PV15.14	1,20	3,30	1,45	1,85	1,00	0,85	1,00
PV15.15	1,50	3,55	1,45	2,10	1,50	0,60	1,00
PV15.16	1,50	3,40	1,45	1,95	1,00	0,95	1,00
PV15.17	1,50	3,00	1,45	1,55	1,00	0,55	1,00
PV15.18	1,50	3,20	1,45	1,75	1,00	0,75	1,00
PV15.19	1,50	3,05	1,45	1,60	1,00	0,60	1,00
PV15.20	1,50	2,00	1,45	0,55	-	0,55	1,00
PV15.21	1,50	2,20	1,45	0,75	-	0,75	1,00
Total:							15,00

01.03.06.05 TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE D 400 (RUPTURA > 400 KN) 4,00 UN

Equipamento	Local	Quantidade
PV15.07	Passelo	-
PV15.08	Passelo	-
PV15.09	Leito Carroçavel	1,00
PV15.10	Passelo	-
PV15.11	Passelo	-
PV15.12	Leito Carroçavel	1,00
PV15.13	Passelo	-
PV15.14	Passelo	-
PV15.15	Passelo	-
PV15.16	Leito Carroçavel	1,00
PV15.17	Passelo	-
PV15.18	Passelo	-
PV15.19	Passelo	-
PV15.20	Passelo	-
PV15.21	Leito Carroçavel	1,00
Total:		4,00

01.03.06.06 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 11,00 UN

Equipamento	Local	Quantidade
PV15.07	Passelo	1,00
PV15.08	Passelo	1,00
PV15.09	Leito Carroçavel	-
PV15.10	Passelo	1,00
PV15.11	Passelo	1,00
PV15.12	Leito Carroçavel	-
PV15.13	Passelo	1,00
PV15.14	Passelo	1,00
PV15.15	Passelo	1,00
PV15.16	Leito Carroçavel	-
PV15.17	Passelo	1,00
PV15.18	Passelo	1,00
PV15.19	Passelo	1,00
PV15.20	Passelo	1,00
PV15.21	Leito Carroçavel	-
Total:		11,00

01.03.07 REDE DE DRENAGEM

01.03.07.01 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM 46,40 M

Trecho	Comprimento (m)	Tubo (m)	Comprimento Tubo 400MM (m)
PV15.06 - PV15.07	30,00	0,60	-
PV15.07 - PV15.08	30,00	0,70	-
PV15.08 - BLC15.13	2,02	0,50	-
BLC15.12 - BLC15.13	5,80	0,40	5,80
PV15.08 - PV15.09	30,00	0,70	-
PV15.09 - PV15.10	30,00	0,70	-
PV15.10 - BLC15.15	3,00	0,50	-
BLC15.14 - BLC15.15	5,80	0,40	5,80
PV15.10 - PV15.11	30,00	0,70	-
PV15.11 - PV15.12	30,00	0,80	-
PV15.12 - BLC15.17	3,00	0,50	-
BLC15.16 - BLC15.17	5,80	0,40	5,80
PV15.12 - PV15.13	30,00	0,80	-
PV15.13 - PV15.14	30,00	0,80	-
PV15.14 - BLC15.19	3,00	0,50	-
BLC15.18 - BLC15.19	5,80	0,40	5,80
PV15.14 - PV15.15	30,00	0,80	-
PV15.15 - PV15.16	30,00	0,90	-
PV15.16 - BLC15.21	3,00	Página 7 0,50	-

ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.

REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

L15.36	BLC15.20 - BLC15.21	5,80	0,40	5,80
L15.37	PV15.16 - PV15.17	30,00	0,90	-
L15.38	PV15.17 - BLC15.23	2,93	0,50	-
L15.39	BLC15.22 - BLC15.23	5,80	0,40	5,80
L15.40	PV15.17 - PV15.18	30,00	0,90	-
L15.41	PV15.18 - PV15.19	30,00	1,00	-
L15.42	PV15.19 - BLC15.25	3,00	0,50	-
L15.43	BLC15.24 - BLC15.25	5,80	0,40	5,80
L15.44	PV15.19 - PV15.20	30,00	1,00	-
L15.45	PV15.20 - PV15.21	30,00	1,00	-
L15.46	PV15.21 - BLC15.27	3,00	0,50	-
L15.47	BLC15.26 - BLC15.27	5,80	0,40	5,80
L15.48	PV15.21 - PV15.22	10,93	1,20	-
			Total:	46,40

01.03.07.02	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 500MM	22,95	M
-------------	------------------------------------	-------	---

	Trecho	Comprimento (m)	Tubo (m)	Comprimento Tubo 500MM (m)
L15.17	PV15.06 - PV15.07	30,00	0,60	-
L15.18	PV15.07 - PV15.08	30,00	0,70	-
L15.19	PV15.08 - BLC15.13	2,02	0,50	2,02
L15.20	BLC15.12 - BLC15.13	5,80	0,40	-
L15.21	PV15.08 - PV15.09	30,00	0,70	-
L15.22	PV15.09 - PV15.10	30,00	0,70	-
L15.23	PV15.10 - BLC15.15	3,00	0,50	3,00
L15.24	BLC15.14 - BLC15.15	5,80	0,40	-
L15.25	PV15.10 - PV15.11	30,00	0,70	-
L15.26	PV15.11 - PV15.12	30,00	0,80	-
L15.27	PV15.12 - BLC15.17	3,00	0,50	3,00
L15.28	BLC15.16 - BLC15.17	5,80	0,40	-
L15.29	PV15.12 - PV15.13	30,00	0,80	-
L15.30	PV15.13 - PV15.14	30,00	0,80	-
L15.31	PV15.14 - BLC15.19	3,00	0,50	3,00
L15.32	BLC15.18 - BLC15.19	5,80	0,40	-
L15.33	PV15.14 - PV15.15	30,00	0,80	-
L15.34	PV15.15 - PV15.16	30,00	0,90	-
L15.35	PV15.16 - BLC15.21	3,00	0,50	3,00
L15.36	BLC15.20 - BLC15.21	5,80	0,40	-
L15.37	PV15.16 - PV15.17	30,00	0,90	-
L15.38	PV15.17 - BLC15.23	2,93	0,50	2,93
L15.39	BLC15.22 - BLC15.23	5,80	0,40	-
L15.40	PV15.17 - PV15.18	30,00	0,90	-
L15.41	PV15.18 - PV15.19	30,00	1,00	-
L15.42	PV15.19 - BLC15.25	3,00	0,50	3,00
L15.43	BLC15.24 - BLC15.25	5,80	0,40	-
L15.44	PV15.19 - PV15.20	30,00	1,00	-
L15.45	PV15.20 - PV15.21	30,00	1,00	-
L15.46	PV15.21 - BLC15.27	3,00	0,50	3,00
L15.47	BLC15.26 - BLC15.27	5,80	0,40	-
L15.48	PV15.21 - PV15.22	10,93	1,20	-
			Total:	22,95

01.03.07.03	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM	30,00	M
-------------	------------------------------------	-------	---

	Trecho	Comprimento (m)	Tubo (m)	Comprimento Tubo 600MM (m)
L15.17	PV15.06 - PV15.07	30,00	0,60	30,00
L15.18	PV15.07 - PV15.08	30,00	0,70	-
L15.19	PV15.08 - BLC15.13	2,02	0,50	-
L15.20	BLC15.12 - BLC15.13	5,80	0,40	-
L15.21	PV15.08 - PV15.09	30,00	0,70	-
L15.22	PV15.09 - PV15.10	30,00	0,70	-
L15.23	PV15.10 - BLC15.15	3,00	0,50	-
L15.24	BLC15.14 - BLC15.15	5,80	0,40	-
L15.25	PV15.10 - PV15.11	30,00	0,70	-
L15.26	PV15.11 - PV15.12	30,00	0,80	-
L15.27	PV15.12 - BLC15.17	3,00	0,50	-
L15.28	BLC15.16 - BLC15.17	5,80	0,40	-
L15.29	PV15.12 - PV15.13	30,00	0,80	-
L15.30	PV15.13 - PV15.14	30,00	0,80	-
L15.31	PV15.14 - BLC15.19	3,00	0,50	-
L15.32	BLC15.18 - BLC15.19	5,80	0,40	-
L15.33	PV15.14 - PV15.15	30,00	0,80	-
L15.34	PV15.15 - PV15.16	30,00	0,90	-
L15.35	PV15.16 - BLC15.21	3,00	0,50	-
L15.36	BLC15.20 - BLC15.21	5,80	0,40	-
L15.37	PV15.16 - PV15.17	30,00	0,90	-
L15.38	PV15.17 - BLC15.23	2,93	0,50	-
L15.39	BLC15.22 - BLC15.23	5,80	0,40	-
L15.40	PV15.17 - PV15.18	30,00	0,90	-
L15.41	PV15.18 - PV15.19	30,00	1,00	-
L15.42	PV15.19 - BLC15.25	3,00	0,50	-
L15.43	BLC15.24 - BLC15.25	5,80	0,40	-
L15.44	PV15.19 - PV15.20	30,00	1,00	-
L15.45	PV15.20 - PV15.21	30,00	1,00	-
L15.46	PV15.21 - BLC15.27	3,00	0,50	-
L15.47	BLC15.26 - BLC15.27	5,80	0,40	-
L15.48	PV15.21 - PV15.22	10,93	1,20	-
			Total:	30,00

01.03.07.04	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 700MM	120,00	M
-------------	------------------------------------	--------	---

	Trecho	Comprimento (m)	Tubo (m)	Comprimento Tubo 700MM (m)
L15.17	PV15.06 - PV15.07	30,00	0,60	-
L15.18	PV15.07 - PV15.08	30,00	0,70	30,00
L15.19	PV15.08 - BLC15.13	2,02	0,50	-
L15.20	BLC15.12 - BLC15.13	5,80	0,40	-
L15.21	PV15.08 - PV15.09	30,00	0,70	30,00
L15.22	PV15.09 - PV15.10	30,00	0,70	30,00
L15.23	PV15.10 - BLC15.15	3,00	0,50	-
L15.24	BLC15.14 - BLC15.15	5,80	0,40	-
L15.25	PV15.10 - PV15.11	30,00	0,70	30,00
L15.26	PV15.11 - PV15.12	30,00	0,80	-
L15.27	PV15.12 - BLC15.17	3,00	0,50	-

ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.

REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

L15.28	BLC15.16 - BLC15.17	5,80	0,40	-
L15.29	PV15.12 - PV15.13	30,00	0,80	-
L15.30	PV15.13 - PV15.14	30,00	0,80	-
L15.31	PV15.14 - BLC15.19	3,00	0,50	-
L15.32	BLC15.18 - BLC15.19	5,80	0,40	-
L15.33	PV15.14 - PV15.15	30,00	0,80	-
L15.34	PV15.15 - PV15.16	30,00	0,90	-
L15.35	PV15.16 - BLC15.21	3,00	0,50	-
L15.36	BLC15.20 - BLC15.21	5,80	0,40	-
L15.37	PV15.16 - PV15.17	30,00	0,90	-
L15.38	PV15.17 - BLC15.23	2,93	0,50	-
L15.39	BLC15.22 - BLC15.23	5,80	0,40	-
L15.40	PV15.17 - PV15.18	30,00	0,90	-
L15.41	PV15.18 - PV15.19	30,00	1,00	-
L15.42	PV15.19 - BLC15.25	3,00	0,50	-
L15.43	BLC15.24 - BLC15.25	5,80	0,40	-
L15.44	PV15.19 - PV15.20	30,00	1,00	-
L15.45	PV15.20 - PV15.21	30,00	1,00	-
L15.46	PV15.21 - BLC15.27	3,00	0,50	-
L15.47	BLC15.26 - BLC15.27	5,80	0,40	-
L15.48	PV15.21 - PV15.22	10,93	1,20	-
		Total:	120,00	

01.03.07.05	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 800MM	120,00	M
-------------	------------------------------------	--------	---

Trecho	Comprimento (m)	Tubo (m)	Comprimento Tubo 800MM (m)
L15.17	PV15.06 - PV15.07	30,00	0,60
L15.18	PV15.07 - PV15.08	30,00	0,70
L15.19	PV15.08 - BLC15.13	2,02	0,50
L15.20	BLC15.12 - BLC15.13	5,80	0,40
L15.21	PV15.08 - PV15.09	30,00	0,70
L15.22	PV15.09 - PV15.10	30,00	0,70
L15.23	PV15.10 - BLC15.15	3,00	0,50
L15.24	BLC15.14 - BLC15.15	5,80	0,40
L15.25	PV15.10 - PV15.11	30,00	0,70
L15.26	PV15.11 - PV15.12	30,00	0,80
L15.27	PV15.12 - BLC15.17	3,00	0,50
L15.28	BLC15.16 - BLC15.17	5,80	0,40
L15.29	PV15.12 - PV15.13	30,00	0,80
L15.30	PV15.13 - PV15.14	30,00	0,80
L15.31	PV15.14 - BLC15.19	3,00	0,50
L15.32	BLC15.18 - BLC15.19	5,80	0,40
L15.33	PV15.14 - PV15.15	30,00	0,80
L15.34	PV15.15 - PV15.16	30,00	0,90
L15.35	PV15.16 - BLC15.21	3,00	0,50
L15.36	BLC15.20 - BLC15.21	5,80	0,40
L15.37	PV15.16 - PV15.17	30,00	0,90
L15.38	PV15.17 - BLC15.23	2,93	0,50
L15.39	BLC15.22 - BLC15.23	5,80	0,40
L15.40	PV15.17 - PV15.18	30,00	0,90
L15.41	PV15.18 - PV15.19	30,00	1,00
L15.42	PV15.19 - BLC15.25	3,00	0,50
L15.43	BLC15.24 - BLC15.25	5,80	0,40
L15.44	PV15.19 - PV15.20	30,00	1,00
L15.45	PV15.20 - PV15.21	30,00	1,00
L15.46	PV15.21 - BLC15.27	3,00	0,50
L15.47	BLC15.26 - BLC15.27	5,80	0,40
L15.48	PV15.21 - PV15.22	10,93	1,20
		Total:	120,00

01.03.07.06	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 900MM	90,00	M
-------------	------------------------------------	-------	---

Trecho	Comprimento (m)	Tubo (m)	Comprimento Tubo 900MM (m)
L15.17	PV15.06 - PV15.07	30,00	0,60
L15.18	PV15.07 - PV15.08	30,00	0,70
L15.19	PV15.08 - BLC15.13	2,02	0,50
L15.20	BLC15.12 - BLC15.13	5,80	0,40
L15.21	PV15.08 - PV15.09	30,00	0,70
L15.22	PV15.09 - PV15.10	30,00	0,70
L15.23	PV15.10 - BLC15.15	3,00	0,50
L15.24	BLC15.14 - BLC15.15	5,80	0,40
L15.25	PV15.10 - PV15.11	30,00	0,70
L15.26	PV15.11 - PV15.12	30,00	0,80
L15.27	PV15.12 - BLC15.17	3,00	0,50
L15.28	BLC15.16 - BLC15.17	5,80	0,40
L15.29	PV15.12 - PV15.13	30,00	0,80
L15.30	PV15.13 - PV15.14	30,00	0,80
L15.31	PV15.14 - BLC15.19	3,00	0,50
L15.32	BLC15.18 - BLC15.19	5,80	0,40
L15.33	PV15.14 - PV15.15	30,00	0,80
L15.34	PV15.15 - PV15.16	30,00	0,90
L15.35	PV15.16 - BLC15.21	3,00	0,50
L15.36	BLC15.20 - BLC15.21	5,80	0,40
L15.37	PV15.16 - PV15.17	30,00	0,90
L15.38	PV15.17 - BLC15.23	2,93	0,50
L15.39	BLC15.22 - BLC15.23	5,80	0,40
L15.40	PV15.17 - PV15.18	30,00	0,90
L15.41	PV15.18 - PV15.19	30,00	1,00
L15.42	PV15.19 - BLC15.25	3,00	0,50
L15.43	BLC15.24 - BLC15.25	5,80	0,40
L15.44	PV15.19 - PV15.20	30,00	1,00
L15.45	PV15.20 - PV15.21	30,00	1,00
L15.46	PV15.21 - BLC15.27	3,00	0,50
L15.47	BLC15.26 - BLC15.27	5,80	0,40
L15.48	PV15.21 - PV15.22	10,93	1,20
		Total:	90,00

01.03.07.07	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 1000MM	90,00	M
-------------	-------------------------------------	-------	---

Trecho	Comprimento (m)	Tubo (m)	Comprimento Tubo 1000MM (m)
L15.17	PV15.06 - PV15.07	30,00	0,60
L15.18	PV15.07 - PV15.08	30,00	0,70
L15.19	PV15.08 - BLC15.13	2,02	0,50

 SETOR DE CONVÊNIOS									
ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO									
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.									
REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023									
L15.20	BLC15.12 - BLC15.13	5,80	0,40	-					
L15.21	PV15.08 - PV15.09	30,00	0,70	-					
L15.22	PV15.09 - PV15.10	30,00	0,70	-					
L15.23	PV15.10 - BLC15.15	3,00	0,50	-					
L15.24	BLC15.14 - BLC15.15	5,80	0,40	-					
L15.25	PV15.10 - PV15.11	30,00	0,70	-					
L15.26	PV15.11 - PV15.12	30,00	0,80	-					
L15.27	PV15.12 - BLC15.17	3,00	0,50	-					
L15.28	BLC15.16 - BLC15.17	5,80	0,40	-					
L15.29	PV15.12 - PV15.13	30,00	0,80	-					
L15.30	PV15.13 - PV15.14	30,00	0,80	-					
L15.31	PV15.14 - BLC15.19	3,00	0,50	-					
L15.32	BLC15.18 - BLC15.19	5,80	0,40	-					
L15.33	PV15.14 - PV15.15	30,00	0,80	-					
L15.34	PV15.15 - PV15.16	30,00	0,90	-					
L15.35	PV15.16 - BLC15.21	3,00	0,50	-					
L15.36	BLC15.20 - BLC15.21	5,80	0,40	-					
L15.37	PV15.16 - PV15.17	30,00	0,90	-					
L15.38	PV15.17 - BLC15.23	2,93	0,50	-					
L15.39	BLC15.22 - BLC15.23	5,80	0,40	-					
L15.40	PV15.17 - PV15.18	30,00	0,90	-					
L15.41	PV15.18 - PV15.19	30,00	1,00	30,00					
L15.42	PV15.19 - BLC15.25	3,00	0,50	-					
L15.43	BLC15.24 - BLC15.25	5,80	0,40	-					
L15.44	PV15.19 - PV15.20	30,00	1,00	30,00					
L15.45	PV15.20 - PV15.21	30,00	1,00	30,00					
L15.46	PV15.21 - BLC15.27	3,00	0,50	-					
L15.47	BLC15.26 - BLC15.27	5,80	0,40	-					
L15.48	PV15.21 - PV15.22	10,93	1,20	-					
			Total:	90,00					
01.03.07.08	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE							10,93	M
	Trecho	Comprimento (m)	Tubo (m)	Comprimento Tubo 1200MM (m)					
L15.17	PV15.06 - PV15.07	30,00	0,60	-					
L15.18	PV15.07 - PV15.08	30,00	0,70	-					
L15.19	PV15.08 - BLC15.13	2,02	0,50	-					
L15.20	BLC15.12 - BLC15.13	5,80	0,40	-					
L15.21	PV15.08 - PV15.09	30,00	0,70	-					
L15.22	PV15.09 - PV15.10	30,00	0,70	-					
L15.23	PV15.10 - BLC15.15	3,00	0,50	-					
L15.24	BLC15.14 - BLC15.15	5,80	0,40	-					
L15.25	PV15.10 - PV15.11	30,00	0,70	-					
L15.26	PV15.11 - PV15.12	30,00	0,80	-					
L15.27	PV15.12 - BLC15.17	3,00	0,50	-					
L15.28	BLC15.16 - BLC15.17	5,80	0,40	-					
L15.29	PV15.12 - PV15.13	30,00	0,80	-					
L15.30	PV15.13 - PV15.14	30,00	0,80	-					
L15.31	PV15.14 - BLC15.19	3,00	0,50	-					
L15.32	BLC15.18 - BLC15.19	5,80	0,40	-					
L15.33	PV15.14 - PV15.15	30,00	0,80	-					
L15.34	PV15.15 - PV15.16	30,00	0,90	-					
L15.35	PV15.16 - BLC15.21	3,00	0,50	-					
L15.36	BLC15.20 - BLC15.21	5,80	0,40	-					
L15.37	PV15.16 - PV15.17	30,00	0,90	-					
L15.38	PV15.17 - BLC15.23	2,93	0,50	-					
L15.39	BLC15.22 - BLC15.23	5,80	0,40	-					
L15.40	PV15.17 - PV15.18	30,00	0,90	-					
L15.41	PV15.18 - PV15.19	30,00	1,00	-					
L15.42	PV15.19 - BLC15.25	3,00	0,50	-					
L15.43	BLC15.24 - BLC15.25	5,80	0,40	-					
L15.44	PV15.19 - PV15.20	30,00	1,00	-					
L15.45	PV15.20 - PV15.21	30,00	1,00	-					
L15.46	PV15.21 - BLC15.27	3,00	0,50	-					
L15.47	BLC15.26 - BLC15.27	5,80	0,40	-					
L15.48	PV15.21 - PV15.22	10,93	1,20	10,93					
			Total:	10,93					
01.04	EVENTO 04 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
01.04.01	SERVIÇOS PRELIMINARES E BASE								
01.04.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018							910,02	M
		Obs	Comprimento (m)						
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 03	Lado Direito	455,01						
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 03	Lado Esquerdo	455,01						
		Total:	910,02						
01.04.01.02	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO							3.156,35	M2
		Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)				
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 03	Estacas 14 à 39	455,01	6,00	2.730,06				
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 03	Embocaduras			426,29				
		Total:			3.156,35				
01.04.01.03	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019							609,95	M3
		Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Altura (m)	Volume (m³)		
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 03	Estacas 14 à 39	455,01	6,00	2.730,06	0,20	546,01		
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 03	Embocaduras			426,29	0,15	63,94		
		Total:					609,95		
01.04.01.04	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA							1.280,90	T
		Obs.	Volume Total (m³)	Empolamento	Volume Total C/ empolamento (m³)	Peso / Volume (T/m³)	Peso Total (T)		
	Base Macadame Seco		609,95	1,40	853,93	1,50	1.280,90		
		Total:					1.280,90		
01.04.01.05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020							21.348,25	M3XKM
		Obs:	Volume (m³)	Empolamento	Volume (m³)	Distância (Km)	Total (M³XKm)		
	Base Macadame Seco		609,95	1,40	853,93	25,00	21.348,25		
		Total:					21.348,25		

ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.

REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

01.04.02		CAMADA DE REVESTIMENTO - CBUQ						
01.04.02.01		IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE					2.730,06	M2
Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 03		Obs: Estacas 14 à 39	Comprimento (m) 455,01	Largura (m) 6,00 Total:	Área (m²) 2.730,06 2.730,06			
01.04.02.02		IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE					2.730,06	M2
Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 03		Obs: Estacas 14 à 39	Comprimento (m) 455,01	Largura (m) 6,00 Total:	Área (m²) 2.730,06 2.730,06			
01.04.02.03		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).					112,61	TXKM
Pintura de Ligação			Área (m²) 2.730,06	Peso por Área (T/m²) 0,000450	Distância média estimada (km) 25,00	Total (TXKm) 30,71		
Imprimação			2.730,06	0,001200	25,00	81,90		
					Total:	112,61		
01.04.02.04		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019					109,20	M3
Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 03		Obs: Estacas 14 à 39	Comprimento (m) 455,01	Largura (m) 6,00	Altura (m) 0,040 Total:	Volume (m³) 109,20 109,20		
01.04.02.05		CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020					327,60	T
Material betuminoso (CBUQ)		Obs.	Volume Total C/ empolamento (1,25) (m³) 136,50	Peso / M³ 2,40 Total:	Peso Total (T) 327,60			
01.04.02.06		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020					3.412,50	M3XKM
Material betuminoso (CBUQ)		Obs.	Volume por área - com empolamento (m³/m²) 0,04000	Área (m²) 2.730,06	Volume Total (m³) 109,20	Volume Total C/ empolamento (1,25) (m³) 136,50	Distância média estimada (km) 25,00 Total:	Total (M³/KM) 3.412,50 3.412,50
01.04.03		CAMADA DE REVESTIMENTO - INTERTRAVADO						
01.04.03.01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022					426,29	M2
Avenida Getulio Vargas - Trecho 03		Obs. Cruzamento Rua Mato Grosso - Lado Direito	Área (m²) 61,52					
Avenida Getulio Vargas - Trecho 03		Cruzamento Rua Mato Grosso - Lado Esquerdo	51,61					
Avenida Getulio Vargas - Trecho 03		Cruzamento Rua Amazonas - Lado Direito	49,42					
Avenida Getulio Vargas - Trecho 03		Cruzamento Rua Amazonas - Lado Esquerdo	54,39					
Avenida Getulio Vargas - Trecho 03		Cruzamento Rua Lotério Pinto - Lado Direito	50,44					
Avenida Getulio Vargas - Trecho 03		Cruzamento Rua Lotério Pinto - Lado Esquerdo	52,65					
Avenida Getulio Vargas - Trecho 03		Cruzamento Rua Goiás - Lado Direito	50,01					
Avenida Getulio Vargas - Trecho 03		Cruzamento Rua Goiás - Lado Esquerdo	56,25					
		Total:	426,29					
01.04.03.02		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA					40,41	T
Intertravado - areia/pó de pedra		Obs.	Volume por área - com empolamento (m³/m²) 0,06320	Área (m²) 426,29	Volume Total (m³) 26,94	Peso / Volume (T/m³) 1,50 Total:	Peso Total (T) 40,41 40,41	
01.04.03.03		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020					842,00	M3XKM
Intertravado - areia/pó de pedra		Obs.	Volume por área - com empolamento (m³/m²) 0,06320	Área (m²) 426,29	Volume Total (m³) 26,94	Volume Total C/ empolamento (1,25) (m³) 33,68	Distância média estimada (km) 25,00 Total:	Total (M³/KM) 842 842,00
01.05		EVENTO 05 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
01.05.01		PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²					4,73	M2
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 x Rua Copacabana		Obs Placa Pare R1	Área (m²) 0,30	Quantidade 1,00	Área Total (m²) 0,30			
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 x Rua Copacabana		Placa Nome de Rua	0,11	2,00	0,23			
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 x Rua Lotério Pinto		Placa Pare R1	0,30	2,00	0,60			
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 x Rua Lotério Pinto		Placa Nome de Rua	0,11	4,00	0,45			
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 x Rua Amazonas		Placa Pare R1	0,30	2,00	0,60			
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 x Rua Amazonas		Placa Nome de Rua	0,11	4,00	0,45			
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 x Rua Goiás		Placa Pare R1	0,30	2,00	0,60			
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 x RuaGoiás		Placa Nome de Rua	0,11	4,00	0,45			
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 x Rua Mato Grosso		Placa Pare R1	0,30	2,00	0,60			
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 x Rua Mato Grosso		Placa Nome de Rua	0,11	4,00	0,45			
		Total:			4,73			
01.05.02		SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO					18,00	UN

ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO									
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.									
REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023									
			Obs	Quantidade de postes					
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 x Rua Copacabana			Placa Pare R1	1,00					
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 x Rua Copacabana			Placa Nome de Rua	1,00					
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 x Rua Lotério Pinto			Placa Pare R1	2,00					
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 x Rua Lotério Pinto			Placa Nome de Rua	2,00					
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 x Rua Amazonas			Placa Pare R1	2,00					
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 x Rua Amazonas			Placa Nome de Rua	2,00					
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 x Rua Goiás			Placa Pare R1	2,00					
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 x RuaGoiás			Placa Nome de Rua	2,00					
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 x Rua Mato Grosso			Placa Pare R1	2,00					
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 x Rua Mato Grosso			Placa Nome de Rua	2,00					
Total:			18,00						
01.05.03	LIMPEZA, PRÉ MARCAÇÃO E PRÉ PINTURA DE SOLO						88,18	M2	
			Obs	Comprimento (m)	Largura (m)	Quantidade	Área (m²)		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03			Linha central	159,87	0,10	0,50	7,99		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03			Linha Dupla - Pare	15,00	0,20	3,00	9,00		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03			Linha contínua - Pare	12,75	0,60	1,00	7,65		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03			Linha proibido estacionar	635,38	0,10	1,00	63,54		
						Total:	88,18		
01.05.04	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA						88,18	M2	
			Obs	Comprimento (m)	Largura (m)	Quantidade	Área (m²)		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03			Linha central	159,87	0,10	0,50	7,99		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03			Linha Dupla - Pare	15,00	0,20	3,00	9,00		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03			Linha contínua - Pare	12,75	0,60	1,00	7,65		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03			Linha proibido estacionar	635,38	0,10	1,00	63,54		
						Total:	88,18		
01.05.05	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021						6,12	M2	
			Comprimento (m)	Altura (m)	Área (m²)	Quantidade	Área Total (m²)		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03			2,55	2,40	6,12	1,00	6,12		
						Total:	6,12		
01.06	EVENTO 06 - PASSEIO								
01.06.01	CARGA MANUAL DE SOLO						148,32	M3	
			Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Volume (m³)	
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03			Lado Direito	446,55	1,50	669,83	0,11	73,68	
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03			Lado Esquerdo	452,37	1,50	678,56	0,11	74,64	
							Total:	148,32	
01.06.02	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM						185,40	M3	
			Volume (m³)	Empolamento	Volume Total (m³)				
Movimentação de solo dentro da obra - utilizar solo proveniente da regularização da via			148,32	1,25	185,40				
				Total:	185,40				
01.06.03	REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO						185,40	M3	
			Volume (m³)	Empolamento	Volume Total (m³)				
Reaterro laterais do passeio para nivelamento com a altura da face superior da guia.			148,32	1,25	185,40				
				Total:	185,40				
01.06.04	LASTRO DE PEDRA BRITADA						55,18	M3	
			Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade	Volume (m³)
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03			Lado Direito	446,55	1,20	535,86	0,05	1,00	26,79
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03			Lado Esquerdo	452,37	1,20	542,84	0,05	1,00	27,14
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03			Rampas	-	-	1,92	0,05	13,00	1,25
							Total:	55,18	
01.06.05	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.						66,10	M3	
			Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade	Volume (m³)
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03			Lado Direito	446,55	1,20	535,86	0,06	1,00	32,15
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03			Lado Esquerdo	452,37	1,20	542,84	0,06	1,00	32,57
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03			Rampas	-	-	1,92	0,06	12,00	1,38
							Total:	66,10	
01.06.06	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA						3,50	M2	
			Comprimento (m)	Largura (m)	Quantidade por rampa	Quantidade de rampa	Total (m²)		
Entrada Rampa			1,00	0,25	1,00	14,00	3,50		
						Total:	3,50		
01.06.07	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)						23,46	M2	
			Obs:	Área (m²)					
Cruzamento AV. GETÚLIO VARGAS x RUA LOTÉRIO PINTO			Ao lado das rampas	9,29					
Cruzamento AV. GETÚLIO VARGAS x RUA AMAZONAS			Ao lado das rampas	9,44					
Cruzamento AV. GETÚLIO VARGAS x RUA GOIÁS			Ao lado das rampas	4,73					
			Total:	23,46					
02.	ETAPA 02 - RECURSOS CONVÊNIO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEMANDA 046527 - Pavimentação e Drenagem Ruas Santa Catarina - Trecho 02,								
02.01	EVENTO 07 - SERVIÇOS PRELIMINARES								
02.01.01	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON						6,00	M2	
			Comprimento (m)	Largura (m)	Quant.	Área (m²)			
PLACA PADRÃO GOVERNO ESTADO SP			4,00	1,50	1,00	6,00			
					Total:	6,00			
Página 12									

ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.
REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

02.01.02	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE	2.097,46	M2
Obs. Comprimento (m) Largura (m) Área (m²)			
Avenida Getulio Vargas - Trecho 01 Lado Direito 35,53 2,50 88,83			
Avenida Getulio Vargas - Trecho 01 Lado Esquerdo 35,53 2,50 88,83			
Avenida Getulio Vargas - Trecho 02 Lado Direito 320,00 2,50 800,00			
Avenida Getulio Vargas - Trecho 02 Lado Esquerdo 320,00 2,50 800,00			
Rua Santa Catarina - Trecho 02 Lado Direito 63,96 2,50 159,90			
Rua Santa Catarina - Trecho 02 Lado Esquerdo 63,96 2,50 159,90			
Total: 2.097,46			

02.02EVENTO 08 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DA VIA

02.02.01	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020					1.102,46	M3
	Obs.	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Altura média (m)	Volume (m³)	
Avenida Getulio Vargas - Trecho 01	regularização e conformação do terreno - área pavimento natural consolidado. Ver Nota 01.	35,53	7,90	280,69	0,20	56,14	
Avenida Getulio Vargas - Trecho 02		320,00	10,30	3.296,00	0,20	659,20	
Rua Santa Catarina - Trecho 02		63,96	10,30	658,79	0,20	131,76	
Avenida Getulio Vargas - Trecho 01	regularização e conformação do terreno - lateral direita	35,53	2,00	71,06	0,50	35,53	
Avenida Getulio Vargas - Trecho 02		320,00	1,20	384,00	0,20	76,80	
Rua Santa Catarina - Trecho 02		63,96	1,20	76,75	0,20	15,35	
Avenida Getulio Vargas - Trecho 01	regularização e conformação do terreno - lateral esquerda	35,53	2,00	71,06	0,50	35,53	
Avenida Getulio Vargas - Trecho 02		320,00	1,20	384,00	0,20	76,80	
Rua Santa Catarina - Trecho 02		63,96	1,20	76,75	0,20	15,35	
						Total:	1.102,46
Notas:							
01: a regularização deverá ser executada considerando o greide final da rua na altura das sarjetas. Foi considerando na largura a faixa de rolamento, a sarjeta, a guia e mais 50 cm para a extrusora.							

02.02.02	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA	1.378,08	T
Volume (m³) Empolamento Volume Total (m³)			
Movimentação de solo dentro da obra - o solo excedente 1.102,46 1,25 1.378,08			
deverá ser colocado em terreno disponibilizado pela PMAS.			
Total: 1.378,08			

02.02.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.378,08	M3XKM
Volume (m³) Distância média (km) KmXM			
Movimentação de solo dentro da obra - o solo excedente 1.378,08 1,00 1.378,08			
deverá ser colocado em terreno disponibilizado pela PMAS.			
Total: 1.378,08			

02.02.04	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	1.378,08	M3
Volume (m³)			
Movimentação de solo dentro da obra - o solo excedente 1.378,08			
deverá ser colocado em terreno disponibilizado pela PMAS.			
Total: 1.378,08			

02.02.05	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1.063,62	M2
Obs. Comprimento (m) Largura (m) Área (m²)			
Avenida Getulio Vargas - Trecho 01 regularização e 35,53 2,00 71,06			
Avenida Getulio Vargas - Trecho 02 conformação do terreno - 320,00 1,20 384,00			
Rua Santa Catarina - Trecho 02 lateral direita 63,96 1,20 76,75			
Avenida Getulio Vargas - Trecho 01 regularização e 35,53 2,00 71,06			
Avenida Getulio Vargas - Trecho 02 conformação do terreno - 320,00 1,20 384,00			
Rua Santa Catarina - Trecho 02 lateral esquerda 63,96 1,20 76,75			
Total: 1.063,62			
Obs: Laterais da faixa de rolamento. A regularização e compactação da via estão inclusas no item abertura de caixa.			

02.03EVENTO 09 - DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA

02.03.01SERVIÇOS PRELIMINARES

02.03.01.01	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	315,16	M
Trecho Comprimento (m)			
L15.01 BLC15.01 - BLC15.02 6,61			
L15.02 BLC15.02 - PV15.01 22,56			
L15.03 PV15.01 - BLC15.03 2,93			
L15.04 PV15.01 - PV15.02 40,00			
L15.05 PV15.02 - BLC15.05 2,19			
L15.06 BLC15.04 - BLC15.05 5,95			
L15.07 PV15.02 - PV15.03 40,00			
L15.08 PV15.03 - BLC15.07 3,00			
L15.09 BLC15.06 - BLC15.07 5,80			
L15.10 PV15.03 - PV15.04 40,00			
L15.11 PV15.04 - BLC15.09 3,00			
L15.12 BLC15.08 - BLC15.09 5,80			
L15.13 PV15.04 - PV15.05 40,00			
L15.14 PV15.05 - PV15.06 30,00			
L15.15 PV15.06 - BLC15.11 3,00			
L15.16 BLC15.10 - BLC15.11 5,80			
LCAP15.01 BLC15.04 - CAP15.01 10,50			
LCAP15.02 CAP15.01 - CAP15.02 11,73			
LCAP15.03 BLC15.10 - CAP15.03 24,79			

 SETOR DE CONVÊNIOS ALVORADA - PA									
ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO									
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.									
REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023									
LCAP15.04	CAP15.03 - CAP15.04			11,50					
			Total:	315,16					
02.03.02	DRENAGEM SUPERFICIAL								
02.03.02.01	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO						35,20	M3	
		Obs.		Guia Reta (m)	Guia Curva (m)	Comprimento (m)	Área Perfil (m²)	Volume (m³)	
Av. Getúlio Vargas - TRECHO 1	Rua Rio Grande do Sul - Rua Santa Catarina	Lado Direito		15,96	27,42	43,38	0,0550	2,39	
Av. Getúlio Vargas - TRECHO 1	Rua Rio Grande do Sul - Rua Santa Catarina	Lado Esquerdo		37,89	11,03	48,92	0,0550	2,69	
Av. Getúlio Vargas - TRECHO 2	Rua Santa Catarina - Rua Prof Toledo	Lado Direito		98,53	19,22	117,75	0,0550	6,48	
Av. Getúlio Vargas - TRECHO 2	Rua Prof. Toledo - Rua Minas Gerais	Lado Direito		81,80	20,14	101,94	0,0550	5,61	
Av. Getúlio Vargas - TRECHO 2	Rua Minas Gerais - Rua Mato Grosso	Lado Direito		43,15	20,14	63,29	0,0550	3,48	
Av. Getúlio Vargas - TRECHO 2	Rua Santa Catarina - Rua Acre	Lado Esquerdoo		126,52	17,44	143,96	0,0550	7,92	
Av. Getúlio Vargas - TRECHO 2	Rua Acre - Rua Mato Grosso	Lado Esquerdoo		100,74	19,74	120,48	0,0550	6,63	
							Total:	35,20	
02.03.02.02	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO						35,20	M3	
		Obs.		Guia Reta (m)	Guia Curva (m)	Comprimento (m)	Área Perfil (m²)	Volume (m³)	
Av. Getúlio Vargas - TRECHO 1	Rua Rio Grande do Sul - Rua Santa Catarina	Lado Direito		15,96	27,42	43,38	0,0550	2,39	
Av. Getúlio Vargas - TRECHO 1	Rua Rio Grande do Sul - Rua Santa Catarina	Lado Esquerdo		37,89	11,03	48,92	0,0550	2,69	
Av. Getúlio Vargas - TRECHO 2	Rua Santa Catarina - Rua Prof Toledo	Lado Direito		98,53	19,22	117,75	0,0550	6,48	
Av. Getúlio Vargas - TRECHO 2	Rua Prof. Toledo - Rua Minas Gerais	Lado Direito		81,80	20,14	101,94	0,0550	5,61	
Av. Getúlio Vargas - TRECHO 2	Rua Minas Gerais - Rua Mato Grosso	Lado Direito		43,15	20,14	63,29	0,0550	3,48	
Av. Getúlio Vargas - TRECHO 2	Rua Santa Catarina - Rua Acre	Lado Esquerdoo		126,52	17,44	143,96	0,0550	7,92	
Av. Getúlio Vargas - TRECHO 2	Rua Acre - Rua Mato Grosso	Lado Esquerdoo		100,74	19,74	120,48	0,0550	6,63	
							Total:	35,20	
02.03.02.03	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPA						8,28	M3	
		Obs.	Comprimento (m)	Largura (m)	Espessura (m)	Volume (m³)			
Avenida Getulio Vargas - Trecho 02	Encontro com Rua Professor Toledo		19,20	1,00	0,10	1,92			
Avenida Getulio Vargas - Trecho 02	Encontro com Rua Acre		22,06	1,00	0,10	2,21			
Avenida Getulio Vargas - Trecho 02	Encontro com Rua Minas Gerais		18,88	1,00	0,10	1,89			
Avenida Getulio Vargas - Trecho 01	Encontro com Rua Rio Grande do Sul		22,57	1,00	0,10	2,26			
					Total:	8,28			
02.03.02.04	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO						257,23	KG	
Tela Q 196		Obs.	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Peso / m²	Peso Total (kg)		
Avenida Getulio Vargas - Trecho 02	Encontro com Rua Professor Toledo		19,20	1,00	19,20	3,11	59,71		
Avenida Getulio Vargas - Trecho 02	Encontro com Rua Acre		22,06	1,00	22,06	3,11	68,61		
Avenida Getulio Vargas - Trecho 02	Encontro com Rua Minas Gerais		18,88	1,00	18,88	3,11	58,72		
Avenida Getulio Vargas - Trecho 01	Encontro com Rua Rio Grande do Sul		22,57	1,00	22,57	3,11	70,19		
							Total:	257,23	
02.03.03	ESCAVAÇÕES REDE DE DRENAGEM								
02.03.03.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),						478,97	M3	
Trecho		Tubo	Cota Montante	Cota Juzante	Altura Média (m)	Comprimento (m)	Largura	Volume (m³)	
L15.01	BLC15.01 - BLC15.02	0,40	-	-	0,85	6,61	1,60	8,99	
L15.02	BLC15.02 - PV15.01	0,50	-	-	1,00	22,56	1,70	38,35	
L15.03	PV15.01 - BLC15.03	0,50	-	-	1,00	2,93	1,70	4,98	
L15.04	PV15.01 - PV15.02	0,60	1,70	1,30	1,50	40,00	1,80	108,00	
L15.05	PV15.02 - BLC15.05	0,50	-	-	1,00	2,19	1,70	3,72	
L15.06	BLC15.04 - BLC15.05	0,50	-	-	1,00	5,95	1,70	10,12	
L15.07	PV15.02 - PV15.03	0,60	1,30	1,30	1,30	40,00	1,80	93,60	
L15.08	PV15.03 - BLC15.07	0,50	-	-	1,00	3,00	1,70	5,10	
L15.09	BLC15.06 - BLC15.07	0,40	-	-	0,85	5,80	1,60	7,89	
L15.11	PV15.04 - BLC15.09	0,50	-	-	1,00	3,00	1,70	5,10	
L15.12	BLC15.08 - BLC15.09	0,40	-	-	0,85	5,80	1,60	7,89	
L15.12	BLC15.08 - BLC15.09	0,40	-	-	0,85	5,80	1,60	7,89	
L15.13	PV15.04 - PV15.05	0,60	-	-	1,15	40,00	1,80	82,80	
L15.15	PV15.06 - BLC15.11	0,50	-	-	1,00	3,00	1,70	5,10	
L15.16	BLC15.10 - BLC15.11	0,50	-	-	1,00	5,80	1,70	9,86	
LCAP15.01	BLC15.04 - CAP15.01	0,40	-	-	0,85	10,50	1,60	14,28	
LCAP15.02	CAP15.01 - CAP15.02	0,40	-	-	0,85	11,73	1,60	15,95	
LCAP15.03	BLC15.10 - CAP15.03	0,40	-	-	0,85	24,79	1,60	33,71	
LCAP15.04	CAP15.03 - CAP15.04	0,40	-	-	0,85	11,50	1,60	15,64	
							Total:	478,97	
02.03.03.02	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),						226,80	M3	
Trecho		Tubo	Cota Montante	Cota Juzante	Altura Média (m)	Comprimento (m)	Largura	Volume (m³)	
L15.10	PV15.03 - PV15.04	0,60	1,65	1,60	1,63	40,00	1,80	117,00	
L15.13	PV15.04 - PV15.05	0,60	1,75	1,30	1,53	40,00	1,80	109,80	
							Total:	226,80	
02.03.03.03	ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO						304,84	M2	
Trecho		Comprimento (m)	Altura Média (m)	Área Parede Vala (m²)	Faces	Área Total (m²)			
L15.01	BLC15.01 - BLC15.02	6,61	0,85	2,81	2,00	5,62			

 SETOR DE CONVÊNIOS ALVORADA - PA								
ANEXO B - MEMORIAL DE CALCULO								
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.								
REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023								
L15.02	BLC15.02 - PV15.01	22,56	1,00	11,28	2,00	22,56		
L15.03	PV15.01 - BLC15.03	2,93	1,00	1,47	2,00	2,94		
L15.04	PV15.01 - PV15.02	40,00	1,50	30,00	2,00	60,00		
L15.05	PV15.02 - BLC15.05	2,19	1,00	1,10	2,00	2,20		
L15.06	BLC15.04 - BLC15.05	5,95	1,00	2,98	2,00	5,96		
L15.07	PV15.02 - PV15.03	40,00	1,30	26,00	2,00	52,00		
L15.08	PV15.03 - BLC15.07	3,00	1,00	1,50	2,00	3,00		
L15.09	BLC15.06 - BLC15.07	5,80	0,85	2,47	2,00	4,94		
L15.11	PV15.04 - BLC15.09	3,00	1,00	1,50	2,00	3,00		
L15.12	BLC15.08 - BLC15.09	5,80	0,85	2,47	2,00	4,94		
L15.12	BLC15.08 - BLC15.09	5,80	0,85	2,47	2,00	4,94		
L15.13	PV15.04 - PV15.05	40,00	1,15	23,00	2,00	46,00		
L15.15	PV15.06 - BLC15.11	3,00	1,00	1,50	2,00	3,00		
L15.16	BLC15.10 - BLC15.11	5,80	1,00	2,90	2,00	5,80		
L15.10	PV15.03 - PV15.04	40,00	1,63	2,81	2,00	5,62		
L15.13	PV15.04 - PV15.05	40,00	1,53	11,28	2,00	22,56		
LCAP15.01	BLC15.04 - CAP15.01	10,50	0,85	4,46	2,00	8,92		
LCAP15.02	CAP15.01 - CAP15.02	11,73	0,85	4,99	2,00	9,98		
LCAP15.03	BLC15.10 - CAP15.03	24,79	0,85	10,54	2,00	21,08		
LCAP15.04	CAP15.03 - CAP15.04	11,50	0,85	4,89	2,00	9,78		
Total:						304,84		
02.03.03.04	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020					0,45	M3	
L15.01	Trecho	Tubo	Comprimento (m)	Altura Média (m)	Volume (m³)			
L15.02	BLC15.01 - BLC15.02	0,40	0,80	0,05	0,02			
L15.03	BLC15.02 - PV15.01	0,50	0,90	0,05	0,02			
L15.03	PV15.01 - BLC15.03	0,50	0,90	0,05	0,02			
L15.04	PV15.01 - PV15.02	0,60	1,00	0,05	0,03			
L15.05	PV15.02 - BLC15.05	0,50	0,90	0,05	0,02			
L15.06	BLC15.04 - BLC15.05	0,50	0,90	0,05	0,02			
L15.07	PV15.02 - PV15.03	0,60	1,00	0,05	0,03			
L15.08	PV15.03 - BLC15.07	0,50	0,90	0,05	0,02			
L15.09	BLC15.06 - BLC15.07	0,40	0,80	0,05	0,02			
L15.10	PV15.03 - PV15.04	0,60	1,00	0,05	0,03			
L15.11	PV15.04 - BLC15.09	0,50	0,90	0,05	0,02			
L15.12	BLC15.08 - BLC15.09	0,40	0,80	0,05	0,02			
L15.13	PV15.04 - PV15.05	0,60	1,00	0,05	0,03			
L15.14	PV15.05 - PV15.06	0,60	1,00	0,05	0,03			
L15.15	PV15.06 - BLC15.11	0,50	0,90	0,05	0,02			
L15.16	BLC15.10 - BLC15.11	0,50	0,90	0,05	0,02			
LCAP15.01	BLC15.04 - CAP15.01	0,40	0,80	0,05	0,02			
LCAP15.02	CAP15.01 - CAP15.02	0,40	0,80	0,05	0,02			
LCAP15.03	BLC15.10 - CAP15.03	0,40	0,80	0,05	0,02			
LCAP15.04	CAP15.03 - CAP15.04	0,40	0,80	0,05	0,02			
Total:					0,45			
02.03.03.05	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR					478,97	M3	
L15.01	Trecho	Tubo	Comprimento (m)	Altura Média (m)	Largura (m)	Volume (m³)		
L15.02	BLC15.01 - BLC15.02	0,40	6,61	0,85	1,60	8,99		
L15.02	BLC15.02 - PV15.01	0,50	22,56	1,00	1,70	38,35		
L15.03	PV15.01 - BLC15.03	0,50	2,93	1,00	1,70	4,98		
L15.04	PV15.01 - PV15.02	0,60	40,00	1,50	1,80	108,00		
L15.05	PV15.02 - BLC15.05	0,50	2,19	1,00	1,70	3,72		
L15.06	BLC15.04 - BLC15.05	0,50	5,95	1,00	1,70	10,12		
L15.07	PV15.02 - PV15.03	0,60	40,00	1,30	1,80	93,60		
L15.08	PV15.03 - BLC15.07	0,50	3,00	1,00	1,70	5,10		
L15.09	BLC15.06 - BLC15.07	0,40	5,80	0,85	1,60	7,89		
L15.11	PV15.04 - BLC15.09	0,50	3,00	1,00	1,70	5,10		
L15.12	BLC15.08 - BLC15.09	0,40	5,80	0,85	1,60	7,89		
L15.12	BLC15.08 - BLC15.09	0,40	5,80	0,85	1,60	7,89		
L15.13	PV15.04 - PV15.05	0,60	40,00	1,15	1,80	82,80		
L15.15	PV15.06 - BLC15.11	0,50	3,00	1,00	1,70	5,10		
L15.16	BLC15.10 - BLC15.11	0,50	5,80	1,00	1,70	9,86		
LCAP15.01	BLC15.04 - CAP15.01	0,40	10,50	0,85	1,60	14,28		
LCAP15.02	CAP15.01 - CAP15.02	0,40	11,73	0,85	1,60	15,95		
LCAP15.03	BLC15.10 - CAP15.03	0,40	24,79	0,85	1,60	33,71		
LCAP15.04	CAP15.03 - CAP15.04	0,40	11,50	0,85	1,60	15,64		
Total:						478,97		
02.03.04	ESCAVAÇÕES EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM							
02.03.04.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M					227,30	M3	
	Equipamento	Comprimento Equipamento (m)	Largura Equipamento (m)	Altura Equipamento (m)	Comprimento Vala (m)	Largura Vala (m)	Altura Cava (m)	Volume (m³)
	CAP 15.01	1,30	0,60	1,00	2,50	1,80	1,00	4,50
	CAP 15.02	1,30	0,60	1,00	2,50	1,80	1,00	4,50
	CAP 15.03	1,30	0,60	1,00	2,50	1,80	1,00	4,50
	CAP 15.04	1,30	0,60	1,00	2,50	1,80	1,00	4,50
	BLC 15.01	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	9,46
	BLC 15.02	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	9,46
	BLC 15.03	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	9,46
	BLC 15.04	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	9,46
	BLC 15.05	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	9,46
	BLC 15.06	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	9,46
	BLC 15.07	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	9,46
	BLC 15.08	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	9,46
	BLC 15.09	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	9,46
	BLC 15.10	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	9,46
	BLC 15.11	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	9,46
	BLC 15.12	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	9,46
	BLC 15.13	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	9,46
	BLC 15.14	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	9,46
	BLC 15.15	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	9,46
	BLC 15.16	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	9,46
	PV15.01		1,20	1,70		2,40	1,70	15,37
	PV15.02			1,30		2,40	1,30	11,76
Página 151,20								

ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.

REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

PV15.03	1,20	1,65	2,40	1,65	14,92
PV15.04	1,20	1,75	2,40	1,75	15,83
PV15.05	1,20	2,20	2,40	2,20	-
PV15.06	1,20	2,70	2,40	2,70	-
				Total:	227,30

02.03.04.02	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M	19,90	M3
-------------	--	-------	----

Equipamento	Comprimento Equipamento (m)	Largura Equipamento (m)	Altura Equipamento (m)	Comprimento Vala (m)	Largura Vala (m)	Altura Cava (m)	Volume (m³)
CAP 15.01	1,30	0,60	1,00	2,50	1,80	1,00	-
CAP 15.02	1,30	0,60	1,00	2,50	1,80	1,00	-
CAP 15.03	1,30	0,60	1,00	2,50	1,80	1,00	-
CAP 15.04	1,30	0,60	1,00	2,50	1,80	1,00	-
BLC 15.01	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	-
BLC 15.02	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	-
BLC 15.03	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	-
BLC 15.04	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	-
BLC 15.05	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	-
BLC 15.06	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	-
BLC 15.07	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	-
BLC 15.08	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	-
BLC 15.09	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	-
BLC 15.10	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	-
BLC 15.11	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,40	-
PV15.01	-	1,20	1,70	-	2,40	1,70	-
PV15.02	-	1,20	1,30	-	2,40	1,30	-
PV15.03	-	1,20	1,65	-	2,40	1,65	-
PV15.04	-	1,20	1,75	-	2,40	1,75	-
PV15.05	-	1,20	2,20	-	2,40	2,20	19,90
PV15.06	-	1,20	2,20	-	2,40	2,70	24,42
						Total:	19,90

02.03.04.03	ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO	219,04	M2
-------------	---------------------------------	--------	----

Trecho	Comprimento Cava (m)	Largura Cava (m)	Altura Cava (m)	Área Parede Cava (m²)
CAP 15.01	1,30	0,60	1,00	4,94
CAP 15.02	1,30	0,60	1,00	4,94
CAP 15.03	1,30	0,60	1,00	4,94
CAP 15.04	1,30	0,60	1,00	4,94
BLC 15.01	1,40	1,40	1,40	7,84
BLC 15.02	1,40	1,40	1,40	7,84
BLC 15.03	1,40	1,40	1,40	7,84
BLC 15.04	1,40	1,40	1,40	7,84
BLC 15.05	1,40	1,40	1,40	7,84
BLC 15.06	1,40	1,40	1,40	7,84
BLC 15.07	1,40	1,40	1,40	7,84
BLC 15.08	1,40	1,40	1,40	7,84
BLC 15.09	1,40	1,40	1,40	7,84
BLC 15.10	1,40	1,40	1,40	7,84
BLC 15.11	1,40	1,40	1,40	7,84
PV15.01	0,00	1,20	1,70	12,81
PV15.02	0,00	1,20	1,30	9,80
PV15.03	0,00	1,20	1,65	12,43
PV15.01	0,00	1,20	1,70	12,81
PV15.02	0,00	1,20	1,30	9,80
PV15.03	0,00	1,20	1,65	12,43
PV15.04	0,00	1,20	1,75	13,19
PV15.05	0,00	1,20	1,75	13,19
PV15.06	0,00	1,20	2,20	16,58
			Total:	219,04

02.03.04.04	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	122,70	M3
-------------	--	--------	----

Equipamento	Volume Equipamento (m³)	Volume Escavado (m³)	Volume Reaterro (m³)
CAP 15.01	0,78	4,50	3,72
CAP 15.02	0,78	4,50	3,72
CAP 15.03	0,78	4,50	3,72
CAP 15.04	0,78	4,50	3,72
BLC 15.01	2,74	9,46	6,72
BLC 15.02	2,74	9,46	6,72
BLC 15.03	2,74	9,46	6,72
BLC 15.04	2,74	9,46	6,72
BLC 15.05	2,74	9,46	6,72
BLC 15.06	2,74	9,46	6,72
BLC 15.07	2,74	9,46	6,72
BLC 15.08	2,74	9,46	6,72
BLC 15.09	2,74	9,46	6,72
BLC 15.10	2,74	9,46	6,72
BLC 15.11	2,74	9,46	6,72
PV15.01	2,26	9,04	6,78
PV15.02	2,26	9,04	6,78
PV15.03	2,26	9,04	6,78
PV15.04	2,26	9,04	6,78
PV15.06	2,26	9,04	6,78
		Total:	122,70

02.03.05	BOCAS DE LOBO E LEÃO		
----------	----------------------	--	--

02.03.05.01	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M.	11,00	UN
Obs. Quantidade			
Avenida Getulio Vargas - Trecho 02	BLC 01 à BLC 11	11,00	
		Total:	11,00

02.03.05.02	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO					2,34	M3
		Comprimento (m)	Altura (m)	Largura (m)	Quantidade	Volume (m³)	
	BLC 01 à BLC 13	5,60	0,20	0,19	11,00	2,34	
					Total:	2,34	

Obs: Verga interna para prolongamento da altura da boca de lobo conjugada.

ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.

REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

02.03.05.03	BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA		Obs.	Quantidade		4,00	UN	
Avenida Getulio Vargas - Trecho 02		CAP 01 à BLC 04		4,00				
		Total:		4,00				
02.03.06	POÇOS DE VISITA							
02.03.06.01	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO					6,00	UN	
Equipamento		Tubo Montante (m)	Tubo Jusante (m)	Profundidade Tubo Montante (m)	Profundidade Tubo Jusante (m)	Altura (m)	Quantidade	
PV01		-	0,60	-	1,70	1,70	1,00	
PV02		0,60	0,60	1,30	1,30	1,30	1,00	
PV03		0,60	0,60	1,30	1,65	1,65	1,00	
PV04		0,60	0,60	1,60	1,75	1,75	1,00	
PV05		0,60	0,60	1,30	2,20	2,20	1,00	
PV06		0,60	0,60	1,30	2,70	2,70	1,00	
		Total:					6,00	
02.03.06.02	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020					1,50	M	
Equipamento		Tubo Montante (m)	Tubo Jusante (m)	Profundidade Tubo Montante (m)	Profundidade Tubo Jusante (m)	Altura (m)	Acréscimo (m)	
PV01		-	0,60	-	1,70	1,70	-	
PV02		0,60	0,60	1,30	1,30	1,30	-	
PV03		0,60	0,60	1,30	1,65	1,65	-	
PV04		0,60	0,60	1,60	1,75	1,75	-	
PV05		0,60	0,60	1,30	2,20	2,20	0,50	
PV06		0,60	0,60	1,30	2,70	2,70	1,00	
		Total:					1,50	
02.03.06.03	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020					5,50	M	
Equipamento		Profundidade Tubo Montante (m)	Profundidade Tubo Jusante (m)	Altura (m)	Altura Base (m)	Altura Chaminé (m)	Quantidade de anéis	Comprimento (múltiplos de 0,5m) (m)
PV01		-	1,70	1,70	1,00	0,70	2,00	1,00
PV02		1,30	1,30	1,30	1,00	0,30	1,00	0,50
PV03		1,30	1,65	1,65	1,00	0,65	2,00	1,00
PV04		1,60	1,75	1,75	1,00	0,75	2,00	1,00
PV05		1,30	2,20	2,20	1,50	0,70	2,00	1,00
PV06		1,30	2,70	2,70	2,00	0,70	2,00	1,00
		Total:					5,50	
02.03.06.04	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE D 400 (RUPTURA> 400 KN)					3,00	UN	
Equipamento		Local	Quantidade					
PV01		Passelo	-					
PV02		Passelo	-					
PV03		Leito Carroçavel	1,00					
PV04		Passelo	-					
PV05		Leito Carroçavel	1,00					
PV06		Leito Carroçavel	1,00					
		Total:	3,00					
02.03.06.05	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020					3,00	UN	
Equipamento		Local	Quantidade					
PV01		Passelo	1,00					
PV02		Passelo	1,00					
PV03		Leito Carroçavel	-					
PV04		Passelo	1,00					
PV05		Leito Carroçavel	-					
PV06		Leito Carroçavel	-					
		Total:	3,00					
02.03.07	REDE DE DRENAGEM							
02.03.07.01	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM					76,73	M	
Trecho		Comprimento (m)	Tubo (m)	Comprimento Tubo 400MM (m)				
L15.01	BLC15.01 - BLC15.02	6,61	0,40	6,61				
L15.02	BLC15.02 - PV15.01	22,56	0,50	-				
L15.03	PV15.01 - BLC15.03	2,93	0,50	-				
L15.04	PV15.01 - PV15.02	40,00	0,60	-				
L15.05	PV15.02 - BLC15.05	2,19	0,50	-				
L15.06	BLC15.04 - BLC15.05	5,95	0,50	-				
L15.07	PV15.02 - PV15.03	40,00	0,60	-				
L15.08	PV15.03 - BLC15.07	3,00	0,50	-				
L15.09	BLC15.06 - BLC15.07	5,80	0,40	5,80				
L15.10	PV15.03 - PV15.04	40,00	0,60	-				
L15.11	PV15.04 - BLC15.09	3,00	0,50	-				
L15.12	BLC15.08 - BLC15.09	5,80	0,40	5,80				
L15.13	PV15.04 - PV15.05	40,00	0,60	-				
LCAP15.01	BLC15.04 - CAP15.01	10,50	0,40	10,50				
LCAP15.02	CAP15.01 - CAP15.02	11,73	0,40	11,73				
LCAP15.03	BLC15.10 - CAP15.03	24,79	0,40	24,79				
LCAP15.04	CAP15.03 - CAP15.04	11,50	0,40	11,50				
		Total:		76,73				
02.03.07.02	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 500MM					39,63	M	
Trecho		Comprimento (m)	Tubo (m)	Comprimento Tubo 500MM (m)				
L15.01	BLC15.01 - BLC15.02	6,61	0,40	-				
L15.02	BLC15.02 - PV15.01	22,56	0,50	22,56				
L15.03	PV15.01 - BLC15.03	2,93	0,50	2,93				
L15.04	PV15.01 - PV15.02	40,00	0,60	-				
L15.05	PV15.02 - BLC15.05	2,19	0,50	2,19				
L15.06	BLC15.04 - BLC15.05	5,95	0,50	5,95				
L15.07	PV15.02 - PV15.03	40,00	0,60	-				
L15.08	PV15.03 - BLC15.07	3,00	0,50	3,00				
L15.09	BLC15.06 - BLC15.07	5,80	0,40	-				
L15.10	PV15.03 - PV15.04	40,00	0,60	-				
L15.11	PV15.04 - BLC15.09	3,00	0,50	3,00				



SETOR DE CONVÊNIOS

ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.

REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

L15.12	BLC15.08 - BLC15.09	5,80	0,40	-
L15.13	PV15.04 - PV15.05	40,00	0,60	-
			Total:	39,63

02.03.07.03	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM					160,00	M
	Trecho	Comprimento (m)	Tubo (m)	Comprimento Tubo 600MM (m)			
L15.01	BLC15.01 - BLC15.02	6,61	0,40	-			
L15.02	BLC15.02 - PV15.01	22,56	0,50	-			
L15.03	PV15.01 - BLC15.03	2,93	0,50	-			
L15.04	PV15.01 - PV15.02	40,00	0,60	40,00			
L15.05	PV15.02 - BLC15.05	2,19	0,50	-			
L15.06	BLC15.04 - BLC15.05	5,95	0,50	-			
L15.07	PV15.02 - PV15.03	40,00	0,60	40,00			
L15.08	PV15.03 - BLC15.07	3,00	0,50	-			
L15.09	BLC15.06 - BLC15.07	5,80	0,40	-			
L15.10	PV15.03 - PV15.04	40,00	0,60	40,00			
L15.11	PV15.04 - BLC15.09	3,00	0,50	-			
L15.12	BLC15.08 - BLC15.09	5,80	0,40	-			
L15.13	PV15.04 - PV15.05	40,00	0,60	40,00			
			Total:	160,00			
02.04	EVENTO 10 - PAVIMENTAÇÃO - AV. PRESID. GETÚLIO VARGAS						
02.04.01	SERVIÇOS PRELIMINARES E BASE						
02.04.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018					711,06	M
	Obs	Comprimento (m)	Lados	Comprimento Total (m)			
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 01	Estacas 00 à 02	35,53	2,00	71,06		
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 02	Estacas 00 à 16	320,00	2,00	640,00		
			Total:	711,06			
02.04.01.02	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO					2.376,33	M2
	Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)			
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 01	Estacas 00 à 02	35,53	8,40	298,45		
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 02	Estacas 00 à 16	320,00	6,00	1.920,00		
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 01 - embocaduras	embocadura intertravado	-	-	157,88		
			Total:	2.376,33			
02.04.01.03	BASE DE BICA CORRIDA					467,37	M3
	Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Altura (m)	Volume (m³)	
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 01	Estacas 00 à 02	35,53	8,40	298,45	0,20	59,69
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 02	Estacas 00 à 16	320,00	6,00	1.920,00	0,20	384,00
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 01 - embocaduras	embocadura intertravado	-	-	157,88	0,15	23,68
				Total:		467,37	
02.04.02	CAMADA DE REVESTIMENTO - CBUQ						
02.04.02.01	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE					2.218,45	M2
	Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)			
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 01	Estacas 00 à 02	35,53	8,40	298,45		
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 02	Estacas 00 à 16	320,00	6,00	1.920,00		
			Total:	2.218,45			
02.04.02.02	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE					2.218,45	M2
	Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)			
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 01	Estacas 00 à 02	35,53	8,40	298,45		
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 02	Estacas 00 à 16	320,00	6,00	1.920,00		
			Total:	2.218,45			
02.04.02.03	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ					88,74	M3
	Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Volume (m³)		
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 01	Estacas 00 à 02	35,53	8,40	0,040	11,94	
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 02	Estacas 00 à 16	320,00	6,00	0,040	76,80	
				Total:		88,74	
02.04.03	CAMADA DE REVESTIMENTO - INTERTRAVADO						
02.04.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022					157,88	M2
	Obs.	Área (m²)					
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 02	Cruzamento Professor Toledo - Lado Direito	48,99				
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 02	Cruzamento Acre - Lado Esquerdo	61,27				
	Avenida Getulio Vargas - Trecho 02	Cruzamento Rua Minas Gerais - Lado Direito	47,62				
		Total:	157,88				
02.05	EVENTO 11 - PAVIMENTAÇÃO - RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02						
02.05.01	SERVIÇOS PRELIMINARES E BASE						
02.05.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018					127,92	M
	Obs	Comprimento (m)	Lados	Comprimento Total (m)			
	Rua Santa Catarina - trecho 02	Estacas 00 à 04	63,96	2,00	127,92		
			Total:	127,92			
02.05.01.02	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO					537,26	M2
	Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)			
	Rua Santa Catarina - trecho 02	Estacas 00 à 04	63,96	8,40	537,26		
			Total:	537,26			
02.05.01.03	BASE DE BICA CORRIDA					107,45	M3

Página 18

ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.

REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

	Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Altura (m)	Volume (m³)
Rua Santa Catarina - trecho 02	Estacas 00 à 04	63,96	8,40	537,26	0,20	107,45
				Total:		107,45

02.05.02 CAMADA DE REVESTIMENTO - CBUQ

02.05.02.01	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE					537,26	M2
	Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)			
Rua Santa Catarina - trecho 02	Estacas 00 à 04	63,96	8,40	537,26			
			Total:	537,26			

02.05.02.02	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE					537,26	M2
	Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)			
Rua Santa Catarina - trecho 02	Estacas 00 à 04	63,96	8,40	537,26			
			Total:	537,26			

02.05.02.03	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ					21,49	M3
	Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Volume (m³)		
Rua Santa Catarina - trecho 02	Estacas 00 à 04	63,96	8,40	0,040	21,49		
				Total:	21,49		

02.06 EVENTO 12 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA

02.06.01	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²					4,41	M2
----------	--	--	--	--	--	------	----

	Obs	Área (m²)	Quantidade	Área Total (m²)
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01 x Rua Rio Grande do Sul	Placa Pare R1	0,30	1,00	0,30
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01 x Rua Rio Grande do Sul	Placa Nome de Rua	0,11	2,00	0,23
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01 x Rua Santa Catarina - Trecho 02	Placa Pare R1	0,30	1,00	0,30
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01 x Rua Santa Catarina - Trecho 02	Placa Nome de Rua	0,11	2,00	0,23
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02 x Rua Santa Catarina - Trecho 02	Placa Pare R1	0,30	1,00	0,30
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02 x Rua Santa Catarina - Trecho 02	Placa Nome de Rua	0,11	2,00	0,23
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02 x Rua Professor Toledo	Placa Pare R1	0,30	1,00	0,30
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02 x Rua Professor Toledo	Placa Nome de Rua	0,11	2,00	0,23
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02 x Rua Acre	Placa Pare R1	0,30	1,00	0,30
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02 x Rua Acre	Placa Nome de Rua	0,11	2,00	0,23
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02 x Rua Minas Gerais	Placa Pare R1	0,30	1,00	0,30
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02 x Rua Minas Gerais	Placa Nome de Rua	0,11	2,00	0,23
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01	Faixa de Pedestres	0,20	2,00	0,41
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02	Faixa de Pedestres	0,20	2,00	0,41
Rua Santa Catarina - Trecho 02	Faixa de Pedestres	0,20	2,00	0,41
	Total:			4,41

02.06.02	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO					72,00	UN
----------	--	--	--	--	--	-------	----

	Obs	Área (m²)	Quantidade	Comprimento Unitário (m)	Comprimento Total (m)
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01 x Rua Rio Grande do Sul	Placa Pare R1	0,30	1,00	3,00	3,00
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01 x Rua Rio Grande do Sul	Placa Nome de Rua	0,11	2,00	3,00	6,00
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01 x Rua Santa Catarina - Trecho 02	Placa Pare R1	0,30	1,00	3,00	3,00
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01 x Rua Santa Catarina - Trecho 02	Placa Nome de Rua	0,11	2,00	3,00	6,00
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02 x Rua Santa Catarina - Trecho 02	Placa Pare R1	0,30	1,00	3,00	3,00
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02 x Rua Santa Catarina - Trecho 02	Placa Nome de Rua	0,11	2,00	3,00	6,00
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02 x Rua Professor Toledo	Placa Pare R1	0,30	1,00	3,00	3,00
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02 x Rua Professor Toledo	Placa Nome de Rua	0,11	2,00	3,00	6,00
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02 x Rua Acre	Placa Pare R1	0,30	1,00	3,00	3,00
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02 x Rua Acre	Placa Nome de Rua	0,11	2,00	3,00	6,00
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02 x Rua Minas Gerais	Placa Pare R1	0,30	1,00	3,00	3,00
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02 x Rua Minas Gerais	Placa Nome de Rua	0,11	2,00	3,00	6,00
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01	Faixa de Pedestres	0,20	2,00	3,00	6,00
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02	Faixa de Pedestres	0,20	2,00	3,00	6,00
Rua Santa Catarina - Trecho 02	Faixa de Pedestres	0,20	2,00	3,00	6,00
	Total:				72,00

02.06.03	LIMPEZA, PRÉ MARCAÇÃO E PRÉ PINTURA DE SOLO					114,95	M2
----------	---	--	--	--	--	--------	----

	Obs	Comprimento (m)	Largura (m)	Quantidade	Área (m²)
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01	Linha central	-	0,10	0,50	-
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01	Linha Dupla - Pare	15,00	0,20	2,00	6,00
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01	Linha contínua - Pare	21,37	0,60	1,00	12,82
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01	Linha proibido estacionar	86,10	0,10	1,00	8,61
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02	Linha central	170,00	0,10	0,50	8,50
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02	Linha Dupla - Pare	15,00	0,20	4,00	12,00
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02	Linha contínua - Pare	11,12	0,60	1,00	6,67
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02	Linha proibido estacionar	482,54	0,10	1,00	48,25
Rua Santa Catarina - Trecho 02	Linha central	47,43	0,10	0,50	2,37
Rua Santa Catarina - Trecho 02	Linha Dupla - Pare	-	0,10	2,00	-
Rua Santa Catarina - Trecho 02	Linha contínua - Pare	-	0,60	1,00	-
Rua Santa Catarina - Trecho 02	Linha proibido estacionar	97,27	0,10	1,00	9,73
	Total:				114,95

02.06.04	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA					105,95	M2
----------	---	--	--	--	--	--------	----

	Obs	Comprimento (m)	Largura (m)	Quantidade	Área (m²)
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01	Linha central	-	0,10	0,50	-
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01	Linha Dupla - Pare	15,00	0,20	2,00	6,00

ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.

REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01	Linha contínua - Pare	21,37	0,60	1,00	12,82
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01	Linha proibido estacionar	86,10	0,10	1,00	8,61
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02	Linha central	170,00	0,10	0,50	8,50
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02	Linha Dupla - Pare	15,00	0,20	1,00	3,00
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02	Linha contínua - Pare	11,12	0,60	1,00	6,67
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02	Linha proibido estacionar	482,54	0,10	1,00	48,25
Rua Santa Catarina - Trecho 02	Linha central	47,43	0,10	0,50	2,37
Rua Santa Catarina - Trecho 02	Linha Dupla - Pare	-	0,10	2,00	-
Rua Santa Catarina - Trecho 02	Linha contínua - Pare	-	0,60	1,00	-
Rua Santa Catarina - Trecho 02	Linha proibido estacionar	97,27	0,10	1,00	9,73
Total:					105,95

02.06.05	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021							41,76	M2
		Obs	Comprimento (m)	Altura (m)	Área (m²)	Quantidade	Área Total (m²)		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01		Pare	2,55	2,40	6,12	2,00	12,24		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02		Pare	2,55	2,40	6,12	1,00	6,12		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01		Faixa de Pedestre	3,00	0,30	0,90	13,00	11,70		
Rua Santa Catarina - Trecho 02		Faixa de Pedestre	3,00	0,30	0,90	13,00	11,70		
						Total:	41,76		
02.07	EVENTO 13 - PASSEIO (RAMPAS E ACESSIBILIDADE)								
02.07.01	CARGA MANUAL DE SOLO							78,68	M3
		Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Volume (m³)		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01		Lado Direito	39,09	1,50	58,64	0,11	6,45		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01		Lado Esquerdo	32,10	1,50	48,15	0,11	5,30		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02		Lado Direito	280,67	1,50	421,01	0,11	46,31		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02		Lado Esquerdo	21,45	1,50	32,18	0,11	3,54		
Rua Santa Catarina - Trecho 02		Lado Direito	54,28	1,50	81,42	0,11	8,96		
Rua Santa Catarina - Trecho 02		Lado Esquerdo	49,20	1,50	73,80	0,11	8,12		
						Total:	78,68		
02.07.02	TRANSPORTE DE SOLO DE 1º E 2º CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM							98,35	M3
			Volume (m³)	Empolamento	Volume Total (m³)				
Movimentação de solo dentro da obra - utilizar solo proveniente da regularização da via			78,68	1,25	98,35				
				Total:	98,35				
02.07.03	REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO							98,35	M3
			Volume (m³)	Empolamento	Volume Total (m³)				
Reaterro laterais do passeio para nivelamento com a altura da face superior da guia.			78,68	1,25	98,35				
				Total:	98,35				
02.07.04	LASTRO DE PEDRA BRITADA							28,62	M3
		Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Volume (m³)		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01		Lado Direito	39,09	1,20	46,91	0,05	2,35		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01		Lado Esquerdo	32,10	1,20	38,52	0,05	1,93		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02		Lado Direito	280,67	1,20	336,80	0,05	16,84		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02		Lado Esquerdo	21,45	1,20	25,74	0,05	1,29		
Rua Santa Catarina - Trecho 02		Lado Direito	54,28	1,20	65,14	0,05	3,26		
Rua Santa Catarina - Trecho 02		Lado Esquerdo	49,20	1,20	59,04	0,05	2,95		
						Total:	28,62		
02.07.05	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.							34,32	M3
		Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Volume (m³)		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01		Lado Direito	39,09	1,20	46,91	0,06	2,81		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01		Lado Esquerdo	32,10	1,20	38,52	0,06	2,31		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02		Lado Direito	280,67	1,20	336,80	0,06	20,21		
Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02		Lado Esquerdo	21,45	1,20	25,74	0,06	1,54		
Rua Santa Catarina - Trecho 02		Lado Direito	54,28	1,20	65,14	0,06	3,91		
Rua Santa Catarina - Trecho 02		Lado Esquerdo	49,20	1,20	59,04	0,06	3,54		
						Total:	34,32		
02.07.06	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA							4,75	M2
		Comprimento (m)	Largura (m)	Quantidade por rampa	Quantidade de rampa	Total (m²)			
Entrada Rampa - RAMPa CONTÍNUA		1,25	0,25	1,00	4,00	1,25			
Saída Rampa - RAMPa CONTÍNUA		1,00	0,25	2,00	4,00	2,00			
Saída Rampa - RAMPa ÚNICA		1,00	0,25	1,00	6,00	1,50			
					Total:	4,75			
02.07.07	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)							62,81	M2
		Obs:	Área (m²)						
Cruzamento AV. GETÚLIO VARGAS x RUA GOIÁS		Ao lado das rampas	4,76						
Cruzamento AV. GETÚLIO VARGAS x RUA MATO GROSSO		Ao lado das rampas	4,75						
Cruzamento AV. GETÚLIO VARGAS x RUA MINAS GERAIS		Ao lado das rampas	4,68						
Cruzamento AV. GETÚLIO VARGAS x RUA PROFESSOR TOLEDO		Ao lado das rampas	4,59						
AV. GETÚLIO VARGAS x RUA SANTA CATARINA		Entre o passeio e a guia	44,03						
		Total:	62,81						
02.08	EVENTO 14 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
02.08.01	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE ÁREA PAVIMENTADA PARA VEÍCULO E PEDESTRE							2.913,59	M2
			Área (m²)						
Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 01			298,45						
Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 02			1.920,00						
Avenida Pres. Getúlio Vargas - trecho 01 - embocaduras			157,88						
Rua Santa Catarina - trecho 02			537,26						
		Total:	2.913,59						

ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.

REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

ETAPA 03 - RECURSOS CONVÊNIO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEMANDA 046527 - Pavimentação e Drenagem Rua Bahia - Trecho 02										
03.01		EVENTO 15 - SERVIÇOS PRELIMINARES								
03.01.02		LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE						549,20	M2	
		Obs.	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)					
Rua Bahia - Trecho 02		Lado Direito	109,84	2,50	274,60					
Rua Bahia - Trecho 02		Lado Esquerdo	109,84	2,50	274,60					
				Total:	549,20					
03.02		EVENTO 16 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DA VIA								
03.02.01		ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020						2.921,74	M3	
		Obs.	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Altura média (m)	Volume (m³)			
Rua Bahia - Trecho 02		regularização e conformação do terreno - área pavimento natural consolidado. Ver Nota 01.	109,84	12,30	1.351,03	2,00	2.702,06			
Rua Bahia - Trecho 02		regularização e conformação do terreno - lateral direita	109,84	2,00	219,68	0,50	109,84			
Rua Bahia - Trecho 02		regularização e conformação do terreno - lateral esquerda	109,84	2,00	219,68	0,50	109,84			
						Total:	2.921,74			
Notas:										
01: a regularização deverá ser executada considerando o greide final da rua na altura das sarjetas. Foi considerando na largura a faixa de rolamento, a sarjeta, a guia e mais 50 cm para a extrusora.										
03.02.02		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA						3.652,18	T	
		Volume (m³)	Empolamento	Volume Total (m³)						
Movimentação de solo dentro da obra - o solo excedente deverá ser colocado em terreno disponibilizado pela PMAS.		2.921,74	1,25	3.652,18						
			Total:	3.652,18						
03.02.03		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020						3.652,18	M3XKM	
		Volume (m³)	Distância Média (KM)	Volume Total (m³)						
Movimentação de solo dentro da obra - o solo excedente deverá ser colocado em terreno disponibilizado pela PMAS.		3.652,18	1,00	3.652,18						
			Total:	3.652,18						
03.02.04		ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019						3.652,18	M3	
		Volume (m³)								
Movimentação de solo dentro da obra - o solo excedente deverá ser colocado em terreno disponibilizado pela PMAS.		3.652,18								
		Total:	3.652,18							
03.02.05		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019						439,36	M2	
		Obs.	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)					
Rua Bahia - Trecho 02		regularização e conformação do terreno - lateral direita	109,84	2,00	219,68					
Rua Bahia - Trecho 02		regularização e conformação do terreno - lateral esquerda	109,84	2,00	219,68					
				Total:	439,36					
Obs: Laterais da faixa de rolamento. A regularização e compactação da via estão inclusas no item abertura de caixa.										
03.03		EVENTO 17 - DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA								
03.03.01		SERVIÇOS PRELIMINARES								
03.03.01.01		LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018						152,13	M	
Trecho		Tubo	Comprimento (m)							
L14.01	BLC4.01 - BLC4.02	0,40	9,00							
L14.02	BLC4.02 - PV4.01	0,50	3,88							
L14.03	PV4.01 - PV4.02	0,50	77,82							
L14.04	BLE04.01 - BLC4.03	0,40	7,82							
L14.05	BLC4.03 - BLC4.04	0,40	9,00							
L14.06	BLC4.04 - PV4.02	0,50	3,88							
L14.07	PV4.02 - PV4.03	0,60	40,73							
		Total:	152,13							
03.03.02		DRENAGEM SUPERFICIAL								
03.03.02.01		EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO						14,80	M3	
		Obs.	Guia Reta (m)	Guia Curva (m)	Comprimento (m)	Área Perfil (m²)	Volume (m³)			
Rua Bahia - Trecho 02		Guia Americana Lado Direito	118,97	15,18	134,15	0,06	8,05			
Rua Bahia - Trecho 02		Guia Americana Lado Esquerdo	78,47	34,03	112,50	0,06	6,75			
					Total:	14,80				
03.03.02.02		CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO						14,80	M3	
		Obs.	Guia Reta (m)	Guia Curva (m)	Comprimento (m)	Área Perfil (m²)	Volume (m³)			
Rua Bahia - Trecho 02		Guia Americana Lado Direito	118,97	15,18	134,15	0,06	8,05			
Rua Bahia - Trecho 02		Guia Americana Lado Esquerdo	78,47	34,03	112,50	0,06	6,75			
					Total:	14,80				

ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO									
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.									
REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023									
03.03.02.03	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPA							4,89	M3
		Obs.	Comprimento (m)	Largura (m)	Espessura (m)	Volume (m³)			
	Rua Bahia - Trecho 02	Entrada UBS	14,22	1,00	0,10	1,42			
	Rua Bahia - Trecho 02	Cruzamento Av. Maria José de Camargo Sá - Lado Direito	16,31	1,00	0,10	1,63			
	Rua Bahia - Trecho 02	Cruzamento Av. Maria José de Camargo Sá - Lado Direito	18,43	1,00	0,10	1,84			
					Total:	4,89			
03.03.02.04	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO							152,26	KG
	Tela Q 196	Obs.	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Peso / m²	Peso Total (kg)		
	Rua Bahia - Trecho 02	Entrada UBS	14,22	1,00	14,22	3,11	44,22		
	Rua Bahia - Trecho 02	Cruzamento Av. Maria José de Camargo Sá - Lado Direito	16,31	1,00	16,31	3,11	50,72		
	Rua Bahia - Trecho 02	Cruzamento Av. Maria José de Camargo Sá - Lado Direito	18,43	1,00	18,43	3,11	57,32		
					Total:	152,26			
03.03.03	ESCAVAÇÕES REDE DE DRENAGEM								
03.03.03.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),							148,46	M3
	Trecho	Tubo	Comprimento (m)	Altura Média (m)	Largura (m)	Volume (m³)			
L14.01	BLC4.01 - BLC4.02	0,40	9,00	1,00	1,40	12,60			
L14.02	BLC4.02 - PV4.01	0,50	3,88	1,25	1,50	7,28			
L14.03	PV4.01 - PV4.02	0,50	77,82	3,00	1,50	-			
L14.04	BLE04.01 - BLC4.03	0,40	7,82	1,00	1,40	10,95			
L14.05	BLC4.03 - BLC4.04	0,40	9,00	1,00	1,40	12,60			
L14.06	BLC4.04 - PV4.02	0,50	3,88	1,25	1,50	7,28			
L14.07	PV4.02 - PV4.03	0,60	40,73	1,50	1,60	97,75			
					Total:	148,46			
03.03.03.02	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),							350,19	M3
	Trecho	Tubo	Comprimento (m)	Altura Média (m)	Largura (m)	Volume (m³)			
L14.01	BLC4.01 - BLC4.02	0,40	9,00	1,00	1,40	-			
L14.02	BLC4.02 - PV4.01	0,50	3,88	1,25	1,50	-			
L14.03	PV4.01 - PV4.02	0,50	77,82	3,00	1,50	350,19			
L14.04	BLE04.01 - BLC4.03	0,40	7,82	1,00	1,40	-			
L14.05	BLC4.03 - BLC4.04	0,40	9,00	1,00	1,40	-			
L14.06	BLC4.04 - PV4.02	0,50	3,88	1,25	1,50	-			
L14.07	PV4.02 - PV4.03	0,60	40,73	1,50	1,60	-			
					Total:	350,19			
03.03.03.03	ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO							294,56	M2
	Trecho	Comprimento (m)	Altura Média (m)	Área Parede Vala (m²)	Faces	Escoramento	Área Total (m²)		
L14.01		9,00	1,00	4,50	2,00	NÃO	-		
L14.02		3,88	1,25	2,43	2,00	NÃO	-		
L14.03		77,82	3,00	116,73	2,00	SIM	233,46		
L14.04		7,82	1,00	3,91	2,00	NÃO	-		
L14.05		9,00	1,00	4,50	2,00	NÃO	-		
L14.06		3,88	1,25	2,43	2,00	NÃO	-		
L14.07		40,73	1,50	30,55	2,00	SIM	61,10		
						Total:	294,56		
03.03.03.04	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020							6,91	M3
	Trecho	Tubo	Comprimento (m)	Altura Média (m)	Largura (m)	Volume (m³)			
L14.01	BLC4.01 - BLC4.02	0,40	9,00	0,05	0,80	0,36			
L14.02	BLC4.02 - PV4.01	0,50	3,88	0,05	0,90	0,17			
L14.03	PV4.01 - PV4.02	0,50	77,82	0,05	0,90	3,50			
L14.04	BLE04.01 - BLC4.03	0,40	7,82	0,05	0,80	0,31			
L14.05	BLC4.03 - BLC4.04	0,40	9,00	0,05	0,80	0,36			
L14.06	BLC4.04 - PV4.02	0,50	3,88	0,05	0,90	0,17			
L14.07	PV4.02 - PV4.03	0,60	40,73	0,05	1,00	2,04			
					Total:	6,91			
03.03.03.05	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR							498,65	M3
	Trecho	Tubo	Comprimento (m)	Altura Média (m)	Largura (m)	Volume (m³)			
L14.01	BLC4.01 - BLC4.02	0,40	9,00	1,00	1,40	12,60			
L14.02	BLC4.02 - PV4.01	0,50	3,88	1,25	1,50	7,28			
L14.03	PV4.01 - PV4.02	0,50	77,82	3,00	1,50	350,19			
L14.04	BLE04.01 - BLC4.03	0,40	7,82	1,00	1,40	10,95			
L14.05	BLC4.03 - BLC4.04	0,40	9,00	1,00	1,40	12,60			
L14.06	BLC4.04 - PV4.02	0,50	3,88	1,25	1,50	7,28			
L14.07	PV4.02 - PV4.03	0,60	40,73	1,50	1,60	97,75			
					Total:	498,65			
03.03.04	ESCAVAÇÕES EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM								
03.03.04.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M							48,03	M3
	Equipamento	Comprimento Equipamento (m)	Largura Equipamento (m)	Altura Equipamento (m)	Comprimento Vala (m)	Largura Vala (m)	Altura Cava (m)	Volume Equipamento (m³)	Volume Vala (m³)
	BLC 04.01	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,60	2,74	10,82
	BLC 04.02	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,60	2,74	10,82
	BLC 04.03	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,60	2,74	10,82
	BLC 04.04	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,60	2,74	10,82
	BLE 04.01	1,00	0,60	1,00	2,20	1,80	1,20	0,60	4,75
	PV 04.01		1,20	3,00		2,40	3,20	-	-
	PV 04.02		1,20	3,00		2,40	3,20	-	-
								Total:	48,03

ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.

REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

03.03.04.02	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M							28,94	M3
Equipamento	Comprimento Equipamento (m)	Largura Equipamento (m)	Altura Equipamento (m)	Comprimento Vala (m)	Largura Vala (m)	Altura Cava (m)	Volume Equipamento (m³)	Volume Vala (m³)	
BLC 04.01	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,60	-	-	
BLC 04.02	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,60	-	-	
BLC 04.03	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,60	-	-	
BLC 04.04	1,40	1,40	1,40	2,60	2,60	1,60	-	-	
BLE 04.01	1,00	0,60	1,00	2,20	1,80	1,20	-	-	
PV 04.01		1,20	3,00		2,40	3,20	3,39	14,47	
PV 04.02		1,20	3,00		2,40	3,20	3,39	14,47	
							Total:	28,94	
03.03.04.03	ESCORAMENTO DE SOLO PONTALETADO							91,24	M2
Equipamento	Comprimento Vala (m)	Largura Vala (m)	Altura Cava (m)	Área Parede Cava (m²)					
BLC 04.01	2,60	2,60	1,60	16,64					
BLC 04.02	2,60	2,60	1,60	16,64					
BLC 04.03	2,60	2,60	1,60	16,64					
BLC 04.04	2,60	2,60	1,60	16,64					
BLE 04.01	2,20	1,80	1,20	9,60					
PV 04.01	-	2,40	3,20	7,54					
PV 04.02	-	2,40	3,20	7,54					
			Total:	91,24					
03.03.04.04	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR							58,63	M3
Equipamento	Volume Equipamento (m³)	Volume Vala (m³)	Volume Reaterro (m³)						
BLC 04.01	2,74	10,82	8,08						
BLC 04.02	2,74	10,82	8,08						
BLC 04.03	2,74	10,82	8,08						
BLC 04.04	2,74	10,82	8,08						
BLE 04.01	0,60	4,75	4,15						
PV 04.01	3,39	14,47	11,08						
PV 04.02	3,39	14,47	11,08						
		Total:	58,63						
03.03.05	BOCAS DE LOBO E LEÃO								
03.03.05.01	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M.							4,00	UN
Avenida Getulio Vargas - Trecho 02		Obs.	Quantidade						
		BLC 04.01 à BLC 04.04	4,00						
		Total:	4,00						
03.03.05.02	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO							0,85	M3
BLC 01 à BLC 13		Comprimento (m)	Altura (m)	Largura (m)	Quantidade	Volume (m³)			
		5,60	0,20	0,19	4,00	0,85			
Obs: Verga interna para prolongamento da altura da boca de lobo conjugada.				Total:	0,85				
03.03.05.03	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020							1,00	UN
Avenida Getulio Vargas - Trecho 02		Obs.	Quantidade						
		BLE 04.01	1,00						
		Total:	1,00						
03.03.06	POÇOS DE VISITA								
03.03.06.01	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO							2,00	UN
Equipamento		Altura (m)	Quantidade						
PV 04.01		3,00	1,00						
PV 04.02		3,00	1,00						
		Total:	2,00						
03.03.06.02	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020							1,00	M
Equipamento		Altura padrão(m)	Altura real (m)	Diferença (m)	Acréscimo (m)				
PV 04.01		1,60	3,00	1,40	0,50				
PV 04.02		1,60	3,00	1,40	0,50				
				Total:	1,00				
03.03.06.03	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020							2,00	M
Equipamento		Altura padrão(m)	Altura real (m)	Diferença (m)	Chaminé (m)				
PV 04.01		1,60	3,00	1,40	1,00				
PV 04.02		1,60	3,00	1,40	1,00				
				Total:	2,00				
03.03.06.04	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020							2,00	UN
Equipamento		Local	Quantidade						
PV 04.01			1,00						
PV 04.02			1,00						
		Total:	2,00						
03.03.07	REDE DE DRENAGEM								
03.03.07.01	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM							25,82	M
Trecho		Tubo (m)	Comprimento (m)	Comprimento Tubo 400MM (m)					
L14.01	BLC4.01 - BLC4.02	0,40	9,00	9,00					
L14.02	BLC4.02 - PV4.01	0,50	3,88	-					
L14.03	PV4.01 - PV4.02	0,50	77,82	-					
L14.04	BLE04.01 - BLC4.03	0,40	7,82	7,82					
L14.05	BLC4.03 - BLC4.04	0,40	9,00	9,00					
L14.06	BLC4.04 - PV4.02	0,50	3,88	-					
L14.07	PV4.02 - PV4.03	0,60	40,73	-					
			Total:	25,82					

ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.

REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

03.03.07.02	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 500MM						85,58	M
Trecho		Tubo (m)	Comprimento (m)	Comprimento Tubo 500MM (m)				
L14.01	BLC4.01 - BLC4.02	0,40	9,00	-				
L14.02	BLC4.02 - PV4.01	0,50	3,88	3,88				
L14.03	PV4.01 - PV4.02	0,50	77,82	77,82				
L14.04	BLE04.01 - BLC4.03	0,40	7,82	-				
L14.05	BLC4.03 - BLC4.04	0,40	9,00	-				
L14.06	BLC4.04 - PV4.02	0,50	3,88	3,88				
L14.07	PV4.02 - PV4.03	0,60	40,73	-				
			Total:	85,58				
03.03.07.03	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM						40,73	M
Trecho		Tubo (m)	Comprimento (m)	Comprimento Tubo 600MM (m)				
L14.01	BLC4.01 - BLC4.02	0,40	9,00	-				
L14.02	BLC4.02 - PV4.01	0,50	3,88	-				
L14.03	PV4.01 - PV4.02	0,50	77,82	-				
L14.04	BLE04.01 - BLC4.03	0,40	7,82	-				
L14.05	BLC4.03 - BLC4.04	0,40	9,00	-				
L14.06	BLC4.04 - PV4.02	0,50	3,88	-				
L14.07	PV4.02 - PV4.03	0,60	40,73	40,73				
			Total:	40,73				
03.04	EVENTO 18 - PAVIMENTAÇÃO							
03.04.01	SERVIÇOS PRELIMINARES E BASE							
03.04.01.01	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018						219,68	M
		Obs	Comprimento (m)	Lados	Comprimento Total (m)			
Rua Bahia - Trecho 02		Estacas 00 à 06	109,84	2,00	219,68			
				Total:	219,68			
03.04.01.02	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO						997,95	M2
		Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)			
Rua Bahia - Trecho 02		Estacas 00 à 06	109,84	8,40	922,66			
Rua Bahia - Trecho 02		embocadura intertravado	-	-	75,29			
				Total:	997,95			
03.04.01.03	BASE DE BICA CORRIDA						195,82	M3
		Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Altura (m)	Volume (m³)	
Rua Bahia - Trecho 02		Estacas 00 à 06	109,84	8,40	922,66	0,20	184,53	
Rua Bahia - Trecho 02		embocadura intertravado	-	-	75,29	0,15	11,29	
					Total:	195,82		
03.04.02	CAMADA DE REVESTIMENTO - CBUQ							
03.04.02.01	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE						922,66	M2
		Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)			
Rua Bahia - Trecho 02		Estacas 00 à 06	109,84	8,40	922,66			
				Total:	922,66			
03.04.02.02	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE						922,66	M2
		Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)			
Rua Bahia - Trecho 02		Estacas 00 à 06	109,84	8,40	922,66			
				Total:	922,66			
03.04.02.03	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ						36,91	M3
		Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Volume (m³)		
Rua Bahia - Trecho 02		Estacas 00 à 06	109,84	8,40	0,040	36,91		
					Total:	36,91		
03.04.03	CAMADA DE REVESTIMENTO - INTERTRAVADO							
03.04.03.01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022						75,29	M2
		Obs.	Área (m²)					
Rua Bahia - Trecho 02		Embocadura no Cruzamento com a Av. Maria José de Camargo Sá	41,15					
Rua Bahia - Trecho 02		Embocadura entrada UBS	34,14					
			Total:	75,29				
03.05	EVENTO 19 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
03.05.01	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IAI/A - ÁREA ATÉ 2,0 M²						0,83	M2
		Obs	Área (m²)	Quantidade	Área Total (m²)			
Rua Bahia - Trecho 02		Placa Pare R1	0,30	2,00	0,60			
Rua Bahia - Trecho 02		Placa Nome de Rua	0,11	2,00	0,23			
				Total:	0,83			
03.05.02	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO						9,00	UN
		Obs	Área (m²)	Quantidade	Comprimento Unitário (m)	Comprimento Total (m)		
Rua Bahia - Trecho 02		Placa Pare R1	0,30	2,00	3,00	6,00		
Rua Bahia - Trecho 02		Placa Nome de Rua	0,11	1,00	3,00	3,00		
					Total:	9,00		

ANEXO B - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.

REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

03.05.03	LIMPEZA, PRÉ MARCAÇÃO E PRÉ PINTURA DE SOLO						15,65	M2
		Comprimento (m)	Largura (m)	Quantidade	Área (m²)			
	Linha central	108,58	0,10	0,50	5,43			
	Linha Dupla - Pare	15,00	0,20	2,00	6,00			
	Linha contínua - Pare	7,04	0,60	1,00	4,22			
				Total:	15,65			
03.05.04	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA						15,65	M2
		Comprimento (m)	Largura (m)	Quantidade	Área (m²)			
	Linha central	108,58	0,10	0,50	5,43			
	Linha Dupla - Pare	15,00	0,20	2,00	6,00			
	Linha contínua - Pare	7,04	0,60	1,00	4,22			
				Total:	15,65			
03.05.05	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021						6,12	M2
		Obs	Comprimento (m)	Altura (m)	Área (m²)	Quantidade	Área Total (m²)	
	Cruzamento Rua Bahia - Trecho 02	Pare	2,55	2,40	6,12	1,00	6,12	
						Total:	6,12	
03.06	EVENTO 20 - PASSEIO (RAMPAS E ACESSIBILIDADE)							
03.06.01	CARGA MANUAL DE SOLO						18,56	M3
		Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Volume (m³)	
	Rua Bahia - Trecho 02	Lado Esquerdo	112,50	1,50	168,75	0,11	18,56	
						Total:	18,56	
03.06.02	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM						23,20	M3
			Volume (m³)	Empolamento	Volume Total (m³)			
	Movimentação de solo dentro da obra - utilizar solo proveniente da regularização da via		18,56	1,25	23,20			
				Total:	23,20			
03.06.03	REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO						23,20	M3
			Volume (m³)	Empolamento	Volume Total (m³)			
	Reaterro laterais do passeio para nivelamento com a altura da face superior da guia.		18,56	1,25	23,20			
				Total:	23,20			
03.06.04	LASTRO DE PEDRA BRITADA						6,75	M3
		Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Volume (m³)	
	Rua Bahia - Trecho 02	Lado Esquerdo	112,50	1,20	135,00	0,05	6,75	
						Total:	6,75	
03.06.05	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.						8,10	M3
		Obs:	Comprimento (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Volume (m³)	
	Rua Bahia - Trecho 02	Lado Esquerdo	112,50	1,20	135,00	0,06	8,10	
						Total:	8,10	
03.06.06	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA						1,31	M2
		Comprimento (m)	Largura (m)	Quantidade por rampa	Quantidade de rampa	Total (m²)		
	Entrada Rampa - RAMPA CONTÍNUA	1,25	0,25	1,00	1,00	0,31		
	Saída Rampa - RAMPA CONTÍNUA	1,00	0,25	2,00	1,00	0,50		
	Saída Rampa - RAMPA ÚNICA	1,00	0,25	1,00	2,00	0,50		
				Total:		1,31		
03.06.07	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)						772,80	M2
		Obs:	Área (m²)					
	Rua Bahia - Trecho 02	Talude Lado Direito	428,00					
	Rua Bahia - Trecho 02	Talude Lado Esquerdo	344,80					
		Total:	772,80					
04.	ETAPA 04 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RECURSOS PRÓPRIOS PMAS							
04.01	EVENTO 22 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
04.01.01	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES						12,69	M3
		Obs	Comprimento (m)	Largura (m)	Espessura (m)	Volume (m³)		
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01		3,55	1,50	0,10	0,53		
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02	Demolição de calçada	32,00	1,50	0,10	4,80		
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03	existente	45,50	1,50	0,10	6,83		
	Rua Santa Catarina - Trecho 02		3,55	1,50	0,10	0,53		
				Total:		12,69		
04.01.02	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL						12,69	M3
		Obs	Comprimento (m)	Largura (m)	Espessura (m)	Volume (m³)		
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01		3,55	1,50	0,10	0,53		
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02	Demolição de calçada	32,00	1,50	0,10	4,80		
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03	existente	45,50	1,50	0,10	6,83		
	Rua Santa Catarina - Trecho 02		3,55	1,50	0,10	0,53		
				Total:		12,69		
04.02	EVENTO 23 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DRENAGEM (Travessas Avenida Getúlio Vargas)							
04.02.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),						27,00	M3
		Obs	Quantidade Estacas					
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01		3,00					
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02	01 ENSAIO POR ESTACA	20,00					
	Rua Santa Catarina - Trecho 02		4,00					
		Total:	27,00					
04.02.02	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020						27,00	M3
		Obs	Quantidade Estacas					
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01		3,00					
	Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02	01 ENSAIO POR ESTACA	20,00					
	Rua Santa Catarina - Trecho 02		4,00					
		Total:	27,00					



ANEXO C - CRONOGRAMA FÍSICO E DE INVESTIMENTO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.
REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	2024	2025	TOTAL
			PERÍODO: 180 dias	PERÍODO: 180 dias	
01.	ETAPA 01 - RECURSOS CONVÊNIO EMENTA PARLAMENTAR - CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL - Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 - PROGRAMA: Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Convênio 932215/22	TOTAL:	R\$ 811.751,08	R\$ 427.518,44	R\$ 1.239.269,52
			65,50%	34,50%	100,00%
01.01	EVENTO 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	3.016,45	-	3.016,45
		%	100,0%	0,0%	100%
01.02	EVENTO 02 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DA VIA	R\$	27.798,67	-	27.798,67
		%	100,0%	0,0%	100%
01.03	EVENTO 03 - DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA	R\$	564.944,50	-	564.944,50
		%	100,0%	0,0%	100%
01.04	EVENTO 04 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$	215.991,46	323.987,20	539.978,66
		%	40,0%	60,0%	100%
01.05	EVENTO 05 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$	-	31.593,97	31.593,97
		%	0,0%	100,0%	100%
01.06	EVENTO 06 - PASSEIO	R\$	-	71.937,27	71.937,27
		%	0,0%	100,0%	100%
02.	ETAPA 02 - RECURSOS CONVÊNIO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEMANDA 046527 - Pavimentação e Drenagem Ruas Santa Catarina - Trecho 02, Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01 e Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02	TOTAL:	R\$ 759.154,30	R\$ 107.018,98	R\$ 866.173,28
			87,64%	12,36%	100,00%
02.01	EVENTO 07 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	3.525,87	-	3.525,87
		%	100,0%	0,0%	100%
02.02	EVENTO 08 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DA VIA	R\$	19.435,38	-	19.435,38
		%	100,0%	0,0%	100%
02.03	EVENTO 09 - DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA	R\$	215.200,54	-	215.200,54
		%	100,0%	0,0%	100,0%
02.04	EVENTO 10 - PAVIMENTAÇÃO - AV. PRES. GETÚLIO VARGAS	R\$	424.438,49	-	424.438,49
		%	100,0%	0,0%	100%
02.05	EVENTO 11 - PAVIMENTAÇÃO - RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02	R\$	96.554,02	-	96.554,02
		%	100,0%	0,0%	100%
02.06	EVENTO 12 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$	-	67.406,72	67.406,72
		%	0,0%	100,0%	100%
02.07	EVENTO 13 - PASSEIO (RAMPAS E ACESSIBILIDADE)	R\$	-	38.913,00	38.913,00
		%	0,0%	100,0%	100%
02.08	EVENTO 14 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	-	699,26	699,26
		%	0,0%	100,0%	100%
03.	ETAPA 03 - RECURSOS CONVÊNIO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEMANDA 046527 - Pavimentação e Drenagem Rua Bahia - Trecho 02	TOTAL:	R\$ 144.811,18	R\$ 212.304,16	R\$ 357.115,34
			40,55%	59,45%	100,00%
03.01	EVENTO 15 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	291,08	-	291,08
		%	100,0%	0,0%	100%
03.02	EVENTO 16 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DA VIA	R\$	43.845,76	-	43.845,76
		%	100,0%	0,0%	100%
03.03	EVENTO 17 - DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA	R\$	100.674,34	-	100.674,34
		%	100,0%	0,0%	100%
03.04	EVENTO 18 - PAVIMENTAÇÃO	R\$	-	177.987,97	177.987,97
		%	0,0%	100,0%	100%
03.05	EVENTO 19 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$	-	9.235,10	9.235,10
		%	0,0%	100,0%	100%
03.06	EVENTO 20 - PASSEIO (RAMPAS E ACESSIBILIDADE)	R\$	-	24.841,58	24.841,58
		%	0,0%	100,0%	100%
03.07	EVENTO 21 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	-	239,51	239,51
		%	0,0%	100,0%	100%
04.	ETAPA 04 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RECURSOS PRÓPRIOS PMAS	TOTAL:	R\$ 51.558,58	R\$ 485.934,24	R\$ 537.492,82
			9,59%	90,41%	100,00%
04.01	EVENTO 22 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$	2.503,67	2.503,67	5.007,34
		%	50,0%	50,0%	100%
04.02	EVENTO 23 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DRENAGEM (Travessas Avenida Getúlio Vargas)	R\$	15.041,82	85.237,00	100.278,82
		%	15,0%	85,0%	100%
04.03	EVENTO 24 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DRENAGEM (Ligação com galerias de drenagem da Rua Rio Grande do Sul e da Avenida Getúlio Vargas)	R\$	-	79.397,98	79.397,98
		%	0,0%	100,0%	100%
04.04	EVENTO 25 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DRENAGEM (Ligação Drenagem Av. Presidente Tancredo Neves)	R\$	-	261.710,02	261.710,02
		%	0,0%	100,0%	100%
04.05	EVENTO 26 - CONFORMAÇÃO ENTORNO RUA BAHIA	R\$	-	284.782,50	284.782,50
		%	0,0%	100,0%	100%
04.06	EVENTO 27 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	R\$	34.013,09	34.013,09	68.026,18
		%	50,0%	50,0%	100%
TOTAL			R\$ 1.767.275,15	R\$ 1.494.485,83	R\$ 3.261.760,98

Araçoiaba da Serra, 12 de março de 2024.

ANEXO D - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - QCI

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA - TRECHO 02.

REFERÊNCIAS: SINAPI 12/2023 - CPOS 192 - SICRO 1023

ITEM	DESCRIÇÃO		REPASSE	CONTRAPARTIDA	TOTAL
01.	ETAPA 01 - RECURSOS CONVÊNIO EMENTA PARLAMENTAR - CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL - Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 03 - PROGRAMA: Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Convênio 932215/22	VALOR:	R\$ 628.835,34	R\$ 182.915,74	R\$ 811.751,08
		FICHA:	743	362	
02.	ETAPA 02 - RECURSOS CONVÊNIO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEMANDA 046527 - Pavimentação e Drenagem Ruas Santa Catarina - Trecho 02, Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 01 e Avenida Pres. Getúlio Vargas - Trecho 02	VALOR:	R\$ 759.154,30	R\$ -	R\$ 759.154,30
		FICHA:	737	-	
03.	ETAPA 03 - RECURSOS CONVÊNIO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEMANDA 046527 - Pavimentação e Drenagem Rua Bahia - Trecho 02	VALOR:	R\$ 144.811,18	R\$ -	R\$ 144.811,18
		FICHA:	737	-	
04.	ETAPA 04 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES - RECURSOS PRÓPRIOS PMAS	VALOR:	R\$ -	R\$ 51.558,58	R\$ 51.558,58
		FICHA:	-	362	
TOTAL			R\$ 1.533.543,82	R\$ 235.198,32	R\$ 1.767.275,15

QCI - QUADRO RESUMO		Exercício 2024	Exercício 2025
RECURSOS CONVÊNIO EMENTA PARLAMENTAR - CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL - PROGRAMA: Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Convênio 932215/22	VALOR:	R\$ 628.835,34	R\$ 331.183,66
	FICHA:	743	LOA 2025
RECURSOS CONVÊNIO EMENTA PARLAMENTAR - CONVÊNIO GOVERNO FEDERAL - PROGRAMA: Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Convênio 932215/22	VALOR:	R\$ 903.965,48	R\$ 96.034,52
	FICHA:	737	LOA 2025
RECURSOS PRÓPRIOS PMAS	VALOR:	R\$ 234.474,32	R\$ 1.067.267,66
	FICHA:	362	LOA 2025

Araçoiaba da Serra, 12 de março de 2024.

ANEXO E - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA
PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02 E RUA BAHIA -
TRECHO 02.

CÁLCULO DO BDI (TCU 2622/2013)

OBRAS EM VIAS URBANAS, RODOVIAS E FERROVIAS

ITENS COMPONENTES DO BDI	INCIDÊNCIA ADOTADA [1]	INCIDÊNCIAS ACEITAS		
		Min.	Méd.	Máx.
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,93%	3,80%	4,01%	4,67%
LUCRO	6,64%	6,64%	7,30%	8,69%
DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%	1,02%	1,11%	1,21%
SEGUROS E GARANTIAS	0,32%	0,32%	0,40%	0,74%
RISCOS	0,50%	0,50%	0,56%	0,97%
TRIBUTOS	5,65%	Conforme Legislação		
PIS	0,65%			
COFINS	3,00%			
ISS	2,00%	Conforme legislação municipal		
[2] Desoneração (4,5%)	0,00%	0% OU 4,5%		
[2] BDI ADOTADO	19,60%	22,19%	23,62%	27,01%

[1] Preencher células em amarelo

[2] Obras orçadas **SEM** desoneração deverão adotar índice
0,00% neste item e intervalo de BDI adotado conforme
LIMITES do quadro ao lado

19,60% 20,97% 24,23%

Declaramos sob pena da Lei que a alternativa adotada pela Prefeitura do Município de
Araçoiaba da Serra é NÃO DESONERADO e que esta é a mais vantajosa para a
Administração Pública.

Declaramos sob pena da Lei que o imposto sobre serviços ISS municipal para a atividade
deste objeto é de 2%.

Araçoiaba da Serra, 12 de março de 2024.

ANEXO F - MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de drenagem, pavimentação, acessibilidade e sinalização viária da Avenida Presidente Getúlio Vargas, Rua Santa Catarina - Trecho 02 e Rua Bahia - Trecho 02.

Município: Araçoiaba da Serra/SP - CEP: 18190-000.

F. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

F.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A execução da obra de pavimentação, drenagem e sinalização viária do Jardim Alvorada – Fase 02 será executado através de dois convênios, um estadual e outro federal.

Ambas as etapas fazem parte do mesmo objeto e serão contratadas através de procedimento licitatório único.

F.2. SERVIÇOS PRELIMINARES

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar placa de obra em lona conforme o “Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras” fornecido pela CAIXA. A placa será constituída por: banner em lona com impressão digital de alta resolução, requadro em metalon de 30 x 20 mm e estrutura de fixação da placa em metalon pintado.

A placa deverá seguir o “Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras” fornecido pela CAIXA.

Deverá ainda ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento a ser definido pelo responsável técnico da obra. A placa deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

A obra terá início após a instalação e aprovação da placa de obra pela FISCALIZAÇÃO.

Os serviços serão iniciados com a limpeza da camada vegetal, a demarcação topográfica e a regularização de toda a área, incluindo as laterais.

Após a aprovação do greide pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá iniciar os serviços de drenagem profunda, que serão compostos por rede enterrada de tubos de concreto armado.

F.2.DRENAGEM PROFUNDA

F.2.1.Escavação, preparo de vala e reaterro:

A escavação deverá ser realizada com retro escavadeira, abrindo uma vala até atingir a profundidade determinada em projeto para tubulações de transposição de segmentos de sarjeta, conforme projeto. A largura mínima da vala será 150 cm a fim de facilitar o trabalho de regularização do fundo e assentamento do tubo. A escavação deverá seguir a inclinação do tubo.

Executar a limpeza, regularização e ajuste de declividade, conforme previsto em projeto, do fundo da vala para tubulações. O fundo da vala deve ser regularizado e compactado.

Executar, quando necessário, a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de compactação prevista em projeto, iniciando o reaterro lateral, região que recobre o tubo, atendendo as especificações de projeto e memoriais e garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento. O trecho por cima do tubo não é compactado com equipamentos de alto impacto para evitar deformações ou quebras. Finaliza-se com o reaterro final, região acima do reaterro superior até a superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas, de no máximo 20 cm, compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. A compactação das camadas é essencial para garantir que não haja futuro afundamento do pavimento no trecho da tubulação.

F.2.2.Tubo de concreto armado para redes coletoras de águas pluviais:

Transportar com auxílio da escavadeira o tubo em concreto armado, para dentro da vala, com cuidado para não danificar a peça. Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas. Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao alinhamento da tubulação e realizar o encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.

F.3.DRENAGEM SUPERFICIAL

Deverá ser construída ao longo da borda da pista de rolamento a drenagem superficial a fim de interceptar o deflúvio que possam comprometer a integridade dos pavimentos e a segurança do tráfego. A interceptação do deflúvio será por meio de guia e sarjetas conjugadas de concreto PADRÃO TIPO AMERICANO.

F.3.1.Execução de guia e sarjeta Padrão Americana

Executar o alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. Regularizar o solo natural e executar a base de assentamento em areia, depois executar as guias e sarjetas conforme projeto (DET 02) com máquina extrusora com concreto usinado (não bombeável), classe de resistência C25, com brita 0, slump = 20 +/- 10mm com as juntas de dilatação. Efetuar o acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do concreto.

F.3.2.Sarjeta ou sarjetão de concreto usinado, moldada in loco:

Os sarjetões serão executados conforme projeto (DET 06). O serviço abrange o fornecimento de concreto usinado com fck de 20 MPa, pedra britada nº 2, inclusive perdas; fornecimento e instalação de formas: lançamento do concreto, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a seção e caimentos desejados. Executar o alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. Regularizar o solo e executar o lastro em brita nº 2 sob o solo compactado. Colocar tela soldada nervurada Q - 196 D=mm de malha 10x10, com cobrimento de 5 cm. Instalar as formas de madeira e efetuar o lançamento e adensamento do concreto, sarrafeando a superfície do sarjetão. Executar as juntas. O sarjetão será moldado com canaleta no meio de 5 cm de largura, com caimento adequado do pavimento asfáltico para o sarjetão.

F.4.PAVIMENTAÇÃO – PREPARO E BASE

O serviço de pavimentação serão iniciados com a abertura de caixa e preparo do subleito.

As camadas do pavimento serão compostas conforme projeto. A base precisa estar limpa de impurezas a fim de garantir que se atinja boa resistência na base do pavimento. Deverá seguir rigorosamente as especificações do projeto básico e das normas vigentes quanto ao controle dos materiais empregados na obra, tal como o índice de suporte Califórnia (CBR), expansão do material, grau de compactação, granulometria, umidade ótima e demais características dos materiais.

F.4.1.Abertura de caixa, regularização e compactação de subleito até 25 cm de espessura:

Deverá fornecer equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: regularização e compactação do subleito para a implantação da camada de base; acabamento da superfície para o acerto das cotas.

O local deverá ser compactado utilizando rolo compressor, até atingir o grau de compactação de 100% do Proctor Normal.

O serviço compreende o fornecimento dos equipamentos e a mão-de-obra necessários para a execução da abertura de caixa, compreendendo a escavação até 25cm; remoção até o primeiro quilômetro; o transporte do material de bota-fora, até 5km, além do primeiro quilômetro, a execução do preparo do sub-leito compreendendo a regularização, escarificação e a compactação de camada de 15cm, abaixo dos 25cm escavados; o fornecimento de terra, caso não haja troca de solo, ou solo reforçado com aditivos químicos, brita, cal ou cimento. Entende-se por fornecimento de terra o material que foi escavado e, não transportado além do primeiro quilômetro, seja utilizado para a regularização de caixa.

F.4.2.Execução e compactação de base com macadame seco:

Esse serviço será executado em toda extensão do trecho, a camada sob a qual irá se executar a base de macadame seco deve estar totalmente concluída, limpa, compactada e sem excessos de umidade.

O material é transportado entre a usina de britagem e a frente de serviço através de caminhões basculantes que a despejam no local de execução do serviço. A equipe auxilia a distribuição do material ao longo da frente de serviço, na sequência, a motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até atingir a espessura da camada prevista em projeto.

Posterior ao espalhamento do agregado graúdo, executa-se o enchimento da camada, na qual os agregados finos (pó de pedra) são espalhados e nivelados pela motoniveladora para que se preencha os vazios da camada de macadame seco.

Em seguida, executa-se a compactação da camada utilizando-se rolo compactador liso vibratório. Finalizada a compactação com o rolo liso vibratório, inicia-se a rolagem com o rolo de pneus, a fim de atender as exigências de compactação e realizar o acabamento da camada.

A execução da base de brita graduada simples deverá seguir o projeto básico e as especificações técnicas do Departamento de Estradas e Rodagem DER/SP ET-DE-P00/008 REV A.

F.5.PAVIMENTAÇÃO – REVESTIMENTO ASFÁLTICO

A via principal será em pavimentação asfáltica, com aplicação de imprimação betuminosa impermeabilizante e ligante, seguida da camada de rolamento em CBUQ. A imprimação impermeabilizante servirá para proteção contra infiltração de água na base, de modo que se garanta a impermeabilização do pavimento e o surgimento de futuras imperfeições na via, como por exemplo, surgimento de borrachudos e crateras. Há, ainda, a aplicação da imprimação ligante entre a brita graduada e a camada de rolamento em CBUQ para melhor aderência entre as camadas. A camada de rolamento em CBUQ terá espessura 4cm conforme determinado em projeto.

Divisão de Convênios

15 3281-7018 | www.aracoiaba.sp.gov.br | convencios@aracoiaba.sp.gov.br
Av. Luane Milanda de Oliveira, 600, Jardim Salete, Araçoiaba da Serra/SP | CEP 18.190-000

4 / 7

F.5.1.Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30:

Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes, a seguir aplica-se o asfalto diluído tipo CM-30. O material não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10°C, ou em dias chuvosos, ou quando a superfície a ser imprimada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade. Deve-se imprimir a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida, e na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida.

F.5.2.Execução de imprimação ligante (pintura de ligação) com emulsão asfáltica RR-2C:

Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a emulsão betuminosa ligante tipo RR-2-C, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes; a seguir aplica-se o material betuminoso. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10°C, ou em dias chuvosos, ou quando a superfície a ser imprimada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade. Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida.

F.5.3.Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ:

Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser pavimentada com o uso da vassoura mecânica rebocável para remoção de materiais que possam prejudicar a adesão da massa asfáltica à base. A mistura asfáltica é transportada entre a usina e a frente de serviço através de caminhões basculantes que a despejam no silo da vibroacabadora. A vibroacabadora é ajustada para executar o revestimento asfáltico com a espessura de 4 cm com largura (variável) prevista em projeto, percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré-compactando a mistura aquecida. Os rasteiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos deixados pela vibroacabadora. Na sequência, assim que há frente disponível de trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus na faixa recém-pavimentada. Deve ser possível ajustar a pressão dos pneus, iniciando a passagem com pequenas pressões e, assim que a mistura asfáltica for esfriando, aumentam-se as pressões. Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem dando o acabamento final ao revestimento asfáltico. Os operários aspergem óleo vegetal nos pneus e no cilindro dos rolos compactadores para evitar que haja suspensão do material recém aplicado. Esse item contempla o material da camada de rolamento, maquinário e mão de obra necessária para execução do serviço, incluso a perda, carga, descarga, limpeza, compactação e acabamento final, bem como mobilização e desmobilização.

Divisão de Convênios

15 3281-7018 | www.aracoiaba.sp.gov.br | convencios@aracoiaba.sp.gov.br
Av. Luane Milanda de Oliveira, 600, Jardim Salete, Araçoiaba da Serra/SP | CEP 18.190-000

5 / 7

F.6.PAVIMENTAÇÃO – REVESTIMENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

A pavimentação das embocaduras indicadas no projeto será em blocos pré-moldados sextavados conforme indicado em projeto, articulados, em concreto simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 MPa, espessura de 6 cm, na cor natural. Serão executados os serviços de lançamento e execução do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratória, assentamento dos blocos a partir de um meio-fio lateral, em ângulos retos ou a 45°, em relação ao eixo definido, garantindo o intertravamento e que as juntas entre as peças não excedam a 3 mm, execução de arremates junto ao meio-fio, ou bueiros e ou caixas de inspeção, compactação das lajotas por meio de placa vibratória, juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espaços das juntas do pavimento e o consequente intertravamento dos blocos. Inclui o preenchimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços existentes entre os blocos e as bordas de acabamento.

F.7.ACESSIBILIDADE

A acessibilidade será necessária em toda extensão do trecho de intervenção da Avenida Presidente Getúlio Vargas – Trecho 03 e servirá para a livre circulação de pedestres com a devida segurança, sem interferir na pista de rolamento. Deverá ser feita a regularização na inclinação indicada em projeto e compactação mecanizada de superfície do local. Sobre a base de solo compactada, deverá ser executado um lastro de brita. O passeio deverá ser executado com concreto de fck 20 MPa, com 6 cm de espessura e acabamento vassourado com borda lisa de 5 cm.

O acabamento final do passeio deverá estar em nível com a guia, exceto quando houver obstáculos no trajeto, sendo necessário desviar o passeio, respeitando sempre a largura mínima. A largura mínima exigida é de 1,20 m, sempre que possível sem interferências, a fim de atender principalmente pessoas com mobilidade reduzida e prevendo o rebaixamento das calçadas onde houver necessidade de travessia e entrada/saída de veículos. A acessibilidade universal deverá obedecer ao Decreto Nº 5296 de 02 de dezembro de 2004 e à NBR 9050/21.

Deverão ser feitas as juntas de dilatação a cada 2 metros. O passeio deverá ser contínuo longitudinalmente ao longo da via e seguindo a inclinação da rua, sem degraus, tendo como cota de referência a guia. Não será admitido degrau entre o passeio novo e passeios existentes, sendo assim, será necessário fazer a adequação do novo passeio a construir com o greide do passeio a ser mantido.

Nas rampas de acessibilidade deverão ser executados piso em ladrilho hidráulico podo tátil, para portadores de deficiência visual, de 25 x 25 cm, com espessura média de 2,5 cm conforme NBR 9050.

Divisão de Convênios

15 3281-7018 | www.aracoiaba.sp.gov.br | convencios@aracoiaba.sp.gov.br
Av. Luane Milanda de Oliveira, 600, Jardim Salete, Aracoiaba de Serra/SP | CEP 18.190-000

6 / 7

F.8.SINALIZAÇÃO VIÁRIA



A sinalização horizontal será feita com a aplicação de tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica.

Nas faixas deverão ser empregados Microesferas de vidro para sinalização horizontal viária, tipo II-A (Drop-on), a ser dispersa imediatamente após aplicação da tinta com micro esferas de vidro


A sinalização vertical será composta por placas de trânsito em alumínio e núcleo polietileno na espessura de 3mm e pintura esmaltada, devidamente fixadas no solo por meio de suporte metálico tubular galvanizado de 2 ½", com 2 metros de altura, ou em postes já existentes conforme projeto. As ruas também receberão identificação através de placas esmaltada azul, nas dimensões 45x25cm.

Deverá ser fornecido o material, transporte e montagem de placa de alumínio com espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 1,50 mm, bitola #16 e núcleo de polietileno de baixa densidade espessura de 3 mm (GT+GT). Com pintura eletrostática de cores variáveis e película refletiva com esferas inclusas, verificar as cores no projeto de sinalização. Poderão ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de desenvolvimento tecnológico, desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam as características essenciais do sinal, durante toda sua vida útil, em quaisquer condições climáticas, inclusive após execução do processo de manutenção. O verso da placa deverá ser na cor preta, fosca ou semifosca. As dimensões e quantidades estão previstas em projeto conforme especificações do CONTRAN. Toda a sinalização vertical deverá seguir o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Regulamentação Volume I e Advertência Volume II do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.


Araçoiaba da Serra, 12 de março de 2024.

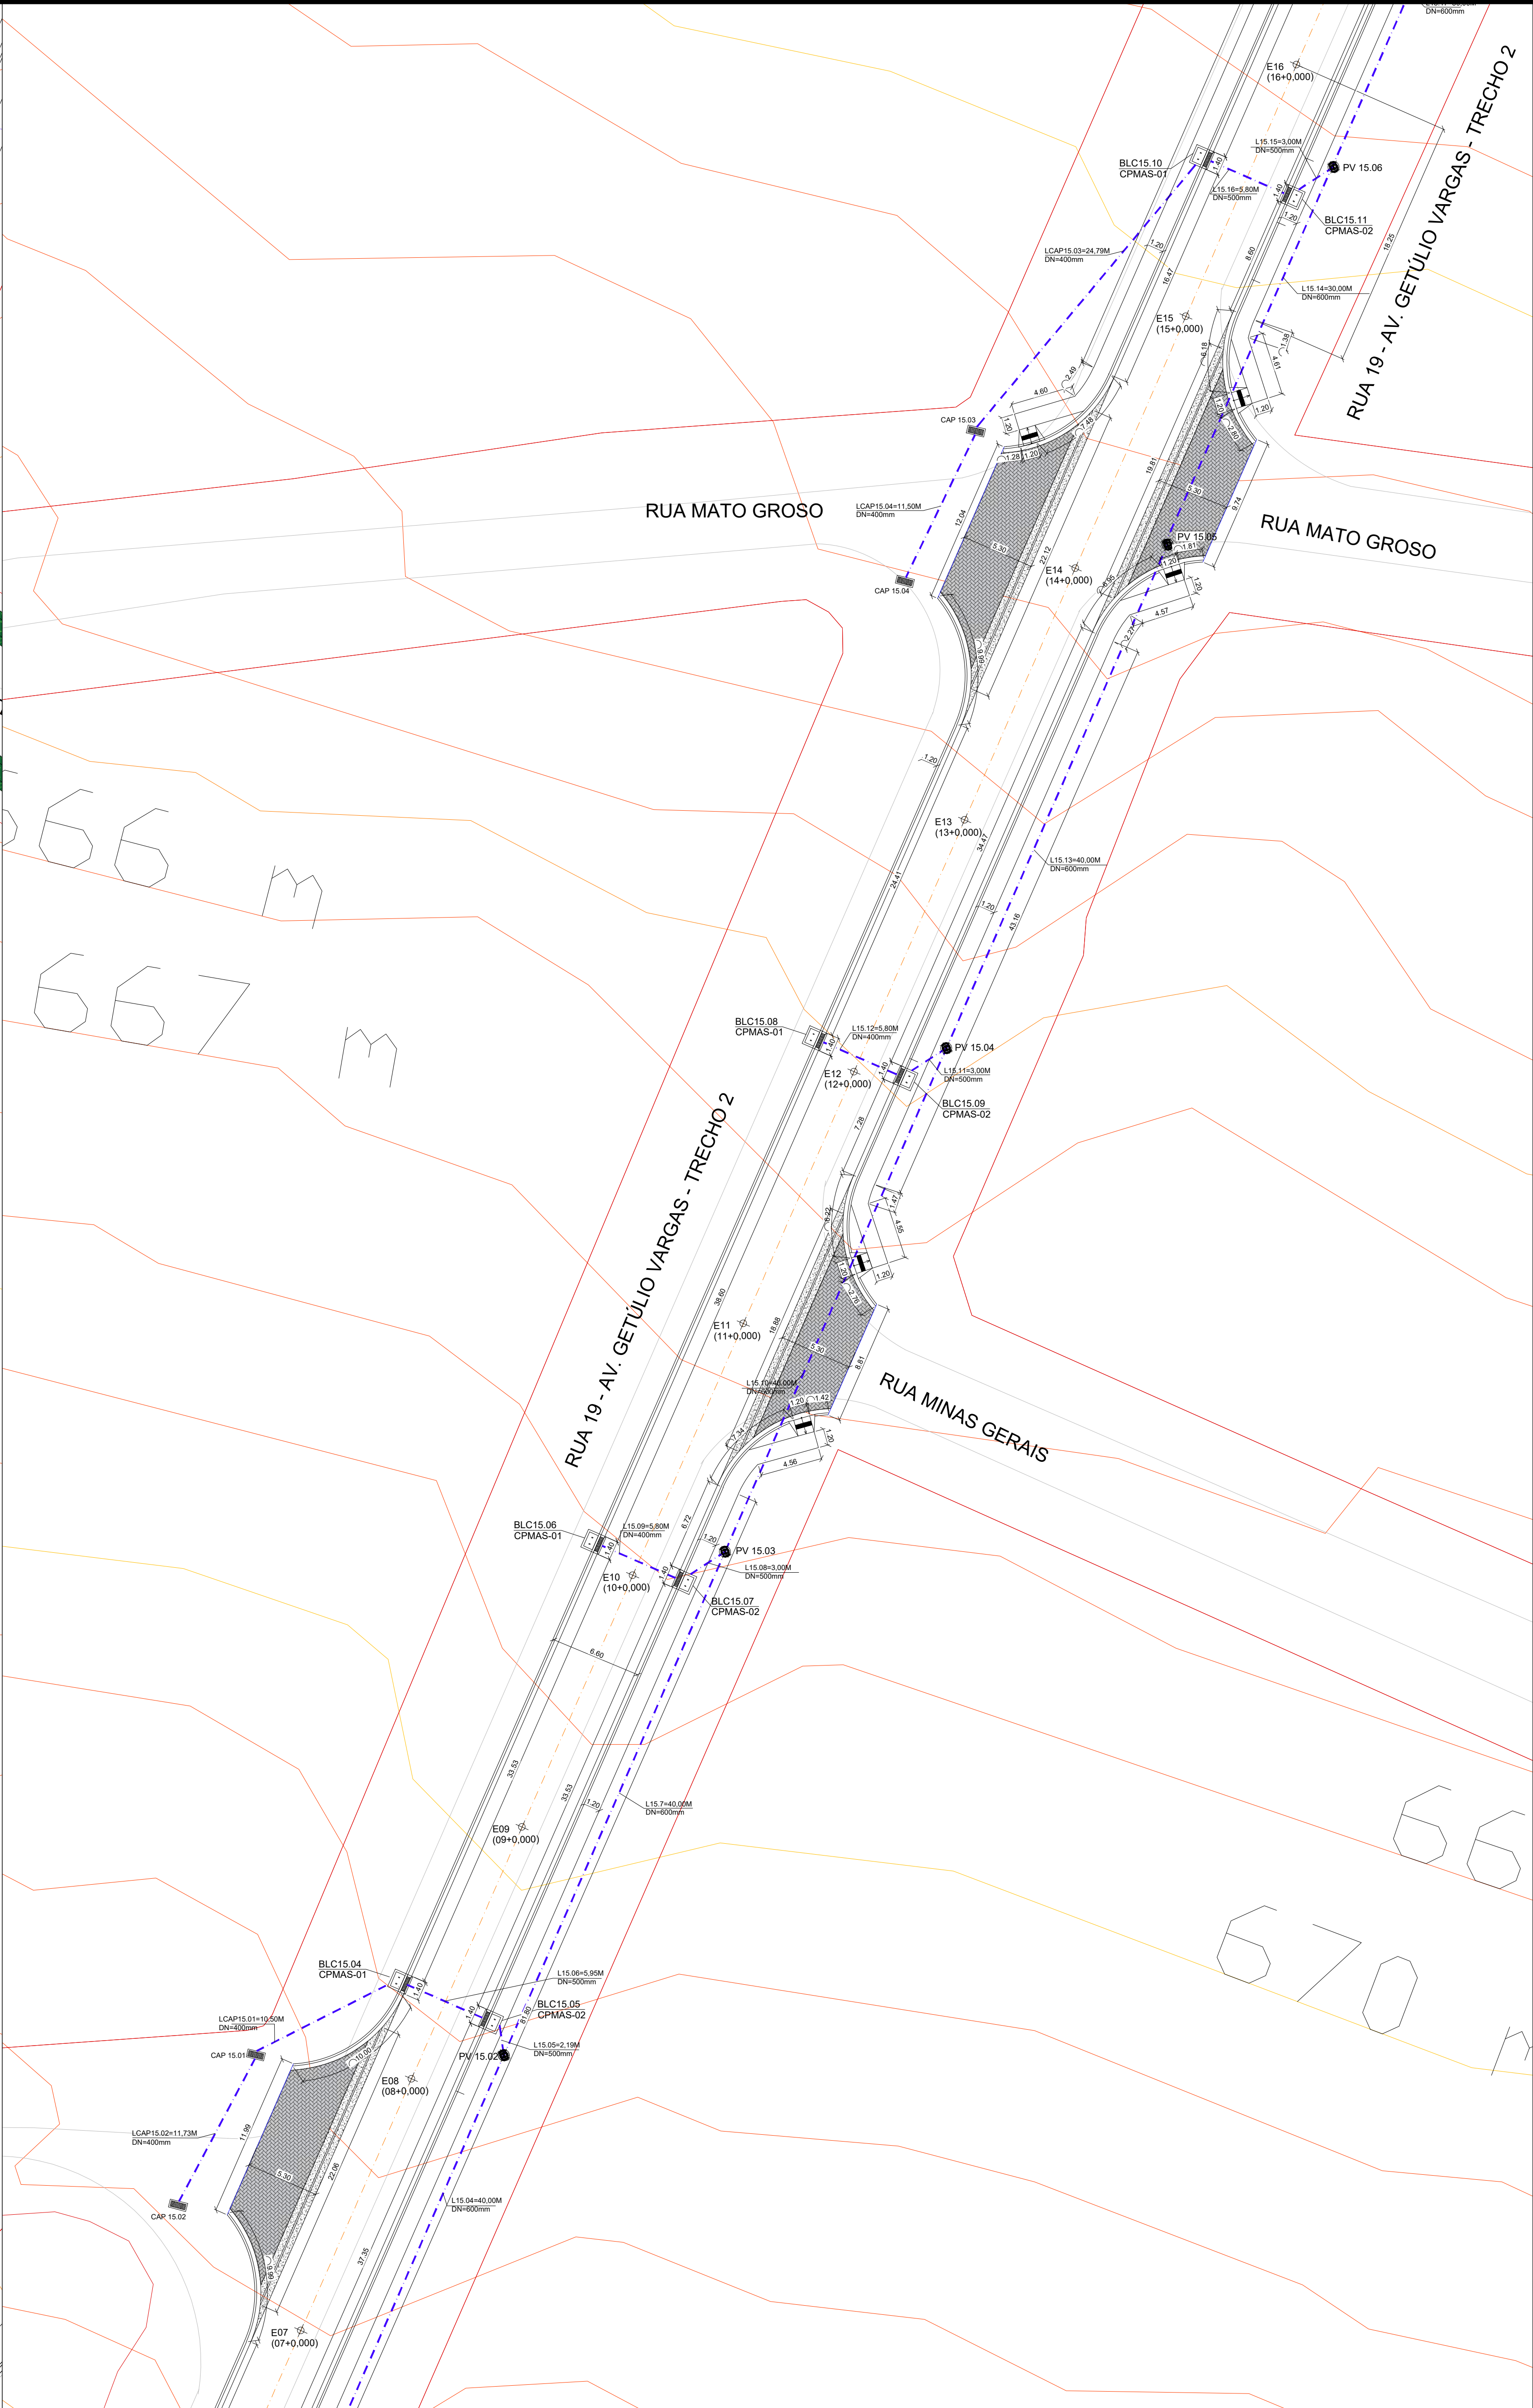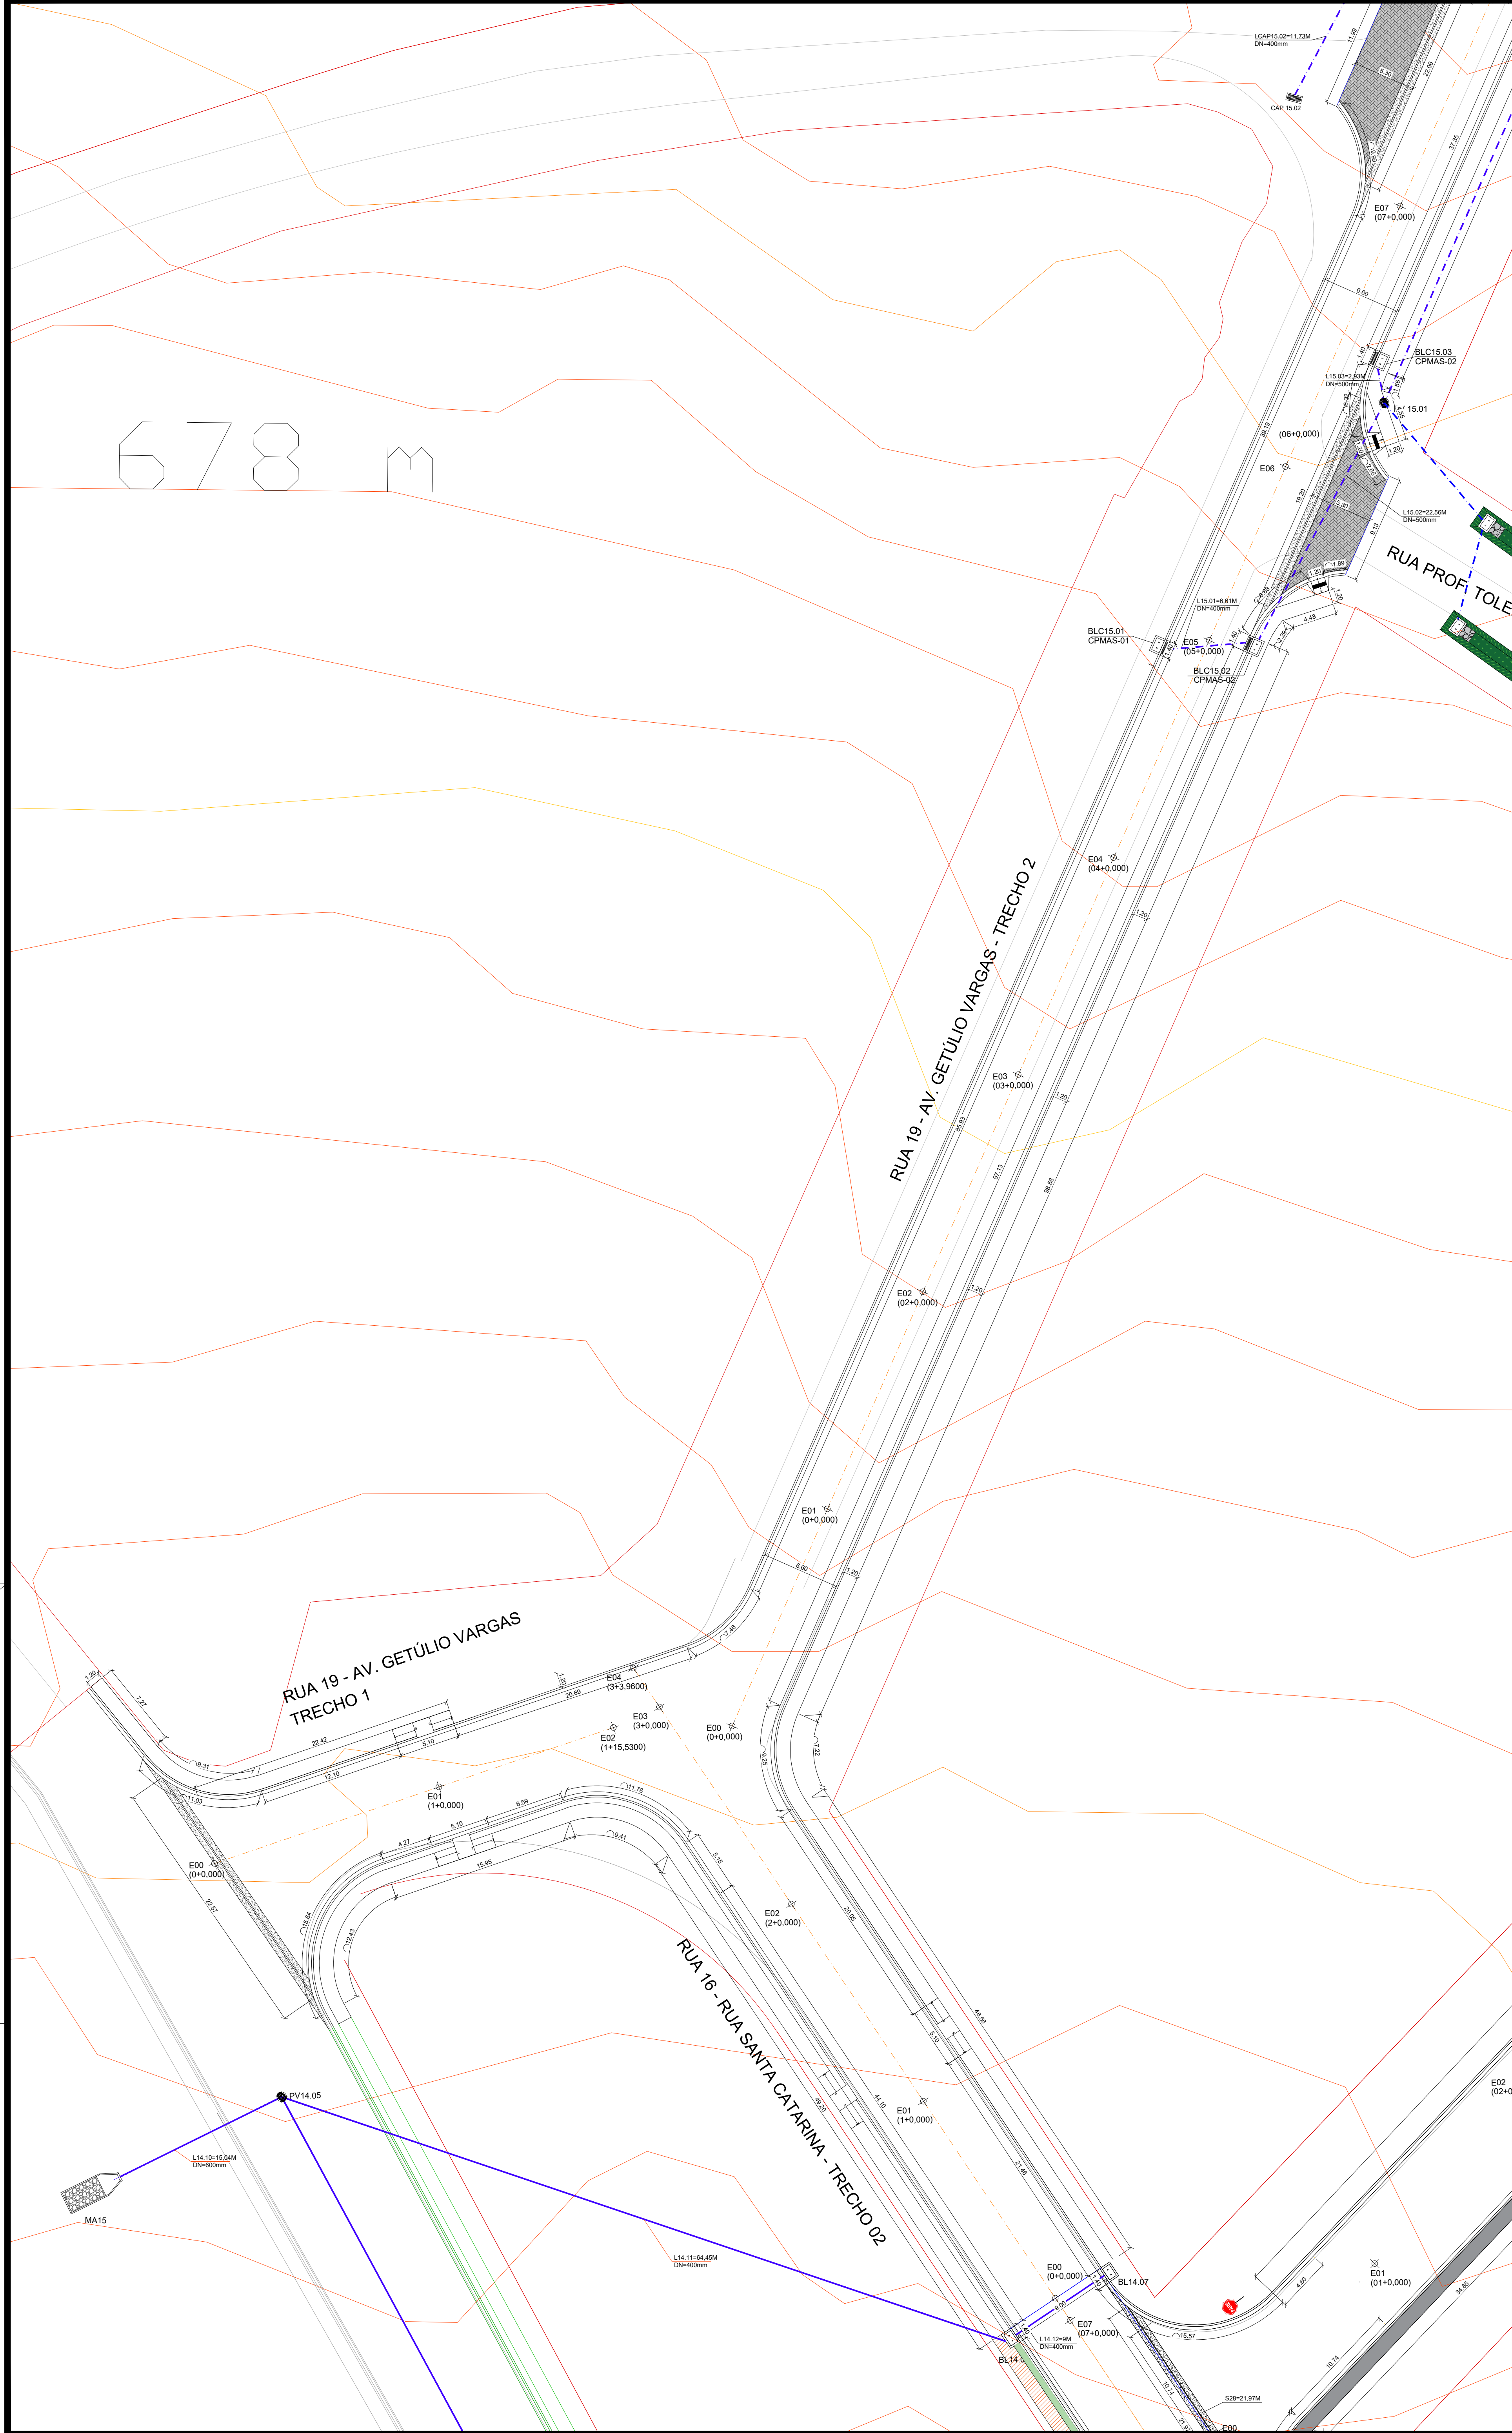

DETALHE DO PASSEIO
VISTA SUPERIOR E
CORTE TRANSVERSAL PADRÃO PMAS - PERFIL TIPO 01A
ESC. 1:50

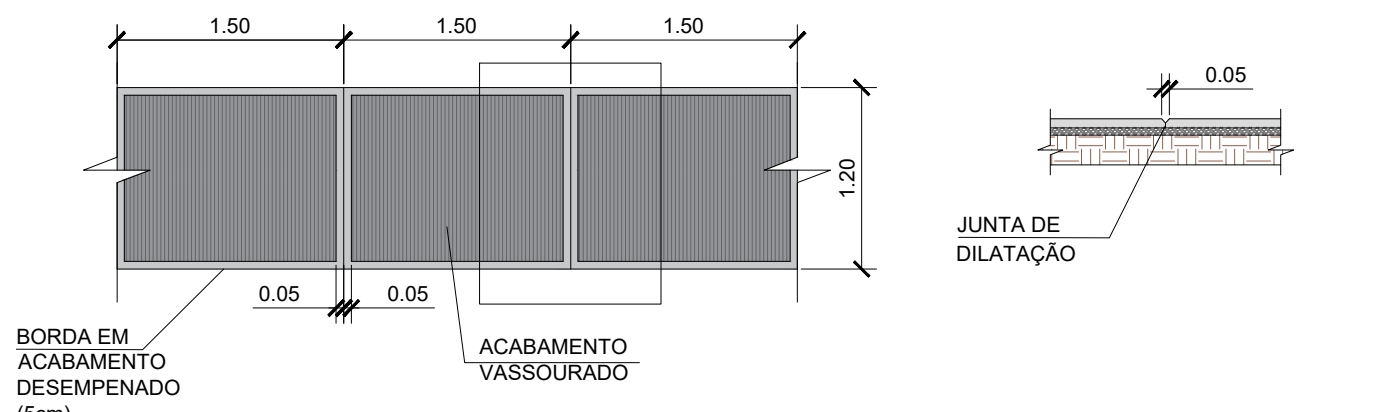


DETALHE 08
SARJETÃO 100 MEDIDAS EM CM
ESCALA 1:50




DETALHE 07
GUIA E SARJETA EXTRUSADA
TIPO AMERICA - MEDIDAS EM CM
ESCALA 1:50

DETALHE 06 - CORTE TRANSVERSAL PADRÃO PMAS - PERFIL TIPO 1
ESC. 1:50

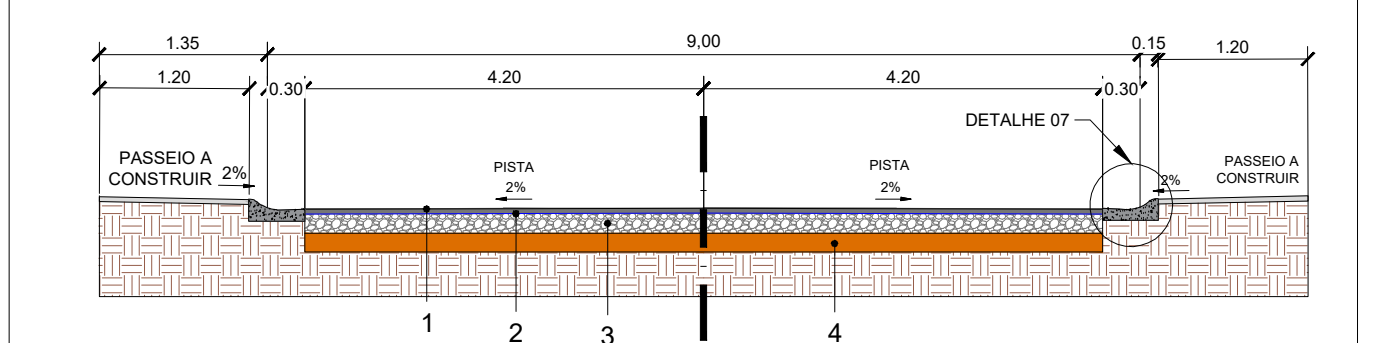


Nº	SEÇÃO TIPO ADOPTADA	(CM)	LEGENDA
1.	SARJETA DE POLIMENTO DO CONCRETO BETÃO 20 MPa	4.00	CONCRETO FCK 20 MPa
2.	SARJETA DE POLIMENTO DO CONCRETO BETÃO 20 MPa	4.00	CONCRETO FCK 20 MPa
3.	SARJETA DE POLIMENTO DO CONCRETO BETÃO 20 MPa	4.00	CONCRETO FCK 20 MPa
4.	SARJETA DE POLIMENTO DO CONCRETO BETÃO 20 MPa	4.00	CONCRETO FCK 20 MPa

DETALHE 07 - CORTE TRANSVERSAL PADRÃO PMAS - PERFIL TIPO 2
ESC. 1:50

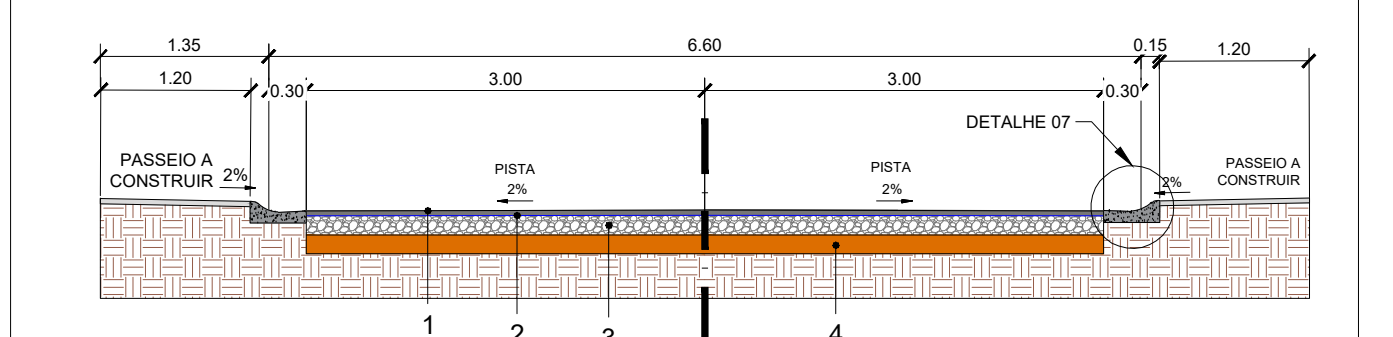


Nº	SEÇÃO TIPO ADOPTADA	(CM)	LEGENDA
1.	SARJETA DE POLIMENTO DO CONCRETO BETÃO 20 MPa	4.00	CONCRETO FCK 20 MPa
2.	SARJETA DE POLIMENTO DO CONCRETO BETÃO 20 MPa	4.00	CONCRETO FCK 20 MPa
3.	SARJETA DE POLIMENTO DO CONCRETO BETÃO 20 MPa	4.00	CONCRETO FCK 20 MPa
4.	SARJETA DE POLIMENTO DO CONCRETO BETÃO 20 MPa	4.00	CONCRETO FCK 20 MPa

DETALHE 03 - CAIXA PARA BOCA DE LOBO CONJUGADA
COM GRELHA METÁLICA
ESC. 1:50



EQUIPAMENTO DE DRENAGEM PADRÃO PMAS - EQ01
DETALHE POÇO DE VISITA - PV TIPO

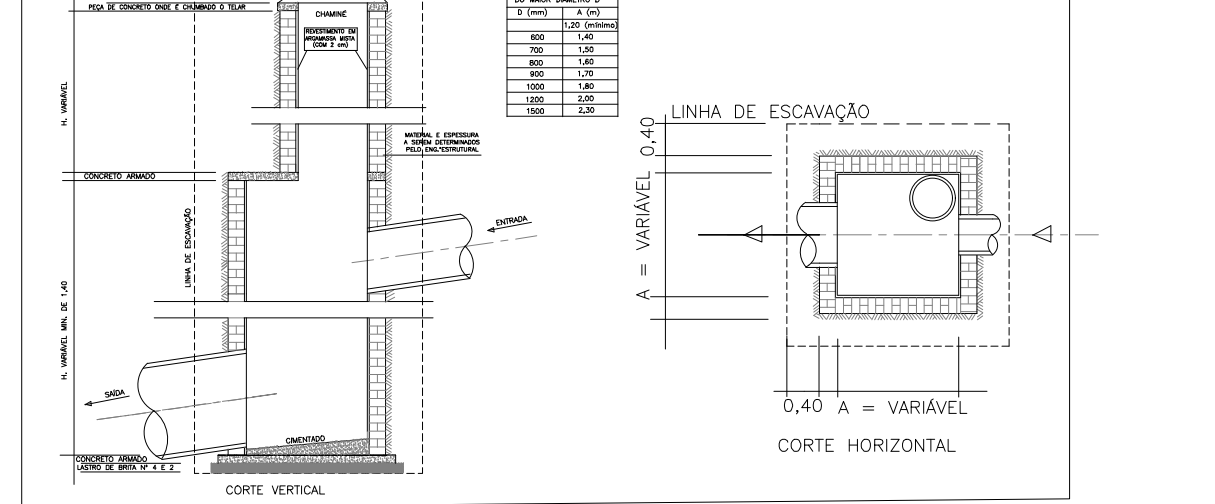

REVISÃO	DATA	ASSUNTO	RESPONSÁVEL
REV_01	06/2022	EMISSÃO INICIAL	ENG. VINÍCIUS AYUB DE CAMPOS ABRAME


RUA	PERFIL	INÍCIO	TRECHO	TÉRMINO	CONVÊNIO
AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01	TIPO 01 - DETALHE 06	RUA RIO GRANDE DO SUL	até	RUA SANTA CATARINA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02	TIPO 02 - DETALHE 07	RUA SANTA CATARINA	até	AV. GETÚLIO VARGAS - ESTACA 16	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO 03	TIPO 02 - DETALHE 07	AV. GETÚLIO VARGAS - ESTACA 16	até	RUA COPACABANA	Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Convênio 932215/22
RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02	TIPO 01 - DETALHE 06	RUA SANTA CATARINA - TRECHO 01	até	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
RUA BAHIA - TRECHO 02	TIPO 01 - DETALHE 06	RUA BAHIA - TRECHO 01	até	ALAMEDA FRANKLIN DE LIMA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527

ARACAJU - SERGIPE

SETOR DE CONVÊNIOS

PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

PROJETO BÁSICO ALVORADA FASE 02 - REV01 - Página 02 de 02



DETALHE DO PASSEIO
VISTA SUPERIOR E
CORTE TRANSVERSAL PADRÃO PMAS - PERFIL TIPO 01A
ESC. 1:50

DETALHE 08
SARJETÃO 100 MEDIDAS EM CM
ESCALA 1:50

DETALHE 07
GUIA E SARJETA EXTRUSADA
TIPO AMERICA - MEDIDAS EM CM
ESCALA 1:50

DETALHE 06 - CORTE TRANSVERSAL PADRÃO PMAS - PERFIL TIPO 1
ESC. 1:50

DETALHE 07 - CORTE TRANSVERSAL PADRÃO PMAS - PERFIL TIPO 2
ESC. 1:50

DETALHE 03 - CAIXA PARA BOCA DE LOBO CONJUGADA
COM GRELHA METÁLICA
ESC. 1:50

EQUIPAMENTO DE DRENAGEM PADRÃO PMAS - EQ01
DETALHE POÇO DE VISITA - PV TIPO

APROVAÇÃO DEMULTRAR

DR. JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
PREFEITO DE ARACAJÓ

DR. JAIR FERREIRA DUARTE JUNIOR
SECRETÁRIO DE RELAÇÕES PÚBLICAS
E INSTITUIÇÕES GUBERNISTAS

ENG. VINÍCIUS AYUB DE CAMPOS ABRAME
RESPONSÁVEL TÉCNICO

REVISÕES

REV.	DATA	ASSUNTO	RESPONSÁVEL
REV_00	06/2022	EMISSÃO INICIAL	ENG. VINÍCIUS AYUB DE CAMPOS ABRAME
REV_01	04/2023	ALTERAÇÃO PASSO E LADO ESQUERDO	ENG. VINÍCIUS AYUB DE CAMPOS ABRAME

ARACAJÓ

15/2023-79118 - www.aracaju.ba.gov.br | www.transparencia.aracaju.ba.gov.br

Av. Lacerda, 100 - Centro, CEP: 55060-000

SETOR DE
CONVÊNIOS

15/2023-79118 - www.aracaju.ba.gov.br | www.transparencia.aracaju.ba.gov.br


Av. Lacerda, 100 - Centro, CEP: 55060-000

PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
AV. PRES. GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02
ESTACAS 11 A 27


PROJETO BÁSICO ALVORADA FASE 02 - REV01 - Página 02 de 02

RUA	PERFIL	TRECHO	INÍCIO	TÉRMINO	CONVÊNIO
AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01	TIPO 01 - DETALHE 06	RUA RIO GRANDE DO SUL	0+00	RUA SANTA CATARINA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02	TIPO 02 - DETALHE 07	RUA SANTA CATARINA	0+00	AV. GETÚLIO VARGAS - ESTACA 16	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO 03	TIPO 02 - DETALHE 07	AV. GETÚLIO VARGAS - ESTACA 16	0+00	RUA COPACABANA	Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Convênio 932215/22
RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02	TIPO 01 - DETALHE 06	RUA SANTA CATARINA - TRECHO 01	0+00	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
RUA BAHIA - TRECHO 02	TIPO 01 - DETALHE 06	RUA BAHIA - TRECHO 01	0+00	ALAMEDA FRANKLIN DE LIMA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527


PROJETO BÁSICO ALVORADA FASE 02 - REV01 - Página 02 de 02

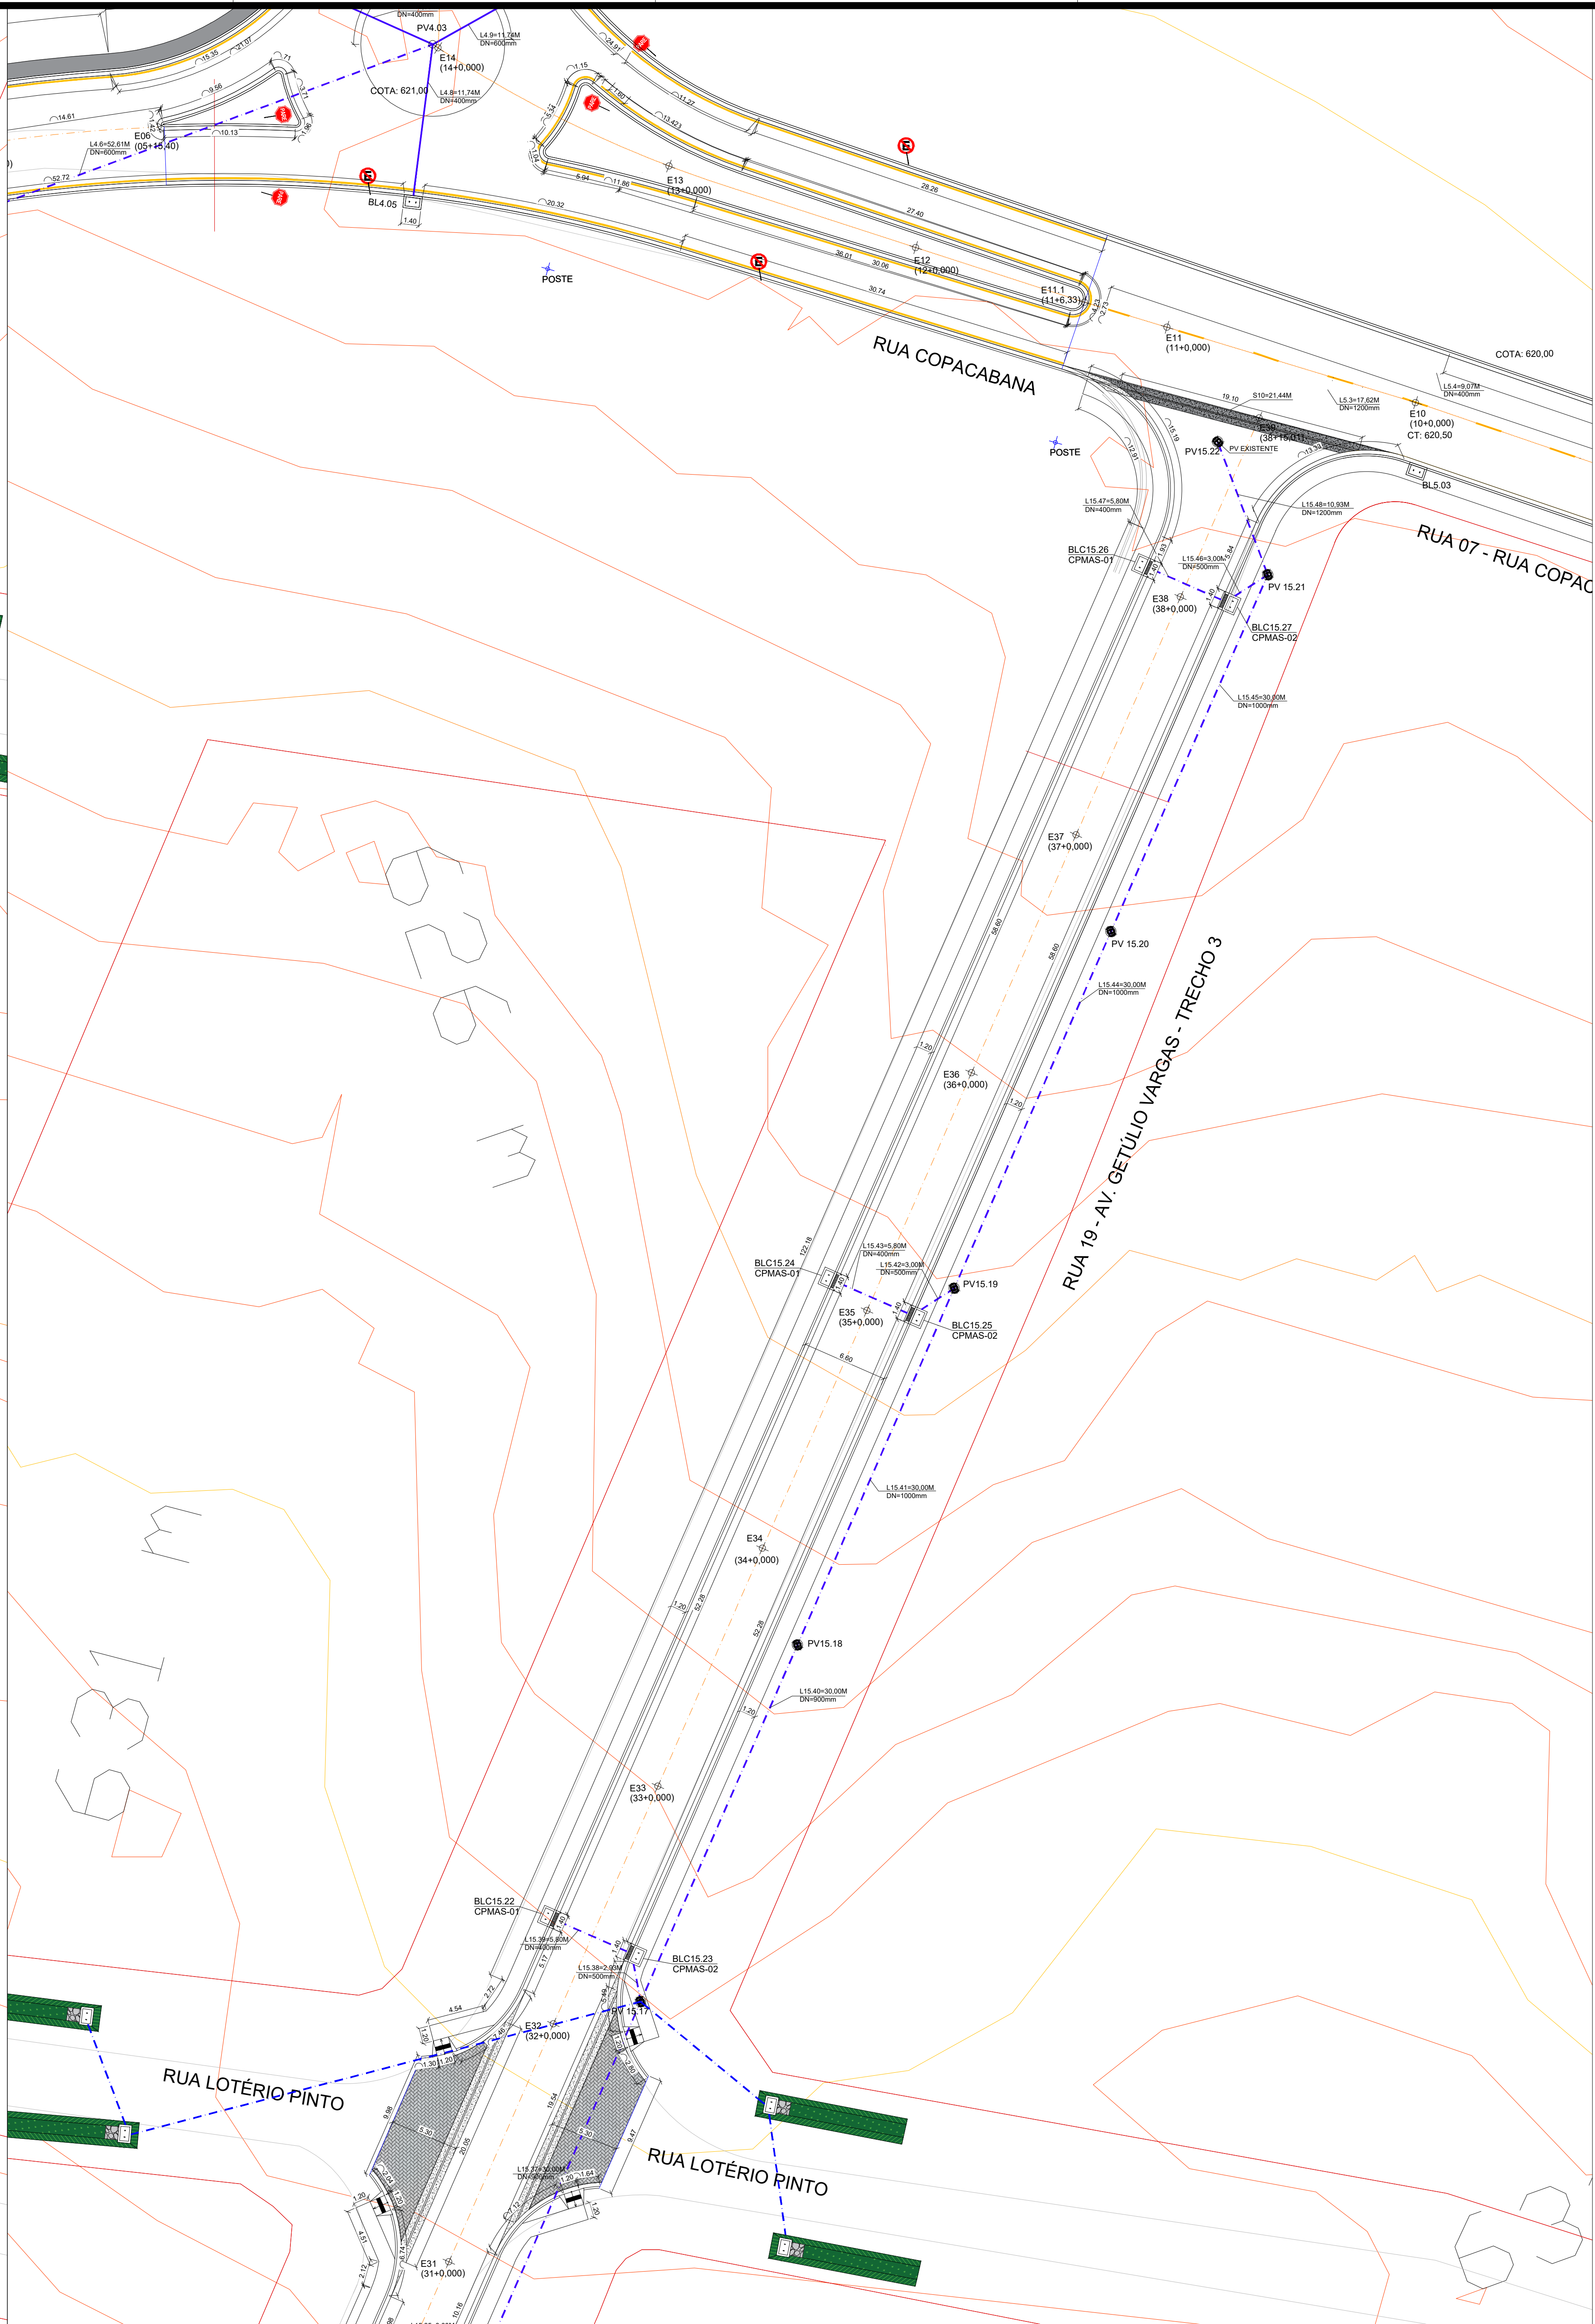

RUA	PERFIL	INÍCIO	TRECHO	TÉRMINO	CONVÊNIO
AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01	TIPO 01 - DETALHE 06	RUA RIO GRANDE DO SUL	até	RUA SANTA CATARINA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02	TIPO 02 - DETALHE 07	RUA SANTA CATARINA	até	AV. GETÚLIO VARGAS - ESTACA 16	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO 03	TIPO 02 - DETALHE 07	AV. GETÚLIO VARGAS - ESTACA 16	até	RUA COPACABANA	Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Convênio 932215/22
RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02	TIPO 01 - DETALHE 06	RUA SANTA CATARINA - TRECHO 01	até	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
RUA BAHIA - TRECHO 02	TIPO 01 - DETALHE 06	RUA BAHIA - TRECHO 01	até	ALAMEDA FRANKLIN DE LIMA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527

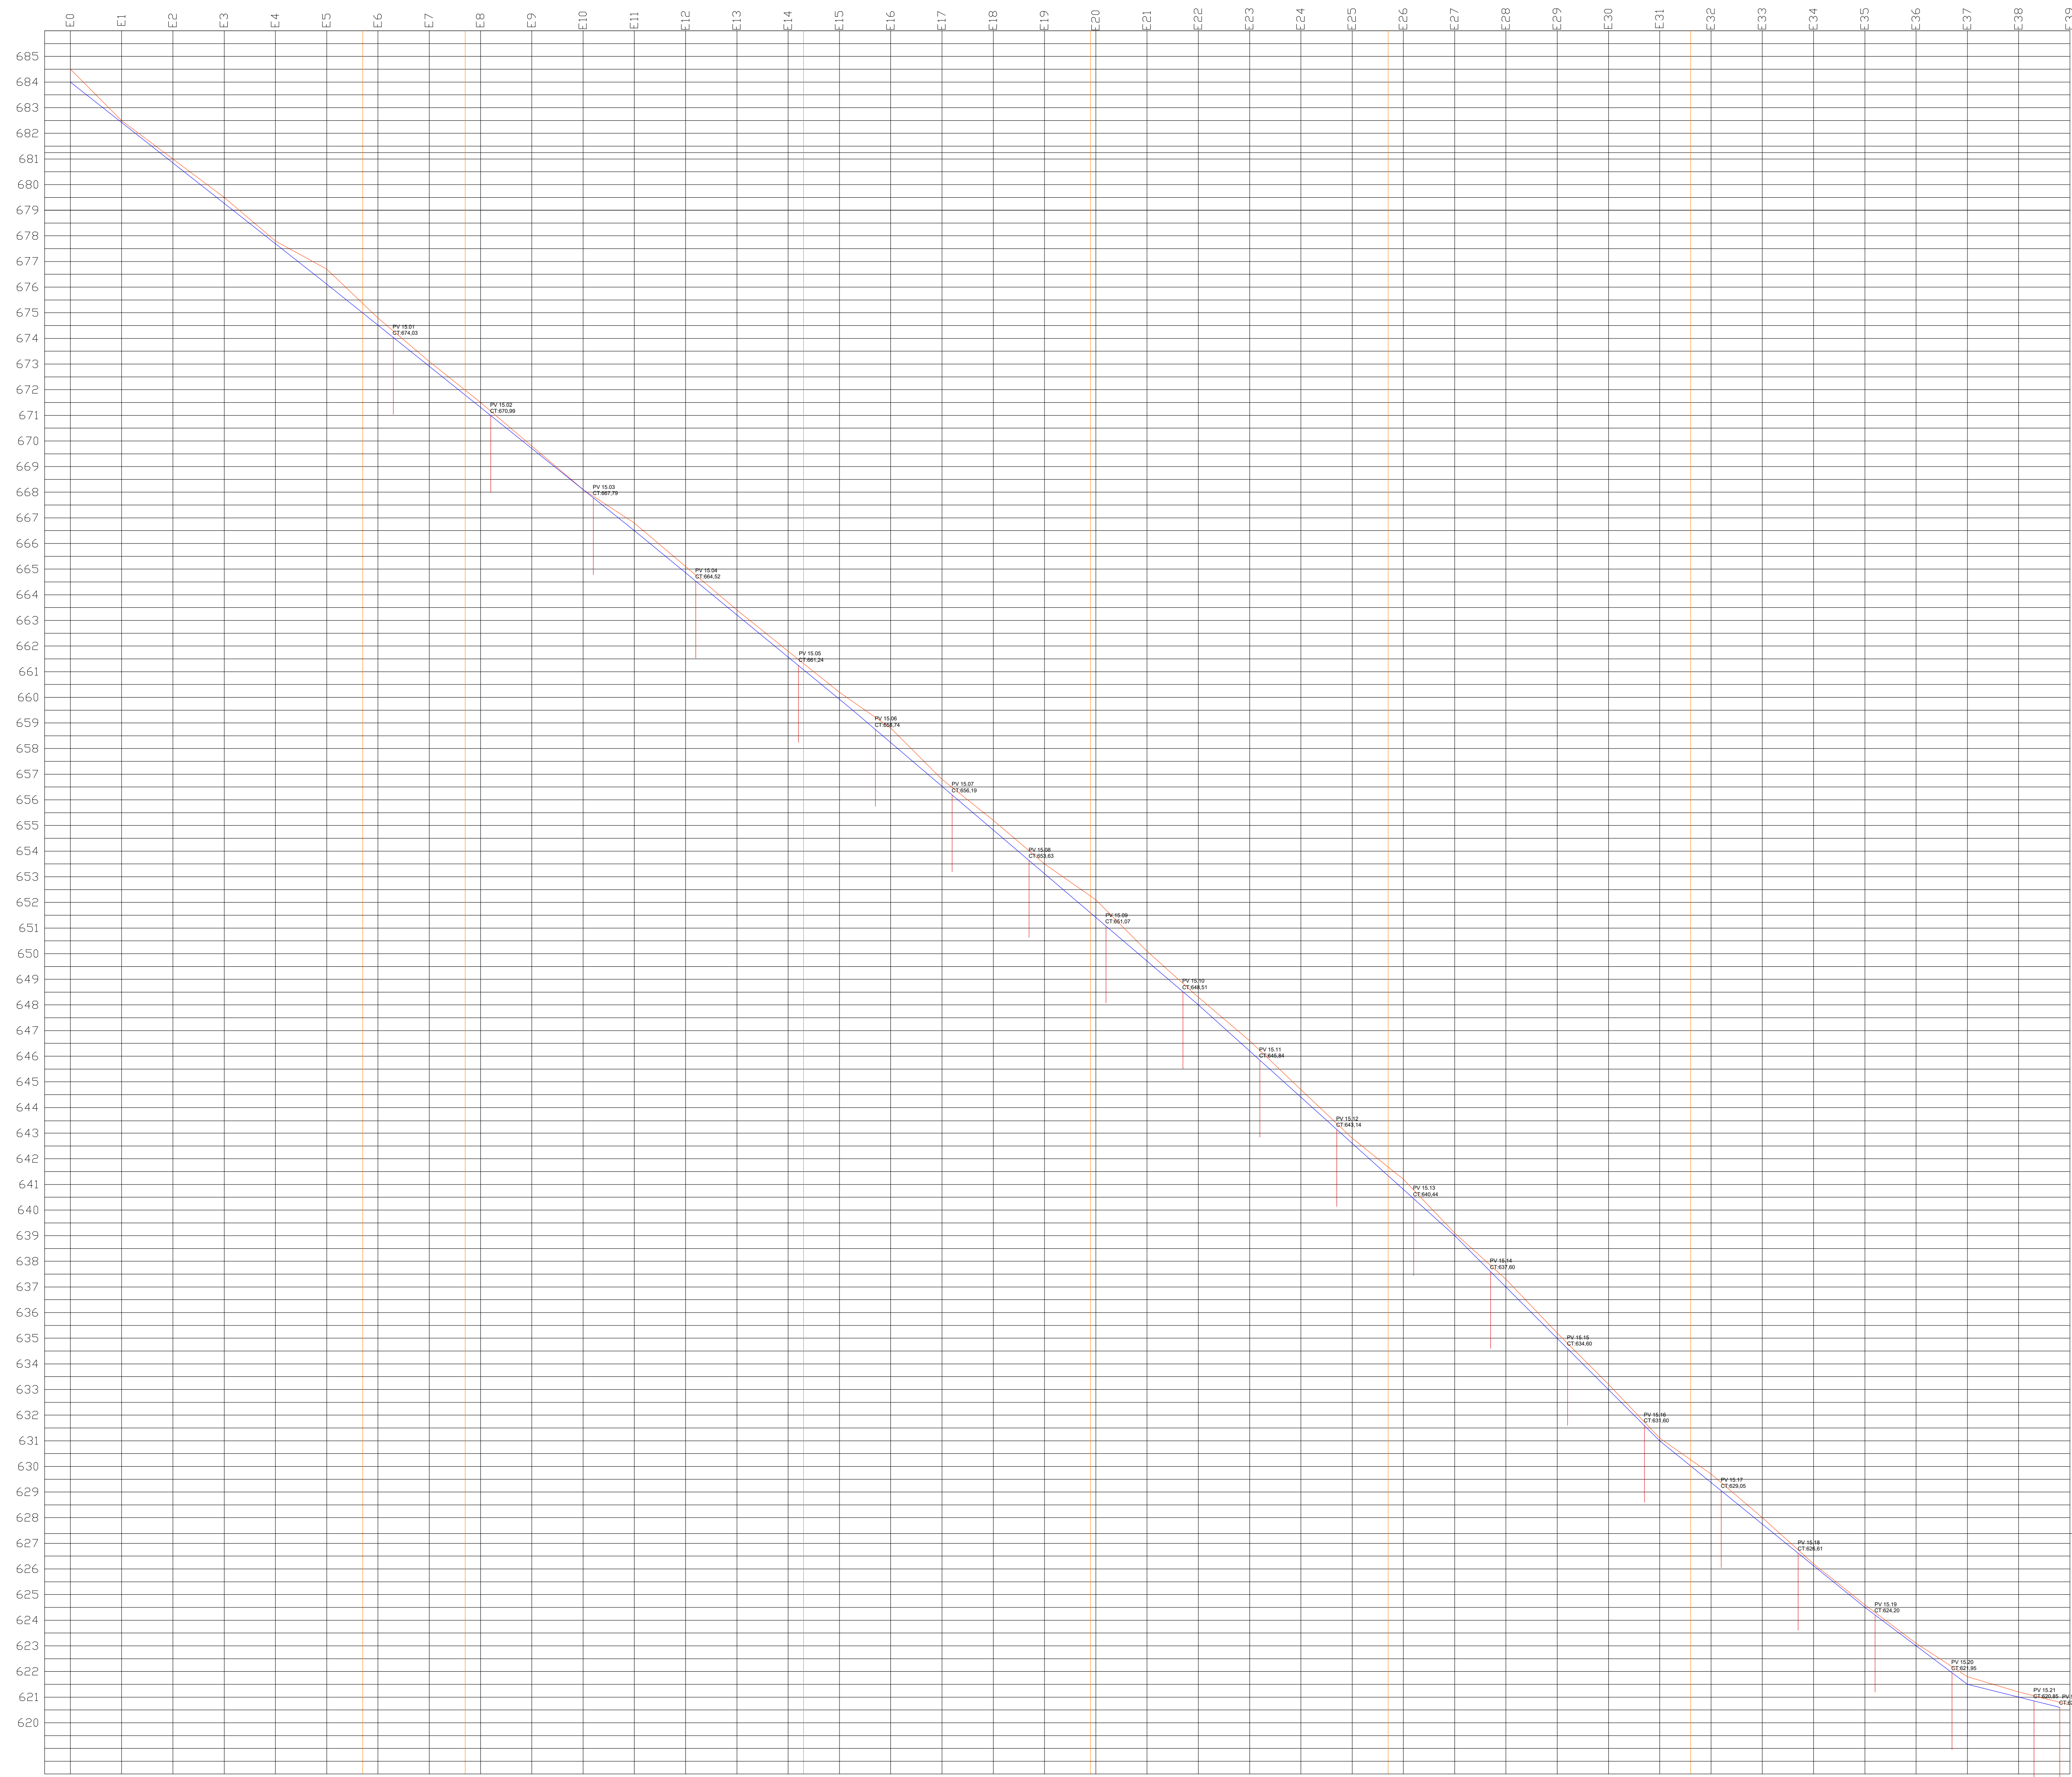

RUA 19 - AV. GETULIO VARGAS - TRECHO 02 e 03

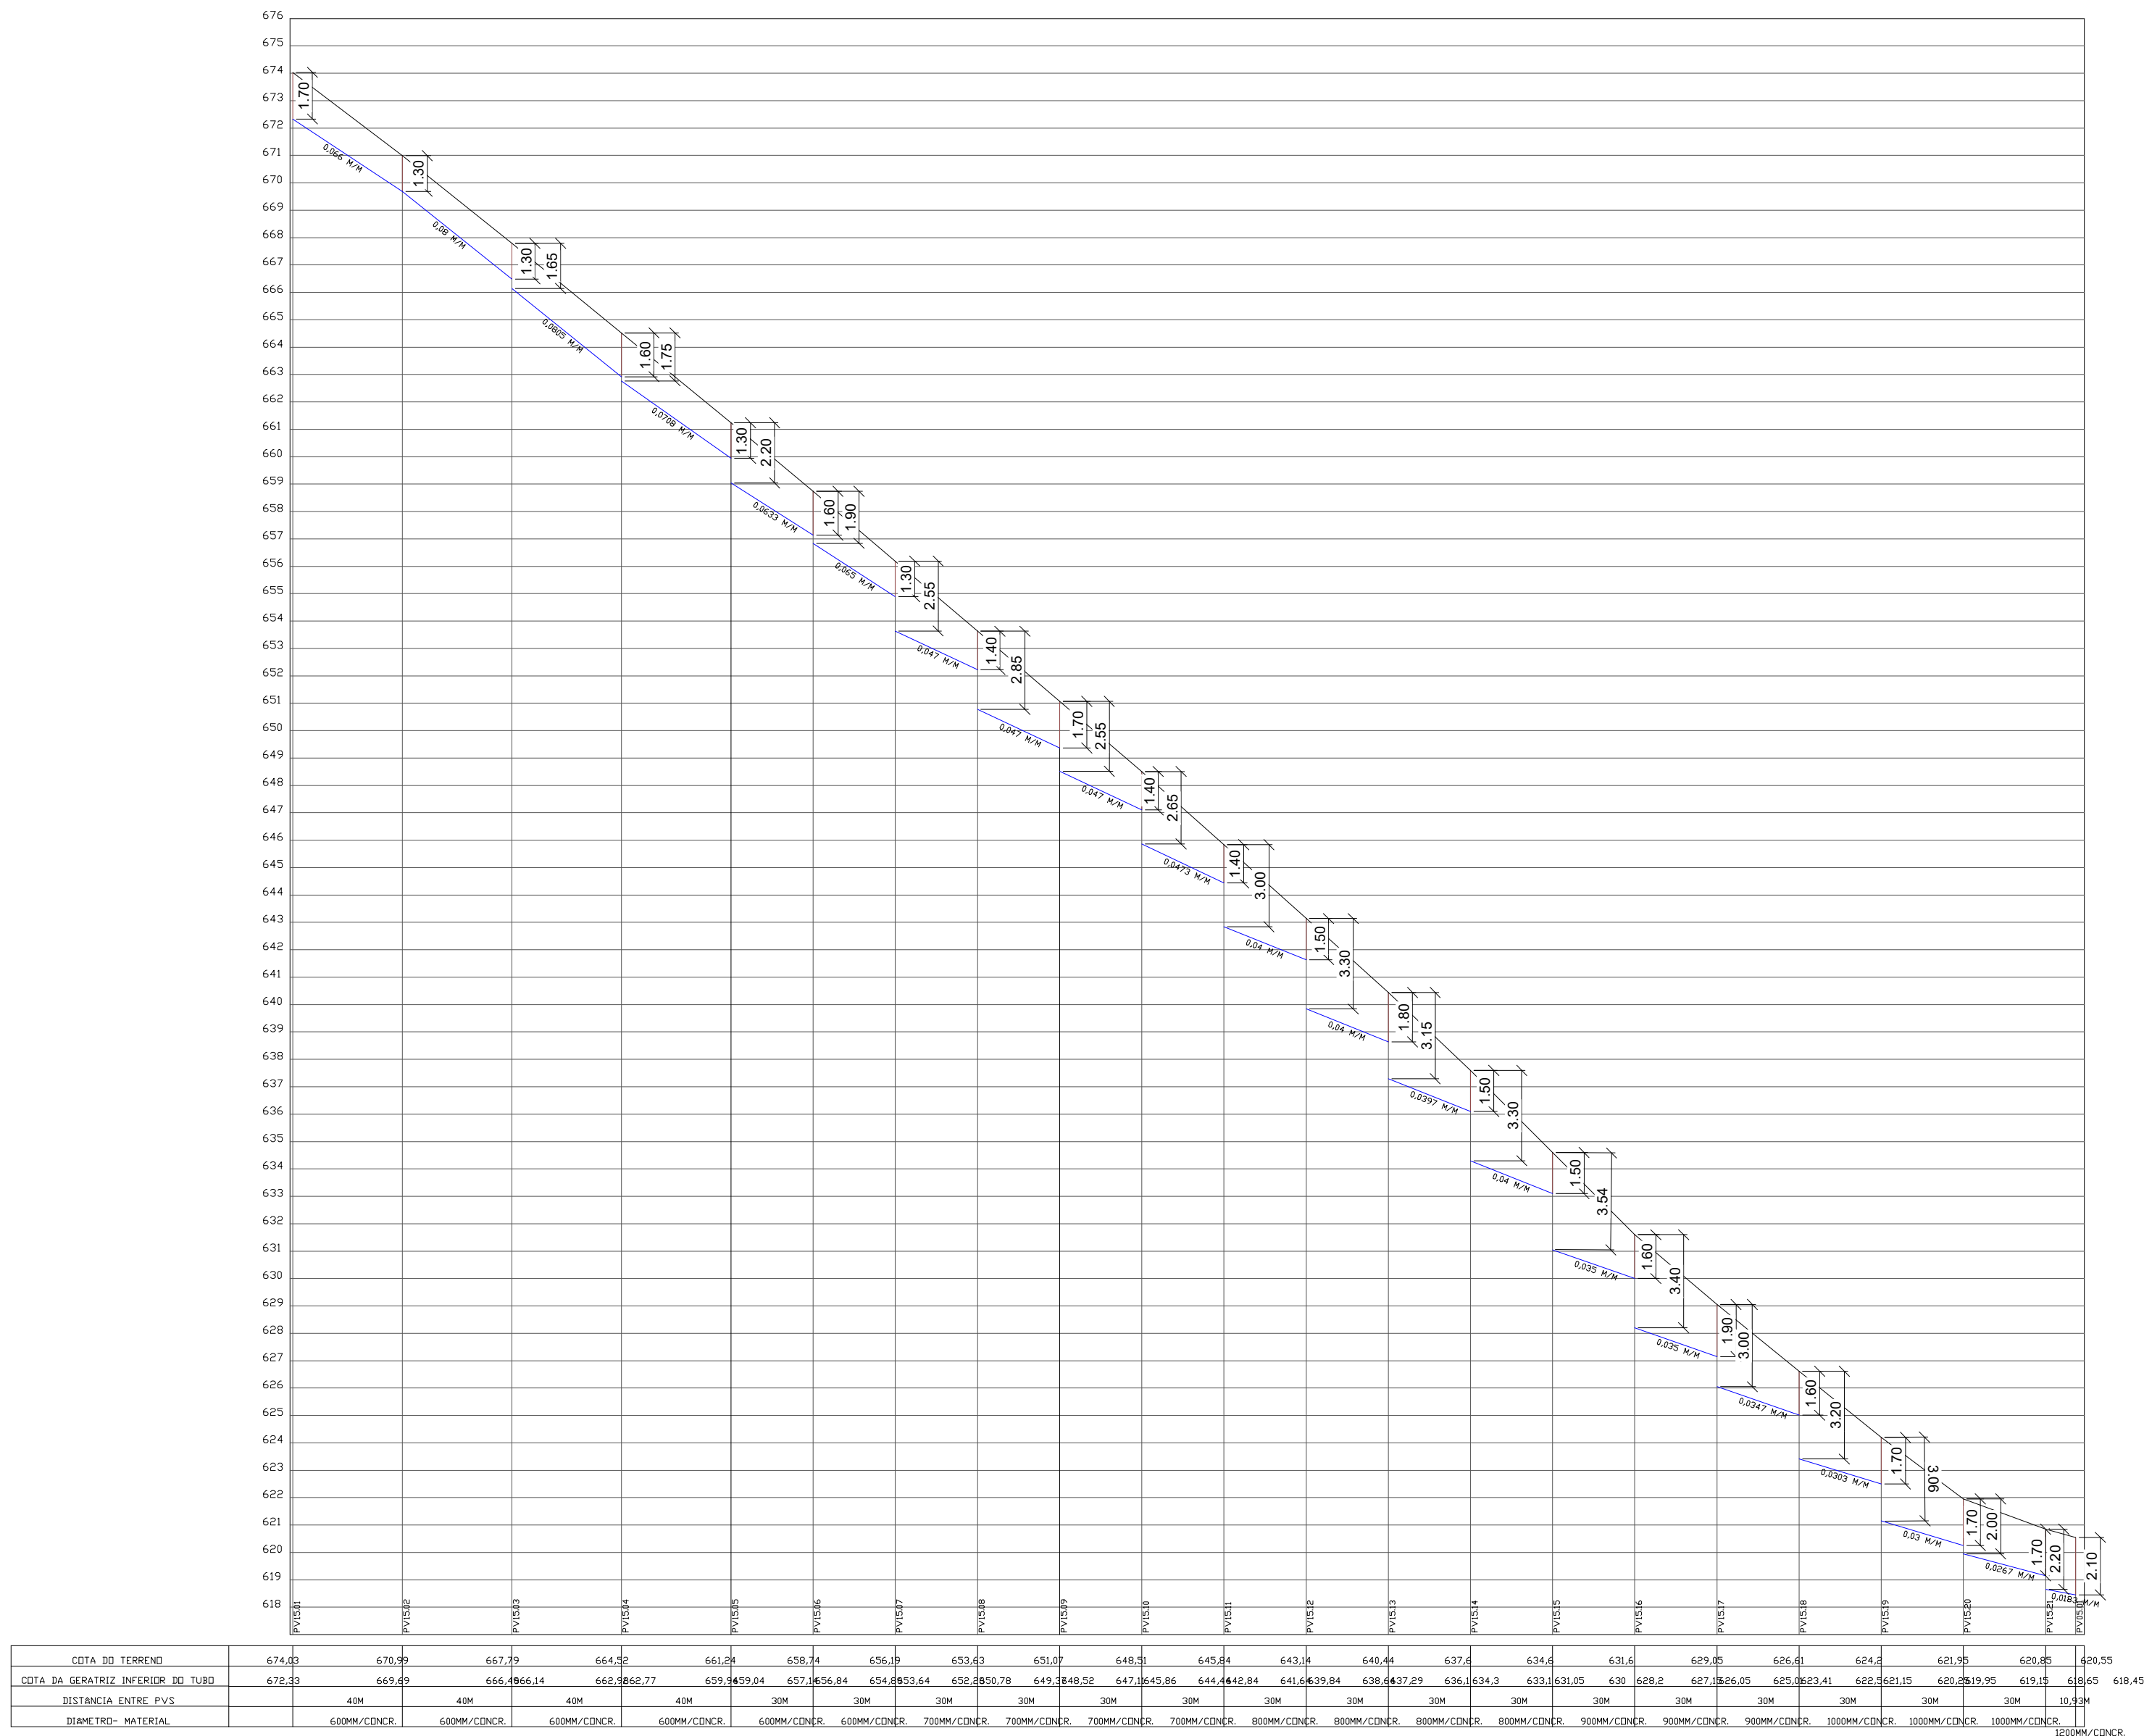

PERFIL DOS TRECHOS: PVI 0+00 A PVI 1+35
ESCALA VERTICAL: 1:100
ESCALA HORIZONTAL: 1:100

RUA	PERFIL	TRECHO	CONVÊNIO
AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01	TIPO 01 - DETALHE 06	RUA RIO GRANDE DO SUL	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02	TIPO 02 - DETALHE 07	RUA SANTA CATARINA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO 03	TIPO 02 - DETALHE 07	AV. GETÚLIO VARGAS - ESTACA 16	Apio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Convênio 932215/22
RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02	TIPO 01 - DETALHE 06	RUA SANTA CATARINA - TRECHO 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
RUA BAHIA - TRECHO 02	TIPO 01 - DETALHE 06	RUA BAHIA - TRECHO 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527

APROVAÇÃO DEMITRAN			
DR. JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR PREFEITO DE ARAÇÓBIA DA SERRA	DR. JAIR FERREIRA DUARTE JUNIOR SECR. DE RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS	ENG. VINÍCIUS AYUB DE CAMPOS ABRAME RESPONSÁVEL TÉCNICO	
REVISÕES			
REVISÃO	DATA	ASSUNTO	RESPONSÁVEL
REV_01	16/02/22	EMISSÃO INICIAL	ENG. VINÍCIUS AYUB DE CAMPOS ABRAME



ARACÓBIA DA SERRA

15 22851-7918 | e-mail: aracobia.sp.gov.br | www.aracobia.sp.gov.br
Rua. Lúcio de Almeida da Silveira, 555, Jd. Santa Helena, Aracóbia - SP, CEP 13.290-000

OBJETO: PAV. ALVORADA - FASE 02 - AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, R. BAHIA T-2 E R. SANTA CATARINA T-2

PROPOSTA: DR. JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR

SECAO GERENTE: DR. JAIR FERREIRA DUARTE JUNIOR

SECAO GERENTE: ENG. MARCOS LARA

SECAO GERENTE: RODOLFO ALEXANDER OLIVASTRO

SECAO GERENTE: VICTORIA SORIANO SANTOS

PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

AV. PRES. GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01 E 02







RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02

DATA: 08/2022

REVISÃO: 00

PROJETO: 04/09

ESCALA: 1:250

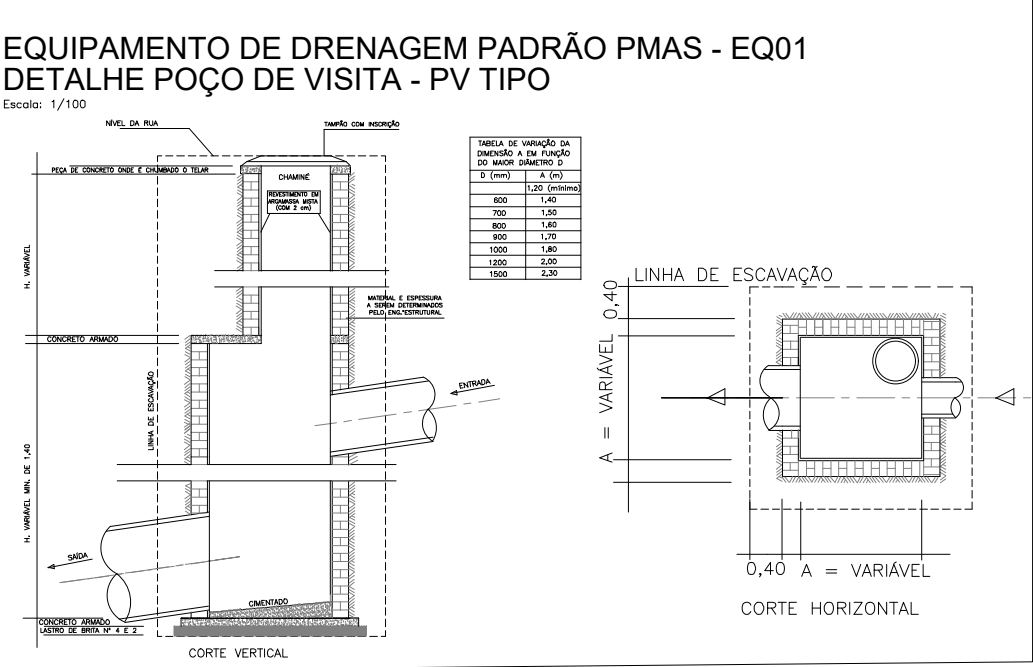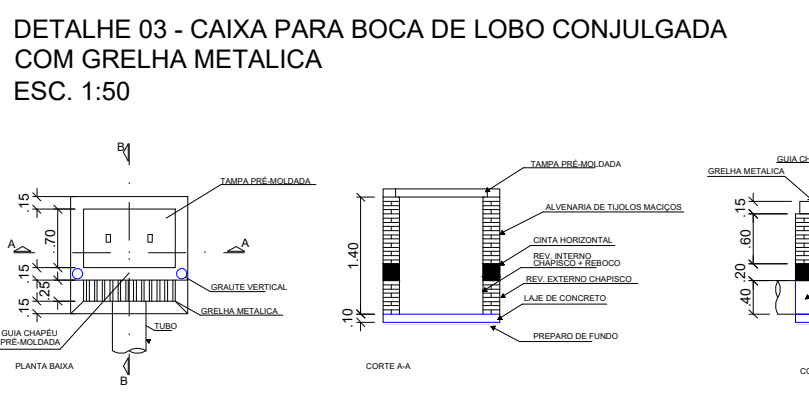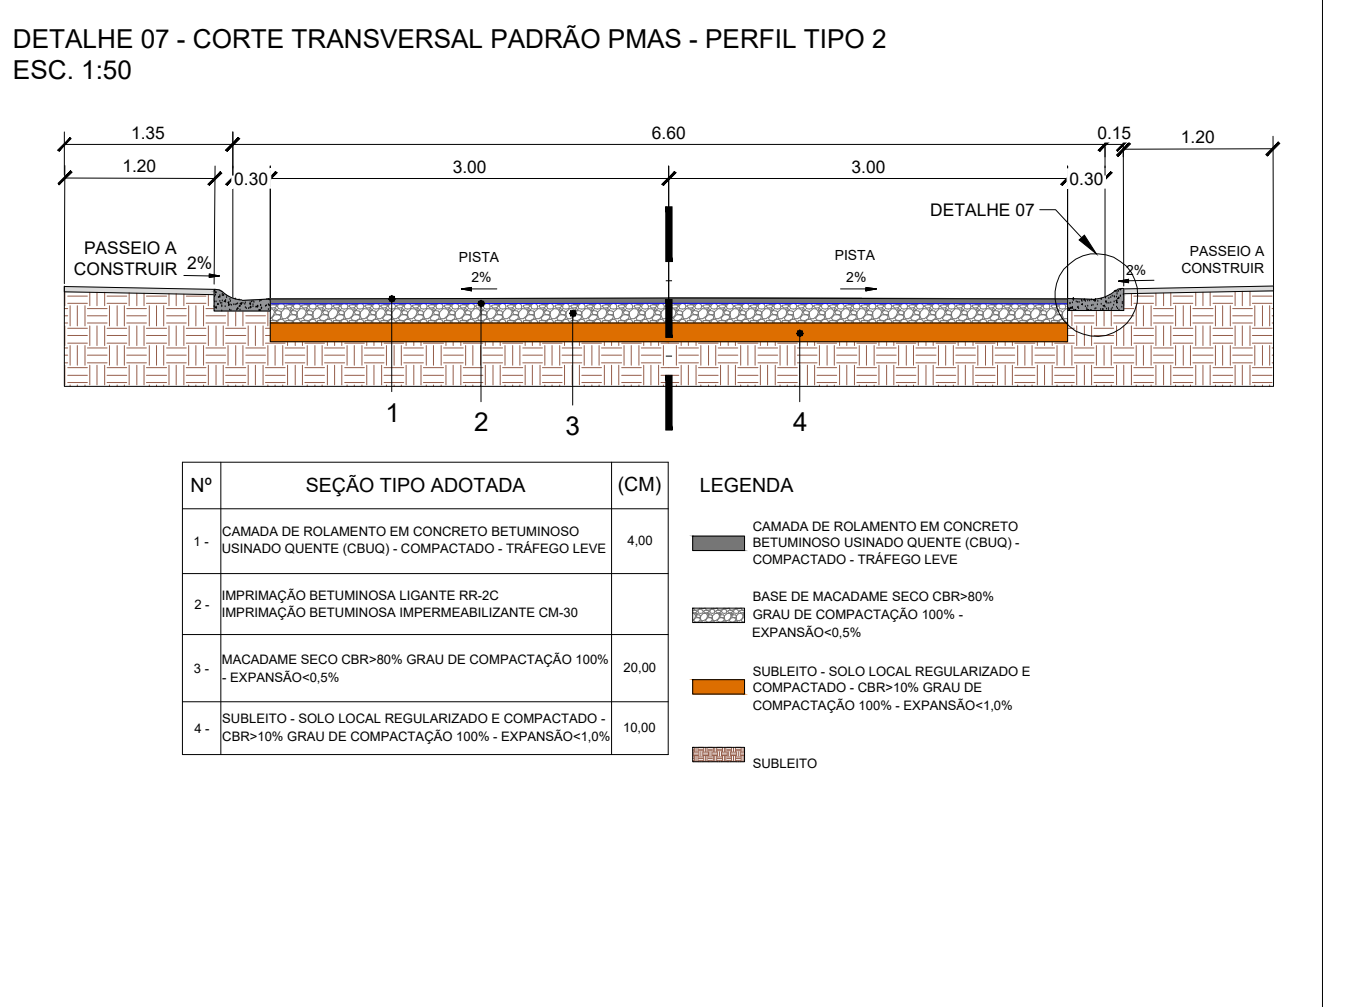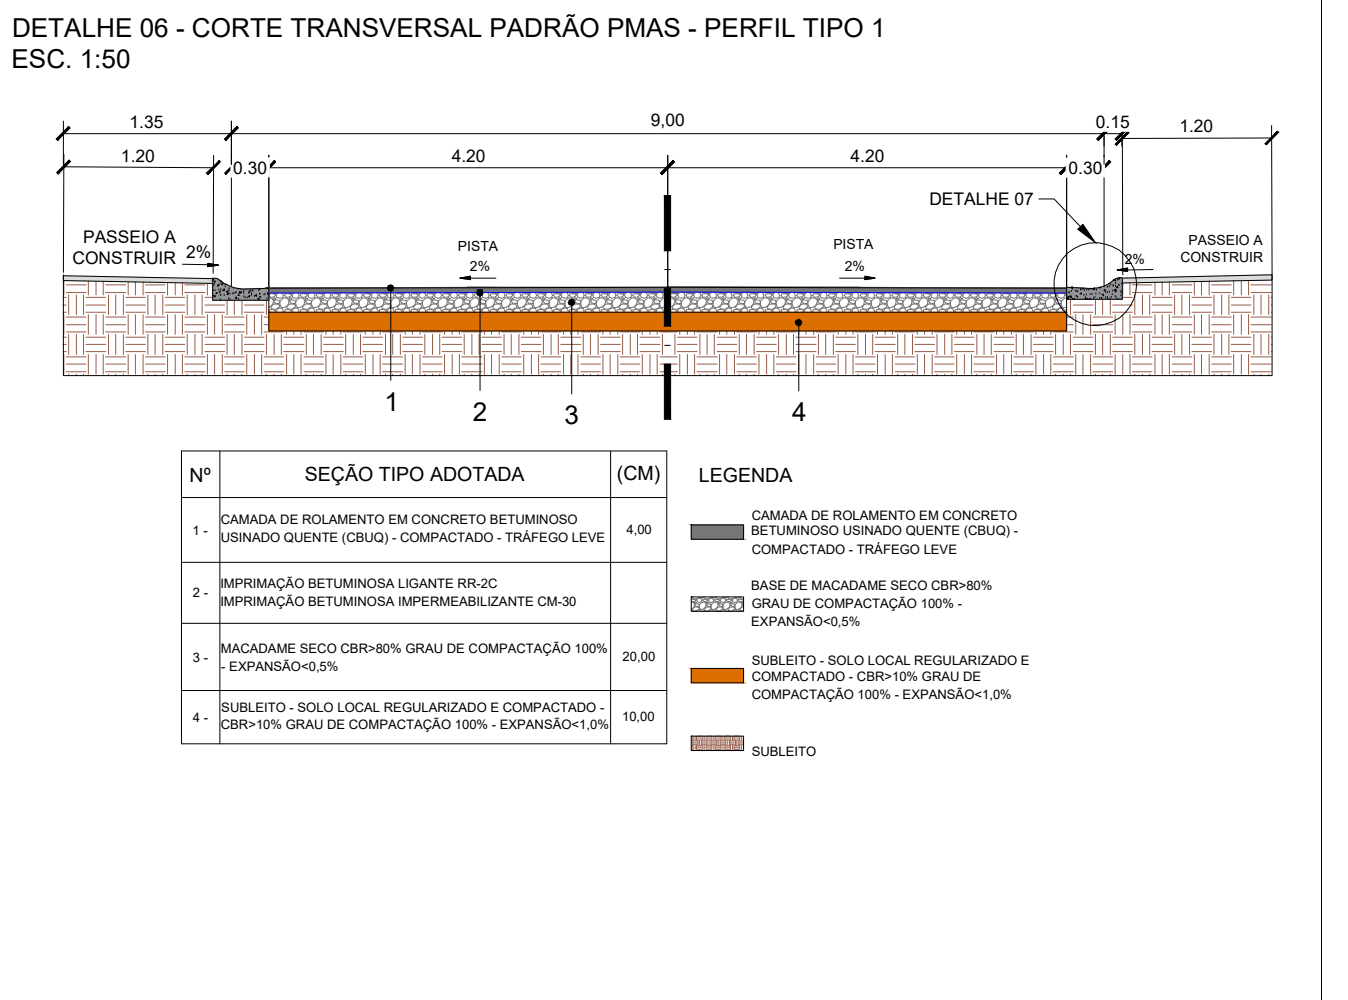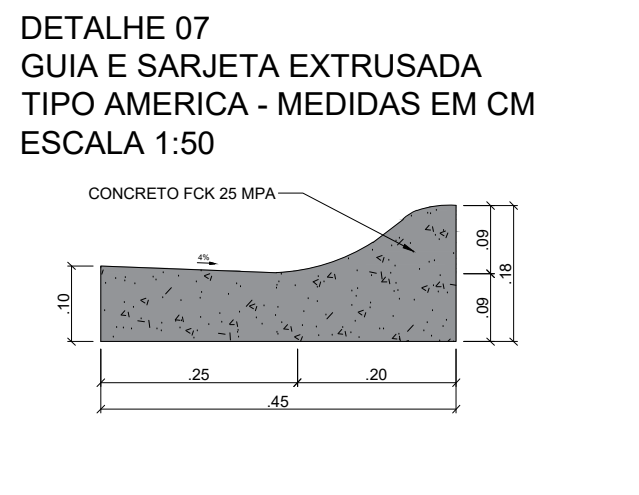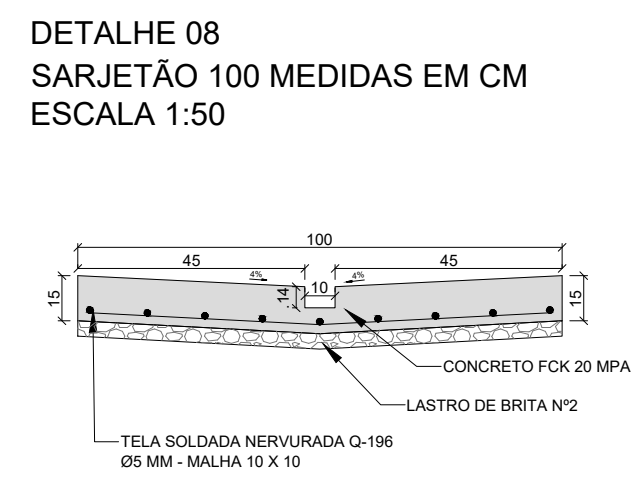

APROVAÇÃO DEMITRAN			
DR. JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR PREFEITO DE ARACAJÓ	DR. JAIRO FERREIRA DUARTE JUNIOR SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527	ENR. VINÍCIUS AYUB DE CAMPOS ABRAME RESPONSÁVEL TÉCNICO	
REVISÕES			
REVISÃO	DATA	ASSUNTO	RESPONSÁVEL
REV. 01	06/02/2022	EMISSÃO INICIAL	ENR. VINÍCIUS AYUB DE CAMPOS ABRAME

RUA	PERFIL	TRECHO	INÍCIO	TÉRMINO	CONVÊNIO
AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01	TIPO 01 - DETALHE 06	RUA RIO GRANDE DO SUL	0+00	RUA SANTA CATARINA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02	TIPO 02 - DETALHE 07	RUA SANTA CATARINA	0+00	AV. GETÚLIO VARGAS - ESTACA 16	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO 03	TIPO 02 - DETALHE 07	AV. GETÚLIO VARGAS - ESTACA 16	0+00	RUA COPACABANA	Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Convênio 932215/22
RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02	TIPO 01 - DETALHE 06	RUA SANTA CATARINA - TRECHO 01	0+00	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
RUA BAHIA - TRECHO 02	TIPO 01 - DETALHE 06	RUA BAHIA - TRECHO 01	0+00	ALAMEDA FRANKLIN DE LIMA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527



ARACAJÓ

SETOR DE CONVÊNIOS

15/08/2022 - 15/08/2022

PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM






PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

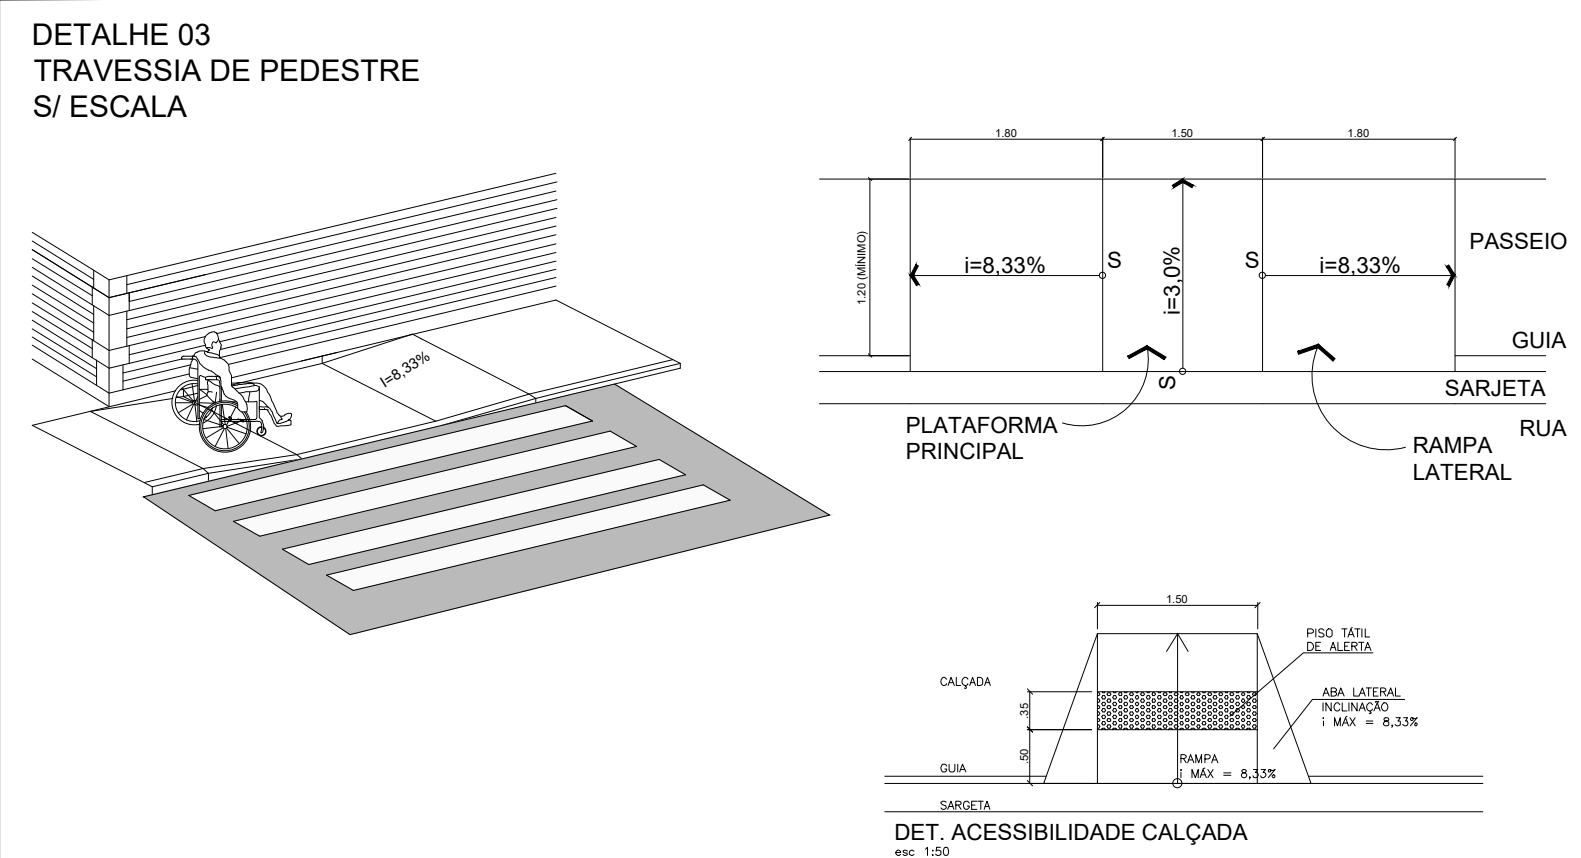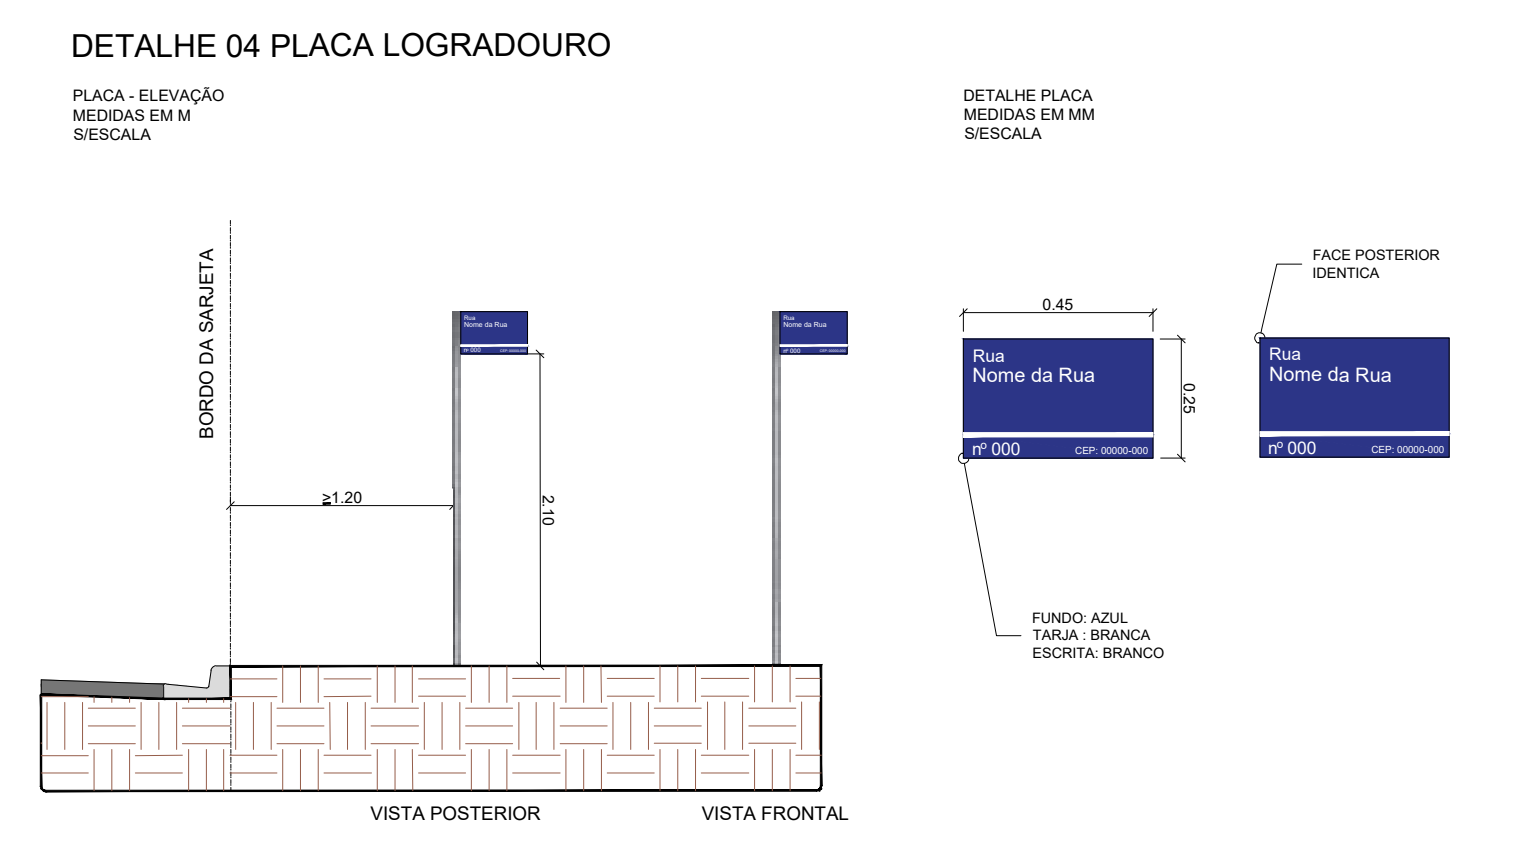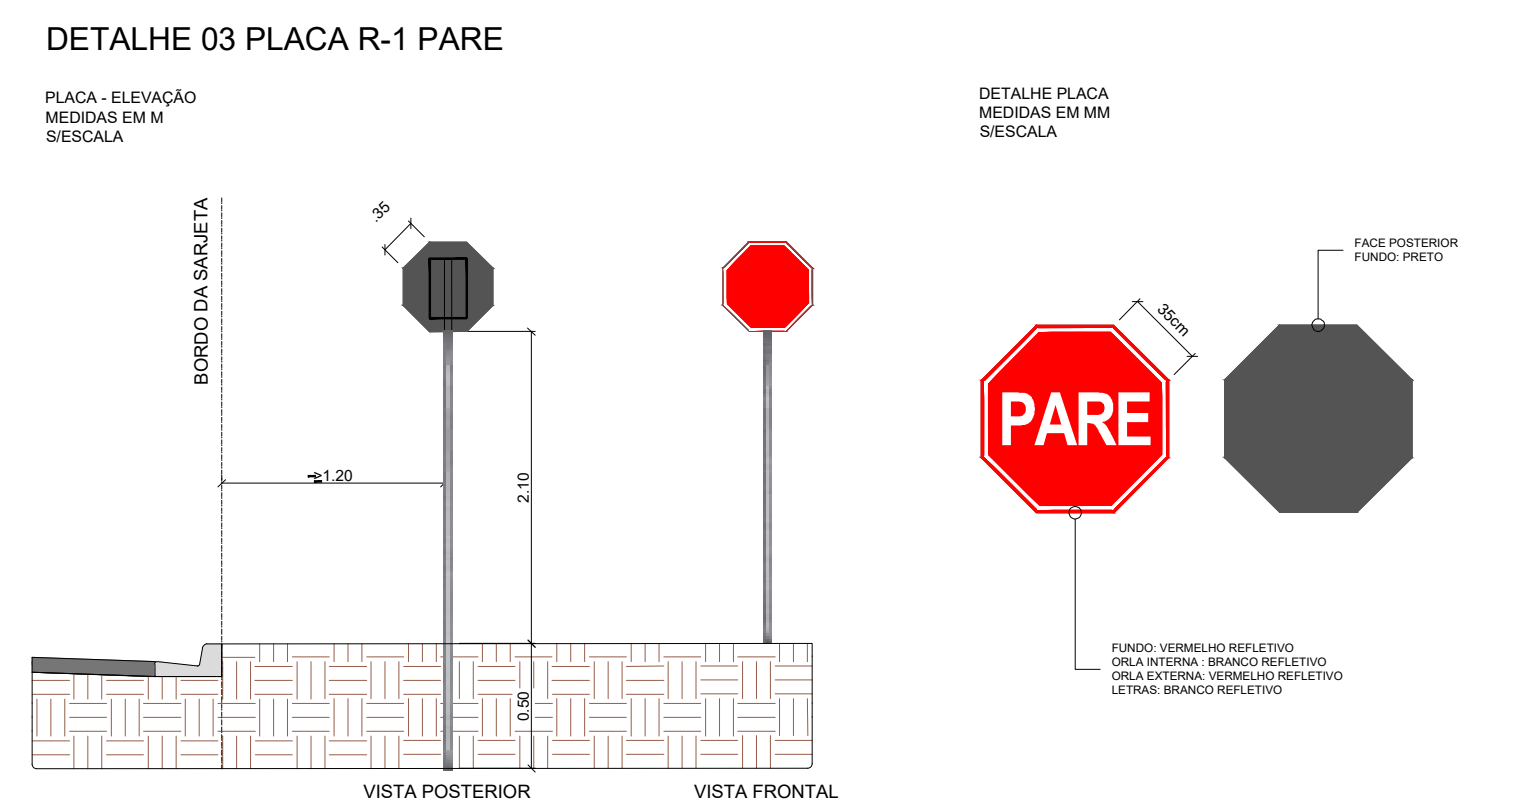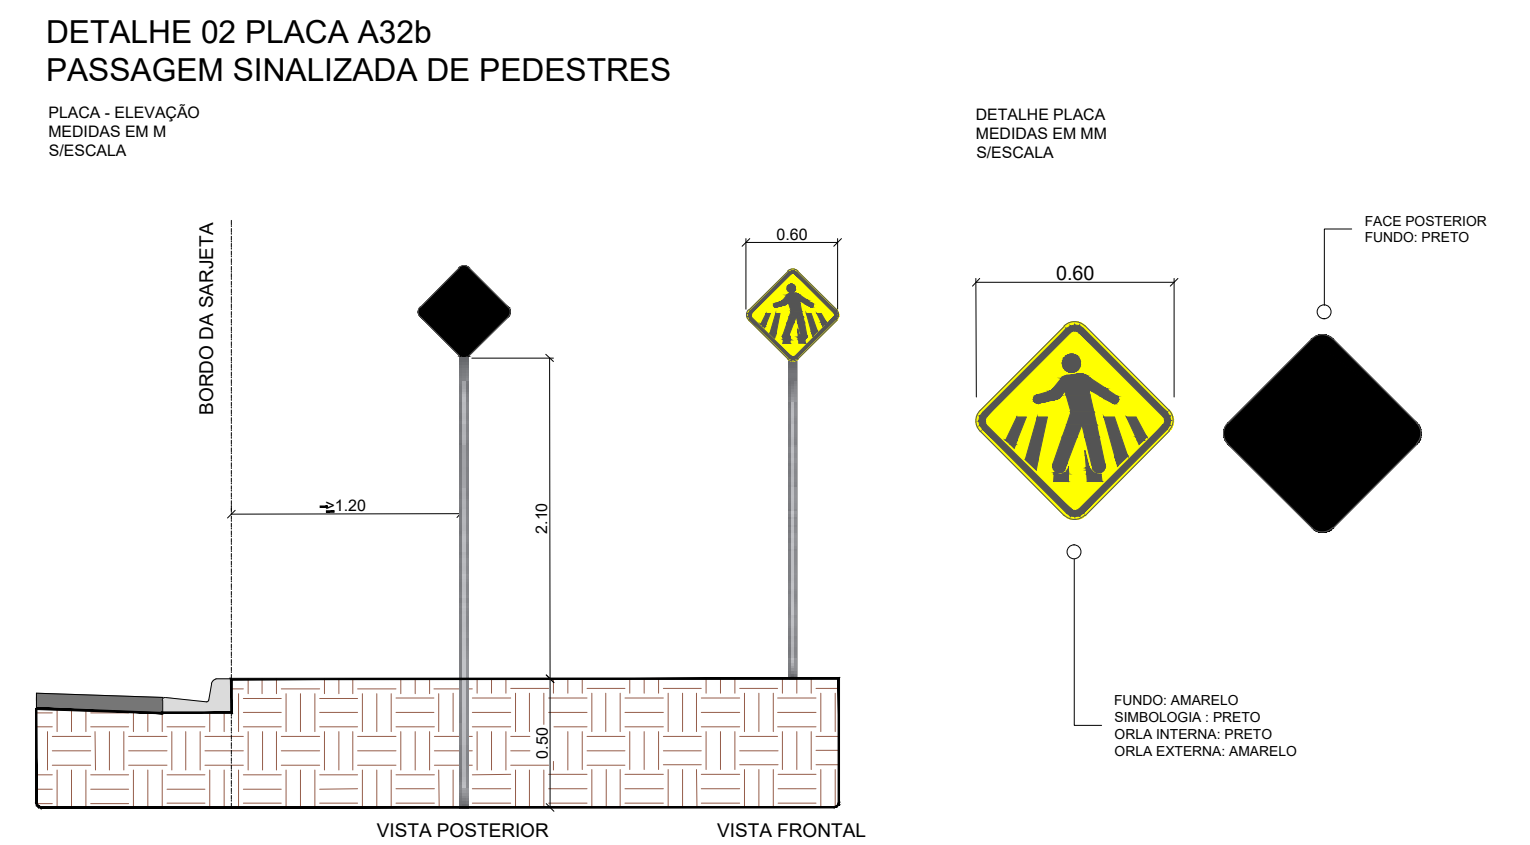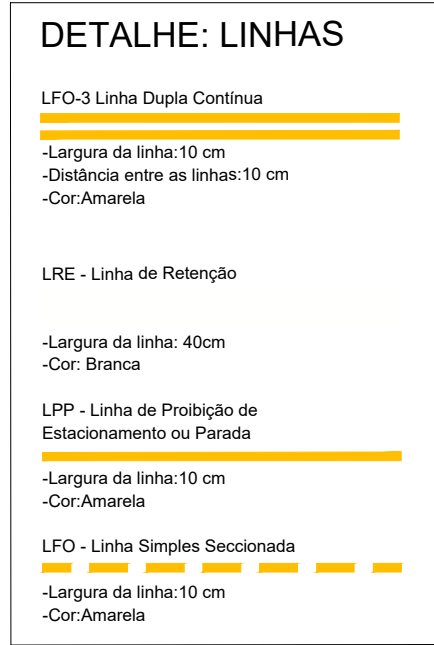

DR. JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR
 PREFEITO DE ARAQUAÇA DA SERRA

DR. JAI FERREIRA DUARTE JUNIOR
 SECR. DE RELAÇÕES PÚBLICAS
 E INSTITUCIONAL DEMITRAN

ENG. VINÍCIUS AYUB DE CAMPOS ABRAME
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

REVISÕES

REVISÃO	DATA	ASSUNTO	RESPONSÁVEL
REV_00	06/2022	EMISSÃO INICIAL	ENG. VINÍCIUS AYUB DE CAMPOS ABRAME


[illegible]




RUA	PERFIL	INÍCIO	TRECHO	TÉRMINO	CONVÊNIO
AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01	TIPO 01 - DETALHE 06	RUA RIO GRANDE DO SUL	até	RUA SANTA CATARINA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02	TIPO 02 - DETALHE 07	RUA SANTA CATARINA	até	AV. GETÚLIO VARGAS - ESTACA 16	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO 03	TIPO 02 - DETALHE 07	AV. GETÚLIO VARGAS - ESTACA 16	até	RUA COPACABANA	Apóio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Convênio 932215/22
RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02	TIPO 01 - DETALHE 06	RUA SANTA CATARINA - TRECHO 01	até	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
RUA BAHIA - TRECHO 02	TIPO 01 - DETALHE 06	RUA BAHIA - TRECHO 01	até	ALAMEDA FRANKLIN DE LIMA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527

DETALHE: LINHAS
LFO-3 Linha Dupla Contínua
-Largura da linha 10 cm
-Distância entre as linhas 10 cm
-Cor Amarela
LSE - Linha de Retenção
-Largura da linha 40cm
-Cor Branco
LPP - Linha de Proibição de Estacionamento ou Parada
-Largura da linha 10 cm
-Cor Amarela
LFO - Linha Simples Seccionada
-Largura da linha 10 cm
-Cor Amarela


DETALHE 02 PLACA A32b PASSAGEM SINHALIZADA DE PEDESTRES

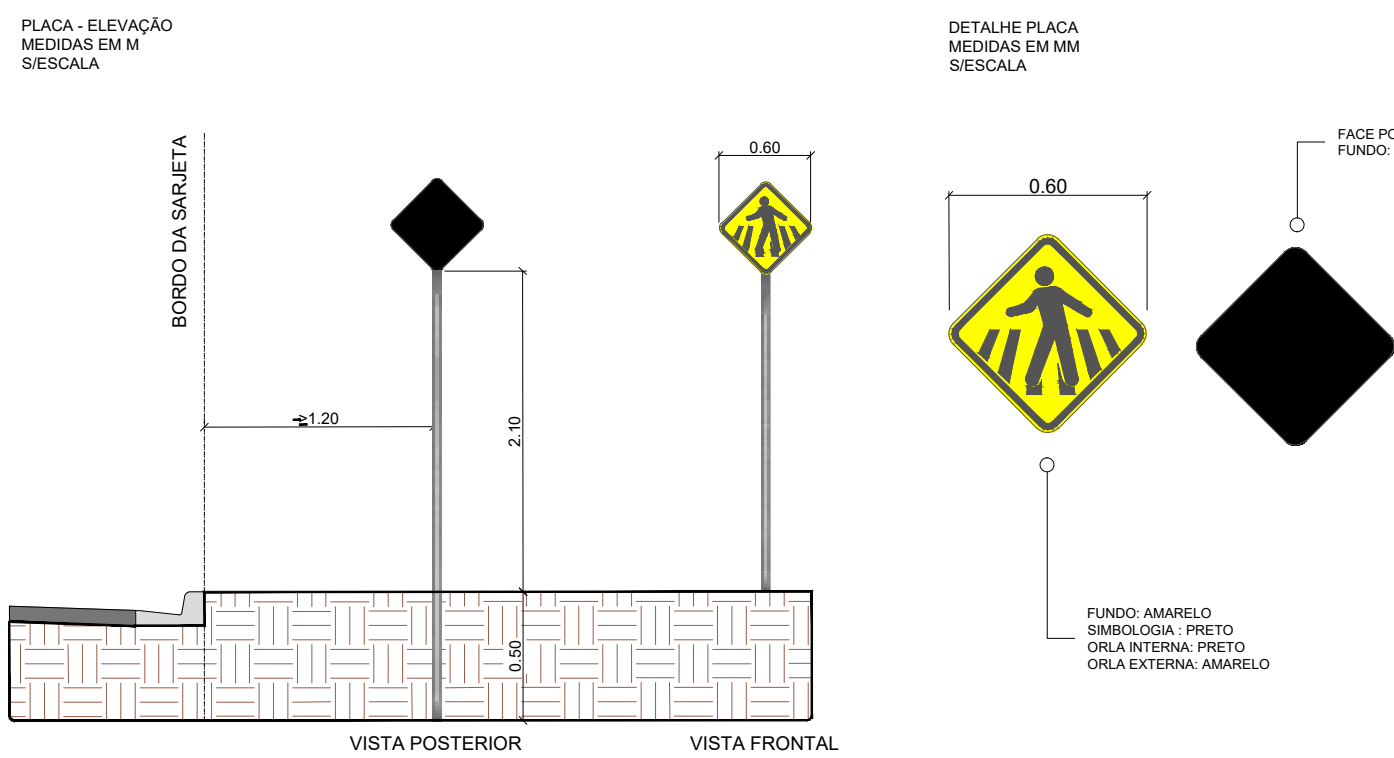


DETALHE 03 PLACA R-1 PARE

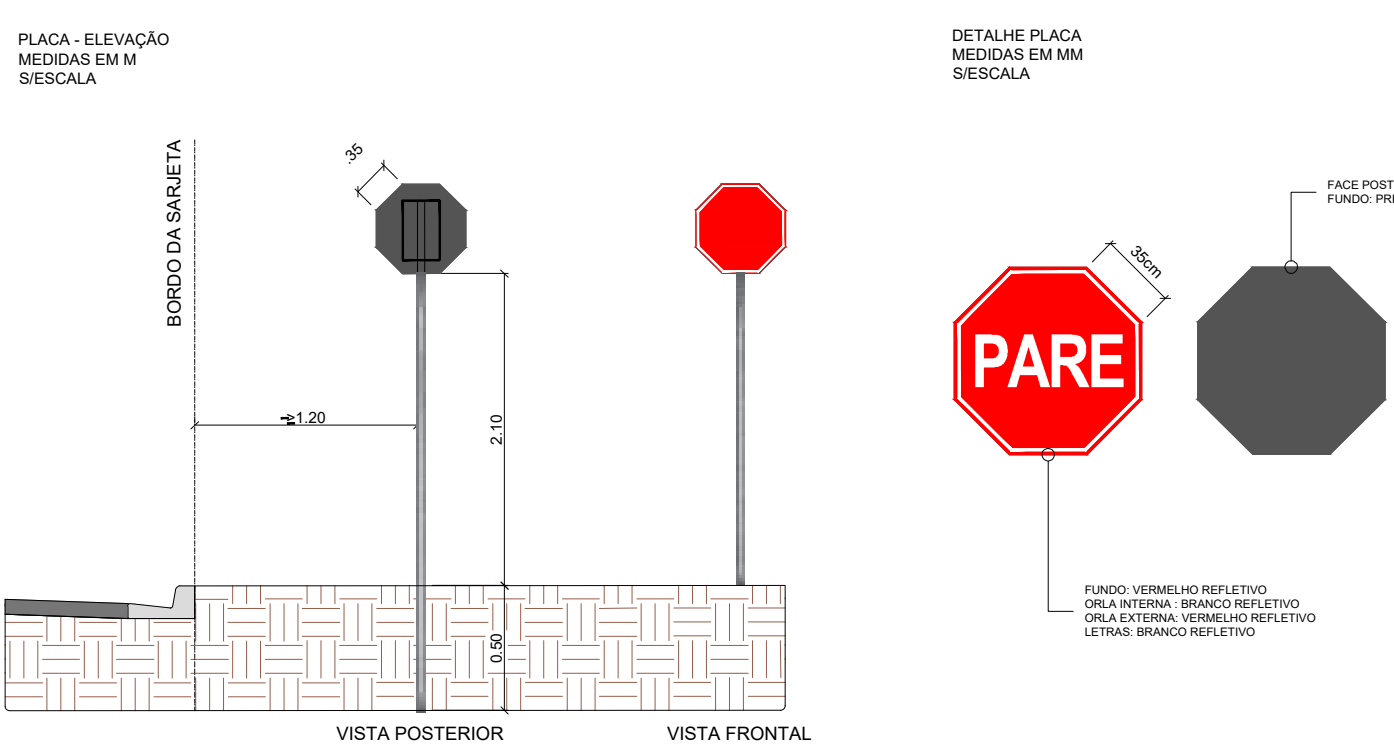

DETALHE 04 PLACA LOGRADOURO

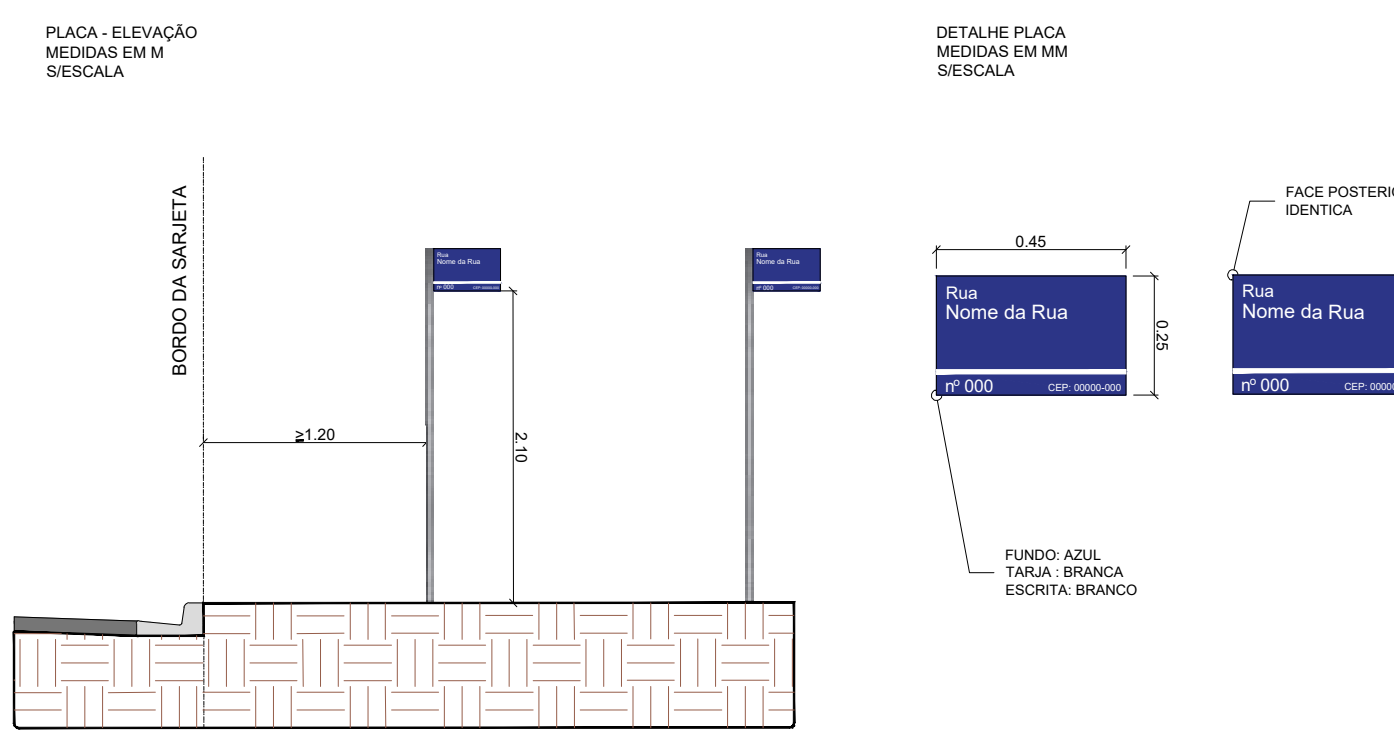

DETALHE 03 TRAVESSIA DE PEDESTRE SI/ESCALA

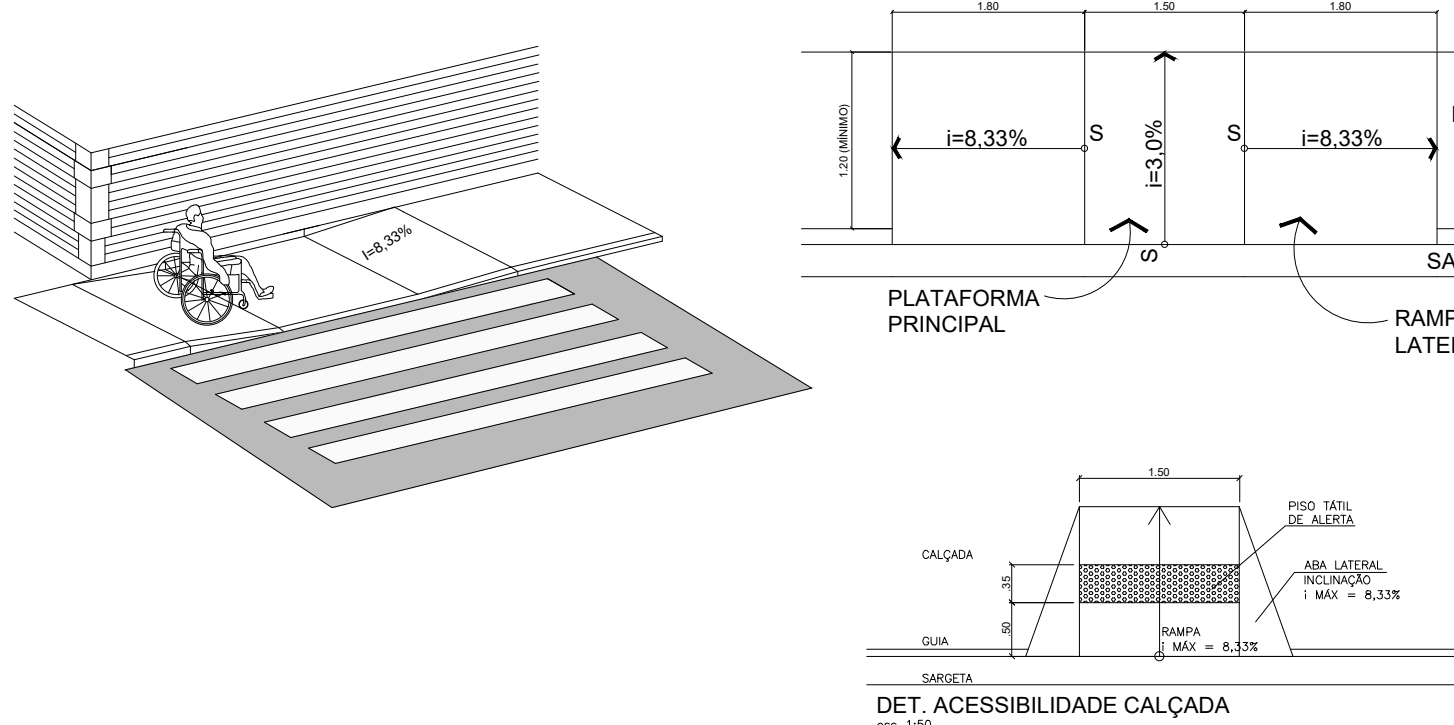

APROVAÇÃO DEMITRAN			
DR. JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR PREFEITO DE ARAÇÓBIA DA BERRA	DR. JAIR FERREIRA DUARTE JUNIOR SECR. DE RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS	ENG. VINÍCIUS AYUB DE CAMPOS ABRAME RESPONSÁVEL TÉCNICO	
REVISÕES			
REVISÃO	DATA	ASSUNTO	RESPONSÁVEL
REV. 01	16/02/2022	EMISSÃO INICIAL	ENG. VINÍCIUS AYUB DE CAMPOS ABRAME



SETOR DE CONVÊNIOS

OBJETO: PAV. ALVORADA - FASE 02 - AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, R. BAHIA T-2 E R. SANTA CATARINA T-2	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
PROPOSTA: DR. JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
PROPOSTA DE CONVÊNIO: GERENTE EMANUEL HENRIQUE	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
PROPOSTA DE CONVÊNIO: GERENTE EMANUEL HENRIQUE	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
PROPOSTA DE CONVÊNIO: GERENTE EMANUEL HENRIQUE	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
PROPOSTA DE CONVÊNIO: GERENTE EMANUEL HENRIQUE	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527




RUA	PERFIL	INÍCIO	TRECHO	TÉRMINO	CONVÊNIO
AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01	TIPO 01 - DETALHE 06	RUA RIO GRANDE DO SUL	até	RUA SANTA CATARINA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02	TIPO 02 - DETALHE 07	RUA SANTA CATARINA	até	AV. GETÚLIO VARGAS - ESTACA 16	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
AVENIDA GETÚLIO VARGAS - TRECHO 03	TIPO 02 - DETALHE 07	AV. GETÚLIO VARGAS - ESTACA 16	até	RUA COPACABANA	Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Convênio 932215/22
RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02	TIPO 01 - DETALHE 06	RUA SANTA CATARINA - TRECHO 01	até	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527
RUA BAHIA - TRECHO 02	TIPO 01 - DETALHE 06	RUA BAHIA - TRECHO 01	até	ALAMEDA FRANKLIN DE LIMA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SP - DEMANDA 046527


DETALHE: LINHAS

- LFO-3 Linha Dupla Contínua
 - Largura de linha 10 cm
 - Quilograma entre as linhas 10 cm
 - Cor Amarela
- LRE - Linha de Retenção
 - Largura de linha 40cm
 - Cor Branco
- LPP - Linha de Proibição de Estacionamento ou Parada
 - Largura de linha 10 cm
 - Cor Amarela
- LFO - Linha Simples Seccionada
 - Largura de linha 10 cm
 - Cor Amarela


DETALHE 02 PLACA A32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES

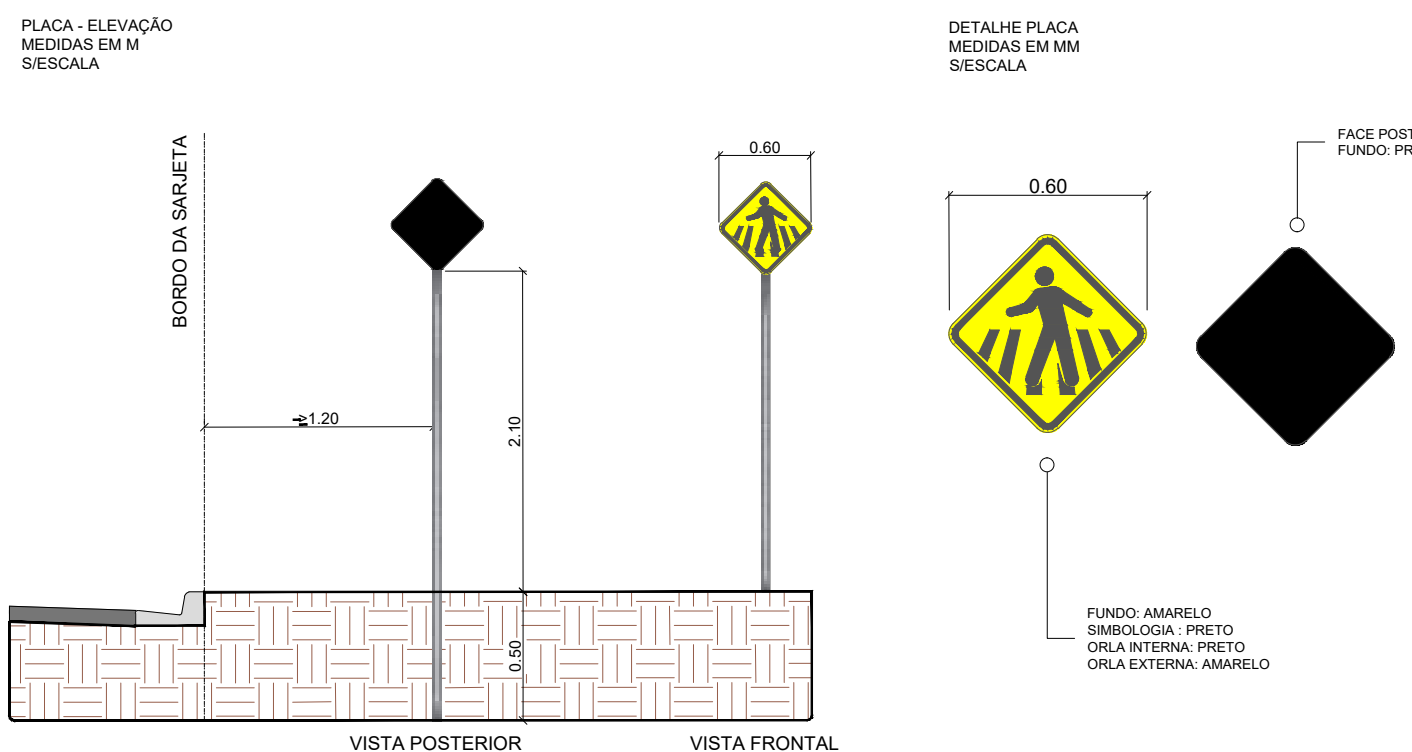


DETALHE 03 PLACA R-1 PARE

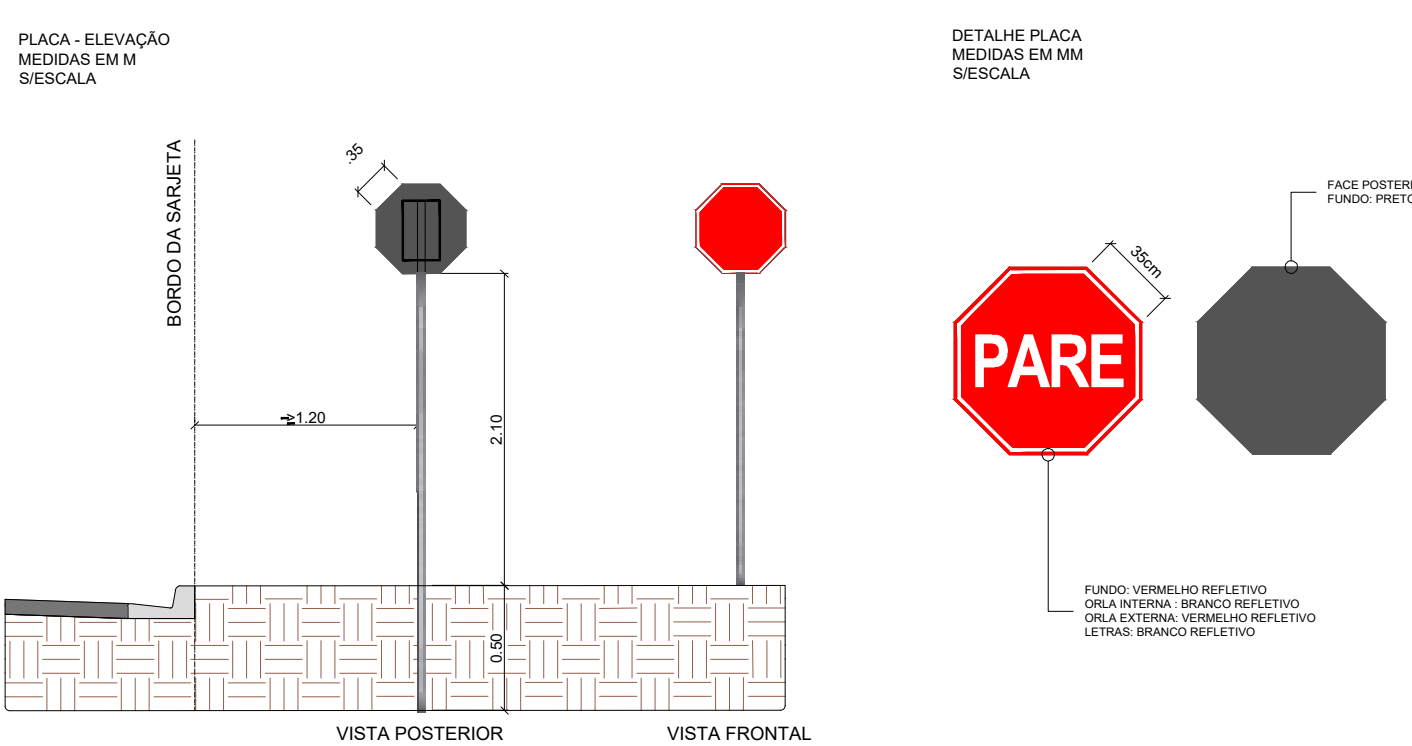

DETALHE 04 PLACA LOGRADOURO

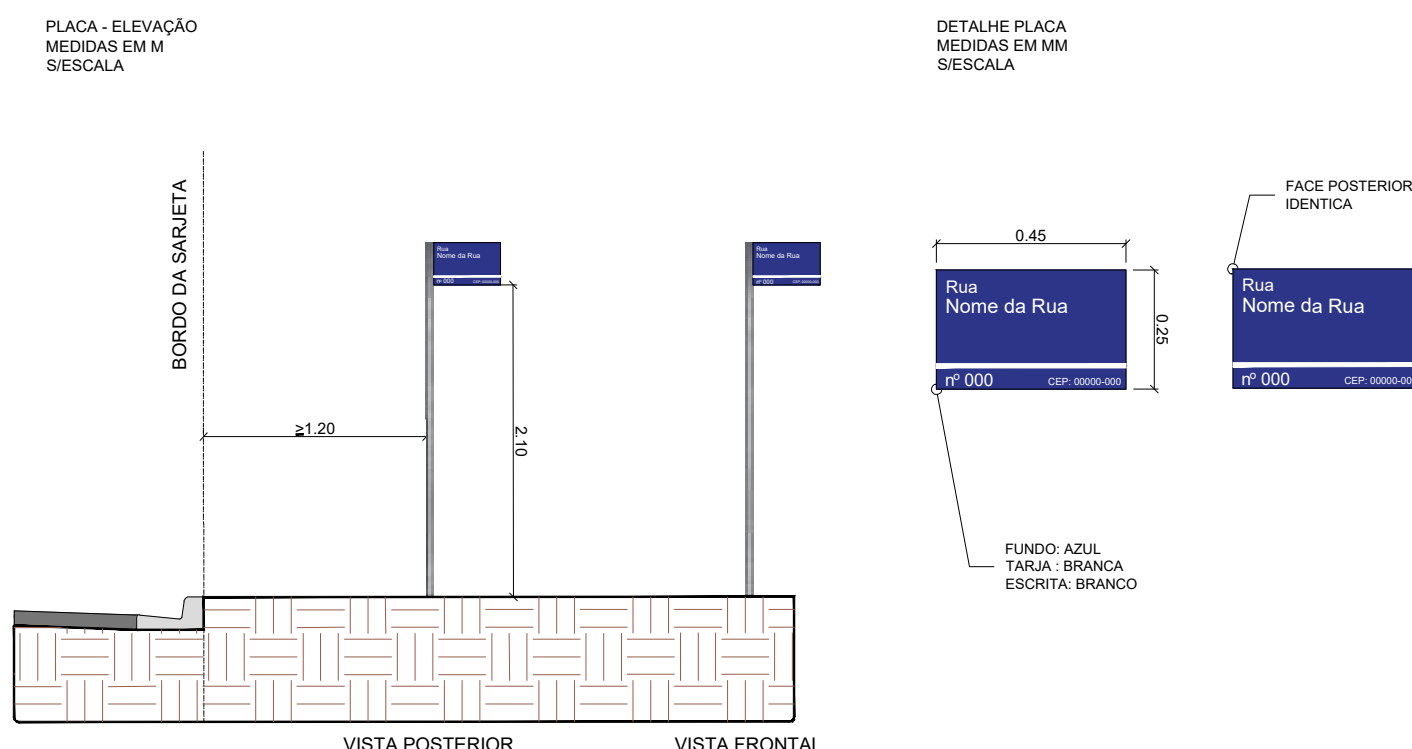

DETALHE 03 TRAVESSIA DE PEDESTRE SI/ESCALA

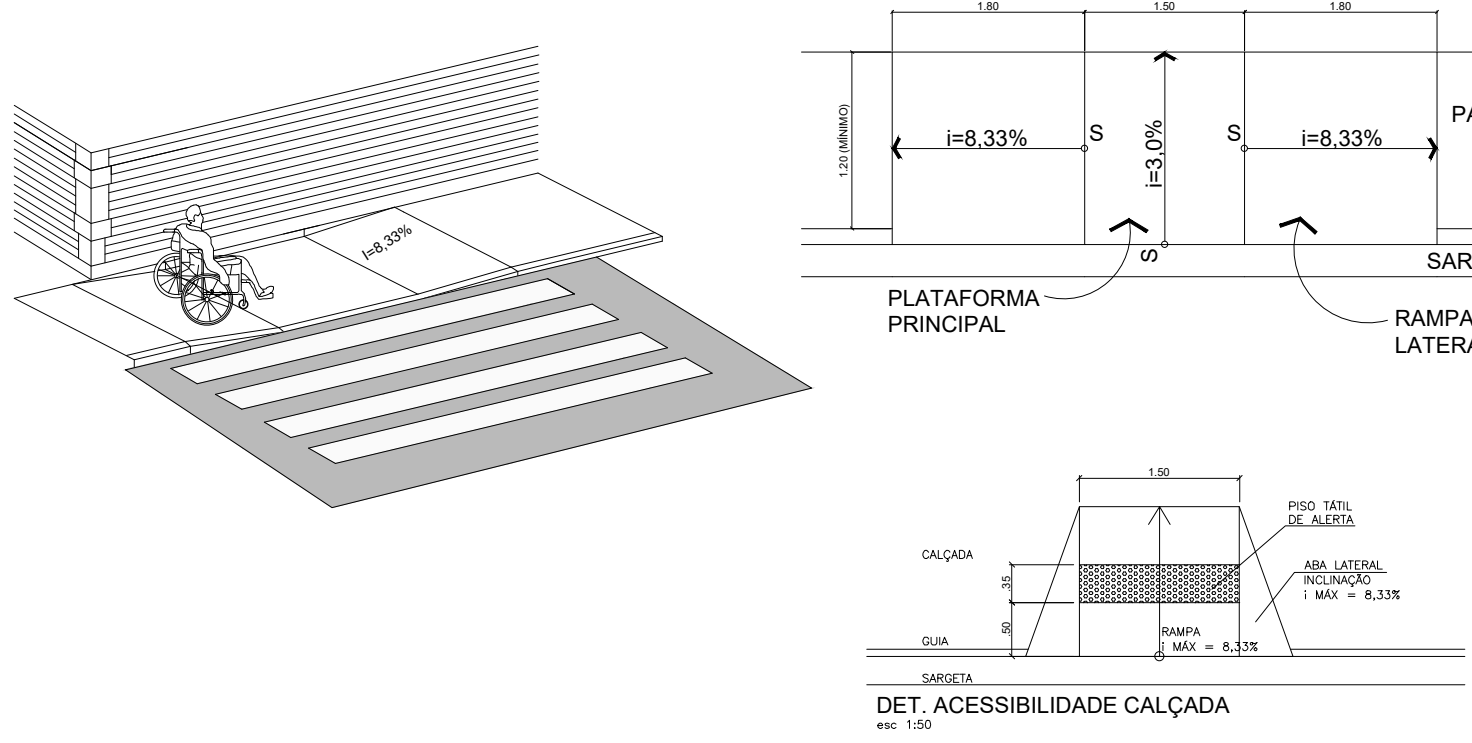

APROVAÇÃO DEMITRAN

DR. JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR PREFEITO DE ARACAJÓ DA BERRA	DR. JAIR FERREIRA DUARTE JUNIOR SECR. DE RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUIÇÕES CÍVILIS	ENG. VINÍCIUS AYUB DE CAMPOS ABRAME RESPONSÁVEL TÉCNICO
REVISÃO	DATA	ASSUNTO
REV. 01	16/02/22	EMISSÃO INICIAL
RESPONSÁVEL	DATA	ASSUNTO
ENG. VINÍCIUS AYUB DE CAMPOS ABRAME	02/2022	PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAÇÃO



SETOR DE CONVÊNIOS

OBJETO: PAV. ALVORADA - FASE 02 - AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, R. BAHIA T-2 E R. SANTA CATARINA T-2	PROJETO: DR. JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR	SEÇÃO TÉCNICA: ENG. MARCOS LARA
PROJETO DE DRENAÇÃO: GERENTE EMANUEL HENRIQUE	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO: ARQUITETA FERNANDA CATARINO	PROJETO DE SINALIZAÇÃO: VICTÓRIA SORIANO SANTOS
PROJETO BÁSICO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAÇÃO	DATA: 02/2022	REVISÃO: 00
PROJETO BÁSICO - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	DATA: 08/09	REVISÃO: 00
AV. PRES. GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02	PROJETO BÁSICO - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	PROJETO BÁSICO - SINALIZAÇÃO VIÁRIA
ESTACAS 23 A 30	PROJETO BÁSICO - SINALIZAÇÃO VIÁRIA	PROJETO BÁSICO - SINALIZAÇÃO VIÁRIA

